

## Smlouva č. 10295/2020/OIMH na zhotovení projektové dokumentace vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru

uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany:

#### Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava - Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství  
k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla,  
ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky  
a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě  
Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství,  
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic  
a místního hospodářství,  
Ing. Monikou Frydrychovou, referentkou oddělení investic, odboru investic  
a místního hospodářství

---

ÍČO: 00845451  
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

---

dále jen „objednatel“

a

#### DK projekt, s.r.o.

Sídlo:

Bohumínská 94/113, 712 00, Ostrava - Muglinov

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX

---

ÍČO: 277 75 518  
DIČ: CZ27775518  
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX  
VS: XXXXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX  
Zapsán: C 51461 vedená u Krajského soudu v Ostravě

---

dále jen „zhotovitel“

## čl. I.

### Základní ustanovení

1. Účelem uzavření této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení případně ohlášení v podrobnostech pro provádění stavby „**Výměna ZTI v ZŠO, Zelená 42**“ (dále jen „stavba“) včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti, funkce koordinátora BOZP v přípravě stavby a autorského dozoru, a to dle požadavků objednatele, ustanoveními této smlouvy, platných ČSN, hygienických norem a souvisejících předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 499/2006 Sb.“).
2. Objednatel touto smlouvou zmocňuje zhotovitele, aby jednal jako objednatelův zástupce ve všech záležitostech souvisejících se zhotovením a projednáním projektové dokumentace pro zajištění vydání příslušných povolení a rozhodnutí (zejména při získávání všech nezbytných souhlasných vyjádření a nutných povolení od dotčených správních orgánů a fyzických nebo právnických osob), nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak. Za tímto účelem uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy a zavazují se jejich změny ohlásit bez prodlení druhé smluvní straně. O změně těchto údajů není nutné uzavírat dodatek smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět této smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

## čl. II.

### Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo, spočívající ve:
  - A) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (případně ohlášení) v podrobnostech pro provádění stavby a zajištění inženýrské činnosti pro zajištění vydání příslušných povolení a rozhodnutí (vyřízení pravomocného stavebního povolení, případně souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, popř. územního souhlasu),
  - B) vypracování plánu BOZP a zajištění funkce koordinátora BOZP v přípravě stavby,
  - C) výkonu autorského dozoru.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace zpracovaná na základě této smlouvy bude součástí zadávacích podmínek na výběr zhotovitele stavby. V případě, že v průběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby vyvstane potřeba vysvětlit, změnit nebo doplnit nějakou část projektové dokumentace, zavazuje se zhotovitel poskytnout k tomuto objednateli bezúplatně veškerou potřebnou součinnost (tzn. zejména poskytnout odpovědi na dotazy objednatele a v případě potřeby upravit nebo dopracovat část projektové dokumentace), a to e-mailem bezodkladně po obdržení žádosti objednatele. Tato lhůta („bezodkladně“) nemusí být dodržena pouze z objektivních důvodů spočívajících zejména v rozsahu žádosti a složitosti zpracování odpovědi. Úplata za tuto činnost je součástí ceny za plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
3. Inženýrskou činností dle této smlouvy se rozumí poskytnutí takových odborných a souvisejících výkonů, které vedou k naplnění účelu vymezenému touto smlouvou. Inženýrskou činnost bude zhotovitel provádět jménem objednatele a na jeho účet s odbornou péčí, podle pokynů objednatele a v rozsahu dle této smlouvy. Součástí inženýrské činnosti jsou zejména tyto práce:
  - vedení všech nákladů spojených s inženýrskou činností,
  - uhrazení všech správních poplatků,
  - zajištění podkladů, identifikace parcel a objektů na nich, zjištění parcel, sousedů dotčených stavbou,

- navázání kontaktů s vlastníky dotčených nemovitostí a spolupráce při získání písemných souhlasů se stavbou, se vstupem na pozemky a realizací stavby (např. smluv o právu provést stavbu),
- projednání projektu s dotčenými orgány a organizacemi, vypracování podkladu a podání žádosti pro vyřízení pravomocného stavebního povolení, případně souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, popř. územního souhlasu, včetně všech požadovaných příloh pro stavbu,
- ostatní inženýrské práce neuvedené výše a související s předmětem plnění dle této smlouvy.

4. Jednotlivé činnosti dle této smlouvy zahrnují zejména následující:

- A) Projektová dokumentace pro stavební povolení případně ohlášení v podrobnostech pro provádění stavby bude vypracována dle stavebního zákona a vyhlášek k tomuto zákonu, včetně všech příloh v těchto předpisech citovaných a příslušných ČSN. Dokumentace bude obsahovat všechny potřebné náležitosti stanovené ZZVZ a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“), aby mohla být použita pro výběr zhotovitele stavby.
- 1) V průběhu zpracování projektové dokumentace bude návrh řešení konzultován a odsouhlasen objednatel formou výrobních výborů, které se musí konat min. 1x měsíčně. V případě, že doba plnění dle čl. III odst. 1 této smlouvy bude kratší než 1 měsíc, musí se výrobní výbor konat min. 2x. Termín konání výrobního výboru projedná zhotovitel s dostatečným předstihem prostřednictvím osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických dle této smlouvy. Z každého výrobního výboru vyhotoví zhotovitel zápis, který rozešle všem zúčastněným a následně jej upraví dle jejich připomínek.
- 2) Součástí projektové dokumentace budou všechny nezbytné doklady o projednání s dotčenými orgány a organizacemi státní správy, správci a majiteli stávajících inženýrských sítí a příslušnými orgány a organizacemi, jichž se předmět stavby týká, včetně písemného doložení jejich vyjádření, a soupis prací.
- 3) Soupis prací nesmí obsahovat položku „rezerva“. V projektové dokumentaci se nebudou v případě, že to nebude nezbytně nutné, vyskytovat odkazy na určité dodavatele nebo výrobky (např. identifikace obchodní firmy, názvu nebo jména a příjmení dodavatele nebo identifikace zboží, služeb nebo specifického postupu, které platí pro určitou osobu). Objednatel bude výslovně upozorněn na skutečnost, že se takový odkaz v projektové dokumentaci nachází.
- B) Funkce koordinátora BOZP v přípravě stavby:
- 1) Zhotovitel bude vykonávat činnost koordinátora stavby v přípravě stavby ve smyslu nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Součástí činností bude rovněž vypracování plánu BOZP, který bude součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, případně ohlášení.
- C) Autorský dozor:
- 1) Výkon autorského dozoru při realizaci stavby bude zahrnovat zejména:
- účast zhotovitele na předání staveniště zhotoviteli stavby,
  - poskytování vysvětlení a objasnění projektové dokumentace v průběhu realizace stavby,
  - účast zhotovitele na kontrolních dnech stavby nebo jiných jednáních dle výzvy objednatele,
  - kontrolu dodržování projektové dokumentace při realizaci stavby,
  - posuzování návrhů na změny a odchylky od projektové dokumentace,
  - spolupráci s koordinátorem BOZP,

- projekční řešení malých změn projektové dokumentace (nákresy, náčrty),
  - projekční řešení upřesňující stávající projektovou dokumentaci (výkresové části),
  - účast při předání a převzetí dokončené stavby (nebo její části),
  - specifikace výrobků, jež jsou v projektové dokumentaci navrženy pouze obecně nikoliv odkazem na přesný výrobek či dodavatele výrobku s ohledem na skutečnost, že projektové dokumentace v jejich jednotlivých fázích jsou podkladem pro zadávací řízení dle ZZVZ.
- 2) Způsob provádění autorského dozoru („AD“):
- výkon AD bude prováděn dle výzvy objednatele nebo zhotovitele stavby provedené telefonicky, emailem či osobně, nebo individuálně dle úvahy zhotovitele,
  - s výjimkou účasti na kontrolních dnech bude účast zhotovitele na stavbě nebo jednáních vždy dohodnuta min. 2 pracovní dny předem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
  - o výkonu AD učiní zhotovitel stručný záznam nebo zápis do stavebního deníku, eventuálně samostatně (lze též řešit e-mailovou poštou),
  - objednatel předá zhotoviteli všechny potřebné podklady, informace a údaje nutné pro řádný výkon AD,
  - zhotovitel se zavazuje vykonávat AD včas, odborně a řádně, dle potřeb objednatele.
- 3) V rámci výkonu autorského dozoru je zhotovitel povinen účastnit se kontrolních dní, kde provádí kvantitativní a kvalitativní kontrolu stavby s ohledem na shodu provádění stavby s projektovou dokumentací. Zhotovitel je povinen zajistit do zápisu z kontrolního dne potvrzení o tom, že dosavadní práce na stavbě byly provedeny v souladu s projektovou dokumentací, případně v čem spatřuje rozpor prací na stavbě s obsahem projektové dokumentace a jaký postup na odstranění tohoto nesouladu navrhuje. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou pro posouzení shody stavby s projektovou dokumentací.

### čl. III.

#### Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Projektová dokumentace pro stavební povolení případně ohlášení v podrobnostech pro provádění stavby vč. všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inženýrských sítí a orgánů státní správy vč. podané žádosti o vydání stavebního povolení případně ohlášení pro stavbu (s potvrzením o podání této žádosti na příslušný stavební úřad) a plán BOZP bude objednateli předána do **90 kalendářních dnů** od nabytí účinnosti smlouvy.
3. Funkce koordinátora BOZP bude vykonávána během přípravy stavby a bude ukončena předáním aktualizovaného plánu BOZP.
4. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen nabytím právní moci všech kolaudačních rozhodnutí nebo převzetím stavby, nebude-li v souladu se stavebním zákonem žádáno o kolaudační souhlas.
5. V případě vzniku překážek, které brání zhotoviteli v plnění jeho povinností dle této smlouvy a které neleží na jeho straně ani jim s náležitou péčí nemohl zabránit (např. překážky ze strany dotčených orgánů státní správy, vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí nebo vlastníků dotčených objektů), lze dobu plnění dle této smlouvy po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran o dobu trvání těchto překážek prodloužit.
6. Za úplnou (řádnou) žádost dle odst. 2 tohoto článku smlouvy se považuje žádost se všemi přílohami vyžadovanými stavebním zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu.

#### čl. IV.

##### Odměna za plnění

1. Odměna za splnění předmětu plnění dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

		Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
A	Projektová dokumentace pro stavební povolení (případně ohlášení stavby) v podrobnostech pro provádění stavby vč. inženýrské činnosti	149.400,-	31.374,-	180.774,-
B	Funkce koordinátora BOZP vč. plánu BOZP	20.500,-	4.305,-	24.805,-
D	CENA CELKEM (D = A + B)	169.900,-	35.679,-	205.579,-

		Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
C	CENA - autorský dozor	30.000,-	6.300,-	36.300,-

		Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
	CENA CELKEM (C + D)	199.900,-	41.979,-	241.879,-

2. Cena C je dána hodinovou sazbou autorského dozoru 600,- Kč/hod bez DPH při maximálním počtu **50** hodin, takto vypočtená částka je maximální a nepřekročitelná. Tato odměna za autorský dozor bude zhotoviteli vyplacena dle skutečně odpracovaných a objednatelům potvrzených hodin autorského dozoru vyúčtovaných dle čl. IX. odst. 8 písm. b) této smlouvy.
3. V celkové ceně (C + D) jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky a náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení plnění dle této smlouvy, včetně správních poplatků a veškerých tisků nutných pro zabezpečení všech činností dle této smlouvy. Součástí ceny jsou i náklady na práce a dodávky, které v této smlouvě nejsou výslovně uvedeny a zhotovitel ze svých odborných znalostí a zkušeností o nich měl nebo mohl vědět, není-li dále stanoveno jinak.
4. Celková cena (C + D) obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení plnění dle této smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
6. Cena celkem (C + D) dle této smlouvy je sjednána jako cena nejvýše přípustná (maximální). Překročení ceny je možné v případě, že v průběhu realizace plnění dle této smlouvy dojde ke zvýšení sazeb DPH. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti této změny zákonné sazby DPH povinen účtovat sazbu DPH ve vyšší odpovídající této změně. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

#### čl. V.

##### Předání díla

1. Dílo dle této smlouvy (jeho samostatné jednotlivé části) bude objednateli předáno osobně na odboru investic a místního hospodářství nebo na podatelně v sídle objednatele v termínu dle čl. III. této smlouvy.
2. Projektová dokumentace dle čl. II odst. 1 písm. A) a plán BOZP dle čl. II odst. 1 písm. B) bude objednateli předána v listinné podobě v 6 vyhotoveních (se 2 oceněnými položkovými rozpočty a 2 slepými rozpočty) a 1 vyhotovení vč. oceněného a slepého rozpočtu na CD (DVD).

3. Textové, výkresové a ekonomické části dokumentací v elektronické podobě budou zpracovány se zajištěním antivirové ochrany, a to následujícím způsobem: Textové a tabulkové části dokumentací musí být objednateli poskytnuty ve formátech kompatibilních s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresové části ve formátu kompatibilním s programy CAD v podobě alespoň pro čtení (dovolené formáty: \*.dwg, \*.dwf, \*.dxf, \*.plp, \*.pdf).
4. Veškeré dokumenty, které je zhotovitel povinen dle této smlouvy vypracovat a předat objednateli musí být předány v podobě a rozsahu požadovaném touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a příslušným stavebním úřadem (tzn. řádná dokumentace bez jakýchkoliv vad či nutnosti doplňování, včetně všech vyjádření a stanovisek). V opačném případě není dílo dokončeno řádně a objednatel není povinen předávanou dokumentací převzít.  
Dílo (jeho samostatná část) je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. O předání a převzetí díla (samostatné části) se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli, a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Převzetím příslušné dokumentace a podpisem protokolu nepotvrzuje objednatel skutečnost, že byla podána řádná (úplná) žádost dle čl. III odst.6.
5. Smluvní strany si tímto vyloučily použití ust. § 2605 odst. 2 a § 2609 občanského zákoníku.

## čl. VI.

### Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel je povinen přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se zhotovitel nezúčastnil.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelné nebo objednatele poškozují.
3. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli k odsouhlasení rozhodující písemnosti.
4. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětu smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen uplatňovat práva objednatele ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti.
6. Zhotovitel je povinen při výkonu oprávnění upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik újmy, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá za újmu takto vzniklou.
7. Jestliže zhotovitel při své činnosti získá pro objednatele jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.
8. Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou péčí.
9. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny objednatele a jednat v jeho zájmu. Od pokynů objednatele se může zhotovitel odchýlit jen, je-li to nezbytně nutné, a to v zájmu objednatele, pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat objednatele a vyžádat si dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno touto smlouvou, zhotovitel se od pokynů nesmí odchýlit.
10. Zhotovitel je povinen bez odkladů oznámit objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů objednatele.
11. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti této smlouvy sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem činností dle této smlouvy, a to v min. výši 1 mil. Kč. Zhotovitel je povinen kdykoliv na požádání objednatele předložit mu pojistnou smlouvu k nahlédnutí.

## čl. VII.

### Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění zhotovitele se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy bylo zhotoveno v souladu s požadavky

objednatele, jež byly nebo musely být zhotoviteli známy, v souladu s právními předpisy a technickými normami platnými v době předání díla, obsahující zejména požadavky na obsah a náležitosti projektové dokumentace a požadavky na způsob a kvalitu provedení stavby na podkladě projektové dokumentace. Zhotovitel odpovídá dále za to, že projektová dokumentace je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným v této smlouvě. Zhotovitel dále v souladu s ust. § 159 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, vč. vlivů na životní prostředí.

3. Dílo dle této smlouvy má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
5. Zhotovitel poskytuje na dílo dle této smlouvy záruku v délce 60 měsíců. Pokud bude v průběhu této záruční doby zahájena realizace stavby dle projektové dokumentace zhotovené na základě této smlouvy, prodlužuje se záruční doba o 60 měsíců běžících ode dne předání stavby.
6. Záruční doba začíná plynout dnem řádného předání a převzetí díla bez vad.
7. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odešle toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
8. Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně po doručení písemného oznámení o vadě.
9. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud nebude v oznámení stanovena delší lhůta.
10. Neodstraní-li zhotovitel vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt nebo odstranit vadu sám. Zhotovitel je následně povinen takto vynaložené náklady uhradit objednateli v plné výši.
11. Zhotovitel předá po řádném odstranění vady objednateli písemné oznámení o odstranění vady. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v odst. 5 tohoto článku smlouvy.
12. Zhotovitel odpovídá za to, že při výkonu autorského dozoru postupuje s péčí řádného hospodáře zejména tak, aby stavba odpovídala ve svém provedení projektové dokumentaci.
13. V případě, že vady projektové dokumentace budou mít za následek zvýšení ceny stavby (nákladů na provedení příp. i opravu stavby), realizované na jejím základě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jako náhradu škody částku, o kterou se navýšila původní cena stavby (náklady na provedení stavby).

## čl. VIII.

### Odpovědnost za újmu

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu plnění dle této smlouvy nebo jeho části či v důsledku vadného plnění povinností zhotovitele nese zhotovitel v plném rozsahu.
2. Za újmu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění.

## čl. IX

### Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelům se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených

v odst. 8 tohoto článku smlouvy.

3. Podkladem pro úhradu odměny dle čl. IV této smlouvy (každého dílčího plnění) je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a bude obsahovat zejména tyto údaje:
- a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky,
  - b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
  - c) obchodní firma, místo podnikání IČO a DIČ zhotovitele,
  - d) název, sídlo a DIČ objednatele a zhotovitele, přičemž jako sídlo objednatele bude uvedeno sídlo statutárního města Ostravy, tzn. že daňový doklad bude vystaven takto:

**Objednatel:**

Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 1803/8  
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451

**Příjemce (zasílací adresa):**

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  
Náměstí Dr. E. Beneše 555/6  
729 29 Ostrava – Moravská Ostrava

přičemž faktura bude doručována na adresu sídla městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tj. náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava,

- e) číslo a datum vystavení faktury,
  - f) lhůtu splatnosti faktury,
  - g) soupis provedených prací,
  - h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
  - i) vlastnoruční podpis včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila.
4. Lhůta splatnosti všech faktur je dohodou stanovena do 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli. Stejný termín splatnosti do 30 kalendářních dnů od doručení druhé smluvní straně platí pro smluvní strany i při placení jiných peněžitých plnění vzniklých z této smlouvy (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).
5. Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty.
6. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsáním příslušné částky z účtu objednatele.
8. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:
- a) objednatel uhradí zhotoviteli odměnu D ( $D = A + B$ ) dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy na základě faktury vystavené po převzetí kompletní projektové dokumentace vč. plánu BOZP a oznámení o zahájení stavebního řízení, případně sdělení, že stavební úpravy nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavby,
  - b) objednatel uhradí zhotoviteli odměnu C dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy za autorský dozor po nabytí právní moci posledního kolaudačního souhlasu pro stavbu, nebo po převzetí dokončené



stavby (nebude-li na stavbu vyžadován kolaudační souhlas) dle skutečně odpracovaných a objednatelům potvrzených hodin autorského dozoru, maximálně však 30.000,- Kč bez DPH.

9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli cenu na základě faktury vystavené dle odst. 8 písm. a) tohoto článku smlouvy pouze ve výši 90%. Zbývajících 10% představuje zádržné, které uhradí objednatel nejpozději do 13 měsíců ode dne převzetí dokumentace v případě, že do této doby nebude uzavřena smlouva se zhotovitelem stavby, nebo do 30 dnů od dokončení a převzetí stavby, nebude-li zádržné použito na úhradu závazků zhotovitele. Zádržné zajišťuje veškeré závazky zhotovitele vzniklé z této smlouvy, a to včetně případné úhrady ceny třetím subjektům za provedené práce, k nimž byl podle této smlouvy povinen zhotovitel.
10. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato smluvní strana povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
11. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své i nesplatné pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli dle této smlouvy proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za plnění dle této smlouvy.
12. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
13. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatel uhradit sjednanou cenu.

## čl. X

### Sankční ujednání

1. V případě nedodržení jakéhokoliv termínu plnění dle čl. III odst. 2 této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové odměny (C+ D) bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost spojenou s výkonem inženýrské činnosti dle čl. II odst. 3 této smlouvy, s výkonem funkce koordinátora BOZP dle čl. II odst. 4 písm. B) této smlouvy nebo s výkonem autorského dozoru dle čl. II odst. 4 písm. C) této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý zjištěný případ a každý i započatý den, ve kterém bude porušení trvat.
3. V případě, že zhotovitel poruší povinnost podat úplnou (řádnou) žádost dle čl. III. odst. 2 této smlouvy, v důsledku čehož bude řízení přerušeno a žadatel vyzván k odstranění nedostatků, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové odměny (C + D) bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to ode dne doručení oznámení stavebního úřadu o přerušování řízení do dne doručení oznámení stavebního úřadu o znovuzahájení řízení).
4. V případě, že zhotovitel neposkytne potřebnou součinnost dle čl. II odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý zjištěný případ a každý i započatý den, ve kterém bude porušení trvat.
5. V případě, že zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady dle čl. VII. odst. 9 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý zjištěný případ a každý i započatý den prodlení.
6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost vypracovat projektovou dokumentaci (jakoukoliv část) dle této smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy ve znění platném v době zpracování projektové dokumentace, ČSN platnými v době zpracování projektové dokumentace nebo ustanoveními této smlouvy a v důsledku tohoto porušení bude objednatel v rámci realizace stavby povinen uhradit vícepráce, které nebyly zahrnuty do projektové dokumentace, je zhotovitel povinen

objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z vynaložených nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele bez DPH za každý zjištěný případ.

7. V případě, že projektová dokumentace pro provádění stavby dle čl. II odst. 4 písm. A) této smlouvy nebude vypracována v souladu se ZZVZ ve znění platném v době zpracování projektové dokumentace nebo vyhláškou č. 169/2016 Sb. ve znění platném v době zpracování projektové dokumentace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za projektovou dokumentaci pro provádění stavby bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý zjištěný případ.
8. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚHOS“) zjistí během zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby (která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli.
9. Zánik závazku dle této smlouvy neznamena zánik nároku na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma. Zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany závazek splnit ani právo strany oprávněné požadovat vedle smluvní pokuty i náhradu újmy do výše skutečně vzniklé újmy.

## čl. XI.

### Autorská práva

1. Zhotovitel uděluje objednateli oprávnění užívat výsledky jeho tvůrčí činnosti dle této smlouvy (včetně hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti), a to všemi časově a místně neomezenými způsoby užití, jak je zná § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), a to v neomezeném rozsahu. Součástí poskytnuté licence je zejména oprávnění objednatele nakládat s dílem dle této smlouvy jak v původní podobě, tak ve zpracované podobě, či v jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a použít jej jako podkladu pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. Zhotovitel dává souhlas objednateli s odchýlením se od díla zpracovaného dle této smlouvy a jeho změnou a souhlas k provedení změn již realizované stavby a také souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn zhotovené dílo neužívat.
2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím svých zaměstnanců při plnění pracovněprávních povinností a ve smyslu § 58 autorského zákona bude vykonavatelem majetkových práv autora. Zhotovitel je oprávněn dílo, které je předmětem této smlouvy provádět pomocí třetích osob pouze v případě, že si zajistí platnou licenční smlouvu, která bude obsahovat souhlas třetí osoby (vykonavatele autorských práv) s užitím díla objednatel k účelu, který je vymezen v této smlouvě, a to ke všem způsobům užití a ve stejném rozsahu, jak je uvedeno v odst. 1 tohoto článku této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práva z licence, pokud se bude jednat o osobu majetkově propojenou s objednatel.
4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že odměna za poskytnutí licence dle této smlouvy je součástí odměny dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

## čl. XII.

### Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, přičemž smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

2. Objednatel může smlouvu nebo její část i bez udání důvodů kdykoli písemně vypovědět se čtrnáctidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli.
3. Účinností výpovědi zaniká závazek zhotovitele uskutečňovat činnosti, na které se výpověď vztahuje a zhotovitel od tohoto okamžiku nebude pokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti.
4. Ust. § 2443 občanského zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě, že bude tato smlouva vypovězena nebo příkaz odvolán z důvodu porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.
5. V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
6. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které lze označit jako obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozví v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám.
8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany (s výjimkou, kdy tato smlouva výslovně uvádí, že není potřeba uzavřít dodatek) pouze formou písemných dodatků uzavřených v listinné podobě, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
9. Odpověď strany podle ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy nebo dodatku k ní, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
10. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
11. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
12. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.
13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
14. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
15. K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle směrnice SME 2019 – 01 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 4. 2. 2019 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

**Za objednatele**

Datum: 10. 6. 2020

Místo: Ostrava

\_\_\_\_\_  
**Ing. Jiří Vozňák**

vedoucí odboru investic a místního hospodářství

**Za zhotovitele**

Datum: 9. 6. 2020

Místo: Ostrava

\_\_\_\_\_  
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

**Přílohy:**

Příloha č. 1 – Plná moc ke smlouvě č. 10295/2020/OIMH

Příloha č. 2 – Zadání

Příloha č. 1 smlouvy č. 10295/2020/OIMH

## PLNÁ MOC

ke smlouvě č.: 10295/2020/OIMH

na inženýrskou činnost pro stavbu „Výměna ZTI v ZŠO, Zelená 42“

**Zmocnitel:** Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  
nám. Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Mor. Ostrava  
IČO: 00845451  
Zastoupený: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

**Zmocněnec:** DK projekt, s.r.o.  
Bohumínská 94/113, 712 00, Ostrava - Muglinov  
IČO: 277 75 518  
Zastoupený: XXXXXXXX

Zmocnitel touto plnou mocí zmocňuje zmocněnce, aby za něj dle smlouvy č. 10295/2020/OIMH vykonal inženýrskou činnost pro zajištění vydání pravomocného stavebního povolení pro stavbu „Výměna ZTI v ZŠO, Zelená 42“.

V rámci uvedeného zmocnění bude zmocněnec jménem a na účet zmocnitele zastupovat zmocnitele v územním řízení, stavebním řízení a ve všech správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, tj. zejména:

- podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za zmocnitele písemnosti,
- zajišťovat veškerá vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, účastnit se veškerých jednání k zajištění potřebných vyjádření k projektové dokumentaci,
- v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy č. 10295/2020/OIMH do nabytí právní moci všech stavebních povolení na stavbu „Výměna ZTI v ZŠO, Zelená 42“.

Za zmocnitele  
V Ostravě dne: 10. 6. 2020

---

**Ing. Jiří Vozňák**  
vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

Za zmocněnce  
V Ostravě dne: 9. 6. 2020

---

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXX

Příloha č. 2 smlouvy č. 10295/2020/OIMH

## Zadání

### Požadavek na zpracování projektové dokumentace na výměnu zdravotnické v Základní škole Ostrava, Zelená 42, PO

#### Stávající stav:

Základní škola Ostrava, Zelená 42, PO se nachází na parcele č. 2635/30, 2641/77, 2641/13 a 4057 v k. ú. Moravská Ostrava, v obci Ostrava. Objekt školy tvoří komplex stavebně a funkčně propojených budov (A, B, C, D, E, F, G, H, I), kde nejstarší a největší část školy pochází z 50. let. 20. století. Zadáním projektové dokumentace je komplexní výměna zdravotnické z důvodu řešení špatného stavu původních rozvodů vody a kanalizace (tyto jsou zanesené inkrustacemi a praskají). Opravy a výměny byly doposud řešeny jen lokálně. Předpokládá se, že realizace výměn bude po etapách dle zpracovaného projektu a bude si ji zajišťovat škola sama (tj. příspěvková organizace objednatele).


#### Požadavky na vypracování projektové dokumentace:

- Vypracovat projektovou dokumentaci vč. rozpočtu dle samostatných funkčních celků tak, aby bylo možné výměnu zdravotnické realizovat postupně v samostatných etapách, kdy jako první etapa je požadována výměna či oprava v budově F a druhá v budově I a navazující části budovy G. Další funkční rozdělení do samostatných celků a jednotlivých etap je ponecháno na návrhu projektanta, který bude předložen k odsouhlasení na výrobním výboru. Schematické výseky jednotlivých objektů jsou v příloze zadání.
- Navrhnout výměnu zdravotnické, čítající rozvody vody a kanalizace vč. zařizovacích předmětů a směšovacích baterií, a obměnu konstrukcí, jako např. dělicích stěn mezi záchody. V částech budov, kde byly v dřívější době prováděny částečné opravy zdravotnické, bude nezbytné ověřit jejich rozsah a na základě posouzení jejich stavu navrhnout výměnu či opravu tak, aby v budoucnu nedocházelo k poruchám neměněných částí a prvků.
- Provést kontrolu rozvodů požární vody a na základě posouzení jejich charakteru a stavu navrhnout případnou výměnu, tak aby splňovaly požadavky na požární vodovod.
- Navrhnout výměnu nebo opravu ležaté kanalizace vč. přípojek (vč. popisu technologického postupu provádění), a to těch částí, kde je na základě kamerového monitorovacího systému shledán jejich vadný stav či poškození (rozsah výměny popř. opravy je zakreslen v grafické příloze zadání pod bodem č. 10). Největší poškození a degradaci vykazuje ležatá kanalizace v budově A, B a C vč. kanalizačních přípojek s napojením na ulici Zelenou, kde převažují betonové a kameninové rozvody pocházející pravděpodobně z roku 1952.
- Provéřit stav vodovodní přípojky a navazujících vodovodních rozvodů, v případě zjištěných nedostatků navrhnout potřebná opatření.
- Provéřit stav lapolu tuku, který byl realizován v roce 1995 a který v současné době vykazuje viditelnou deformaci v obvodové konstrukci.
- Ve všech místnostech soc. zařízení (v celé ploše) vyprojektovat vyměnění obkladů a dlažeb včetně ukončovacích a přechodových lišt, případně předložit jiné úpravy povrchů (návrhy projednat s objednatelem na výrobním výboru). Obklady a dlažby vyprojektovat včetně příslušného hydroizolačního systému (stěrky + pásy) tam, kde je to relevantní. Podlahy musí vyhovovat požadavkům vyhl. 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dbát na bezpečnost s důrazem na protiskluznost a výškové rozdíly).
- V kuchyni a v přilehlých provozních prostorech (budova I) provést výměnu rozvodů a vody vč. obkladů a dlažeb se zřetelem na opotřebenost zdravotnické, popř. vzhledem k nevyhovujícímu stavu, kdy kuchyně a přilehlé místnosti byly rekonstruovány v roce 1995.
- V řešených místnostech vyprojektovat nové opláštění rozvodů zdravotnické vedoucích pod stropem případně nové podhledy (tj. zakrytí viditelných rozvodů).
- V místech měněných keramických obkladů řešit případnou částečnou výměnu elektroinstalace včetně výměny zásuvek a vypínačů, případně i svítidel.
- Součástí rozpočtu bude také drobné vybavení dle specifikace uživatele (zrcadla, sušáky, dávkovače mýdla apod., které bude projednáno na výrobním výboru).


- Do rozpočtu zahrnout stěhování nábytku a zařízení kuchyně vč. odpojení a opětovného napojení, zakrývání a ochranu povrchů a zařízení, výmalbu dotčených místností a komplexní úklid.

## Grafické přílohy zadání


### 1) Půdorysné schéma školy – budovy A, B, C, D, E, F, G, H, I

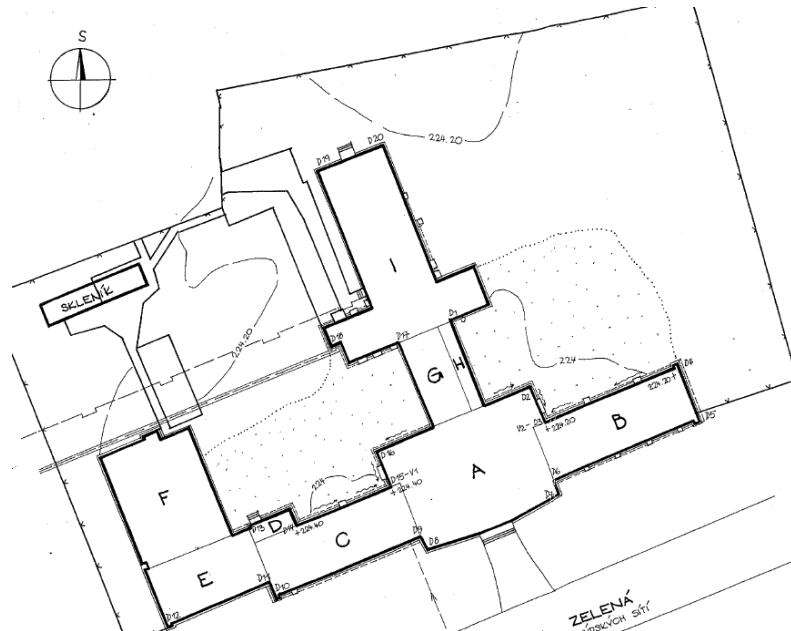

### 2) Výsek půdorysu budovy „F“ – zdravotnicka v 1., 2. a 3.NP

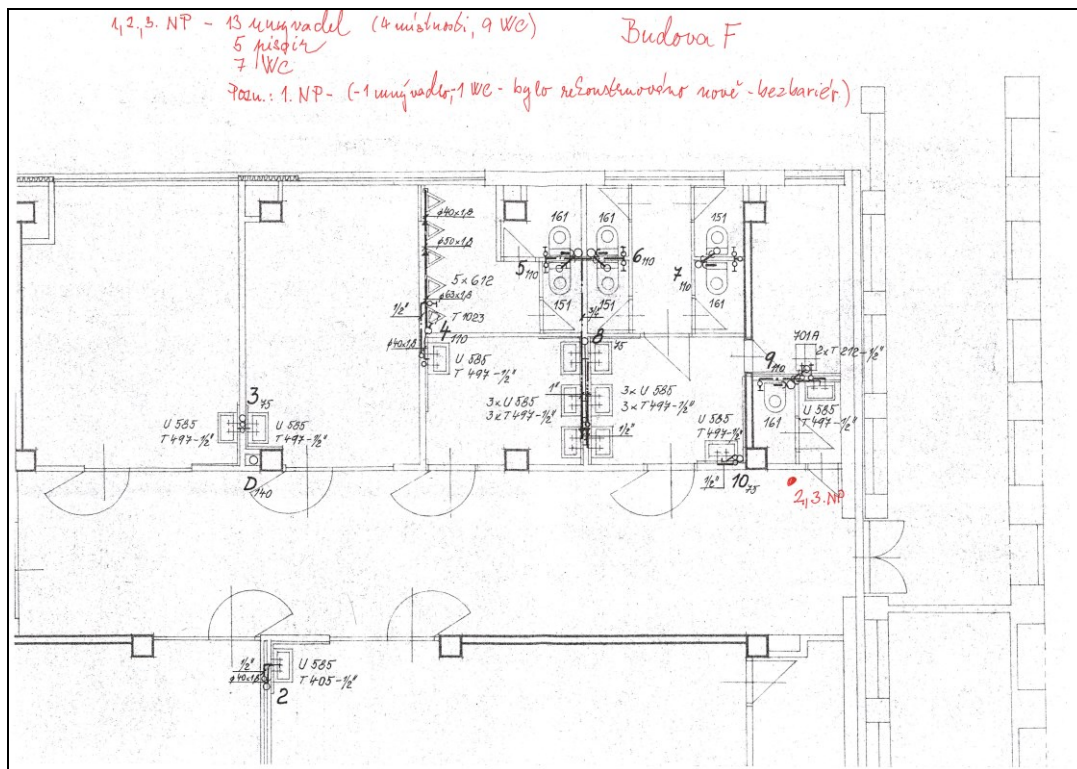


3) Půdorys budovy „I“ zdravotnicka v 1. NP - kuchyně vč. zázemí  
 (ve 2. NP je jen tělocvična)

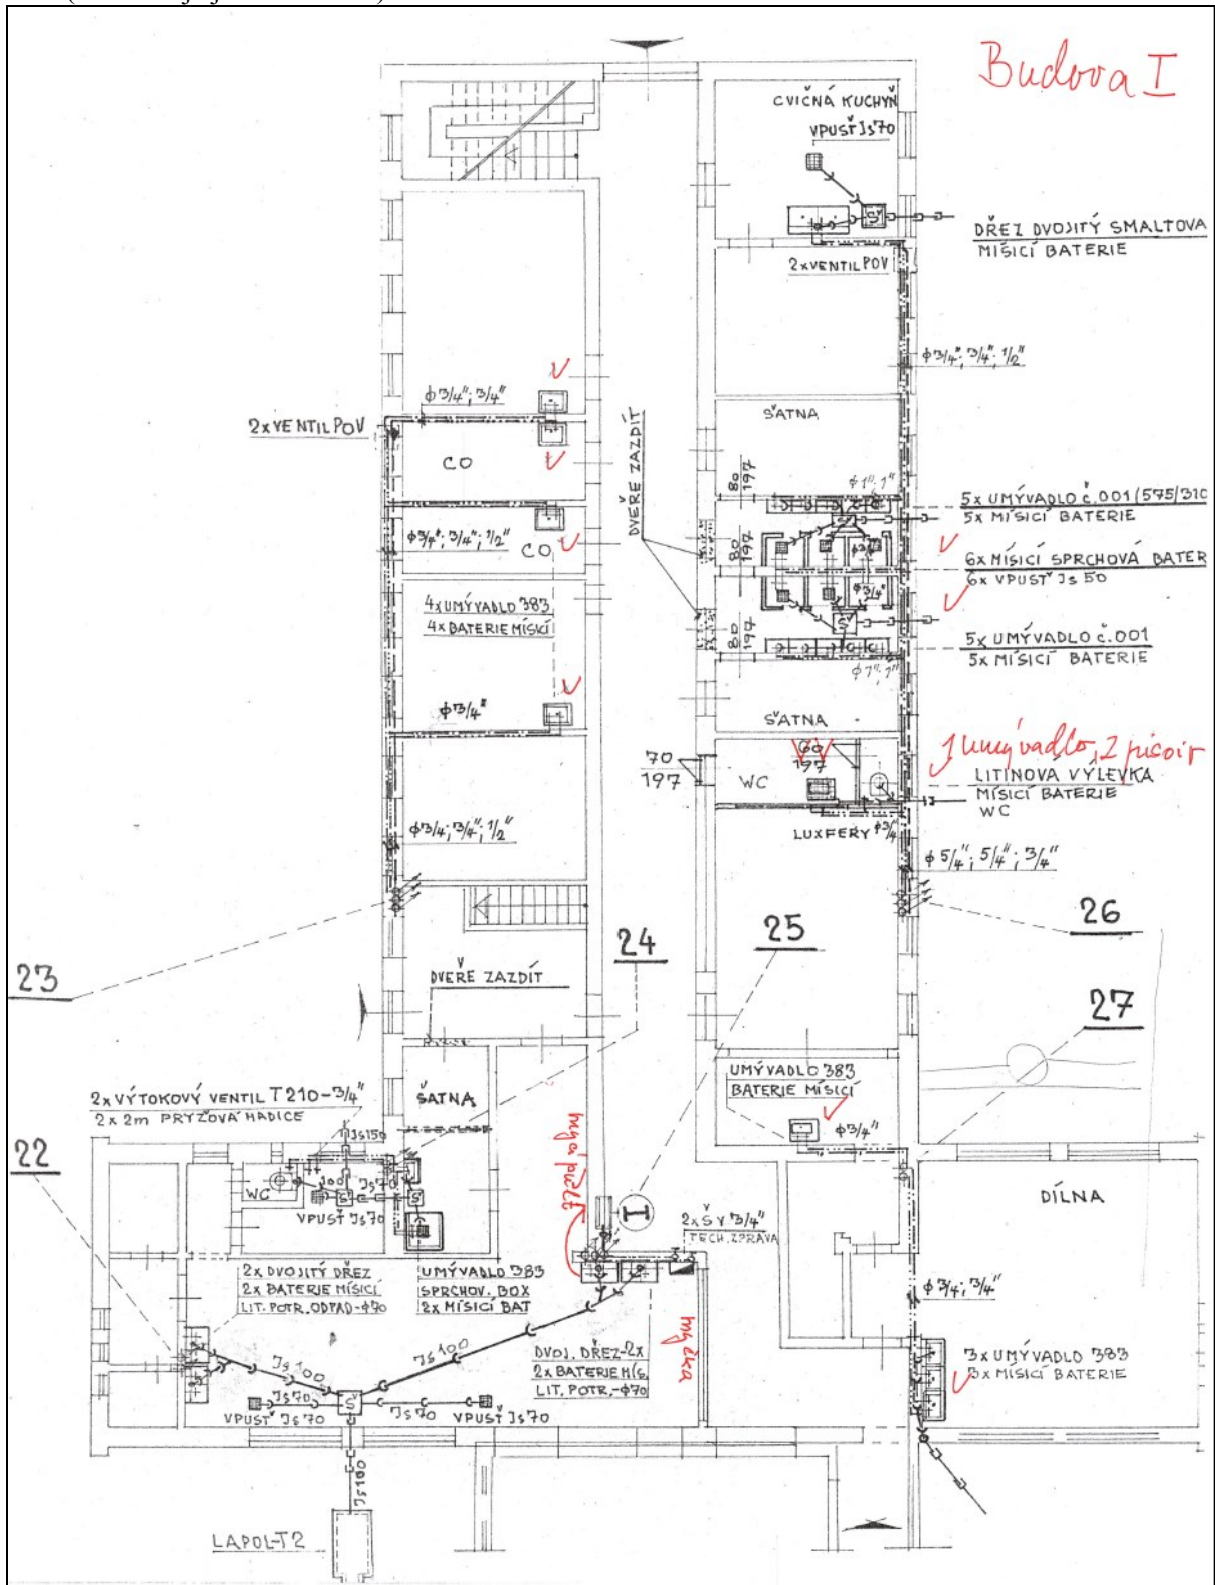







6) Schématický půdorys budovy „B“ (objekt je třípodlažní) - umývadla jsou v učebnách

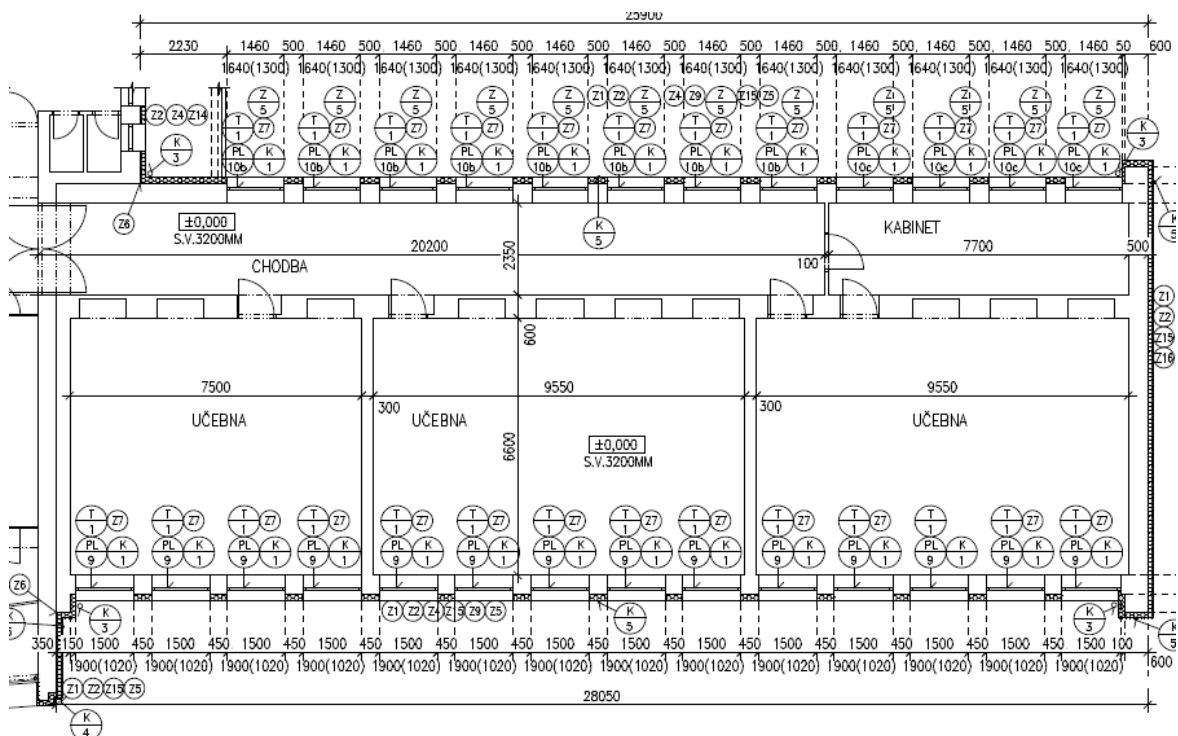


7) Schématický půdorys budovy „C“ a „D“ - 1.NP - umývadla jsou v učebnách a kancelářích

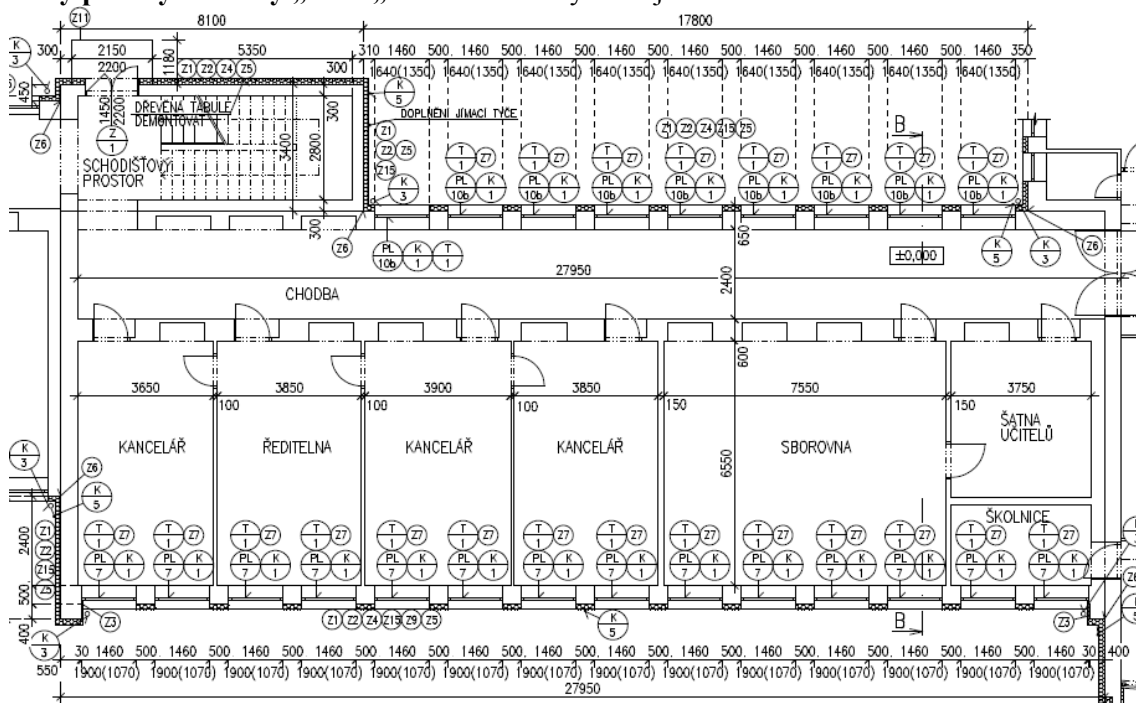

8) Schématický půdorys budovy „C“ a „D“ – 2. a 3.NP - umývadla jsou v učebnách a kabinetu

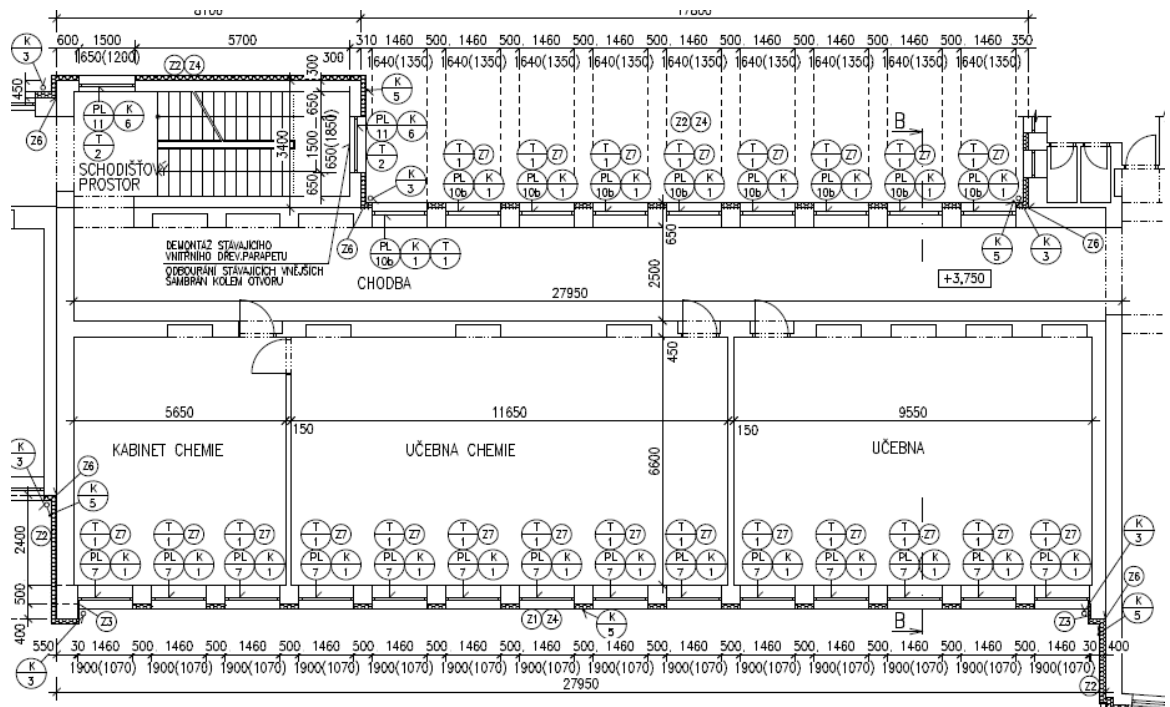

9) Schématický půdorys budovy „E“ - 1., 2. a 3.NP - umývadla jsou v učebnách

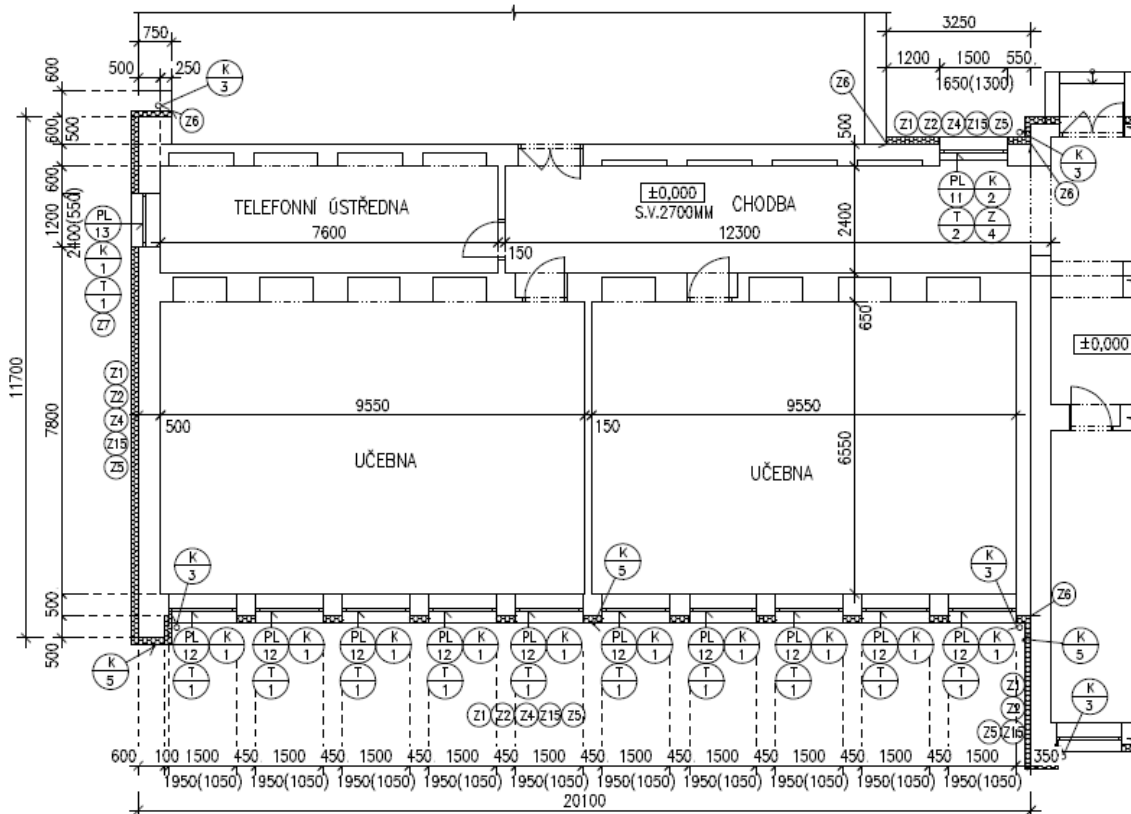

**10) Schématické vyznačení rozsahu výměny popř. opravy ležaté kanalizace**  
(rozsah vyznačen šikmým šrafováním růžové barvy)

