



Číslo Smlouvy CETIN: VPI/MJ/2020/00070
Číslo smlouvy Stavebníka: 27/2020/PRI
Číslo investiční akce: 7574

SAP S/4 Hana: 8030001322
Registr smluv: ANO



**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. VPI/MJ/2020/00070**

mezi

CETIN a.s.

a

statutární město Opava

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2020/00070
Číslo smlouvy Stavebníka: 27/2020/PRI
Číslo investiční akce: 7574

SAP S/4 Hana: 8030001322
Registr smluv: ANO

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená na základě pověření [redacted], supervizorem pro výstavbu

sítě, dle pověření ze dne 7.2.2020

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: [redacted]

datová schránka: qa7425t

(dále jen „CETIN“)

a

statutární město Opava

se sídlem Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

IČO: 00300535

DIČ: CZ00300535

zastoupeno [redacted] primátorem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

číslo účtu: [redacted]

datová schránka: 5eabx4t

(dále jen „Stavebník“)

CETIN a Stavebník dále společně označování jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „Smlouva“)

DEFINICE pojmů

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy níže uvedený význam, není-li touto Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh a současně realizační dokumentace Překládky, který je nedílnou Přílohou č. 1 této Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Kylešovice spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) této Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 této Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.“ ze dne 11.1.2017 a 19.4.2017 vydané pod čj. 50888/17, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC HZ Opava Kylešovice přel SEK**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených touto Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka dle této Smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě této Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizaci Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování CTN;
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však tři (3) měsíce od uzavření této Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“);

Stavebník podpisem této Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí vydané Magistrátem města Opavy, odbor výstavby – rozhodnutí o umístění stavby „Novostavba hasičské zbrojnice v areálu Městského dopravního podniku a.s. Opava – Kylešovice“ č.j. MMOP 72589/2017 ze dne 3.7.2017, které nabylo právní moci dne 12.7.2017, (dále jen „**Územní rozhodnutí**“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v Územním rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Územním rozhodnutí výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem této Smlouvy převáděná práva přijímá. Územní rozhodnutí je nedílnou Přílohou č. 2 této Smlouvy.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do tří (3) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva Stavebníka zastoupeného Odborem přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy;

(b) Stavebník uhradil náklady na CTN Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) této Smlouvy.

- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.
- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 této Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě této Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle této Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 této Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření této Smlouvy **284.147,- Kč** (slovy: *dvě stě osmdesát čtyři tisíc jedno sto čtyřicet sedm korun českých*). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN.
- 5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 této Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo

- dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
 - (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
 - (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
 - (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
 - (f) náklady na identifikaci parcel,
 - (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
 - (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
 - (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
 - (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
 - (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
 - (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
 - (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

- 5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě CTN se změně písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je tato Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti této Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 této Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:
- (a) Faktura za CTN Překládky ve výši **12.192,- Kč** (slovy: *dvanáct tisíc jedno sto devadesát dva korun českých*) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od uzavření této Smlouvy,
 - (b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 této Smlouvy.
- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.

6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle této Smlouvy a v souladu s touto Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.

6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy.

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.

6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu s touto Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:
ve věcech smluvních: [REDACTED]
funkce: specialista pro výstavbu sítě - překládky SEK
e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]
funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: [REDACTED]

8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních: [REDACTED]
funkce: vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]
funkce: referentka odboru přípravy a realizace investic
e-mail: [REDACTED]

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle této Smlouvy, odstoupit od této Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 této Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.

- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle této Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od této Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 této Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy.
- 9.4 Pokud v této Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od této Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených v této Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od této Smlouvy.
- 9.5 Odstoupením od této Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě této Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení této Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření této Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti této Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření této Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 této Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li tato Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním této Smlouvy do doby zániku této Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem této Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě této Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení této Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku této Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti s touto Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti s touto Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění této Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti s touto Smlouvou. Za plnění povinností z této Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění této Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.

12.2 Vztahy z této Smlouvy vyplývající i vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely této Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- (a) v listinné podobě;
- (b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;
- (c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 této Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny této Smlouvy dle odst. 12.6 této Smlouvy, věta první a pro případ odstoupení od této Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem (b) a (c).

- 12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve této Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.6 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky k této Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 této Smlouvy.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit tuto Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti z této Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu této Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v této Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené v této Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem

je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Stavebník obdrží tři (3) vyhotovení a společnost CETIN jedno (1) vyhotovení.

12.14 Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Územní rozhodnutí vydané Magistrátem města Opavy, odbor výstavby – rozhodnutí o umístění stavby „Novostavba hasičské zbrojnice v areálu Městského dopravního podniku a.s. Opava – Kylešovice“ č.j. MMOP 72589/2017

Doložka

Tato Smlouva byla schválena Radou statutárního města Opavy dne **10.06.2020** usnesením č. **1891/44/RM/20, bod 1., písm. a).**

CETIN:

V Brně dne 01-07-2020

[Redacted signature]

CETIN a.s.

supervizor pro výstavbu sítě

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

238

Stavebník:

V Opavě dne 15-06-2020

[Redacted signature]

statutární město Opava

primátor



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň

Technické řešení I.

INVESTIČNÍ AKCE

<i>Kategorie</i>	AN – Přístupová síť
<i>Podkategorie</i>	VPI – metalické kabelové sítě
<i>Číslo SAP</i>	
<i>Číslo interní</i>	
<i>Schvalování akce</i>	2-kolové schvalování
<i>Název</i>	VPIC HZ Opava Kylešovice přel SEK

Budoucí uživatel	NO-OS Opavsko
-------------------------	---------------

Zpracovatel	
--------------------	---

Předkladatel	Vegacom a.s.
---------------------	--------------

Schvaluje

Obsah:

1 Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

1.2 Účel stavby

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady

2.2 Navrhované řešení

2.3 Popis tras

2.4 Použitá technologie

2.5 Použité předpisy

2.6 Koordinace

2.7 Ostatní

3 Podmiňující a související stavby

4 Vyjádření a záznamy

1. Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

Identifikační údaje

Název:	VPIC HZ Opava Kylešovice přel SEK
Kategorie:	AN - Přístupová síť
Podkategorie:	VPI - Metal. kab přístupová síť
Typ investice:	
Důvod 1:	
Číslo interní:	
Prvek SPP:	
ABC:	
HOST:	
ATÚ:	

Kapacitní údaje

		Průměrný náklad na:
100800_Délka HDPE trubek pro OK	0.000 km	kmp mk
100200_Délka metalických kabelů	0,279 km	kmk mk
100700_Délka nadzemní tratě	0 km	km vyk
100100_Délka párů v metalických kabelech	5,260 km	km kv
100300_Délka výkopů vč.podvrtů a přechodů	0.130 km	kmo kv
Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř.	0 pár	b.j.
100400_Páry zakončené v účast. rozvaděčích	0 pár	
100900_Počet bytových domů	0 BD	
101100_Počet bytových jednotek v bytových domech	0 bj	
100500_Počet rodinných domů	0 RD	
100600_Počet bytových jednotek v rodinných domech	0 bj	

Požadavky:

Název polygonu: VPIC HZ Opava Kylešovice přel SEK

K akci nejsou evidovány žádné požadavky

Termíny:

Platnost UR od:	UR na přeložku CETIN zajistí investor.
Platnost UR do:	
Plánované zahájení přípravy:	
Plánované ukončení přípravy:	
Plánované zahájení realizace:	Pravděpodobně v 02/20201 - 11/2021
Plánované ukončení realizace:	
Nabídka k přeji mce (Plán):	

1.2 Účel stavby:

Akce řeší přeložku telefonních kabelů na ulici Bílovecká v Opavě. V dané lokalitě dojde k výstavbě nových komunikací a parkovišť a hasičské zbrojnice na stávajících kabelech společnosti CETIN. Územní rozhodnutí na přeložku zajistil investor v rámci svého stavebního povolení na celou stavbu.

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady:

Objednávka CETIN, podklady TEDO a situace projektu.

2.2 Navrhované řešení:

Z důvodu výstavby nové hasičské zbrojnice je nutno zrušit stáv. sloup CETIN a přeložit zemní trasu v místě plánované výstavby.

- Stávající sloup s OPAL201 bude zrušen. U stáv. sloupu DPO s HSU OPAL1274 bude do chodníku instalován nový rozvaděč SIS1. Kabel vedoucí do OPAL1639 bude po sloupu DPO sveden do země a následně ve VRAP40 doveden do nového rozvaděče SIS1. Ostatní nadzemní kabely budou zrušeny.
- Z nového rozvaděče SIS1 bude novým chodníkem ve VRAP110 vedena nová trasa kabelů PPFL 10XN0,4 a PPFL 5XN0,4. Kabel PPFL odbočí následně do OPAL200 a kabel PPFL 5XN0,4 bude pokračovat v chodníku do nového rozvaděče MRK20 na nový objekt HZ.
- Dále bude z nového rozvaděče SIS1 veden kabel PPFL10XN0,6 a druhý shodný kabel bude v noze rozvaděče zakončen koncovkou. Trasa následně veden v PE110 přes budoucí vjezd do trávníku. Dále trasa vede v souběhu s VO ve VRAP110 až do lomového místa na konci staveniště, kde trasa odbočí směrem k budově ke stáv. trase kde budou kabely pomocí spojek propojeny se stáv. vedením.
- Při realizaci je nutné koordinovat trasu a to i výškově s geodetem stavby (případně stavbyvedoucím), tak, aby byla trasa uložena dle norem CETIN od konečného terénu. Toto není možné v projektu určit, jelikož investorem nebyly dodány „Z“ souřadnice a také nebylo zřejmé, v jakém stádiu výstavby bude překládka CETIN realizována (zda již dojde ke změně stáv. terénu stavbou).
- V rámci této akce budou prováděny montážní práce na vedení, které již zajišťuje telekomunikační provoz. Před započítím prací je nutno v dostatečném předstihu, minimálně 30dní před realizací, požádat o PEW pracovníky údržby kabelů.

2.3 Popis tras

viz polohopis

VVN: ne

El. trakce: ne

Vodní toky: ne

2.4 Použitá technologie:

Spojky XAGA a konce chrániček budou označeny Minimarkerem 3M, typ 1255.

2.5 Použité předpisy:

TPP 2001-1 (TP 69 a) - Výstavba přístupových sítí č. I
TPP 2001-1 (TP 69 b) - Výstavba přístupových sítí č. II
TPP 2001-1 (TP 69 c) - Výstavba přístupových sítí č. III
TPP 2002 (TP 117) - Výstavba přístupových sítí - Optické kabely
TM000072 - Technické řešení překládek a oprav poruch stávajících metalických kabelů kabelovou vložkou
TA 10 (I.-III) - Stavba nadzemních sítí

ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 33405 - Podzemní sdělovací vedení

ČSN 341100 - Křížovatky a souběhy vedení

POS 65-2001

Po ukončení stavby je nutno provést závěrečné měření dle TPP 2001-3B; TPP 2001-4A kap.7. Dokumentace skutečného provedení bude zpracována dle směrnice TD000002 v aktuální verzi včetně geodetického zaměření.

2.6 Koordinace:

Realizace přeložky bude koordinována s realizací výstavby parkovišť a komunikací.

2.7 Ostatní:

Kontakty:

Projektový koordinátor CETIN: [REDACTED]

Pracovník ochrany sítě CETIN: [REDACTED]

Zpracovatel CTN – K.V.Z. spol. s r. o. [REDACTED]

Vypracoval: [REDACTED]

Investor:

Statutární město Opava, Horní náměstí 6, 746 26 Opava
[REDACTED]
[REDACTED]

Při provádění prací je třeba dodržovat zákon č. 251/2005 o inspekci práce, směrnici BOZP č. 595 a stavební zákon č. 183/2006 a jeho prováděcí předpisy.

3. Podmiňující, související a navazující stavby:

Podmiňující akce - vložené: nejsou

Interní číslo	SAP	Název projektu:	Stav:
---------------	-----	-----------------	-------


Navazující akce - vložené:

Interní číslo	SAP	Název projektu:	Stav:
---------------	-----	-----------------	-------

4. Vyjádření a záznamy – viz. příloha

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	155/12
Obec:	Opava [505927]
Katastrální území:	Kylešovice [0114]
Číslo LV:	1362
Výměra [m ²]:	2627
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	manipulační plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha

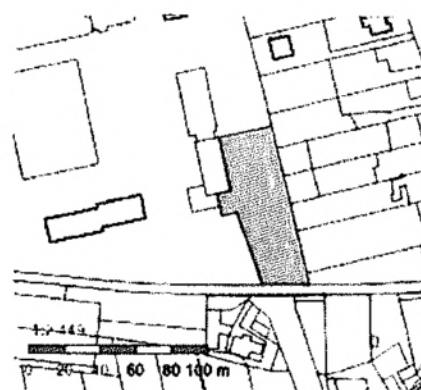

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, Město, 74601 Opava

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj
Katastrální pracoviště Opava


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 04.05.2020 09:00:00.

© 2004 - 2020 Český úřad zeměměřičský a katastrální, jeho organizační složky, IČO 1184066
Podání určené katastrálním úřadům a pracovištím zasílají přímo na [adresu mail@czk.cz](#)

Verze aplikace: 5.6.2 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	655/12
Obec:	Opava [50592/]
Katastrální území:	Kylešovice [711811]
Číslo LV:	1872
Výměra [m ²]:	20897
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	manipulační plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha

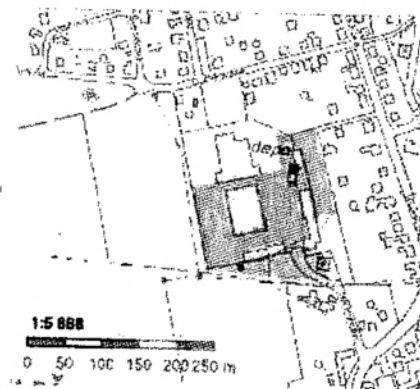

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Městský dopravní podnik Opava, a.s., Bílovecká 1127/98, Kylešovice, 74706 Opava

Podíl

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno chůze a jízdy

Věcné břemeno vedení

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj
Katastrální pracoviště Opava


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 04.05.2020 09:00:00.

© 2004 - 2020 Všechny práva vyhrazena. Všechny údaje jsou zveřejněny pouze pro informační účely. Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mailovou adresu.

Verze aplikace: 5.6.2 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 155/6
 Obec: Opava 150592/1
 Katastrální území: Kyšovice 7119/1
 Číslo LV: 1872
 Výměra [m²]: 168
 Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
 Mapový list: DKM
 Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK
 Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

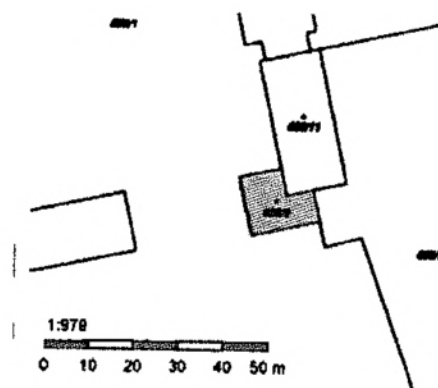

Součástí je stavba

Budova bez čísla popisného
 nebo evidenčního: jiná stavba
 Stavba stojí na pozemku: p. č. 155/6

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo
 Městský dopravní podnik Opava, a.s., Bílovecká 1127/98, Kyšovice, 74706 Opava

Podíl

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava.


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 04.05.2020 09:00:00.

© 2004 - 2020 Český katastr nemovitostí. Všechna práva vyhrazena. Podání určená katastrálními úřady a pracovišti zasílejte přímo na jejich e-mailové adresy.

Verze aplikace: 5.6.2 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 650/14
 Obec: Opava [50592/14]
 Katastrální území: Kyšovice [7:18:1]
 Číslo LV: 1388
 Výměra [m²]: 408
 Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
 Mapový list: DKM
 Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK
 Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

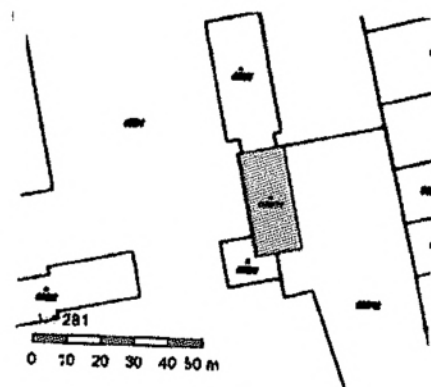

Součástí je stavba

Rozestavěná budova: bez způsobu využití
 Stavba stojí na pozemku: p. č. 650/14

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, Město, 74601 Opava

Podíl

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava.

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 04.05.2020 09:00:00.

© 2004 - 2020 Cuzk, v. v. i. s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Všechny údaje jsou zveřejněny pouze pro informační účely. Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich webové stránky.

Verze aplikace: 5.6.2 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 655/1A
 Obec: Opava [105927]
 Katastrální území: Kylešovice [11611]
 Číslo LV: 1272
 Výměra [m²]: 20897
 Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
 Mapový list: DKM
 Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK
 Způsob využití: manipulační plocha
 Druh pozemku: ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Městský dopravní podnik Opava, a.s., Bílovecká 1127/98, Kylešovice, 74706 Opava

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno chůze a jízdy

Věcné břemeno vedení

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Morávskoslezský kraj
 Katastrální pracoviště Opava

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 04.05.2020 09:00:00.

© 2004 - 2020
 Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na spis@kuzm.cuzk.cz



Verze aplikace: 5.6.2 build 0

A) Intravilán (zastavěné území)

B) Přechody vjezdů a komunikací



A1) Chodník (povrch - asfalt, beton, dlažba)

B1) Vjezdy do objektů do šíře 6 m

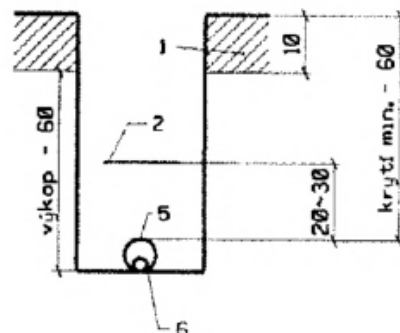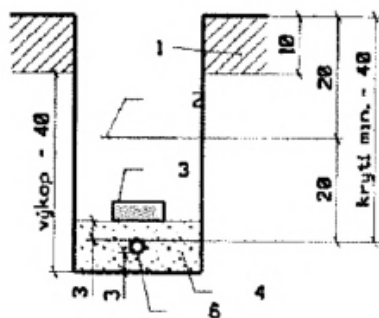



A2) Volný terén (travnatý povrch)

B2) Vozovka (silnice II. tř., III. tř., místní komunikace)

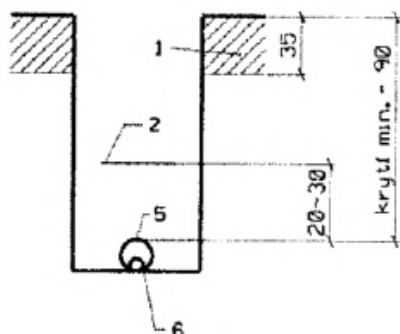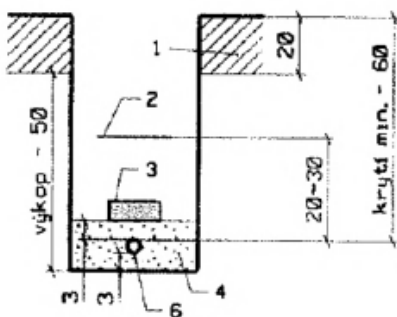

A3) Předzahrádka (výkop mezi hlavní trasou a účastníkem)

B3) Vozovka (dálnice, silnice pro motorová vozidla, silnice I. třídy)

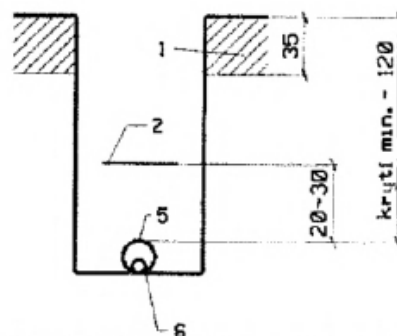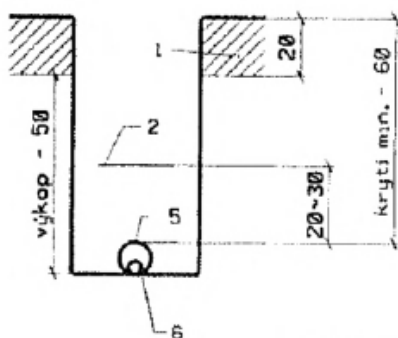

Legenda:

- 1.) odstraněná povrchová vrstva
- 2.) výstražná fólie
- 3.) krycí deska (plast.)
- 4.) lože (písek, prosátá zemina)
- 5.) chránička - trubka
- 6.) kabel, ochr. trubka pro DK

K.V.Z. spol. s r.o. telefonní přechod		Mokrý 386, 760 01 Zlín, IČO 00546178	
PROJEKTANT: [REDACTED]	VYPRACOVAL: [REDACTED]	ČÍSLO ZAKÁZKY: KYZ-3838/20	
STAVBA: VPIC HZ Opava Kulešovice přel SEK		DATUM: 05/2020	
VZOROVÉ ŘEZY		MĚŘÍTKO:	
INVESTOR: Statutární město Opava, Morní náměstí 69, 746 26 Opava		04	

Specifikace nákladů_VPIC HZ Opava Kylešovice přel SEK

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2020.05

Položková 2020.05

Název stavby:

Číslo SPP prvku: VPIC HZ Opava Kylešovice přel SEK

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	12 191,98 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	74 893,60 Kč
MONTÁŽ	98 606,55 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	7 807,15 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	11 512,04 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	6 173,97 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	17 304,30 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	1 138,98 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	54 518,73 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazová	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 284 147,30 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST	240 669,90 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	43 477,40 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084	Návrh cenový a technický		1.00 ks	12 191,98 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		130.00 m	2 382,90 Kč
955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové		6200.00 JV	6 200,00 Kč
	zabetonování chráničky v budoucím vjezdu			
951575 S	Průraz zdířem betonovým tl. od 300 do 600		2.00 ks	1 637,90 Kč
954951 S	Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70		11.00 m	8 931,78 Kč
952362 S	Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70		11.00 m	7 202,91 Kč
952355 S	Rýha v trávě 50/110		102.00 m	46 130,52 Kč
955054 S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice		130.00 m	1 588,60 Kč
954972 S	Znovuosazení obrubníků chodníkových		3.00 m	696,75 Kč
951349 S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky		1.00 ks	122,24 Kč
MONTÁŽ				
955019 S	Demontáž jednod.patkov.stož.s kotvou		1.00 ks	2 576,96 Kč
955016 S	Demontáž samonos. kabelů nad 5 XN		10.00 m	354,30 Kč

955824 S	Instal.metal. kab. do stávajících trubek	250.00 m	12 225,00 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čí	5.00 ks	794,55 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čí	95.00 ks	3 484,60 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	95.00 ks	2 323,70 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	5.00 ks	427,85 Kč
955001 S	Montáž jedné čtyřky za provozu	50.00 ks	4 889,50 Kč
955267 S	Montáž nadzemní tratě síťové	9285.12 JV	9 285,12 Kč
přepojení stávajících nadzemních vedení do nového rozvaděče			
955300 S	Montáž objektu samost. SIS nad 50 čtyř.	1.00 ks	1 664,85 Kč
955292 S	Montáž rozvaděče skříň.zasek.do 50 čtyř.	2.00 ks	2 614,02 Kč
955281 S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	1.00 ks	1 161,21 Kč
955303 S	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	3.00 ks	3 344,40 Kč
953167 S	Pronájem stavebního stroje - použití mechan	8.00 hod.	5 597,76 Kč
958592 S	Provádění PEW v maintenance window	1.00 ks	31 181,51 Kč
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	140.00 ks	3 424,40 Kč
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	7.00 ks	2 481,29 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV	3 720,00 Kč
kolaudace stavby			
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	4.00 ks	4 361,44 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 694,09 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA			
956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km	130.00 m	2 319,20 Kč
956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná č	1.00 ks	5 487,95 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
956283 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km	130.00 m	1 963,00 Kč
956282 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná čá	1.00 ks	5 487,95 Kč
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	3 018,37 Kč
955610 S	Popis umístění tlk.vedení v budově	2.00 ks	1 042,72 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	3.00 ks	6 173,97 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	3.00 ks	7 408,74 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene d	3.00 ks	9 278,16 Kč

Výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.

Limitka materiálu			
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství Celková cena
MATERIÁL VYŘAZENÝ			
301412 S	Průchodka stěnová SMD 26/10		2.00 ks 1 138,98 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		254.00 ks 9 657,08 Kč
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová		102.00 m 391,68 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		254.00 m 1 122,68 Kč
300118 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,6		250.00 m 10 972,50 Kč
320879 S	Materiál pro tratě síťové		6200.00 ks 6 200,00 Kč

302532 S	Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	10.00 ks	2 308,20 Kč
309931 S	Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m	25.00 kg	1 079,50 Kč
310698 S	Propojka uzem. 10114-00125	3.00 ks	311,55 Kč
313137 S	Příchytka kabelu 42-48 mm 05-633-05600	7.00 ks	953,05 Kč
308869 S	Rám montážní SID-CS 50P 22225-050 CZ	1.00 ks	273,68 Kč
312880 S	Rámeček štít. SID 10-párový 79156-51600	5.00 ks	272,65 Kč
306320 S	Skříň rozváděče MRK 20-QT 10-20p-pod omí	2.00 ks	1 512,52 Kč
306472 S	Skříň rozváděče SIS 300-QT 200-300p-sloupe	1.00 ks	13 258,24 Kč
312845 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	1.00 ks	411,22 Kč
309992 S	Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm	3.00 ks	147,06 Kč
302423 S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	130.00 m	5 313,10 Kč
306188 S	Zámek skříně 1370 L2 Morava-42113	3.00 ks	334,02 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
401883 S	Krabice elektro KO 125E odbočovací	2.00 ks	0,00 Kč
316064 S	Přípravek vysoušecí silikagel 10x50g	3.00 sad	0,00 Kč

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY

ODBOR VÝSTAVBY

CZ-746 26 Opava, Horní náměstí 69

Váš dopis ze:

Ze dne:

Spisová značka:

VYST/9784/2017/CIK

Naše značka (Č. j.):

MMOP 72589/2017

Vyřizuje:

Pracoviště:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Datum:

3. 7. 2017

Toto rozhodnutí nabylo právní

mocí dne 29. 07. 2017

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY
odbor výstavby

31. 07. 2017



MMOPP006WLHQ

MMOPX01EAP2U



Městský dopravní podnik Opava, a.s., Bílovecká 98, 747 06 Opava

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor výstavby Magistrátu města Opavy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 20. 4. 2017 podal

Městský dopravní podnik Opava, a.s., Bílovecká 98, 747 06 Opava, který zastupuje Statutární město Opava, zastoupeno odborem přípravy a realizace investic MMO, [redacted], vedoucí odboru, Horní náměstí 69, 746 26 Opava

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších změn

rozhodnutí o umístění stavby

novostavba hasičské zbrojnice v areálu Městského dopravního podniku a.s.

Opava - Kylešovice

- SO 01 - hasičská zbrojnice
- SO 02 - zpevněné plochy, komunikace
- SO 03 - splošková kanalizace
- SO 04 - dešťová kanalizace
- SO 05 - přípojka vody a areálový rozvod
- SO 06 - přípojka plynu a areálový rozvod
- SO 07 - přípojka nn a areálový rozvod
- SO 08 - areálové osvětlení
- SO 09 - oplocení
- SO 10 - přípojka a přeložka CETIN Opava, Kylešovice

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 655/1 (ostatní plocha), parc. č. 655/5 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1806/1 (vodní plocha), parc. č. 1824 (ostatní plocha) v katastrálním území Kylešovice.

Druh a účel umísťované stavby:

- Jedná se o přestavbu stávajícího objektu, umístěného na pozemku parc. č. 655/5 v k. ú. Kylešovice, jehož menší část bude odstraněna. Na místě odstraněné stavby bude vybudována nová stavba hasičské zbrojnice. Součástí stavby bude také vybudování přístupové a příjezdové komunikace, manipulačních ploch a přípojek jednotlivých sítí pro výše uvedenou stavbu.

Umístění stavby na pozemku:

- **SO 01 - Novostavba hasičské zbrojnice** bude třípodlažní objekt o půdorysných rozměrech 13,5 m x 29,9 m, který bude umístěn na pozemku parc. č. 655/5 v k. ú. Kylešovice ve vzdálenosti 29,9 m od společné pozemkové hranice s pozemkem parc. č. 666 v k. ú. Kylešovice a ve vzdálenosti 49,3 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 1806/1 v k. ú. Kylešovice. Výška stavby v nejvyšším bodě bude + 13,5 m od ± 0,000 = 251,450 m. n. m. Stavba hasičské zbrojnice bude zastřešena plochými střechami ve výškových úrovních 8,25 m, 11,4 m a 13,5 m od ± 0,000 = 251,450 m. n. m. Zdrojem tepla bude teplovodní plynový kotel o výkonu 5 – 48 kW s odkoupením nad střechu objektu. Plynový kotel bude sloužit pro primární ohřev teplé užitkové vody, sekundární ohřev bude řešen sestavou solárních panelů umístěných na střeše objektu.
- **SO 02 - zpevněné plochy, komunikace** – Nová komunikace bude umístěna v jihovýchodní části pozemku parc. č. 655/1 v k. ú. Kylešovice v délce cca 42 m, šířky 5,5 m, ve vzdálenosti cca 20 m od východní pozemkové hranice. Na komunikaci bude navazovat zpevněná plocha, určená pro příjezd, parkování a přístup k hasičské zbrojnici. Komunikaci a parkovací místa budou lemovat dlážděné chodníky. Zpevněné plochy areálu jsou dle povrchu rozděleny na plochy s asfaltobetonovým živiničným povrchem s třídou dopravního zatížení IV o celkové ploše cca 1315 m² a plochy dlážděné o celkové ploše cca 205 m².
- **SO 03 - splašková kanalizace** – Přípojka DN 200 v délce 174 m + DN 150 v délce 25 m, celkem 199 m dlouhá bude osazena 4 ks šachet DN 425. Napojení přípojky bude ze stávajícího kanalizačního řadu DN 400 KAM, vedoucího v pozemku parc. č. 1824 v k. ú. Kylešovice a povede přes pozemek parc. č. 655/1 v k. ú. Kylešovice podél jeho východní pozemkové hranice až do objektu hasičské zbrojnice.
- **SO 04 - dešťová kanalizace** – Dešťové vody ze střechy hasičské zbrojnice budou svedeny potrubím DN 200 do retence, umístěné v jihovýchodní části pozemku parc. č. 655/1 v k. ú. Kylešovice. Přepad z retence je napojen do Otického příkopu. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou svedeny potrubím DN 150 do retenčního prostoru.
- **SO 05 - přípojka vody a areálový rozvod** – Připojení bude provedeno z trub PE 100 SDR 11 D 40 kolmo na stávající řad vody PVC DN 150 v pozemku parc. č. 655/1 v k. ú. Kylešovice. Délka přípojky po vodoměrnou šachtu bude mít délku cca 7 m. Od vodoměrné šachty povede areálový rozvod PE 100 SDR 11 podél východní hranice pozemku parc. č. 655/1 v k. ú. Kylešovice až do objektu hasičské zbrojnice. Délka vnějšího rozvodu bude cca 164 m.
- **SO 06 - přípojka plynu a areálový rozvod** – Připojení bude provedeno z trub PE 100 SDR 11 kolmo na stávající plynovodní řad DN 200 v pozemku parc. č. 655/1 v k. ú. Kylešovice. Celková délka plynovodní přípojky po HUP s plynoměrnou soustavou bude cca 8 m. Od přípojky plynu povede vnější rozvod plynu v souběhu s vnějším rozvodem vody až do objektu hasičské zbrojnice. Celková délka vnějšího rozvodu plynu bude cca 164 m.
- **SO 07 - přípojka nn a areálový rozvod** – Přípojka nn typu 3 x AYKY-J 3X240+120 mm² bude provedena z rozvaděče RH stávající trafostanice, umístěné v jižní části pozemku parc. č. 655/1 v k. ú. Kylešovice až do objektu hasičské zbrojnice parc. č. 655/5 v k. ú. Kylešovice.
- **SO 08 - areálové osvětlení** – Jedná se o venkovní osvětlení zpevněných ploch (parc. č. 655/1 v k. ú. Kylešovice) kolem objektu hasičské zbrojnice. Osvětlení bude provedeno osvětlovacími stožáry výšky 10 m (výška světelného bodu) s výložníkem 0,5 m. Rozvod z RVO bude proveden kabelem CYKY 5 x4, který bude uložen ve výkopu pozemku parc. č. 655/1 v k. ú. Kylešovice. Na čelní fasádě objektu parc. č. 655/5 v k. ú. Kylešovice bude umístěno akcentní osvětlení.
- **09 - oplocení** – Nové oplocení areálu bude navazovat na oplocení stávající. Oplocení bude provedeno z pozinkovaného drátu, sloupků s betonových podhrabových desek. V oplocení budou osazeny 2 ks vjezdových bran a vstupní branka. Součástí oplocení je 1 ks automatické závory s dálkovým ovládáním.
- **SO 10- přípojka a přeložka CETIN Opava, Kylešovice** – Stávající sloup CETIN se demontuje včetně rozvaděče. Dále se demontuje vedení mezi rušeným sloupem DPO a zemní vedení od rušeného sloupu do vrátnice. Nově se osadí rozvaděč do pilíře u sloupu DPO (parc. č. 655/1 v k. ú. Kylešovice). Nově se provede svod do terénu ze sloupu DPO a přivede se do nového pilíře. Z rozvaděče v pilíři se provede nově vývod pro vrátnici a objekt (parc. č. 655/4 v k. ú. Kylešovice). Tento kabel povede v zemi parc. č. 655/1 v k. ú. Kylešovice pod komunikací a kolem nové zpevněné plochy, dále v zeleném pásu a následně se zaspojkuje za zpevněnou plochu na stávající kabel.

Dále se provede nové připojení z nového pilíře pro objekt hasičské zbrojnice (parc. č. 655/5 v k. ú. Kylešovice).

Ostatní podrobnosti a umístění jednotlivých stavebních objektů jsou zřejmé z dokumentace pro územní rozhodnutí, které vypracovala [redacted] ČKAIT-1102206.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, které obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Při provádění stavby je nutno respektovat stávající vedení inženýrských sítí a jejich ochranná pásma. Před zahájením prací zajistí stavebník vytyčení veškerých inženýrských sítí, které se v prostoru stavbou dotčeném nacházejí.
3. Projektová dokumentace stavby bude vypracována v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších změn fyzickou osobou, oprávněnou k výkonu vybraných činností ve výstavbě podle zvláštního právního předpisu (§ 158, odst. 1 stavebního zákona).
4. Projektové řešení bude splňovat požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., kterou se stanoví technické požadavky na stavby, ve znění pozdějších změn a 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
5. Nutno dodržet podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správce technické infrastruktury:
 - Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 19. 4. 2017 zn. 508881/17, 11. 1. 2017 č. j. 508881/17
 - Magistrát města Opavy – odbor životního prostředí ze dne 13. 4. 2017 zn. MMOP 43979/2017 spis. zn. ŽP/4344/2017/Dol
 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. ze dne 3. 4. 2017 zn. 9773/V006771/2017/CH
 - GridServices, s. r. o. ze dne 24. 3. 2017 zn. 5001482096
 - ČEZ distribuce a. s. ze dne 11. 1. 2017 zn. 0100680120

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)):

Městský dopravní podnik Opava, a.s., Břilovecká 98, 747 06 Opava

Odůvodnění:

Dne 19. 4. 2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ustní jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Dále stavební úřad účastníkům řízení sdělil, že mají podle ustanovení § 36, odst. 3 správního řádu možnost nejpozději do 3 dnů od skončení lhůty, určené pro podání námitek, vyjádřit se k podkladem rozhodnutí.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, a dotčenými orgány a zjistil, že je záměr žadatele v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, dále s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a s požadavky zvláštních právních předpisů.

Posouzení záměru žadatele v souladu s ustanovením § 90 stavebního zákona:

- se zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, vydanými zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22. 12. 2010 usnesením č. 16/21426 a rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 7 Ao 2/2011 -202 a rozsudku č. j. 7 Ao 72/2011 ze dne 15. 3. 2011; zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje jako opatření obecné povahy nabýly účinnosti dne 4. 2. 2011

Umístěním stavby není předmětné opatření dotčeno.

podle odst. a) *s vydanou územně plánovací dokumentací*

- Umístění „stavby“ je v souladu s Územním plánem města Opavy schváleného usnesením Zastupitelstva města Opavy ze dne 22. 6. 1998 jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou č. 06/98 ze dne 22. 6. 1998, změnou č. 1 Územního plánu města Opavy schválena usnesením Zastupitelstva města Opavy dne 14. 8. 2001, jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou č. 15/2001, změnou č. 2 Územního plánu města Opavy schválena usnesením Zastupitelstva města Opavy dne 16. 9. 2003 jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou č. 6/2003, změnou č. 4 Územního plánu města Opavy schválena usnesením Zastupitelstva města Opavy dne 20. 9. 2005 jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou č. 11/2005, změnou č. 6 Územního plánu města Opavy schválena usnesením Zastupitelstva města Opavy dne 22. 6. 2004 jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou č. 6/2004, změnou č. 7 Územního plánu města Opavy schválena usnesením Zastupitelstva města Opavy dne 19. 12. 2006, změnou č. 8 Územního plánu města Opavy vydanou formou opatření obecné povahy č. 2/2010 Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 31. 8. 2010, změnou č. 9 územního plánu města Opavy vydanou formou opatření obecné povahy č. 3/2010 Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 31. 8. 2010, změnou č. 10 Územního plánu města Opavy vydanou formou opatření obecné povahy č. 4/2010 Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 31. 8. 2010, změnou č. 12 Územního plánu města Opavy vydanou formou opatření obecné povahy č. 1/2012 Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 23. 4. 2012, změnou č. 13 Územního plánu města Opavy vydanou formou opatření obecné povahy č. 1/2013 Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 16. 12. 2013 s účinností ode dne 1.1.2014 změnou č. 13 Územního plánu města Opavy vydanou formou opatření obecné povahy č. 1/2013 Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 16. 12. 2013 včetně
rozhodnutí
č. j. MSK 75690/2014 ze dne 11. 6. 2014, které vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury a kterým byl zrušen územní systém ekologické stability lokální úrovně.

- Stavba bude umístěna v ploše označené písmeny (PA) – plocha podnikatelských aktivit, technického vybavení a garáží. Charakteristika: území výroby, služeb a souvisejících zařízení, které podstatně neobtěžují své okolí. Stavba spadá do funkčního využití vhodného. Umístění stavby a architektonický návrh stavby kladně posoudil odbor hlavního architekta a územního plánování Magistrátu města Opavy.

podle odst. b) *s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území*

- Územní plán v daném území nedefinuje žádné architektonické a urbanistické hodnoty, které by bylo nutno chránit a stanovit podmínky pro jejich ochranu.
- Z ustanovení § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (památkový zákon), vyplývá, že stavebníci jsou již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu (Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, [redacted], a následně umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na základě dohody uzavřené podle § 22 památkového zákona.

podle odst. c) *s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území*

Stavba splňuje obecné technické požadavky na stavby podle vyhlášky č. 266/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších změn, zejména jednotlivá ustanovení části třetí vyhlášky – „požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb“:

- § 8 – základní požadavky – stavba je navržena tak, že je při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a současně splňuje základní požadavky, kterými jsou mechanická odolnost, požární bezpečnost, ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku a bezpečnost při užívání.
- § 10, odst. 1 – všeobecné podmínky – pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí – stavba je navržena tak, že neohrožuje život a zdraví osob, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a neohrožuje životní prostředí nad limity, obsažené v jiných právních předpisech zejména následkem uvolňování látek, nebezpečných pro zdraví a životy osob, zvířat a pro rostliny, nepříznivých účinků elektromagnetického záření,

uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících a nevhodných světelně technických vlastností.

Stavba splňuje obecné technické požadavky na stavby podle vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších změn, zejména jednotlivá ustanovení části třetí vyhlášky – „požadavky na vymezení pozemků a umístování staveb na nich“

- § 20 odst. 3 - pozemek záměru je vymezen tak, že svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním, umožňuje využití pro navrhovaný účel a je dopravně napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci
- § 23. odst. 1 – obecné požadavky na umístování staveb – stavba bude umístěna tak, že je umožněno její napojení na síť technické infrastruktury a pozemní komunikace a její umístění na pozemku umožní přístup požární techniky a provedení jejího zásahu

podle odst. d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

podle odst. e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení

- záměr je v souladu s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení; podmínky vyjádření dotčených orgánů byly zpracovány do projektové dokumentace, případně zahrnuty do podmínek rozhodnutí

K žádosti bylo doloženo:

- dokumentace pro územní rozhodnutí ve dvojím vyhotovení
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě

Stanoviska sdělili:

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 27. 2. 2017 č. j. KHSMS 8614/2017/OP/HOK
- Magistrát města Opavy – odbor životního prostředí ze dne 13. 4. 2017 zn. MMOP 43979/2017 spis. zn. ŽP/4344/2017/DoL
- Magistrát města Opavy – odbor majetku ze dne 28. 2. 2017 zn. MMOP 23191/2017/Be
- ČEZ distribuce a. s. ze dne 11. 1. 2017 zn. 0100680120
- ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 11. 1. 2017 zn. 0200542624
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje – územní odbor Opava ze dne 28. 2. 2017 č. j. HSOS-2383-2/2017
- UPC Česká republika, s. r. o. ze dne 25. 5. 2017 č. E010572/17
- Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany – odbor ochrany územních zájmů ze dne 30. 5. 2017 Sp. zn. 74692/2017-8201-OÚZ-BR
- Povodí Odry státní podnik ze dne 29. 5. 2017 zn. 07518/923/2/812.10/2017
- OpavaNet ze dne 29. 5. 2017 č. j. 96/17
- České radiokomunikace ze dne 24. 5. 2017 zn. UPTS/OS/170420/2017
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 24. 3. 2017 č. j. UZSVM/OOP/2266/2017-OOPM-Koc
- Městský dopravní podnik Opava a. s. ze dne 17. 2. 2017 zn. 2017/02/RS/220
- Česká telekomunikační infrastruktura a. s. ze dne 19. 4. 2017 zn: 508881/17, 11. 1. 2017 č. j. 508881/17
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. ze dne 3. 4. 2017 zn. 9773/V006771/2017/CH, ze dne 31. 1. 2017 zn. 9773/V001307/2017
- GridServices, s. r. o. ze dne 24. 3. 2017 zn. 5001482096, ze dne 11. 1. 2017 zn. 5001437069

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Městský dopravní podnik Opava, a.s., Statutární město Opava, zast. [redacted]
vedoucím odboru majetku MMO, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní
pracoviště Ostrava, odbor odložené pracoviště Opava a Bruntál, Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., GridServices, s.r.o., ČEZ
Distribuce, a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání účastník (§ 81 odst. 1 správního řádu). Včas podané odvolání proti rozhodnutí má odkladný účinek. Lhůta pro podání odvolání je podle § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Za den oznámení rozhodnutí se považuje podle ustanovení § 72 odst. 1 správního řádu doručení stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí do vlastních rukou nebo ústní vyhlášení, pokud se účastník řízení práva na doručení stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí vzdal. Za den doručení se pak považuje den převzetí zásilky (rozhodnutí), nejpozději však 10. den následující po dni, kdy byla zásilka připravena k vyzvednutí (§ 24 odst. 1 správního řádu).

Odvolání se podle ustanovení § 86 odst. 1 správního řádu podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, tedy u odboru výstavby Magistrátu města Opavy, ulice Krnovská 71/C, 746 01 Opava. Odvolacím orgánem, který o podaném odvolání rozhoduje, je nejbližše nadřízený správní orgán, kterým je v daném případě odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nebude-li odvolání podáno s potřebným počtem stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Náležitosti odvolání, odvolací lhůta a účinky odvolání jsou obecně stanoveny v ustanoveních § 82 až § 85 správního řádu.

Podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu musí mít podané odvolání náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu, tedy musí z něj být patrné kdo odvolání činí, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy. Odvoláním lze podle § 82 odst. 1 správního řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

[redacted]
oprávněná úřední osoba



"otisk úředního razítka"

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích dle položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20. 000 Kč byl zaplacen

Příloha: situační výkres v měřítku 1: 500 (výkres č. C 05)

Obdržel:

navrhovatelé (doporučené do vlastních rukou)

Městský dopravní podnik Opava, a.s., IDDS: h49e6w2, kterého zastupuje

Statutární město Opava, zastoupeno odborem přípravy a realizace investic MMO, [redacted]
[redacted], vedoucí odboru, Horní náměstí 69, 746 26 Opava - Město

ostatní účastníci (doporučené do vlastních rukou + datová schránka)

Statutární město Opava, zast. [redacted] vedoucím odboru majetku MMO, Horní
náměstí č.p. 382/69, Město, 746 01 Opava 1

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Ostrava, odbor odloučené
pracoviště Opava a Bruntál, IDDS: 96vaa2e

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

dotčené orgány státní správy

Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, Krnovská 71C, Předměstí, 746 01 Opava 1

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IDDS: w8pai4f

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava, IDDS: spdaive

na vědomí

Magistrát města Opavy, odbor výstavby, Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Městský dopravní podnik Opava, a.s., IDDS: h49e6w2

