



S004P01F2GMP

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na **dodávku stavby** na akci:

„Hodonín – oprava živičných krytů MK 2020“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN
Adresa: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín
IČO: 002 84 891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100
Zastoupené: ve smluvních věcech Liborem Střechou - starostou města Hodonína
v technických věcech Ing. Milanem Hudcem (ved. odboru investic MěÚ)
a [redacted] (referent odboru investic MěÚ)

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Adresa: Jahodová 60, 620 00 Brno
IČO: 480 35 599
DIČ : CZ48035599
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., 212269343/0300
Zastoupen: [redacted] - ředitel oblasti Hodonín a
[redacted] - výrobně-technický ředitel
oba na základě plné moci

/dále jen zhotovitel/

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE

Stavba: HODONÍN – OPRAVA ŽIVIČNÝCH KRYTŮ MK 2020
Místo: HODONÍN - parkoviště Národní třída 46 (za ČS), ul. Masná

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou smlouvnou cenu.

- 3.2. Předmětem zakázky „Hodonín – oprava živičných krytů MK 2020“ je rekonstrukce živičného krytu parkoviště Národní třída 46 (za ČS) a MK Masná v rozsahu dle grafické přílohy (*Příloha č. 1*).
- 3.3. **Předmětem díla jsou rovněž činnosti**, práce a dodávky, které nejsou v zadávací dokumentaci obsaženy, ale jsou nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých by zhotovitel podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl.
- 3.4. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec výkazu výměr, které bude nutno realizovat v důsledku oprávněných požadavků a **rozhodnutí dotčených orgánů** v rámci prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
- 3.5. Součástí předmětu díla je rovněž zajištění povolení a realizace úpravy **dopravního značení**, potřebné pro zhotovení díla.

3 TERMÍNY PLNĚNÍ

- 3.1 Zhotovitel provede dílo v těchto lhůtách a termínech:

předání staveniště:	do 30 dnů od podpisu smlouvy
zahájení prací:	do 3 dnů od předání staveniště
ukončení prací:	do 30 dní od zahájení prací
předání díla:	do 7 dnů od ukončení prací

- 3.2 Plnění termínů realizace díla je podmíněno rovněž vhodnými **klimatickými podmínkami**. Změna termínu realizace díla může být provedena při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy se nový termín realizace díla posune o počet dnů, o které byla stavba přerušena z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Počet dnů, o které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn na pokyn TDS a odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele (viz.čl.1.SOD) záznamem do stavebního deníku a zápisem na KD.

4 CENA ZA DÍLO

- 4.1 Cena díla zahrnuje **veškeré náklady** potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle Přílohy č. 1 a je cenou nejvýše přípustnou ve výši:

3 995 868,- Kč (bez DPH)

839 132,- Kč DPH 21 %

4 835 000,- Kč (včetně DPH)

- 4.2 Cena **díla je stanovena** zhotovitelem na základě **položkového rozpočtu** (*Příloha č. 1*), který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 4.3 Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění **smluvních pokut**.

- 4.4 Cena díla podle odst. 5.1. je cenou **nejvýše přípustnou** a může být změněna jen dodatkem smlouvy.

5 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel **neposkytuje zálohy.**

- 5.1 Faktura bude vystavována po ukončení díla dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb. **Přílohou faktury musí být** odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb, předávací protokol a protokol o odstranění vad a nedodělků, potvrzené objednatelem.
- 5.2 Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného **doručení do sídla objednatele**. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.

6 ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí v souladu s ustanoveními § 2604 a násl. občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s **jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb. a zákonem 13/1997 Sb.** ve znění změn a platných doplňků, příslušných podzákonných norem nebo ČSN včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků. Aplikace ust. § 2605 odst. 1 a 2 občanského zákoníku se vylučuje.
- 6.2 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích které provádí **stavební deník** v souladu s Vyhl.č.499/2006.
- 6.3 Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude jménem zhotovitele odborně řídit provádění stavby - **stavbyvedoucí** v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce. V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže jejich **odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost**, požadovanou v zadávací dokumentaci VZ. **Změna osoby stavbyvedoucího** musí být bezodkladně písemně oznámena objednateli. Výkon funkce stavbyvedoucího **nelze zajistit poddodavatelsky.**
- 6.4 **TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni** vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, je ohrožena bezpečnost stavby, hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.
- 6.5 Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů:

Název	IČO	Rozsah prací
NETÝKÁ SE	---	---

- 6.6 Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 6.7 Zhotovitel je povinen předat objednateli **do 5 dnů** od zahájení prací písemný **seznam poddodavatelů**, kteří se budou podílet na realizaci díla v objemu prací vyšším než **20 %** celkového rozsahu díla (v poměru k celkovým nákladům díla).
- 6.8 Zhotovitel je povinen nejpozději **do 7 dnů** po ukončení díla **vyklidit staveniště** a veškeré dotčené okolní plochy a objekty uvést do původního stavu.
- 6.9 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla, uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc).

Minimální pojistné plnění související s výkonem podnikatelské činnosti je 10 000 000,- Kč. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu provádění díla.

- 6.10 Objednatel předá zhotoviteli bezúplatně po podpisu smlouvy informační tabuli s identifikačními údaji stavby(viz příloha č. 4).

7 ZMĚNY DÍLA

- 7.1 **Veškeré** změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. **134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.2 **Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména **z důvodů**:
- 7.2.1 **neprovedení dohodnutých stavebních prací**, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
- 7.2.2 **provedení dodatečných stavebních prací**, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
- 7.2.3 **požadavků správců** technické infrastruktury,
- 7.2.4 **zlepšení efektivity**, hospodárnosti a účelnosti **budoucího provozu** díla.
- 7.3 **Pokud** objednatel právo na změnu díla uplatní, **je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit** a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity stanovené zejména v **§ 222 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak.
- 7.4 **Pokud** objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 4. (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně **návrh Změnového listu** nejpozději na nejbližším KD k projednání.
- 7.5 **Změnový list** (Příloha č. 3).

- 7.5.1 **Před vlastním provedením** musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována v návrhu Změnového listu a ten **odsouhlasen** technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem projektanta.
- 7.5.2 **Návrh** změnového listu bude **zpracován dle vzoru** předaného zhotoviteli (*Příloha č. 3*). Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla **odpovídá zhotovitel**.
- 7.5.3 Změnové listy budou **odsouhlaseny** objednatelem **formou schválení dodatku ke smlouvě**. Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení objednatelem.
- 7.5.4 **Ocenění** víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno **s použitím položkových cen** položkových rozpočtů (*Příloha č. 1*).
- 7.5.5 **Soupis** prací **jednoho** stavebního nebo inženýrského **objektu**, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat **pouze na jednu cenovou soustavu** pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci.
- 7.5.6 Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta **individuální kalkulace**.
- 7.5.7 K hlavním rozpočtovým nákladům **není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku** na podíl vedlejších rozpočtových nákladů **VRN**, koordinační činnost a jiné přírážky.

K celkovým nákladům pak bude dopočtena **DPH** podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění

8 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.1 Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat **o předání díla zápis**, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
- 8.2 Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné **vady a nedodělky**, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách.
- 8.3 Převzetím díla přechází na objednatele **vlastnické právo** k dílu.

9 REKLAMACE

- 9.1 Postup při reklamaci:
- 9.2 Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje **do 7 dnů** od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.
- Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky
 - datum zjištění vady

- rozsah vady či poškození díla
- návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
- předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady
- uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty
- podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách“, které **nemají podstatný vliv** na funkci dokončeného díla, **zahájí do 15 dnů** od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady **odstraní do 30 dnů** od obdržení písemného oznámení reklamace.

U reklamace, která **má „podstatný vliv“** na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady **odstraní do 15 dnů** od obdržení písemného oznámení reklamace. Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

- 9.3 I když, **reklamace nebude oprávněná**, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.
- 9.4 Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu.

10 ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 10.1 Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **60 měsíců** od data řádného předání stavby objednateli.
- 10.2 Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli, s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo záruční dobu jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená jejich výrobcem nebo dodavatelem, **minimálně však 24 měsíců** ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů.
- 10.3 Zhotovitel obdobně odpovídá za jakékoliv **právní vady díla**, jimiž je dílo postiženo v době jeho předání anebo jimiž bude postiženo v době po předání díla z důvodu zavinění zhotovitele.

11 SMLUVNÍ POKUTA

- 11.1 V případě **prodlení** s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 11.2 V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši **0,1%** z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení.

- 11.3 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a **vyčištění staveniště** (odst. 6.8.) zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 11.4 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k **odstranění vady** uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 11.5 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k **odstranění vady** uplatněné objednatelem **v záruční době**, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 11.6 Zhotovitel se zavazuje, že v případě **porušení jakéhokoli jiného svého závazku** plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,-Kč** za každé porušení svých závazků či povinností.
- 11.7 V případě, že závazek provést dílo **zanikne před řádným ukončením** díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu.
- 11.8 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.
- 11.9 Smluvní pokuty je objednatel **oprávněn započíst** proti jakékoli pohledávce zhotovitele.
- 11.10 Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena přímo na účet správce daně v režimu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.
- 11.11 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem (viz § 106a zákona č. 235/2004 Sb.), tuto skutečnost městu Hodonín nahlásí nejpozději následující den po dni kdy rozhodnutí, na základě, kterého se stal nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit veškerou škodu, kterou tímto městu Hodonín způsobil a smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

12 JINÁ UJEDNÁNÍ

- 12.1 Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou **písemný dodatek** smlouvy. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě ani dodatku sjednány, platí, že je provádí **na svůj náklad**.
- 12.2 Podstatné náležitosti smlouvy mohou být měněny pouze **písemnými dodatky**, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
- 12.3 Smlouva je uzavřena podpisem druhé smluvní strany a **nabývá účinnosti** dnem zveřejněním v Regitru smluv vedeném Ministerstvem vnitra. Smlouva je vyhotovena ve **4 výtiscích** s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
- 12.4 Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.

12.5 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

12.6 Smlouva bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

13 PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Hodonín (www.hodonin.eu). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených ve smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Hodonín má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

- Příloha č. 1** Položkový rozpočet stavebních prací a služeb
vypracovaný na základě soupisu prací VZ
- Příloha č. 2** Časový harmonogram postupu stavebních prací
- Příloha č. 3** Změnový list (vzor)
- Příloha č. 4** Informační tabule (vzor)

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 4.8.2020, usnesení č. 2733

V Hodoníně, dne 18. 8. 2020

V Hodoníně, dne 18. 8. 2020

Objednatel:

Zhotovitel:

Libor Střecha – starosta

... - ředitel oblasti Hodonín,
... - výrobně-technický ředitel,
oba na základě plné moci

„Hodonín – opravy živičných krytů MK 2020“
Rekapitulace stavebních objektů

Název objektu

Cena za objekt bez DPH v Kč

Hodonín, rekonstrukce parkoviště Národní třída 46 (za ČS)	1 214 057 Kč
Hodonín, rekonstrukce živičného krytu MK Masná	2 742 655 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	39 156 Kč

Cena celkem bez DPH:	3 995 868 Kč
DPH 21%:	839 132 Kč
Cena celkem vč. DPH 21%:	4 835 000 Kč



Hodonín, rekonstrukce parkoviště Národní třída 46 (za ČS)

Investor: Město Hodonín

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1 Zemní práce					
1 113154253	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase				
2 113155254	Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase				
3 113107035	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 100 mm při překozech ručně				
5 Komunikace					
4 573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2				
5 577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu				
6 577146151R	Asfaltová kompenzační vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin v. tl. 40mm				
7 58920	Vyplnění spár živičnou zálivkou				
9 Ostatní konstrukce a práce					
8 919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu				
9 915111115	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm ŽLUTOU barvou dělicí čáry souvislé				
10 915611111	Předznačení vodorovného liniového značení				
11 916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého				
12 919721221	Geomfix pro vyztužení asfaltového povrchu				
13 938909331	Čištění vozovek metením podkladu nebo krytu betonového nebo živičného				
14 997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km				
15 997211519	Připlátek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí				
16 997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce				
17 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným				
18 451315136	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 200 mm vč. vybourání				
19 VRN	Přechodné dopravní značení				

Sazba DPH	DPH celkem	Celková cena bez DPH:	1 214 057 Kč
21,00	254 952 Kč	Celková cena s DPH:	1 469 009 Kč

STAVBA CELKEM



Hodonín, rekonstrukce živičného krytu MK Masná

Investor: Město Hodonín

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1 Zemní práce					
1 113154253	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase				
2 113155222	Frézování betonového krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase				
3 113107035	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 100 mm při překozech ručně				
5 Komunikace					
4 573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2				
5 577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu				
6 577146151R	Asfaltová kompenzační vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin SAL tl. 40mm				
7 58920	Vyplnění spár živičnou záplivkou				
9 Ostatní konstrukce a práce					
8 919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící záplivku v živičném krytu				
9 919721221	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu				
10 938909331	Čištění vozovek metením podkladu nebo krytu betonového nebo živičného				
11 997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km				
12 997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti				
13 997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce				
14 998225111	Presun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným				
15 451315136	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 200 mm vč. vybourání				
16 MTŽ	Výšková úprava UV a poklopů				
	Kompletní výměna uliční vpusti včetně vybudování nové přípojky dl. do 15 m a kompletní likvidace původní vpusti				
17 MTŽ					
18 VRN	Přechodné dopravní značení				

STAVBA CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Celková cena bez DPH:	2 742 655 Kč
	21,00	575 957 Kč	Celková cena s DPH:	3 318 612 Kč



Vedlejší a ostatní náklady

Investor: Město Hodonín

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
Vedlejší náklady					
1	Zařízení staveniště				
2	Koordinanční činnost				
3	Zajištění BOZP na staveništi				
Ostatní náklady					
4	Průzkumné práce				
5	Zajištění zkoušek				
6	Zeměměřičské práce při výstavbě - nivelace				

STAVBA CELKEM		Sazba DPH	DPH celkem	Celková cena bez DPH:	39 156 Kč
		21,00	8 223 Kč	Celková cena s DPH:	47 379 Kč

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Hodonín – opravy živičných krytů MK 2020“

Termín realizace stavebních prací: do 30 dnů od zahájení prací

Popis prací	1. MĚSÍC			
	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden
Parkoviště Národní třída 46				
MK Masná				
VON - Vedlejší a ostatní náklady				

Název akce:

„Hodonín – opravy živičných krytů MK 2020“

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: **ZL č. XX**

„(doplnit název změnového listu)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.:

- 1. Oddíl stavby:** *(Stavební objekt, Provozní soubor)*
- 2. Zpracovatel změnového listu:** *(zhotovitel stavby)*
- 3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1 stavební deník: *(SD č. xx, strana č. xx, datum xx.xx.xxxx)*
 - 3.2 kontrolní den: *(KD č. xx, ze dne xx.xx.xxxx)*
 - 3.3 jiné související dokumenty: *(dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele apod.)*
- 4. Zdůvodnění a příčina změny:**
(Podrobný popis příčiny změny.)
- 5. Návrh technického řešení a rozsah změny**
(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)
- 6. Finanční náklady změny**
(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	0,00	0,00
MĚNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	0,00	0,00

V dne

.....
(jméno, podpis zhotovitele)

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení **kontroly výkazu výměr** a nacenění víceprací dle podmínek SOD

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ
- Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd)
- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím
- stanovisky dotčených orgánů
- podmínkami dotačního programu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- Úprava harmonogramu stavby
- Dodatek IZ
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
- Dodatek Smlouvy o dílo
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS (ne)doporučuje ZL č. XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) (ne)doporučuje ZL.XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).

- a) V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.
- b) Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

Fl:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150:

Dotace EU/SR:

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V dne

.....
(jméno, podpis)

VEDOUCÍ ODBORU :

V dne

.....
(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

V dne

.....
(jméno, podpis)

10. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1	Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce
Příloha č. 2	položkový rozpočet
Příloha č. 3	fotodokumentace
Příloha č.	xxx další přílohy dle odst. 3.3.

Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka:

Změnový list č.	Název Změnového listu		celková částka	
Rozpis částky na roky:	2016			
	2017			
	2018			
Finanční profil:				
ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

příkazce operace:	datum:	jmeno:	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jmeno:	podpis:

TABULE PRO OZNAČENÍ STAVEB

SPECIFIKACE BANNERU

Banner (autoplachta) velikosti 3x2 m se zahnutím.
Pokud není možno umístit banner této velikosti,
rozměr konzultujte s odpovědnou osobou.
Umístění ok na banneru po 1 m nebo po 50 cm,
Oka jsou naznačena žlutou barvou.

V případě, že by označení stavby mělo být umístěno
v interiéru, nahradte banner komatexovou deskou 5 mm.



BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Logo vycentrováno na střed

Písmo zarovnáno k druhé
nožičce písmene „H“

Velikost písma 230 b
Helvetica Neue Light
zarovnáno s písmenem „H“

H MĚSTO
HODONÍN

Místo, kde chceme žít...

Text vycentrován
na střed čarného
prostoru s fotografií
nebo jen s textovým
polem

Velikost písma 130 b
Helvetica Neue
černé písmo Light
barevné písmo Bold

Stavba:

Termín výstavby:

Investor:

Zhotovitel:

Náklady:

Projektant:

Technický dozor:

1020 mm

Velikost písma 160 b
Helvetica Neue
kombinace Light / Bold
webová stránka vycentrována na
střed prostoru pod čarou

www.hodonin.eu

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Logo vycentrováno na střed

Písmo zarovnáno k druhé
nožičce písmene „H“

Velikost písma 230 b
Helvetica Neue Light
zarovnáno s písmenem „H“

MĚSTO
HODONÍN


Místo, kde chceme žít...

Obrázky dle zaslaných podkladů
a důležitosti k danému projektu.
Doporučeno 2 - 5 fotografií
dle dodaných materiálů.
Rozlišení 300 dpi.

Text vycentrován
na střed daného
prostoru s fotografií
nebo jen s textovým
polem

Velikost písma 130 b
Helvetica Neue
černé písmo Light
barevné písmo Bold

Stavba:
Termín výstavby:
Investor:
Zhotovitel:
Náklady:
Projektant:
Technický pozor:



Velikost písma 160 b
Helvetica Neue
kombinace Light / Bold
webová stránka vycentrovaná na
střed prostoru pod čarou

www.hodonin.eu

440 mm

580 mm


BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 2 fotografií




MĚSTO
HODONÍN

Místo, kde chceme žít...

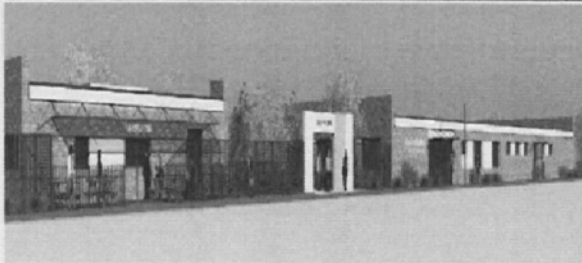

Stavba:
Termín výstavby:
Investor:
Zhotovitel:
Náklady:
Projektant:
Technický dozor:



www.hodonin.eu


BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 3 fotografií



MĚSTO
HODONÍN

Místo, kde chceme žít...

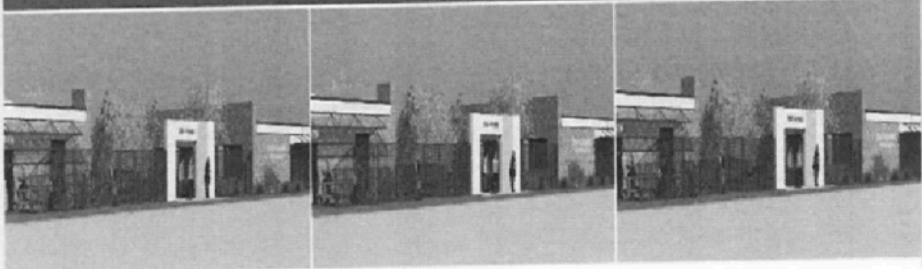

Stavba:	
Termín výstavby:	
Investor:	
Zhotovitel:	
Náklady:	
Projektant:	
Technický dozor:	

www.hodonin.eu


BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 5 fotografií




MĚSTO
HODONÍN

Místo, kde chceme žít...

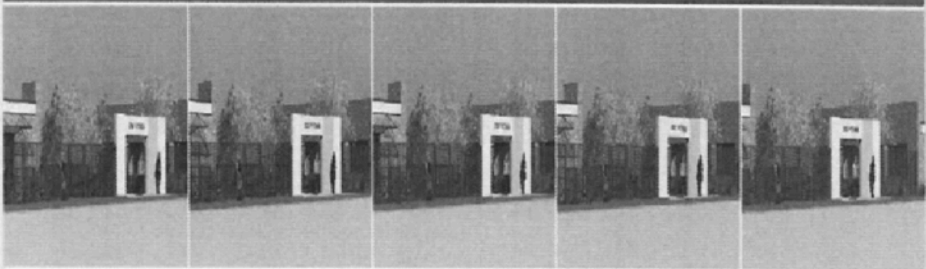

Stavba:
Termín výstavby:
Investor:
Zhotovitel:
Náklady:
Projektant:
Technický dozor:



www.hodonin.eu
