

Číslo smlouvy CETIN: HK 2019\_0001  
Číslo smlouvy stavebníka: 953/018/2020  
Číslo smlouvy Zhotovitele : .....

SAP: 8030001441  
Registr smluv: ANO

---

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY  
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
č. HK 2019\_0001**

---

mezi

**CETIN a.s.**

a

**Lesy České republiky, s.p.**

a

**Dredger, s.r.o.**

Číslo smlouvy CETIN: HK 2019\_0001  
Číslo smlouvy stavebníka: 953/018/2020  
Číslo smlouvy Zhotovitele : .....

SAP: 8030001441  
Regístr smluv: ANO

Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „**Smlouva**“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“), a dle ust. § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) mezi:

**CETIN a.s.**

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. B 20623

zastoupená na základě pověření [REDAKCE], specialistou, Výstavba PPS Čechy

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2019160003/6000

(dále „**CETIN**“)

a

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. AXII 540

zastoupené Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

zastoupený Ing. Tomášem Sajdlem, vedoucím Správy toků - oblast povodí Labe, Hradec Králové,

na základě Pověření ze dne 25. 7. 2019

(dále „**Stavebník**“)

a

**Dredger, s.r.o.**

se sídlem Dubina 30, 362 72 Kyselka

IČO : 263 53 571

DIČ : CZ 263 53 571

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp.zn. C 14845

zastoupená Alicí Dvořákovou, jednatelkou

(dále „**Zhotovitel Stavby**“)

(CETIN, Stavebník a Zhotovitel Stavby jsou dále společně označováni také jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

**DEFINICE**

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy níže uvedený význam:

**CTN** je cenový a technický návrh a současně realizační dokumentace a specifikace nákladů Překládky, jež je Přílohou číslo 1 této Smlouvy;

**Překládka** je stavba v k.ú. Hlinsko (okres Chrudim) spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN.

**SEK** je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

**Vyjádření o existenci SEK je** Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. ze dne 19. 5. 2020 vydané pod čj. 639346/20, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník.

## **1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1 Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.
- 1.2 Stavebník na základě obdrženého Vyjádření o existenci SEK vyvolává dle ustanovení § 104 odst.17 Zákona o elektronických komunikacích Překládku dotčené části SEK.
- 1.3 Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Hlinsko (CR) Drachtinka, přel. sloupů**“

## **2. PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených touto Smlouvou a závazek Zhotovitele Stavby a Stavebníka, jenž Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou v rozsahu CTN, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

## **3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY**

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Vlastníkem SEK, přeložené na základě této Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.3 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN vůči Stavebníkovi odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama. Některé práce provede Zhotovitel Stavby po domluvě se spol. CETIN a o této skutečnosti uvědomí Stavebníka. CETIN bude před realizací přeložky písemně informovat Stavebníka o pověřené osobě.

Číslo smlouvy CETIN: HK 2019\_0001  
Číslo smlouvy stavebníka: 953/018/2020  
Číslo smlouvy Zhotovitele : .....

SAP: 8030001441  
Registr smluv: ANO

#### 4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

- 4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje v souladu se svými zákonnými povinnostmi
- a) před realizací Překládky:
    - i) zajistit vyhotovení CTN;
  - b) po realizaci Překládky:
    - i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky (dokumentace skutečného provedení Překládky není dokumentací skutečného provedení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.).
- 4.2 V souvislosti s provedením Překládky se Zhotovitel Stavby zavazuje
- a) před realizací Překládky:
    - i) písemně vyzvat CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (to vše dále „**Písemná výzva Zhotovitele Stavby**“).
- 4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky (i) do 3 měsíců od doručení Písemné výzvy Zhotovitele Stavby a ze strany Zhotovitele Stavby splněny povinnosti uvedené v čl. 6 odst. 6.1 a) a v čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy, (ii) jinak nejpozději do 3 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN. Společnost CETIN bude informovat Zhotovitele Stavby i Stavebníka 5 dní před započatím prací v terénu.
- 4.4 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 této Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě této Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník nebo Zhotovitel Stavby plněním povinností dle této Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být případně zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.
- 4.5 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Zhotoviteli Stavby a zároveň Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 této Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky s tím, že pokud Zhotovitel stavby případně Stavebník toto oznámení nepřevzme, pak dnem ukončení realizace Překládky je 5. den od odeslání tohoto oznámení společností CETIN Zhotoviteli Stavby nebo Stavebníkovi.

#### 5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Zhotovitel Stavby případně Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK v rozsahu CTN, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN ke dni uzavření této Smlouvy činí **59 610,00 Kč** (slovy: padesát devět tisíc šest set deset korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy.
- 5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy, Zhotovitel Stavby se zavazuje je společností CETIN uhradit.

Mezi nezbytné náklady na Překládku patří zejména, nikoliv však výlučně

- i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- ii) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce,
- iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vážnoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru nemovitostí,
- iv) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- vi) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- vii) náklady na identifikaci parcel,
- viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- xi) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- xiv) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

## 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy je Zhotovitel Stavby povinen uhradit takto:

- a) Fakturu č. 1 za CTN ve výši **10 602,00 Kč** (slovy: deset tisíc šest set dva korun českých) do 30 dnů ode dne jejího vystavení,
- b) Fakturu č. 2 ve výši doplatku nákladů za Překládku do 30 dnů od jejího vystavení.

6.2 Faktura dle odstavce 6.1 písm. a) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy, faktura dle odstavce 6.1 písm. b) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů ode dne ukončení realizace Překládky ve smyslu Čl. 4 bodu 4.5 této Smlouvy a Zhotovitel Stavby je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti, která činí 30 dnů ode dne vystavení faktury.

6.3 Faktury budou Zhotoviteli Stavby zasílány na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy. Každá faktura bude mít všechny zákonné náležitosti. V případě, že faktura nebyla vystavena řádně, je Zhotovitel Stavby oprávněn fakturu vrátit, a to ve lhůtě pěti pracovních dnů od jejího doručení s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě oprávněně vrácena, je CETIN povinen řádně vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či

Číslo smlouvy CETIN: HK 2019\_0001  
Číslo smlouvy stavebníka: 953/018/2020  
Číslo smlouvy Zhotovitele : .....

SAP: 8030001441  
Registr smluv: ANO

doplňenou) fakturu, a to ve lhůtě deseti pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury.

- 6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v čl. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny Zhotovitelem Stavby odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a Zhotovitel Stavby je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.
- 6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Zhotovitelem Stavby hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.

## 7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Zhotovitel Stavby bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.
- 7.4 Zánikem Smlouvy rozvazovací podmínkou dle čl. 9 této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

## 8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

### 8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: [REDACTED]  
funkce: specialista pro výstavbu sítě  
e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]  
funkce: specialista pro výstavbu sítě  
e-mail: [REDACTED]

### 8.2 Za Zhotovitele Stavby:

ve věcech smluvních: [REDACTED]  
funkce: stavbyvedoucí, technik  
e-mail: [REDACTED]

### 8.3 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: [REDACTED]  
funkce: referent pro katastr  
e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]  
funkce: správce vodních toků  
e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

funkce: referent pro provozní činnost

e-mail: [REDACTED]

- 8.4 Tyto a další kontaktní a účetní údaje jedné ze Smluvních stran je příslušná Smluvní strana oprávněna měnit s účinností doručení změněného údaje na adresu ostatních Smluvních stran v hlavičce této Smlouvy či na adresu sídla ostatních Smluvních stran dle zápisu v obchodním rejstříku.

## 9. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 9.1 Písemná výzva Zhotovitel Stavby, učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a 4.3 této Smlouvy, musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou let od uzavření této Smlouvy. Marré uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.
- 9.2 S ohledem na ustanovení odst. 9.1 tohoto článku tedy tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od jejího uzavření, aniž by byla v této lhůtě doručena společnosti CETIN řádná písemná výzva Zhotovitele Stavby (učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a odst. 4.3 této Smlouvy). V případě, že dojde k zániku Smlouvy touto rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy.

## 10. RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ

- 10.1 Stavebník jako ručitel tímto přebírá ručení za řádné a včasné splnění veškerých povinností a dluhů Zhotovitele Stavby vůči společnosti CETIN vyplývajících z této Smlouvy, tzn., zavazuje se, že uhradí jakýkoliv peněžitý dluh Zhotovitele Stavby vůči společnosti CETIN, který vznikne v důsledku porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele Stavby vůči společnosti CETIN dle této Smlouvy, a který nebude Zhotovitelem Stavby uhrazen.
- 10.2 Stavebník je povinen uhradit dluh za Zhotovitele Stavby dle předchozího odstavce nejpozději do 30 dnů ode dne doručení prvního písemného oznámení společnosti CETIN Stavebníkovi, v němž bude uvedeno, že Zhotovitel Stavby řádně a včas nesplnil (jakoukoli) povinnost nebo dluh vyplývající z této Smlouvy.
- 10.3 Ručení Stavebníka z tohoto ručitelského prohlášení není vázáno na podmínku vymáhání nebo uplatnění práva nebo jakéhokoliv jiného nároku vyplývajícího z této smlouvy vůči Zhotoviteli Stavby společností CETIN.

## 11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přijímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným osobním údajům v pozici správce.

- 11.2 Účelem předání osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.
- 11.6 Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
- 11.7 Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.

Stavebník za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance Program Lesů České republiky, s. p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

## 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit **společnosti** CETIN potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude



odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.

11.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.

11.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- a) v listinné podobě;
- b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů; a/ nebo
- c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 této Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem c).

11.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsob řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

11.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11.6 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

11.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:

- § 557;
- § 1767 odst. 2;
- § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
- § 1743.

11.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.

11.9 Stavebník ani Zhotovitel stavby nejsou oprávněni převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku) ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

11.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

Číslo smlouvy CETIN: HK 2019\_0001

SAP: 8030001441

Číslo smlouvy stavebníka: 953/018/2020

Registr smluv: ANO

Číslo smlouvy Zhotovitele : .....

11.11 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

11.12 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

11.13 Společnost CETIN přijal a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>). Stavebník a Zhotovitel Stavby (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník a Zhotovitel Stavby odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník a Zhotovitel Stavby zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo Zhotovitel Stavby nebo jakýkoliv jejich zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník a Zhotovitel Stavby pro společnost CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

11.14 Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 – Specifikace nákladů Překládky

CETIN:

V Táboře dne ..... 2.9.-07-.2020



**CETIN a.s.**


specialista, Výstavba PPS Čechy

CETIN a.s.  
Českomoravská 2510/19, Libeň  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ04084063

202

Stavebník:

V Hradci Králové dne 24.7.2020



**Lesy České republiky, s.p.**

Ing. Tomáš Sajdl

vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe

Zhotovitel Stavby:

V JUBIPE dne 24.8.2020





**Dredger, s.r.o.**

Alice Dvořáková

jednatelka

**místo stavby**

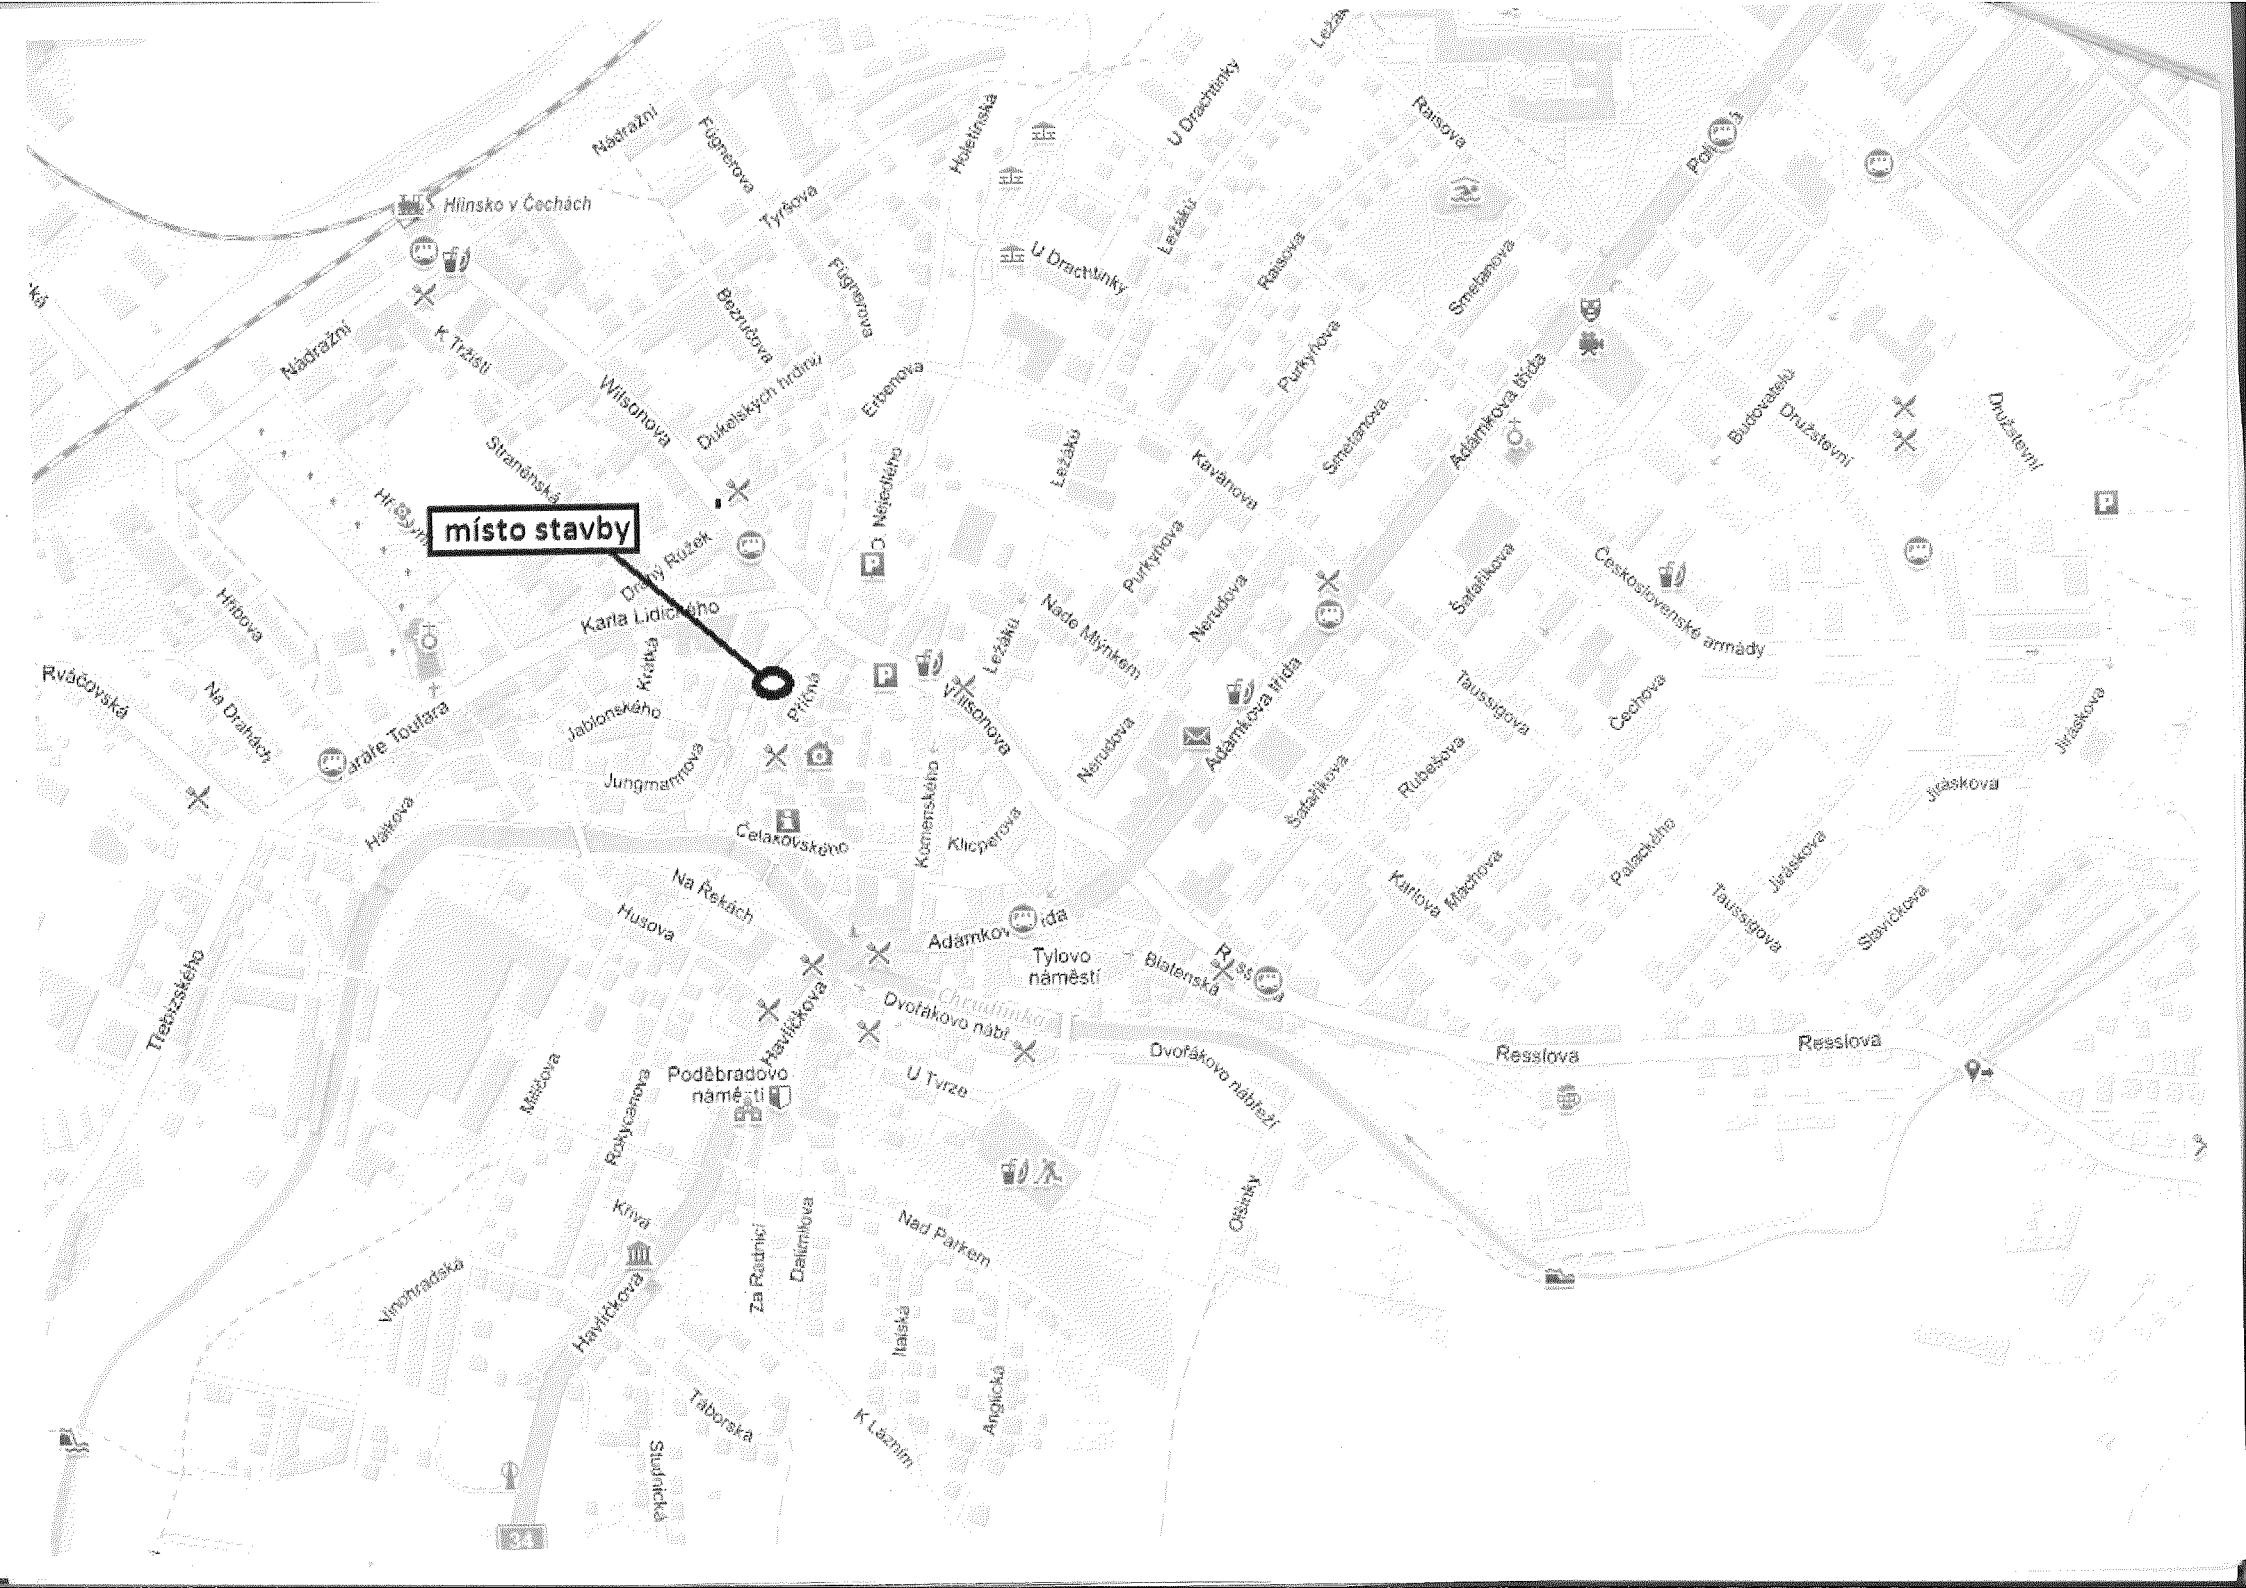

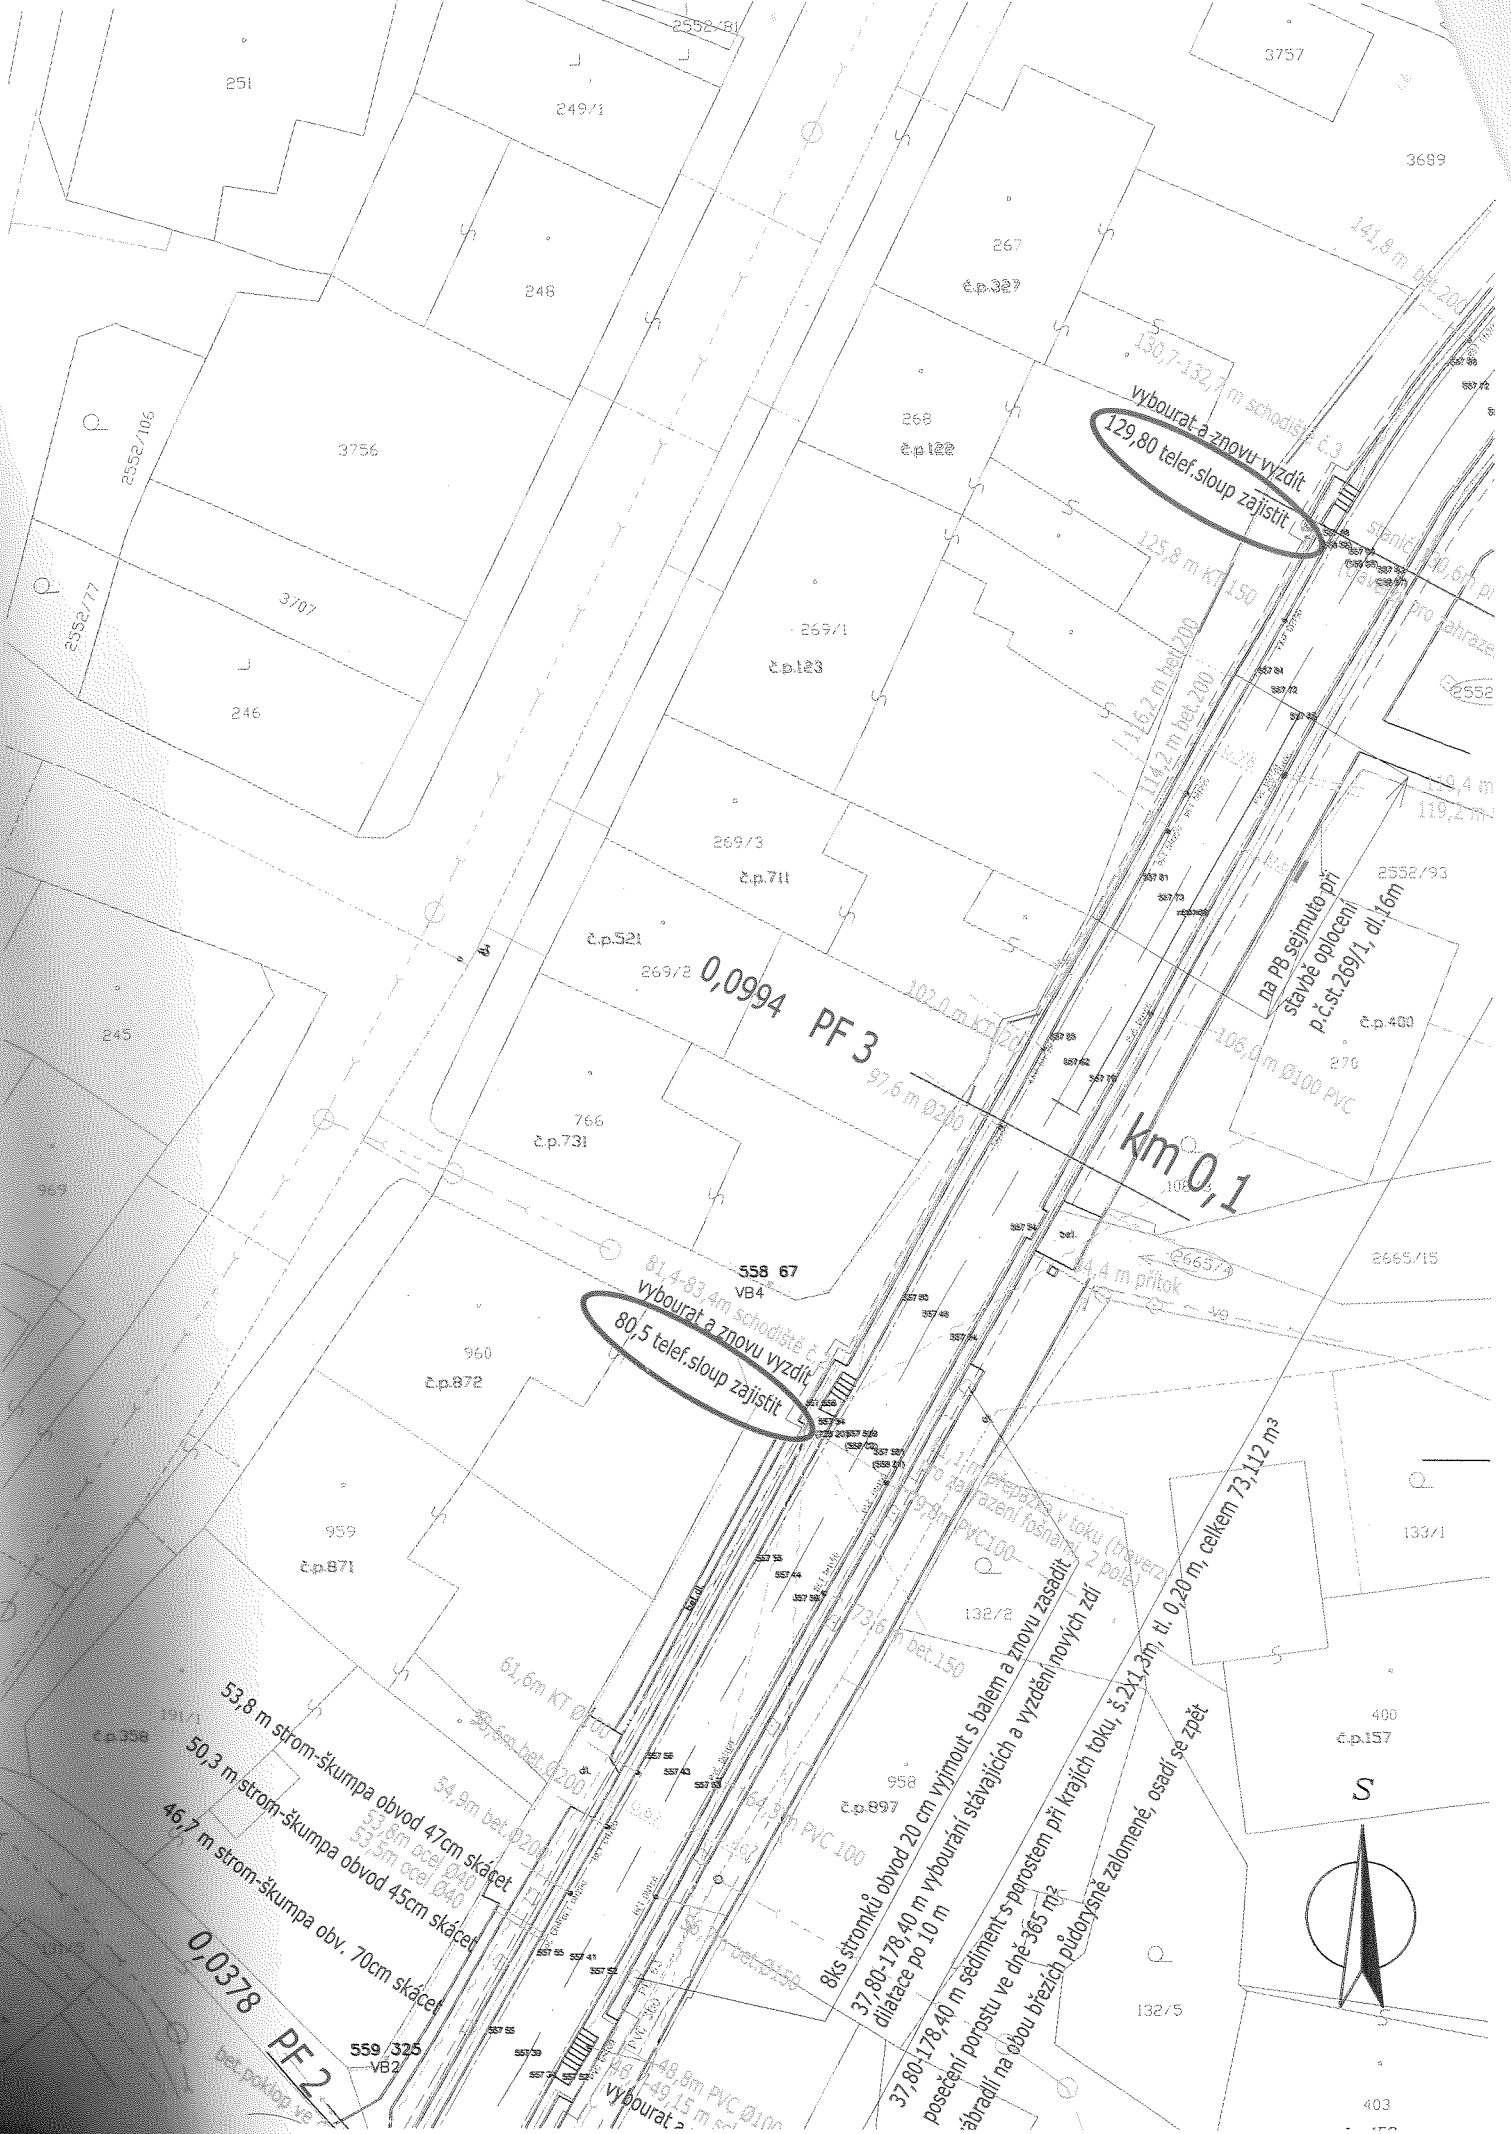

vybourat a znovu vyzdit  
129,80 telef.sloup zajistit

81,4-83,4m schodište  
vybourat a znovu vyzdit  
80,5 telef.sloup zajistit


0,0994 PF 3

Km 0,1

0,0378 PF 2

53,8 m strom-škumpa obvod 47cm skácel  
50,3 m strom-škumpa obvod 45cm skácel  
46,7 m strom-škumpa obv. 70cm skácel

8ks stromků obvod 20 cm vymout s bolem a znovu zasadit  
37,80-178,40 m vybourání stávajících a vyzdění nových zdí  
37,80-178,40 m sediment s perostem při krajích toku, s.2x1,3m, tl. 0,20 m, celkem 73,112 m<sup>3</sup>  
posezení porostu ve dně-365 m<sup>2</sup>  
ábraďil na obou březích plynově zalomené, osadí se zpět



**Obsah:**


1. Požadavek - stavebně technické řešení – technologie, montáž
2. Věcná břemena
3. rozpočet
4. kontakty
5. závěr

**Výkresová část:**

1. Přehledová mapa

**1. Požadavek**

Předmětem cenového technického návrhu (CTN) je požadavek společnosti CETIN a.s. na přeložení vedení sítě elektronických komunikací (SEK) vyvolaný žádostí investora Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, 539 01 Hlinsko. Stávající trasa nadzemního vedení SEK je ohrožena plánovanou rekonstrukcí nábrežních zdí vodního toku Drahtinka. V trase nadzemního vedení SEK se nachází jeden průběžný patkovaný sloup a jeden rozvodný patkovaný sloup vystrojený rozvodnou objímkou a hrncovou spojkou HSU.

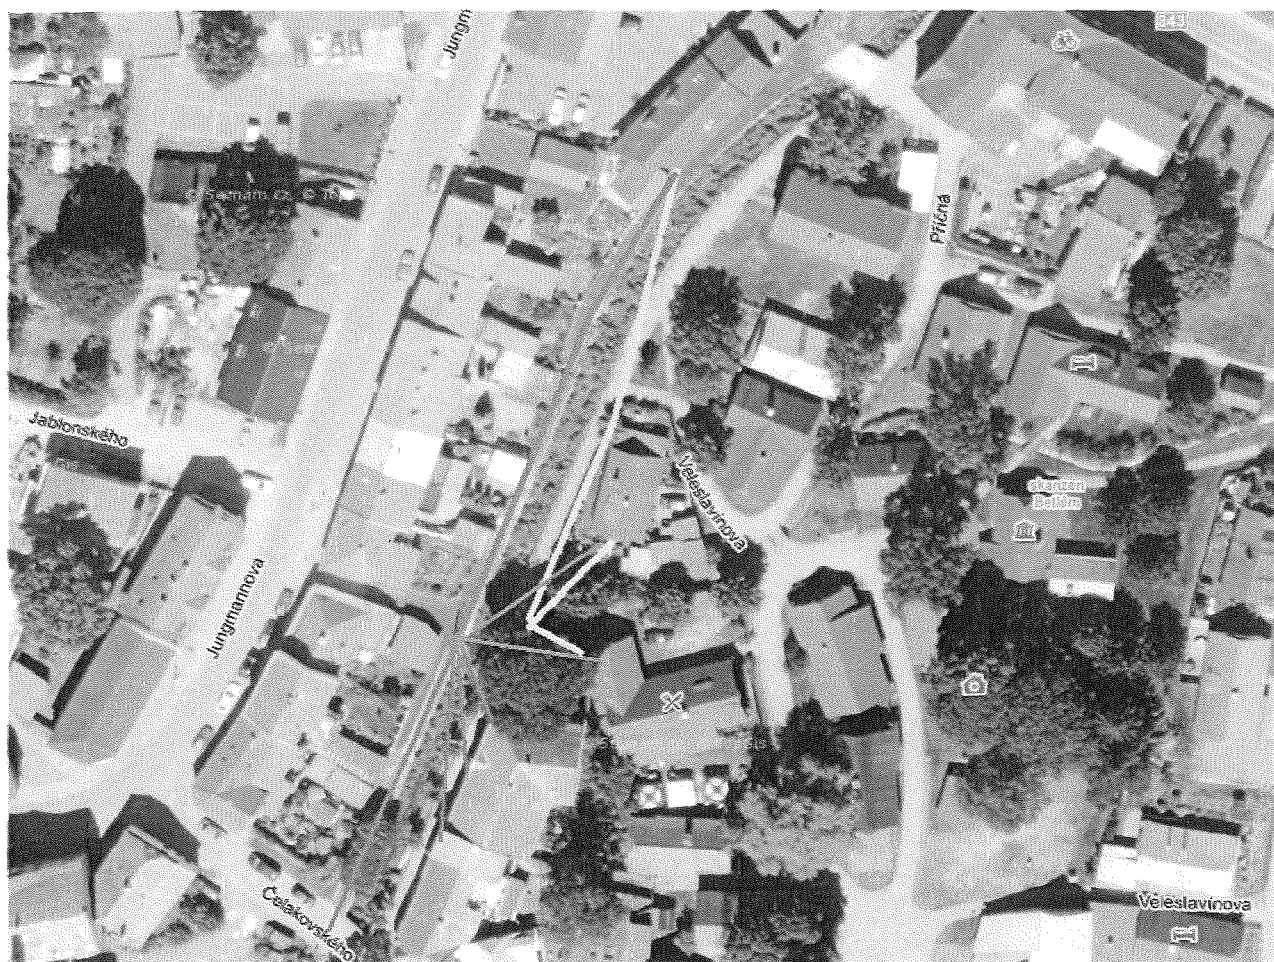

**Pohled na situaci:**

kresleno modře - dotčené nadzemní vedení SEK

kresleno žlutě – krátkodobá provizorní přeložka SEK kabelem SYKFY 3x2x0,5

### Stavebně technické řešení

Nadzemní vedení vychází z kabelového držáku na zdi čp. 1680. Ve zdi čp.1680 se nachází skříňka MIS1QT rozvaděče UR1/24 HLIN193 z níž vede vytrubkování k uvedenému kabelovému držáku.




Pohled na **průběžný sloup** a jeho poloha u nábrežní zdi

Z rozvaděče UR1/24 HLIN193 vede samonosný kabel TCEKFLES 3XN přes průběžný patkovaný sloup na rozvodný patkovaný sloup vystrojený rozvodnou objímkou a hrncovou spojkou HSU.



Pohled na **rozvodný sloup** a jeho poloha u  
nábřežní zdi

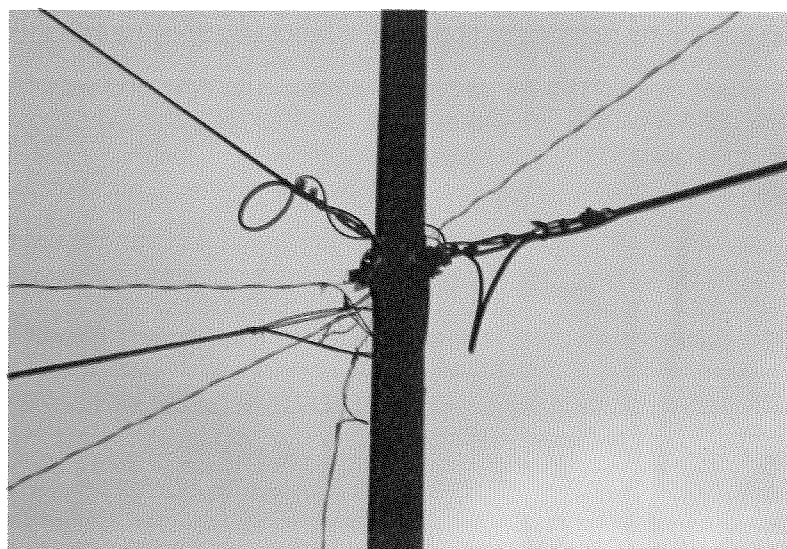

Objímka s kabely na rozvodném sloupu


Z rozvodného sloupu jsou poskytovány služby do domů čp.400 a čp.157. Dům čp.157 je hospoda do níž je poskytována služba PSTN a internet. Zbývající kabely nejsou službami obsazeny. Původní záměr z technických důvodů krátkodobě vypovědět poskytování služeb z důvodu demontáže kabelů jsem zavrhl s ohledem na službu internet poskytovanou do čp.157 – hospoda.

**Navržené řešení:**

Samonosné kabely budou včetně sloupů demontovány. Betonové patky budou na původních místech ponechány. Při rekonstrukci nábrežní zdi by nemělo dojít k jejich sesunutí. Po provedených zemních pracích na zdi bude terén směrem k vodnímu toku u obou patek zpevněn betonovou zálivkou v rámci činnosti vybrané firmy na rekonstruované zdi potoka.

Demontované vedení nahradí provizorní bytový kabel SYKFY 3x2x0,5 natažený z čp.1680 přes stromy k čp.157, kde se na stromě rozdělí na dva provizorní kabely vedoucí na čp. 400 a čp.157

Po zatvrdnutí betonových zálivek a obnově nábrežních zdí se s použitím původního materiálu nadzemní vedení SEK obnoví.

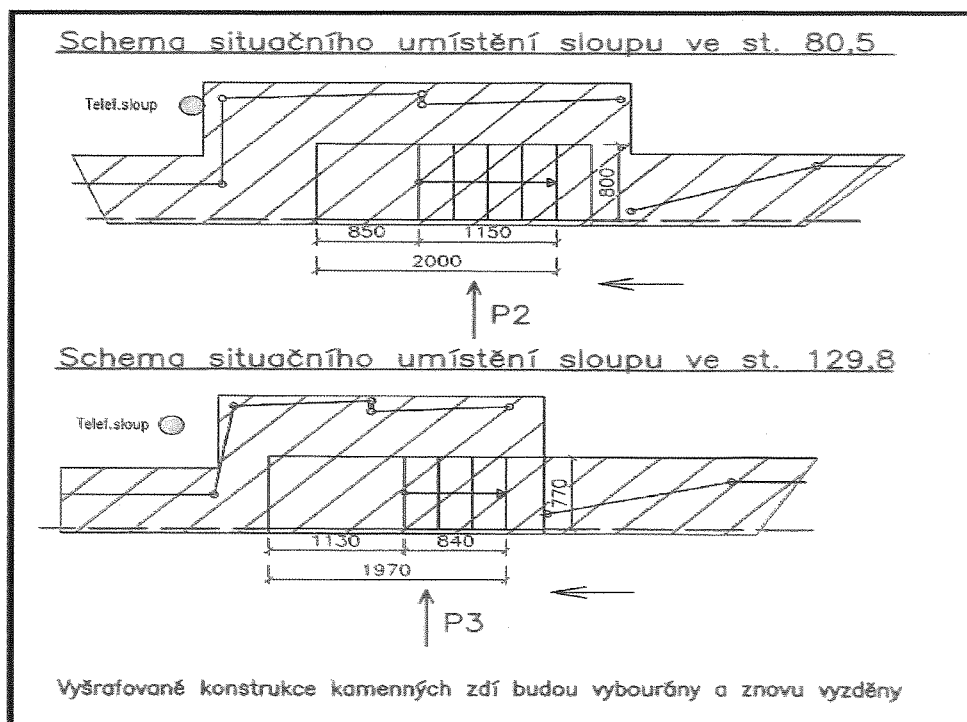

Staničení 80,5 je stávající pozice rozvodného sloupu

Staničení 129,8 je stávající pozice průběžného sloupu



Před montáží původních sloupů bude vhodné provést z pohledových důvodů jejich pokračení.

Demontáž vedení SEK je navržena z důvodu odlehčení zátěže betonových patek za účelem zamezení jejich pádu do stavebního výkopu.

## **2. Věcné břemeno**

- se neuzavírá, vedení SEK zůstává v původní trase

## **3. Rozpočet – viz příloha**

## **4. kontakty**

CETIN a.s. projektový koordinátor [REDAKCE]

Projekt:

ŽP projekt s.r.o.

Nábřeží Karla Čapka 597/III, 537 01 Chrudim

ing. Jirí Hlavatý – [REDAKCE] – jednatel společnosti

Investor:

Město Hlinsko

Poděbradovo náměstí 1

539 01 Hlinsko

Kontakt v době zpracování CTN neznámý

## **5. závěr**

Řešení CTN vychází z požadavku společnosti CETIN a.s. a realizovaného místního šetření.. V rozpočtu nejsou kalkulovány projektové práce z důvodu jednoduchosti montážních prací. Dle úvahy autora CTN lze požadovanou přeložku vedení SEK provést dle tohoto dokumentu CTN

listopad – prosinec 2018

TEMO-TELEKOMUNIKACE  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]

Název stavby: CTN VPIC Hlinsko(CR)Drachtinka, přel. Sloupů  
 Číslo SPP prvku:  
 Zhotovitel PD: Vladko Fiala  
 KPO: PA  
 HOST: CR  
 VUJ:

## Technické údaje:

KMVYK:	0.000	KMP:	0.000	bytových HT	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.000	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

## Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástav	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástav	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástav	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

## Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	10 601,72 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MONTÁŽ	44 807,68 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	4 200,67 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: **59 610 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST 49 008,35 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 10 601,72 Kč

## Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
	PŘÍPRAVA			
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks	10 601,72 Kč
	MONTÁŽ			
955017 S		Demontáž jednoduch. patkovaného stožáru	2.00 ks	3 991,24 Kč
955015 S		Demontáž samonos. kabelů do 5 XN	354.00 m	9 713,76 Kč
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	1.00 ks	162,15 Kč
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	12.00 ks	449,16 Kč

954998 S	Montáž jedné čtyřky bez číslování	3.00 ks	37,44 Kč
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	3.00 ks	93,54 Kč
955267 S	Montáž nadzemní tratě síťové	263.13 JV	263,13 Kč
úprava a montáž dřevěné lišty			
954981 S	Montáž samonosných kabelů do 5 XN	160.00 m	5 388,80 Kč
955285 S	Montáž spojky hrncové	1.00 ks	492,68 Kč
953167 S	Pronájem stavebního stroje - použití mechanizace-Mo	2.00 hod.	1 526,04 Kč
natažení provizorního kabelu po stromech			
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	15.00 ks	374,25 Kč
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	13.00 ks	4 702,36 Kč
955987 S	Ukončení kabelu vnitřního v rozvaděči	6.00 ks	1 623,96 Kč
954985 S	Vystrojení jednoduchého patkov.stožáru	2.00 ks	4 714,66 Kč
955021 S	Vystrojení na stávajících podpěrách - demontáž	3.00 ks	1 159,98 Kč
954989 S	Vystrojení na stávajících podpěrách	2.00 ks	982,86 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 694,09 Kč
955098 S	Zrušení kabelu bytového do 10 XN	160.00 m	3 593,60 Kč
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	12.00 ks	209,64 Kč
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	13.00 ks	1 945,84 Kč
957729 S	Zřízení KBS a přezkoušení	2.00 ks	688,50 Kč

#### Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný</b>				
316624 S		Hadice smršť. SNIM/H 16/5 5 GF 2601	1.00 ks	221,56 Kč
305267 S		Kabel vnitřní SYKFY 3x2x0,5 mm	160.00 m	884,80 Kč
312240 S		Konektor UY2 přímý - plněný	12.00 ks	16,68 Kč
301277 S		Lišta dřevěná 200x4,8x2,8 cm ochranná	1.00 ks	115,14 Kč
306683 S		Napínač šroubový oko-hák M 12	12.00 ks	541,68 Kč
314750 S		Spojka kabelová HSU univerzální hrncová	1.00 ks	927,63 Kč
313998 S		Svorka kabelová SH2 pro up. samon.kabelů	1.00 ks	128,22 Kč
307033 S		Svorka lanová D 9-12 mm	20.00 ks	312,80 Kč
306843 S		Svorník M 20x410x90x25	4.00 ks	182,64 Kč
303204 S		Vodič prop. SM-clip-volný B5 10114-B5U35	6.00 ks	359,46 Kč
303222 S		Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35	6.00 ks	510,06 Kč
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný</b>				
401646 S		Matice šestihřanná M 16,0 ČSN 021601	1.00 ks	0,00 Kč
401706 S		Matice šestihřanná M 20,0 ČSN 021601	8.00 ks	0,00 Kč
304267 S		Páska lepicí iz. 19mmx20mmx0,15mm černá	6.00 ks	0,00 Kč
404063 S		Podložka D 17 mm ČSN 021702	1.00 ks	0,00 Kč
404280 S		Podložka pérová D16,3 mm ČSN 021740	1.00 ks	0,00 Kč
404231 S		Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M20	8.00 ks	0,00 Kč
408324 S		Šroub s šestihř.hl. M16x180 ČSN021301	1.00 ks	0,00 Kč
402871 S		Vrut s šestihř.hl. 10x80 mm ČSN021810	4.00 ks	0,00 Kč

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Plzni  
oddíl C, vložka 14845

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	22. ledna 2003
<b>Spisová značka:</b>	C 14845 vedená u Krajského soudu v Plzni
<b>Obchodní firma:</b>	DREDGER s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Dubina 30, 362 72 Šemnice
<b>Identifikační číslo:</b>	263 53 571
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>Předmět podnikání:</b>	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny provádění staveb, jejich změn a odstraňování truhlářství, podlahářství pokryvačství, tesařství pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor výkon zeměměřických činností
<b>Statutární orgán:</b>	
<b>jednatel:</b>	ALICE DVOŘÁKOVÁ, [redacted] [redacted] Den vzniku funkce: 12. dubna 2012
<b>Počet členů:</b>	1
<b>Způsob jednání:</b>	Jednatel zastupuje společnost samostatně
<b>Společníci:</b>	
<b>Společník:</b>	ALICE DVOŘÁKOVÁ, [redacted] [redacted]
<b>Podíl:</b>	Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 200 000,- Kč Obchodní podíl: 100%
<b>Základní kapitál:</b>	200 000,- Kč
<b>Ostatní skutečnosti:</b>	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
