

LESYČR



Smlouva o dílo číslo 1/LHP2018

**na vyhotovení LHP pro LHC Ostrava
s platností od 1. 1. 2018**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek 1 Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s.p.

Se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Zápis v obchodním rejstříku:

Přemyslova 1106/19 Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Ing. Danielem Szórádem, Ph.D., generálním ředitelem
421 96 451

CZ 421 96 451

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

(dále také jen „objednatel“)

a

2. Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s.

Se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Zápis v obchodním rejstříku:

Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
Ing. Petrem Ratislavem, předsedou představenstva
25351079

CZ 25351079

ČS, a.s., pobočka Frýdek-Místek

KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1391

(dále také jen „zhotovitel“)

Článek 2 Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je zpracování lesního hospodářského plánu (LHP) s platností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2027 pro lesní hospodářský celek/celky (LHC) **Ostrava** nacházející se v oblasti působnosti organizační jednotky objednatel (OJ) s názvem **Ostrava**.
2. V případě, že předmětem této smlouvy je zpracování více LHP (pro více LHC), platí veškerá smluvní ujednání (zejména termíny plnění dle čl. 6 smlouvy) pro všechny LHP zhotovované na základě této smlouvy.

Článek 3 Místo, rozsah a podmínky plnění

1. LHC **Ostrava** se nachází v oblasti působnosti OJ **Ostrava** v **Moravskoslezském** kraji (krajích).
2. Předběžný plošný rozsah všech LHC, pro které je na základě této smlouvy zpracováván LHP, činí **9 416** ha, přičemž bude upřesněn do 31. 3. 2017.
3. LHP bude vyhotoven dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) a vyhlášky MZe č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování (ve znění platných k 1. 1. 2017).
4. LHP bude dále vyhotoven v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ve znění platném k 1. 1. 2017) a při respektování dalších obecně závazných právních předpisů s předmětem díla souvisejících.

5. LHP bude vyhotoven v digitální i analogové formě v souladu s informačním standardem lesního hospodářství platným pro LHP s platností od 1. 1. 2018 (IS LH 2018) schváleným Ministerstvem zemědělství (MZe).
6. LHP bude vyhotoven dle Zadávacího protokolu pro vyhotovení LHP s platností od 1. 1. 2018 (ZP 2018), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (příloha č. 1 je v elektronické podobě), a dle Katalogu výstupů pro LHP s platností od 1. 1. 2018, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (příloha č. 2 je v elektronické podobě).
7. Nedílnou součástí této smlouvy je i příloha č. 3 - Závazné rozpočtové členění ceny za dílo.

Článek 4

Povinnosti objednatele

4.1. Podklady předávané objednatelem, závazné termíny

Objednatel je povinen předložit zhotoviteli jako nezbytný podklad pro řádné vyhotovení LHP následující podklady, a to nejpozději v termínech dále uvedených:

1. Rastry státních map odvozených ve formátu CIT.
Zodpovídá: odbor hospodářské úpravy lesa (OHÚL) Termín: do 10 dní od uzavření smlouvy
2. Rastry porostních a obrysových map končících LHP ve formátu tif.
Zodpovídá: OHÚL Termín: do 10 dní od uzavření smlouvy
3. Kartografická data končících LHP ve formátu BLK.
Zodpovídá: OHÚL Termín: do 10 dní od uzavření smlouvy
4. Vrstva parcel končících LHP ve formátu BLK.
Zodpovídá: OHÚL Termín: do 10 dní od uzavření smlouvy
5. Hranice působnosti OJ a revírů (polesí) v aktuálním stavu, v případě více LHP i hranice zařizovaných území jednotlivých LHP, ve formátu SHP.
Zodpovídá: OHÚL Termín: do 10 dní od uzavření smlouvy
6. Geografická data základního rozdělení (ZRO) končících LHP ve formátu BLK.
Zodpovídá: OHÚL Termín: do 10 dní od uzavření smlouvy
7. Alfanumerická data končících LHP ve formátu XML – stav po uzávěrci lesní hospodářské evidence za rok 2015.
Zodpovídá: OHÚL Termín: do 10 dní od uzavření smlouvy
8. Vektor výškopisu (zdroj ÚHÚL) ve formátu BLK.
Zodpovídá: OHÚL Termín: do 10 dní od uzavření smlouvy
9. Vrstva parcel (hraniční linie) digitálně zpracovaných navazujících LHP objednatele s platností do 31. 12. 2016 a mladších ve formátu BLK.
Zodpovídá: OHÚL Termín: do 10 dní od uzavření smlouvy
10. Geografická data ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů a zdrojů minerálních vod ve formátu SHP – stav k 31. 12. 2015.
Zodpovídá: OHÚL Termín: do 10 dní od uzavření smlouvy
11. Textová část v digitální podobě.
Zodpovídá: OHÚL Termín: do 10 dní od uzavření smlouvy
12. Katastrální mapy v analogové podobě s vyznačením parcel určených k obnově LHP s výjimkou katastrálních území, kde probíhá ve druhé polovině roku 2016 obnova mapového operátu – viz bod 19. odst. 4.1. této smlouvy. Na území, kde je již vyhotovena digitální katastrální mapa (DKM) nebo katastrální mapa digitalizovaná (KMD nebo KM-D), bude předána tato část v digitální podobě ve formátu xml.
Zodpovídá: OJ Termín: od uzavření smlouvy průběžně do 15. 12. 2016
13. Databáze parcel určených k obnově LHP z programu pozemkové evidence, korespondující s podklady uvedenými v bodu 12. odst. 4.1. této smlouvy.
Zodpovídá: OJ Termín: od uzavření smlouvy průběžně do 15. 12. 2016

14. Dříve platné mapy evidence nemovitostí (EN) v analogové podobě, pokud byly při přípravě pozemkových podkladů použity.
Zodpovídá: OJ **Termín: od uzavření smlouvy průběžně do 15. 12. 2016**
15. Geometrické plány, pokud byly při přípravě pozemkových podkladů využity.
Zodpovídá: OJ **Termín: od uzavření smlouvy průběžně do 15. 12. 2016**
16. Seznam dotčených parcel s nesoulady v druzích pozemků zjištěných OJ při přípravě pozemkových podkladů.
Zodpovídá: OJ **Termín: od uzavření smlouvy průběžně do 15. 12. 2016**
17. Předání současného stavu a záměru objednatele na kategorizaci lesů nového LHP.
Zodpovídá: OJ **Termín: do 31. 1. 2017**
18. Vektorová data cest z Centrální evidence lesní dopravní sítě (cesty 1L, 2L, 3L, 4L) ve formátu xml.
Zodpovídá: OHÚL **Termín: do 15. 2. 2017**
19. DKM, KMD nebo KM-D ve formátu xml pro k.ú., kde proběhla obnova mapového operátu ve druhé polovině roku 2016 a data byla zařazena do informačního systému KN k 1. 1. 2017.
Zodpovídá: OJ **Termín: do 20. 2. 2017**
20. Ortofotomapy v digitální podobě ve formátu tif.
Zodpovídá: OHÚL **Termín: do 28. 2. 2017**
21. Vymezení hospodářských souborů (HS) s návrhem základních hospodářských doporučení (ZHD) uvedených v §1, bod 7. Vyhlášky č.83/1996 Sb.
Zodpovídá: specialista hospodářské úpravy lesů (spec. HÚL) **Termín: do 28. 2. 2017**
22. Definování hospodářských cílů a záměrů objednatele pro tvorbu LHP.
Zodpovídá: OJ **Termín: do 28. 2. 2017**
23. Osnova pro tvorbu předběžné zprávy k základnímu šetření v digitální podobě.
Zodpovídá: spec. HÚL **Termín: do 28. 2. 2017**
24. Aktualizovaný seznam porostů s dřevinami zařazenými do fenotypové třídy A nebo B s vyznačením uznaných selektovaných zdrojů, včetně záměru objednatele při aktualizaci fenotypové klasifikace a seznam semenných porostů.
Zodpovídá: OJ ve spolupráci se specialistou pro genetiku **Termín: do 28. 2. 2017**
25. Schválené oblastní plány rozvoje lesů (OPRL) pro přírodní lesní oblasti (PLO) dotčené vyhotovením LHP v digitální podobě (poskytují se pouze na vyžádání zhotovitelem).
Zodpovídá: OHÚL **Termín: do 28. 2. 2017**
26. Zhodnocení hospodaření za uplynulé období platnosti končícího LHP.
Zodpovídá: OJ **Termín: do 6. 3. 2017**
27. Předání podkladů nezbytných k upřesnění, aktualizaci hranic všech zvláště chráněných území (ZCHÚ), včetně jejich ochranných pásem, smluvně chráněných území (SCHÚ), ptačích oblastí (PO) a evropsky významných lokalit (EVL), proti podkladům převzatým zhotovitelem dle čl. 6.2, bod 1. Smlouvy. Dále budou předány platné předpisy (v případě SCHÚ smlouvy), jimiž jsou tato území vyhlášena a u všech ZCHÚ platné plány péče o ně a dále platná rozhodnutí o omezení těžeb z důvodu ochrany přírody.
Zodpovídá: OJ **Termín: do 20. 3. 2017**
28. Zákes hranic revírů, základního rozdělení (oddělení, dílce), včetně jejich označení pro nový LHP, upřesnění místních názvů do prozatímního výtisku pozemkové mapy dodaného zhotovitelem.
Zodpovídá: OJ **Termín: průběžně do 27. 3. 2017**
29. Seznam porostních skupin navržených k relaskopování.
Zodpovídá: spec. HÚL ve spolupráci s OJ **Termín: do 31. 3. 2017**
30. Seznamy změn v pozemkových podkladech zjištěných po odevzdání náležitostí uvedených v bodech 12. až 16. a 19. odst. 4.1. této smlouvy.
Zodpovídá: OJ **Termín: do 31. 3. 2017**
- Další změny zjištěné po 31. 3. 2017, které bude nutné zohlednit při tvorbě LHP, budou zhotovitelem provedeny na základě písemného požadavku objednatele.

31. Předání připomínek k prozatímnímu výtisku pozemkových map, předanému zhotovitelem dle odst. 6.2. bodu 2. této smlouvy, včetně trvalé spolupráce se zhotovitelem při odstraňování zjištěných nesouladů při zařazení pozemků do pozemků určených k plnění funkcí lesů (PUPFL).
Zodpovídá: OJ **Termín: do 31. 3. 2017**
32. Vymezení lokalit pro předání podkladů zhotovitelem dle odst. 6.2. bodu 7. a 8. této smlouvy pro vyhotovení projektů lesnických činností na rok 2018.
Zodpovídá: OJ **Termín: do 31. 3. 2017**
33. Vybrané části OPRL dotčených PLO, aktualizované jednotlivými pobočkami ÚHÚL, Brandýs nad Labem, zejména se jedná o digitální data funkcí lesů, předběžná data lesnické typologie (LT) a lesních vegetačních stupňů (LVS).
Zodpovídá: spec. HÚL **Termín: do 31. 3. 2017**
34. Vybrané údaje LHE v digitální podobě za období od počátku platnosti končícího/končících LHP do 31.12.2016.
Zodpovídá: OHÚL **Termín: do 30. 4. 2017**
35. Geografická data přírodních lesních oblastí (PLO), lesních vegetačních stupňů (LVS) a lesnické typologie (LT) závazná pro tvorbu podsouborů lesních typů (PLT) s číselníkem zařazení LT do PLT - viz ZP 2018.
Zodpovídá: OHÚL **Termín: do 15. 5. 2017**
36. Předání souhlasů k využití kartografických dat LHP jiných vlastníků a LHO za účelem vytvoření soutisků u finálních tisků map.
Zodpovídá: OJ **Termín: průběžně do 31. 8. 2018**
 Na základě těchto souhlasů si zpracovatel vyžádá data u příslušných zhotovitelů LHP jiných vlastníků a LHO – viz ZP 2018.
37. Seznam rodičovských stromů (klonů) pro zpracování do LHP.
Zodpovídá: OJ ve spolupráci se specialistou pro genetiku **Termín: do 31. 10. 2017**
38. Soupis hospodářských opatření a orientační zákresy holin provedených po termínu venkovního šetření do konce roku 2017 k upřesnění zhotovitelem.
Zodpovídá: OJ **Termín: průběžně do 31. 12. 2017**

4.2. Další činnosti zajišťované objednatelem

1. Základní šetření k LHP.
Zodpovídá: OJ **Termín: do 15. 5. 2017**

4.3. Spolupráce objednatele

Objednatel průběžně spolupracuje při vyhotovení LHP se zhotovitelem prostřednictvím svých organizačních jednotek. Podrobnosti stanoví ZP 2018.

Článek 5 Kontrola objednatelem

- Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu řádného plnění díla zhotovitelem.
- Osobou oprávněnou k provádění kontrol jsou specialisté HÚL, specialista digitálního zpracování LHP (spec. DZ LHP), lesní správce (ředitel LZ), revírník (vedoucí polesí) a pracovník zodpovědný za stav lesní dopravní sítě na organizační jednotce (zpravidla technický pracovník HIM na LS na KŘ nebo na LZ - dále jen „HIM“).
- Kontrola dodržování smlouvy se provádí v rozsahu max. 5 pracovních dnů v rámci čtvrtletí. Nevyčerpané kontrolní dny se převádějí do následujícího čtvrtletí. Objednatel může provádět kontrolu plnění smlouvy zhotovitelem i nad rámec 5 pracovních dnů v každém čtvrtletí, pokud tím neváže zhotovitele (nepřiměřeně jej neomezuje v provádění díla). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli požadované analogové podklady na 7 dnů, digitální data neomezeně, a to i v rozpracované podobě.

4. Termín provádění kontrol, místo konání kontrol a rozsah ke kontrole požadovaných podkladů musí být zhotoviteli oznámen nejméně 5 dnů předem.
5. Kontrola se provádí vždy za účasti kontrolovaného zařizovatele (příslušného pracovníka) zhotovitele, odpovědného vedoucího projektanta zhotovitele, nebo jím zmocněného zástupce; jejich účast je zhotovitel povinen zajistit.
6. Kontrolující i kontrolovaná strana může ke kontrole přizvat ještě další pracovníky z organizačních složek objednatele a zhotovitele.
7. Objednatel může pro kontrolu využít i třetí subjekt, který k tomu bude odpovídajícím způsobem zmocněn.
8. O kontrole se pořizuje zápis, který odsouhlasí podpisem obě smluvní strany.
9. V případě, že jedna ze stran se zněním zápisu nesouhlasí, uvede do zápisu zdůvodnění.
10. Závady zjištěné při kontrole je zhotovitel povinen odstranit v termínech a způsobem v zápise stanoveným, nejpozději však do 5 pracovních dnů (nebude-li písemně dohodnuto jinak). V případě, že zjištěné závady nebudou odstraněny v termínu a způsobem v zápise stanoveným, nejpozději však do 5 pracovních dnů (nebude-li písemně dohodnuto jinak), je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty dle Článku 13 bod 3. smlouvy.
11. Pokud bude při kontrolách objednatelem opakovaně zjištěn stejný typ závady, který byl vytknut zhotoviteli v zápise/ch z již provedených kontrol, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty dle Článku 13 bod 5. smlouvy.
12. Vady na již převzatých výstupech díla je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich vytknutí objednatelem (nebude-li písemně dohodnuto jinak). V případě, že zjištěné závady nebudou zhotovitelem odstraněny do 5 pracovních dnů od jejich vytknutí objednatelem (nebude-li písemně dohodnuto jinak) je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty dle Článku 13 bod 3. smlouvy.
13. Zhotovitel předkládá průběžně, nejméně však jednou za kalendářní měsíc, za účelem kontroly revírníkovi na LS nebo vedoucímu polesí na LZ pracovní mapu a návrh hospodářské knihy. Nejméně jednou za dva kalendářní měsíce předkládá zhotovitel pracovníkovi HIM seznam cest nově navržených k zařazení do kategorie cest 1L, 2L nebo 3L a seznam s návrhem změn kategorizace stávajících lesních cest 1L, 2L a 3L proti stavu dat předaných dle bodu 18. odst. 4.1. této smlouvy. K seznamům zhotovitel přiloží příslušné pracovní mapy s vyznačením návrhů na nové zařazení nebo návrhu na změnu kategorizace lesních cest. Pracovník HIM je oprávněn si vyžádat ke kontrole i další pracovní mapy dle potřeby. Forma a obsah pracovní mapy a návrhu hospodářské knihy je definován v ZP 2018. Pracovní mapa s návrhem umístěných obnovních těžeb a návrh hospodářské knihy mohou být revírníkovi (vedoucímu polesí) předávány v tištěné nebo digitální podobě, a to ve formátu pdf. Forma předávaných podkladů bude dohodnuta mezi revírníkem (vedoucímu polesí) a příslušným pracovníkem (zařizovatelem) zhotovitele. V případě nedohody rozhodne o podobě těchto podkladů revírník (vedoucí polesí). Seznamy s návrhem na nové zařazení nebo na změnu kategorizace lesních cest a příslušné pracovní mapy bude předávat zhotovitel pracovníkovi HIM v digitální podobě.
14. Po provedení kontroly předá revírník (vedoucí polesí) zhotoviteli připomínky k předaným podkladům v termínu do 14 dnů od jejich obdržení. Pracovník HIM prověří správnost navrhovaných úprav a zašle zhotoviteli k předaným návrhům své stanovisko v termínu do 30 dnů od jejich obdržení. Připomínky revírníka (vedoucího polesí) zhotovitel zpracovává a opravenou pracovní mapu a upravený návrh hospodářské knihy v digitální podobě ve formátu pdf předá do 14 dnů po obdržení připomínek zpět revírníkovi (vedoucímu polesí). Zhotovitel seznamy předané pracovníkovi HIM upraví dle jeho stanoviska a pošle mu je zpět v termínu do 7 dnů od obdržení jeho připomínek. Podklady se zpracovávají s připomínkami revírníků (vedoucích polesí), resp. pracovníků HIM předá zhotovitel vždy 1. pracovní den v měsíci i specialistovi HÚL, a to ve formátu pdf. Kromě těchto podkladů ve formátu pdf bude zhotovitel specialistovi HÚL předávat ve stejném termínu též pracovní mapy se zpracovávajícími připomínkami a opravami v podobě georeferencovaných rastrů, oříznutých a maskovaných podle hranice základního rozdělení nového LHP, případně georeferencovaný rastr většího území, který bude vytvořen z digitalizovaných pracovních map. RGB hodnota masky bude (32,0,32). První čtyři znaky názvu rastru budou vyjadřovat příslušný čtyřmístný kód LHC LČR, pátý znak bude podtržítka, další znaky mohou označovat číslo oddělení, revíru, mapového listu, případně jiné hodnoty. V případě opakovaného předání rastru mapy stejného území je nutné dodržet označení prvního předaného rastru.

15. Případné neshody jsou řešeny na úrovni vedoucího projektanta zhotovitele (viz Článek 7 odst. 1. smlouvy) a specialisty HÚL objednatele (viz Článek 7 odst. 2. smlouvy). Zhotovitel dále předkládá vždy k prvnímu pracovnímu dni v měsíci lesnímu správci (řediteli LZ) a specialistovi HÚL kumulovaný seznam všech projednaných oddělení s vyznačením oddělení projednaných v minulém měsíci, s uvedením jména zařizovatelů a plochy PUPFL jednotlivých oddělení.
16. Zhotovitel předkládá za účelem kontroly specialistovi HÚL relaskopické zápisníky a podklady z průměrkování naplno, v členění dle jednotlivých etází, a to průběžně po provedení venkovního šetření a výpočtu zásob.
17. Specialista DZ LHP provádí kontrolu technologických etap díla, které jsou definovány v odst. 3.4. ZP 2018.
18. Do 30 kalendářních dnů od předání finálních výstupů díla (viz odst. 6.2. bod 19. až 24. smlouvy) je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné závady. Zhotovitel je povinen tyto závady odstranit a do 30 kalendářních dnů od data obdržení písemného oznámení závad objednatelem předat opravené dílo, nebude-li písemně dohodnuto jinak.

Článek 6

Povinnosti zhotovitele

6.1. Rozsah relaskopování a průměrkování naplno zajišťovaný zhotovitelem, závazné termíny

Zhotovitel se zavazuje provést zjišťování zásob relaskopicky, u LHC Ostrava v minimálním rozsahu 0 ha. Relaskopické zápisníky budou předávány průběžně po provedeném venkovním měření a výpočtu zásob, nejpozději však v termínech dle odst. 6.2. bod 9. a 10. smlouvy.

Zhotovitel se dále zavazuje provést zjišťování zásob průměrkováním naplno, u LHC Ostrava v minimálním rozsahu 250 ha. Zhotovitel určí porosty, ve kterých bude provádět zjišťování zásob průměrkováním naplno. Podklady z průměrkování naplno budou předávány průběžně po provedeném venkovním měření a výpočtu zásob, nejpozději však v termínech dle odst. 6.2. bod 9. a 10. smlouvy.

Podmínky pro provádění relaskopování a průměrkování naplno, včetně popisu obsahu předávaných podkladů definuje ZP 2018.

6.2. Předání výstupů díla zhotovitelem, závazné termíny

Činnosti zabezpečující zhotovení díla budou zhotovitelem prováděny průběžně od uzavření této smlouvy až do předání řádně zhotoveného díla v jeho úplnosti, a to při dodržení následujících dílčích termínů (milníků) realizace díla (předání příslušných výstupů objednateli).

1. Zhotovitel si vyžádá pro zařizované území od Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „AOPK ČR“) vektorové vrstvy hranic zvláště chráněných území (včetně zonace CHKO), SCHÚ, ptačích oblastí a evropsky významných lokalit. Dále si zhotovitel pro zařizované území vyžádá od Národního památkového ústavu vrstvu archeologických nalezišť.

Termín: do 31. 1. 2017

2. Dvě paré prozatímního výtisku pozemkové mapy vyhotovené dle pozemkových podkladů předaných objednatelem (viz odst. 4.1. body 12. až 16. a 19. této smlouvy) v měřítku 1:5000 (nebo v jiném měřítku dle písemné dohody s objednatelem) na podkladě obrysových map končícího/končících LHP k odsouhlasení objednatelem a pro zákres základního rozdělení dle odst. 4.1. bodu 28. smlouvy).

Termín: do 28. 2. 2017

3. Specialistou HÚL a lesním správcem zkontrolovaná a odsouhlasená předběžná zpráva k základnímu šetření včetně návrhu rámcových směrnic hospodaření vypracovaných na podkladě hospodářských cílů a ZHD předaných objednatelem (viz odst. 4.1. body 21. a 22. této smlouvy) a příslušných OPRL.

Termín: do 15. 3. 2017

4. Předběžná digitální pozemková mapa (DPM) se stavem pozemků k 31. 3. 2017 (viz odst. 4.1. bod 30. této smlouvy).

- Termín: do 30. 4. 2017**
5. Předběžná základní lesnická mapa (ZLM) dle ZP 2018 (na základě podkladů dle odst. 4.1. bod 28. této smlouvy).
- Termín: do 30. 4. 2017**
6. Předání podkladů uvedených v čl.5 odst.13. smlouvy alespoň v rozsahu 10% z předběžného plošného rozsahu LHC uvedeného v čl. 3 odst. 2. smlouvy.
- Termín: do 30. 6. 2017**
7. Předání podkladů uvedených v čl. 5 odst. 13. smlouvy alespoň v rozsahu 40 % z předběžného plošného rozsahu LHC uvedeného v čl. 3 odst. 2. smlouvy, s respektováním lokalit určených objednatelem v odst. 4.1. bod 32. smlouvy.
- Termín: do 31. 7. 2017**
8. Předání podkladů uvedených v čl. 5 odst. 13 smlouvy alespoň v rozsahu 75 % z předběžného plošného rozsahu LHC uvedeného v čl. 3 odst. 2. smlouvy, s respektováním lokalit určených objednatelem v odst. 4.1. bod 32. smlouvy.
- Termín: do 30. 9. 2017**
9. Předání podkladů uvedených v čl. 5 odst.16. smlouvy alespoň v rozsahu 60% z minimálního rozsahu relaskopování a průměrkování naplno uvedeného v čl. 6.1. smlouvy.
- Termín: do 30. 9. 2017**
10. Předání podkladů uvedených v čl. 5 odst.16. smlouvy pro 100% minimálního rozsahu relaskopování a průměrkování naplno uvedeného v čl. 6.1. smlouvy.
- Termín: do 31. 10. 2017**
11. Finální základní lesnická mapa (ZLM) dle ZP 2018.
- Termín: do 30. 11. 2017**
12. Předání podkladů uvedených v čl. 5 odst. 13. smlouvy na 100 % z předběžného plošného rozsahu LHC uvedeného v čl. 3 odst. 2. smlouvy.
- Termín: do 30. 11. 2017**
13. Prozatímní mapy v měřítku 1 : 10 000, tištěné i ve formátu pdf, v členění po revírech na LS a polesích a lesnických úsecích na LZ:
- 3 pare na LS a 3 pare na LZ mapy porostní se situací mimo les, volitelně s vrstevnicemi, oboustranně foliované, skládané na pěšinky s legendou,
 - 2 pare na LS a 3 pare na LZ mapy hospodářských opatření se situací mimo les, volitelně s vrstevnicemi (minimálně se zákresem umístěné obnovní těžby).
- Termín: do 15. 1. 2018**
14. Koncept prozatímní hospodářské knihy v členění 1x vytištěný po revírech na LS a polesích na LZ a 1x převedený do digitální podoby ve formátu pdf.
- Termín: do 15. 1. 2018**
15. Předběžná digitální data numerické i grafické části LHP ve výměnném formátu IS LH 2018 se čtyřmístným kódem LHC LČR včetně ostatních pozemků mimo PUPFL (3. Etapa-SSL dle ZP 2018) a technická zpráva.
- Termín: do 10. 2. 2018**
16. Kompletní návrh LHP potřebný pro schválení s veškerými náležitostmi dle vyhlášky MZe č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, včetně seznamů všech navržených výjimek dle zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon), a k tomu:
- Specialisty HUL a DZ LHP zkontrolovaná digitální data numerické i grafické části LHP dle ZP 2018 – 3. Etapa - SSL a technická zpráva,
 - potřebné výstupy návrhu LHP pro vydání závazného stanoviska ke schválení LHP orgány státní správy ochrany přírody (OOP).
- Termín: do 22. 2. 2018**
17. Podklad pro vyhotovení žádosti objednatele pro správní řízení o zařazení lesů do kategorií lesů ochranných a lesů zvláštního určení.
- Termín: do 25. 2. 2018**

18. Specialisty HÚL a specialisty DZ LHP zkontrolovaná a odsouhlasená finální data dle ZP 2018 – 4. Etapa - final.

Termín: na Ředitelství LČR nejpozději do 31. 3. 2018

19. Čistopis hospodářské knihy v digitální a analogové podobě:

- jedno pare bez evidence v členění dle revírů (polesí),
- jedno pare s vloženými evidenčními listy (dle dohody s objednatelem – OJ) v členění dle revírů (polesí),
- jedno pare s vloženými evidenčními listy (dle dohody s objednatelem – OJ) v členění dle lesnických úseků (na LZ).

Termín: do 30-ti dnů od doručení schválení LHP příslušným krajským úřadem zhotoviteli

- 20.

abulka plochová v digitální podobě ve formátu pdf a v analogové podobě v členění dvě paré dle revírů (polesí) a sumarizace za LHC.

Termín: do 30-ti dnů od doručení schválení LHP příslušným krajským úřadem zhotoviteli

21. Textová část pro LHC v digitální a analogové podobě vytištěná ve čtyřech vyhotoveních (Ředitelství LČR, Krajské ředitelství LČR, LS (LZ) LČR, schvalující orgán státní správy).

Termín: do 30-ti dnů od doručení schválení LHP příslušným krajským úřadem zhotoviteli

22. Zkrácená textová část po revírech (polesích) v analogové podobě.

Termín: do 30-ti dnů od doručení schválení LHP příslušným krajským úřadem zhotoviteli

23. Specialisty HÚL a specialisty DZ LHP zkontrolovaná a odsouhlasená kompletní data LHP (včetně PLT) po schválení orgánem státní správy lesů dle ZP 2018 – 5. Etapa - komplet. V případě změny dat provedené na základě požadavku orgánu státní správy lesů v průběhu schvalování LHP bude součástí komentář k provedeným změnám.

Termín: do 60-ti dnů od doručení schválení LHP příslušným krajským úřadem zhotoviteli

24. Finální tisky map dle specifikace v ZP 2018 a v Katalogu výstupů LHP 2018

Termín: do 90-ti dnů od předání podkladů dle odst. 4.1. bodu 36. smlouvy, nejpozději do 30. 11. 2018

6.3. Upřesňující podmínky

1. Změna digitálních dat předaných objednateli dle odst. 6.2 bodu 18. smlouvy je možná pouze v případě změny dat požadované orgánem státní správy lesů v průběhu schvalování LHP.
2. Další technické upřesnění je obsahem ZP 2018.
3. Zjistí-li zhotovitel při plnění předmětu této smlouvy skryté překážky, které mu znemožňují plnění předmětu smlouvy dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli a navrhnout mu odpovídající řešení, které umožní řádné splnění předmětu díla.

Článek 7

Oprávněné, kontaktní osoby

1. Ve věcech plnění předmětu této smlouvy jsou za zhotovitele oprávněni k jednání:
po stránce smluvní: [REDACTED]
po stránce technické: [REDACTED]

Jméno a příjmení	Funkce	Adresa	Telefon	e-mail
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

	představenství	Frýdek-Místek		
	Vedoucí projektant			

2. Ve věcech plnění předmětu této smlouvy jsou za objednatele oprávněni k jednání:
 po stránce smluvní: [redacted]
 po stránce technické: [redacted]

Jméno a příjmení	Funkce	Adresa	Telefon	e-mail
[redacted]	Ved. odb. HÚL	Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 500 08 Hradec Králové	[redacted]	[redacted]
Ing. [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted] @lesy-cr.cz
[redacted]	Spec DZ LHP	Kopeček Láň 2461, 75661, Rožnov pod Radhoštěm	[redacted]	[redacted]

Článek 8

Podklady poskytnuté zhotoviteli

- Zhotovitel si je vědom toho, že mu objednatel v rámci plnění smlouvy poskytne materiály v digitální nebo analogové formě:
 - 1.1. které jsou vlastnictvím třetích osob a podléhají ochraně dle autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb.),
 - 1.2. které jsou vlastnictvím objednatele, obsahují důvěrné informace, a které jsou nebo by mohly být součástí obchodního tajemství objednatele.
- Předané materiály mohou sloužit výhradně pro plnění předmětu této smlouvy, tj. například, ale nejenom:
 - 2.1. pro zpřesnění majetkové držby (tj. upřesnění identifikace majetku, se kterým má objednatel právo hospodařit),
 - 2.2. pro zpřesnění lesnických map, hraničních linií jednotek základního lesnického rozdělení (cesty, průseky, vodoteče), nižších jednotek lesnického detailu (např. nově vzniklé holiny a 1. věkový stupeň lesa, jednotlivé porostní skupiny),
 - 2.3. pro popis lesních porostů,
 - 2.4. pro identifikaci veřejných zájmů v oblasti ochrany přírody.
- Zhotovitel nesmí bez předchozího souhlasu objednatele data a údaje, které mu byly poskytnuty objednatelem, půjčovat či jakkoliv jinak zpřístupňovat třetím subjektům, kopírovat nebo reprodukovat pro jiné účely než jsou definované touto smlouvou.
- Žádná část díla ani poskytnutých podkladů nesmí být žádným způsobem zhotovitelem použita pro jiné dílo, které by nevznikalo podle této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- Žádná část díla ani poskytnutých podkladů nesmí být žádným způsobem zhotovitelem poskytnuta třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- S podklady poskytnutými AOPK ČR je možné disponovat pouze za podmínek stanovených AOPK ČR při jejich poskytnutí.
- Na všech výstupech a rozmnoženinách, pro které použije zhotovitel jako podklad materiály zpracované třetími subjekty – Ministerstvem zemědělství, Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním, Ministerstvem zdravotnictví, ÚHUL Brandýs nad Labem nebo jinou osobou musí být uveden jejich původ, nestanoví-li objednatel jinak.
- Po kompletním převzetí díla objednatelem nebo při ukončení platnosti a účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu je zhotovitel povinen vrátit objednateli veškeré nespotřebované poskytnuté analogové podklady a všechny poskytnuté nosiče s podklady digitálními a zároveň je zhotovitel povinen zajistit vymazání všech digitálních podkladů ze všech paměťových medií výpočetní

1. techniky svojí a všech subdodavatelů, s výjimkou jedné kopie dat pro účely archivace, která může být užitá výhradně pro potřebu objednatele, a to na jeho žádost anebo s jeho písemným souhlasem.
9. Zhotovitel zabezpečí takový režim práce s daty a údaji, aby výše uvedené podmínky byly dodrženy.

Článek 9

Ochrana informací

1. Předávající strana zůstává výlučným nositelem práv k veškerým důvěrným informacím a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace, zejména bude o nich zachovávat mlčenlivost a zajistí, aby ji ve stejném rozsahu zachovávaly i jiné osoby, kterým tyto informace poskytne v souladu s touto smlouvou. S výjimkou plnění této smlouvy se obě strany zavazují neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohla být smlouva splněna. V případě plnění této smlouvy se smluvní strany zavazují činit tak vždy jen v nezbytně nutném rozsahu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy.
2. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například, ale nejenom popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovníprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu, nebo jejichž zveřejnění předávající strana výslovně zakázala. Tím není dotčeno ustanovení § 66 odst. 4-5 autorského zákona.
3. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které se staly oprávněně veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím přijímající strana.
4. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením platnosti a účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu.

Článek 10

Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za vyhotovení LHP zhotovitelem byla stanovena dohodou, jako cena nejvýše přípustná, ve výši **537 Kč bez DPH** (slovy **Pětsetřicetšedem korun českých**) **za každý 1 ha LHP zpracovávaného na základě této smlouvy.**
2. **Předběžná celková cena** za dílo (dále jen „**Předběžná cena díla**“) při předběžné ploše všech zpracovávaných LHP **9 416 ha** (viz údaj uvedený v Článku 3 odst. 2. této smlouvy) činí **5 056 392 Kč bez DPH** (slovy **Pětmilionůpadesátšesttisícřístadevadesát dva korun českých**). Tato cena je závazně členěna dle jednotlivých rozpočtových položek uvedených v příloze č. 3 této smlouvy – „Závazné rozpočtové členění ceny za dílo“.
3. K uvedeným cenám bude připočtena DPH ve výši stanovené dle zvláštního právního předpisu.
4. Smluvní strany sjednávají, že jednotková cena za vyhotovení LHP (cena za každý 1 ha LHP), sjednaná v odst. 1 tohoto Článku smlouvy je cenou finální (maximálně přípustnou), tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (včetně úplaty za poskytnutí licence dle čl. 12 smlouvy), přičemž její překročení není možné.
5. **Skutečná celková cena**, která bude zhotovitel uhrazena za realizaci díla dle této smlouvy (dále jen „**Skutečná cena díla**“), bude stanovena jako násobek ceny za 1 ha sjednané shora v odst. 1 tohoto Článku smlouvy a skutečně zjištěné plochy LHC uvedené v plochové tabulce všech zpracovávaných LHP, včetně ploch ostatních pozemků mimo PUPFL.

6. Smluvní strany sjednávají, že objednatel bude zhotoviteli hradit cenu díla dle této smlouvy postupně, a to v následujících splátkách:
- a) V roce 2017 bude zhotoviteli uhrazeno 75 % z Předběžné ceny díla dle odst. 2. tohoto Článku smlouvy, a to v následujících dílčích platbách:
- 5 % z Předběžné ceny díla bude zhotoviteli uhrazeno po předání výstupů dle odst. 6.2. bodu 2. této smlouvy,
 - 10 % z Předběžné ceny díla bude zhotoviteli uhrazeno po předání výstupů dle odst. 6.2. bodu 5. této smlouvy,
 - 5 % z Předběžné ceny díla bude zhotoviteli uhrazeno po předání výstupů dle odst. 6.2. bodu 6. této smlouvy
 - 20 % z Předběžné ceny díla bude zhotoviteli uhrazeno po předání výstupů dle odst. 6.2. bodu 7. této smlouvy,
 - 20 % z Předběžné ceny díla bude zhotoviteli uhrazeno po předání výstupů dle odst. 6.2. bodu 8. této smlouvy,
 - 5% z Předběžné ceny díla bude zhotoviteli uhrazeno po předání výstupů dle odst. 6.2. bodu 10. této smlouvy
 - 10 % z Předběžné ceny díla bude zhotoviteli uhrazeno po předání výstupů dle odst. 6.2. bodu 12. této smlouvy.
- Podmínkou fakturace je vždy řádné předání všech výstupů dle příslušného bodu odst. 6.2. smlouvy předcházejících termínově výše uvedený mílník. Faktury na shora uvedené platby budou zhotovitelem vystaveny vždy bez zbytečného odkladu po dosažení/splnění příslušného mílníku dle odst. 6.2. této smlouvy
- b) V roce 2018 bude provedeno vyrovnání fakturace na Skutečnou cenu díla stanovenou dle odst. 5 tohoto Článku smlouvy, při které budou zohledněny platby provedené objednatelem v roce 2017 dle písm. a) shora, přičemž zhotovitel bude oprávněn objednateli vyfakturovat takovou částku (část dosud neuhrazené Skutečné ceny díla), aby na poslední fakturaci dle písm. c) níže zbývala částka odpovídající 10 % Skutečné ceny díla. Fakturu na tuto platbu vystaví zhotovitel bez zbytečného odkladu po splnění náležitostí dle odst. 6.2. bodu 18. této smlouvy.
- c) Po skončení realizace díla dle této smlouvy, tj. poté co objednatel převezme veškeré součásti díla schváleného orgánem státní správy lesů, resp. zhotovitel odstraní všechny jeho případné závady, bude zhotoviteli uhrazena zbývající část ceny díla (ve výši odpovídající 10 % Skutečné ceny díla). Fakturu na tuto platbu vystaví zhotovitel bez zbytečného odkladu po splnění shora uvedené podmínky pro vznik práva na fakturaci této platby.
7. Nedílnou součástí každé faktury bude předávací protokol podepsaný odpovědným zástupcem objednatele (specialistou HÚL, lesním správcem nebo ředitelem LZ) obsahující popis výstupů dle odst. 6.2. smlouvy předaných zhotovitelem ke dni vystavení faktury. Faktury budou mít splatnost 21 dní ode dne jejich doručení objednateli. Faktury je zhotovitel povinen doručit na adresu dotčené organizační jednotky objednatele uvedené v článku 3. odst. 1. této smlouvy. Faktury budou vždy vyhotovovány a zasílány včetně kopie. Faktury budou vždy obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí či nebude splňovat jiný požadavek stanovený touto smlouvou (zejména nebude-li k ní připojen předávací protokol dle věty první), nelze takovou fakturu považovat za řádně vystavenou a objednatel je oprávněn vrátit takovou fakturu zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovém případě neběží, přičemž nová lhůta splatnosti počíná běžet až od doručení opravené či doplněné faktury.
8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto písemně informovat objednatele.
9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Zhotovitel obdrží pouze cenu bez DPH

Článek 11

Majetkové vyrovnání s církvemi

11.1. Východiska a dohoda

1. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění této smlouvy může být ovlivněno vydáním majetku (zejména lesních a jiných pozemků), ve vztahu ke kterému má být zpracován LHP dle této smlouvy, církvím či náboženskými společnostmi na základě zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na tuto skutečnost smluvní strany sjednávají následující podmínky.
2. V případě, že dojde k vydání majetku podle bodu 1. tohoto odstavce smlouvy a objednatel se rozhodne, že v důsledku této skutečnosti nemá zájem na dokončení zpracování LHP v původně plánované výměře (viz čl. 3 odst. 2. této smlouvy), zavazují se smluvní strany uzavřít dohodu, kterou bude provedena úprava této smlouvy v souvislosti s vydáním majetku (dále jen „Dohoda“).
3. Dohodou bude snížena výměra LHC, pro který je zpracováván LHP, a to o plochu vydávaného/vydaného majetku. Současně bude provedeno odpovídající finanční vyrovnání, resp. odpovídající úprava ceny za dílo, a to s ohledem na skutečnost, že dílo bude nadále realizováno pouze v omezeném rozsahu. Bude-li to objektivně nutné, budou Dohodou rovněž nově upraveny povinnosti dle článku 6 odst. 6.1. této smlouvy.
4. Dohoda bude uzavřena na základě předchozí písemné výzvy objednatele adresované zhotoviteli, jejíž součástí bude návrh na provedení úprav této smlouvy a souvisejícího finančního vyrovnání odpovídající principům uvedeným v tomto článku smlouvy. Tato dohoda bude uzavřena bezodkladně po doručení výzvy objednatele dle předchozí věty zhotoviteli.

11.2. Úprava ceny za dílo a finanční vyrovnání

1. Úprava ceny za dílo, resp. finanční vyrovnání budou provedeny dle následujících pravidel:
2. Bude-li Dohoda uzavřena před splněním posledního z milníků uvedených v Článku 10 odst. 6. písm. a) této smlouvy, bude se postupovat dle bodů 4. až 8. odstavce 11.2. této smlouvy, přičemž **rozhodným okamžikem** pro úpravu ceny za dílo bude den splnění/dosažení milníku uvedeného v Článku 10 odst. 6. písm. a) této smlouvy bezprostředně následujícího po dni uzavření Dohody.
3. Případné vydání majetku až po dosažení posledního milníku uvedeného v Článku 10 odst. 6. písm. a) této smlouvy již nebude mít na cenu za dílo vliv.
4. Cena prací provedených podle této smlouvy do rozhodného okamžiku bude stanovena a zaplácena z částky odpovídající Předběžné ceně díla uvedené v Článku 10. odst. 2. této smlouvy a uzavřením Dohody nebude jakkoliv dotčena.
5. Cena za dílo, resp. Předběžná cena díla po rozhodném okamžiku bude stanovena jako součin ceny za každý 1 ha LHP zpracovávaného na základě této smlouvy, uvedené v Článku 10 odst. 1. této smlouvy, a plochy LHC zmenšené o výměru vydaného majetku, uvedenou v Dohodě dle odst. 11.1. bod 2. této smlouvy (dále jen „**Upravená předběžná cena díla**“).
6. Cena prací provedených podle této smlouvy po rozhodném okamžiku bude placena v souladu s článkem 10 odst. 6. této smlouvy, přičemž příslušné zbývající splátky podle článku 10 odst. 6. písm. a) této smlouvy budou stanoveny z Upravené předběžné ceny díla.
7. Vyrovnání fakturace na Skutečnou cenu díla dle Článku 10. odst. 6. písm. b) této smlouvy bude provedeno tak, že základem pro splátku podle článku 10 odst. 6. písm. b) této smlouvy bude Skutečná cena díla (tj. cena stanovená na základě skutečně zjištěné plochy LHC po vydání majetku uvedené v plochové tabulce LHP – viz článek 10 odst. 5 smlouvy) snížená o procentuální hodnotu odpovídající již zaplaceným splátkám z Předběžné ceny díla [tato procentuální hodnota tedy může nabývat pouze hodnot odpovídajících hodnotám zaplacených splátek dle Článku 10. odst. 6. písm. a) této smlouvy, resp. jejich součtu, tedy 5 nebo 15 (tj. 5+10) nebo 20 (tj. 5+10+5) nebo 40 (tj. 5+10+5+20) nebo 60 (tj. 5+10+5+20+20) nebo 65 (tj. 5+10+5+20+20+5) nebo 75 (5+10+5+20+20+5+10)]. Od základu vypočteného dle předchozí věty bude odečtena částka, která byla případně zaplácena z Upravené předběžné ceny díla v souladu s Článkem 10. odst. 6. písm. a), resp. bodem 6 odstavce 11.2. této smlouvy a dále částka ve výši 10 % ze Skutečné ceny díla

(která bude zaplácena v rámci splátky podle dle Článku 10. odst. 6. písm. c) této smlouvy). Takto stanovená částka bude představovat splátku podle Článku 10. odst. 6. písm. b) této smlouvy.

8. V případě, že by částka podle bodu 7. odstavce 11.2. této smlouvy byla záporná, nebude zhotovitel splátka podle článku 10 odst. 6. písm. b) této smlouvy hrazena, přičemž o tuto částku, vyjádřenou v kladném čísle, bude snížena splátka podle článku 10 odst. 6. písm. c) této smlouvy.

11.3. Spolupráce, informační povinnost, minimalizace nákladů

1. Vzhledem k zásadnímu vlivu případného vydání majetku na plnění této smlouvy se smluvní strany za účelem minimalizace vícenákladů s tím spojených zavazují ve zvýšené míře spolupracovat, poskytovat si v maximální možné míře vzájemnou součinnost a vzájemně si v co nejkratších možných termínech poskytovat aktuální informace, kterými budou disponovat, a to zejména informace o stavu, průběhu a předpokládaném vývoji vydávání majetku, jakož i o stavu plnění této smlouvy, a to právě v návaznosti a s ohledem na případné vydání majetku, kterým může být plnění této smlouvy dotčeno.
2. Zhotovitel se zavazuje, při dodržení povinností vyplývajících z této smlouvy, v maximální možné míře minimalizovat rozsah případných víceprací a s nimi spojených vícenákladů, vzniklých z důvodu vydání majetku po tzv. „stop stavu“ pozemkové evidence (viz odst. 4.1. bod 30. této smlouvy), a to zejména formou vhodné organizace prací prováděné v úzké součinnosti s objednatelem (např. odložení venkovního šetření na majetku potenciálně dotčeném vydáním církví či náboženské společnosti). Zhotovitel je v této souvislosti zejména povinen plnit tuto smlouvu průběžně v souladu s mřížkou uvedenými v odst. 6.2. této smlouvy, tj. neprovádět záměrně některé činnosti v předstihu za tím účelem, aby cena za jejich provedení byla hrazena z částky stanovené na základě výměry plochy LHC před vydáním majetku. Smluvní strany berou na vědomí, že vícepráce, jejichž provedení bylo objektivně možno předejít, nemohou být uznány (zadány a propláceny) jako oprávněné vícepráce.

Článek 12

Licenční ujednání

1. Pro případ, že v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy bude zhotovitelem objednateli předána jakákoliv dokumentace, a to zejména dokumenty tvořící předmět díla (v digitální i analogové formě), která bude mít charakter autorského díla (dále jen „autorské dílo“) ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), zhotovitel prohlašuje, že bude nositelem autorských práv k takovému předávanému autorskému dílu, že bude oprávněn s tímto autorským dílem disponovat v rozsahu sjednaném v této smlouvě a že toto autorské dílo bude nedotčeno právy jiných osob. Zhotovitel se dále pro případ, že bude předáváno autorské dílo vytvořené třetí osobou, zavazuje, že zajistí souhlas autora k poskytnutí práva objednateli k užívání autorského díla v rozsahu uvedeném v této smlouvě, příp. v rozsahu nezbytném pro řádné užívání předmětu díla (a to zejména formou licence či sublicence dle autorského zákona).
2. Zhotovitel na základě této smlouvy poskytuje objednateli právo užívat jakékoliv autorské dílo předané na základě této smlouvy bez časového a místního omezení, a to k jakýmkoliv účelům.
3. Objednatel je oprávněn do předaného autorského díla zasahovat a upravovat si je pro své vlastní potřeby, a to i bez předchozího souhlasu zhotovitele, přičemž je oprávněn provést tyto zásahy sám, nebo si je nechat provést třetí osobou.
4. Práva k užívání autorského díla specifikovaná shora v tomto Článku smlouvy jsou zhotovitelem objednateli poskytována jako práva výhradní ve smyslu ustanovení § 2360 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel je oprávněn práva na užití autorského díla specifikovaná shora v tomto Článku smlouvy postoupit zcela nebo z části na třetí osoby, a to i za úplatu.
6. Smluvní strany sjednávají, že úplata za poskytnutí licence dle tohoto Článku smlouvy je součástí ceny díla sjednané v Článku 10 této smlouvy (příp. upravené v souvislosti s vydáním majetku dle článku 11. této smlouvy), přičemž současně sjednávají, že tato úplata je adekvátní s ohledem na účel licence, způsob a okolnosti užití autorských děl, jakož i s ohledem na územní, časový

a množstevní rozsah licence. Zhotovitel za poskytnutí licence dle tohoto Článku smlouvy nemá nárok na jakoukoliv jinou či další platbu.

Článek 13

Odpovědnost za škodu, smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené porušením jeho povinností. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli zejména případnou škodu spočívající v povinnosti objednatele platit pokutu uloženou orgánem státní správy lesů či jinými státními orgány z důvodu, že LHP zpracovaný zhotovitelem na základě této smlouvy nebyl zpracován řádně a/nebo včas, škodu vzniklou v souvislosti s uložením jiných sankcí z důvodu, že LHP zpracovaný zhotovitelem na základě této smlouvy nebyl zpracován řádně a/nebo včas, jakož i jakoukoliv jinou škodu vzniklou následkem neschválení LHP zpracovaného zhotovitelem na základě této smlouvy příslušným orgánem státní správy lesů z důvodů jakýchkoliv vad či chyb tohoto LHP.
2. V případě prodlení zhotovitele s předáním některého z výstupů díla dle odst. 6.2. smlouvy objednateli, trvajících více než 1 pracovní den je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Předběžné ceny díla, a to za každý byť i započatý den prodlení a za každý případ porušení takovéto povinnosti.
3. V případě, že závady na díle realizovaném zhotovitelem dle této smlouvy, resp. jeho části, zjištěné a vytknuté objednatelem dle Článku 5 smlouvy, nebudou zhotovitelem odstraněny v termínu a způsobem stanoveným dle Článku 5 smlouvy, přičemž toto prodlení zhotovitele bude delší než 1 pracovní den, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Předběžné ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení (až do řádného a úplného odstranění závady) a za každý případ porušení takovéto povinnosti.
4. V případě, že nárok na smluvní pokutu dle odst. 2 a 3 tohoto Článku smlouvy vznikne po rozhodném okamžiku dle odst. 11.2. bodu 2. této smlouvy, bude výše smluvní pokuty stanovena z Upravené předběžné ceny díla.
5. V případě, že bude opakovaně zjištěn stejný typ závady na zhotovovaném díle, která již byla dříve vytknuta, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý případ opakovaného výskytu již dříve vytknuté závady.
6. Smluvní pokuty dle odst. 2, 3 a 5 tohoto článku smlouvy jsou splatné do 21 dnů od doručení písemného oznámení o uplatnění smluvní pokuty (výzvy k úhradě) zhotoviteli.
7. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoli povinnost stanovenou v Článku 8 této smlouvy, resp. v případě, že některá ze smluvních stran poruší kteroukoli povinnost stanovenou v Článku 9 této smlouvy, je smluvní strana, která porušila takovou povinnost, povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), a to za každý jednotlivý případ. Tato smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě této smluvní pokuty povinné smluvní straně.
8. Pro jeden případ porušení povinností stanovených smlouvou nelze kumulativně uplatnit více smluvních pokut. Objednatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu, která je stanovena za každý den prodlení, jen za dobu ode dne porušení příslušné povinnosti do dne, kdy došlo k jejímu splnění, nejpozději však do dne, kdy dojde k ukončení této smlouvy.
9. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, jakož i s ohledem na charakter plnění poskytovaného zhotovitelem na základě této smlouvy, považují smluvní pokuty uvedené v tomto Článku smlouvy za přiměřené.
10. Smluvní strany se dohodly, že vznik povinnosti uhradit smluvní pokutu, jakož ani případné uplatnění či zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvní pokutou, a to v plném rozsahu.
11. Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu ani jejím zaplacením nezaniká závazek smluvní strany splnit povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou.
12. Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu ani jejím zaplacením nezaniká právo smluvní strany odstoupit od smlouvy. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok oprávněné smluvní strany na smluvní pokutu, k jejímuž zaplacení již povinné straně vznikla povinnost.

13. Smluvní strana není povinna platit smluvní pokutu v případě, že porušení jejich povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (ve smyslu § 2913 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
14. V případě prodlení objednatele s placením faktur vystavených zhotovitelem dle Článku 10 smlouvy, či v případě prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním jiného peněžitého závazku vzniklého na základě této smlouvy, je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý byt i započatý den prodlení.

Článek 14

Trvání smlouvy

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření. Dnem uzavření smlouvy je den označený datem níže u podpisů smluvních stran. Pokud se data u podpisů smluvních stran liší, je dnem uzavření smlouvy den označený pozdějším datem.
2. Tato smlouva může být zrušena dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky zrušení smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni uzavření takovéto dohody.
3. Odstoupit od této smlouvy je možno z důvodů a za podmínek stanovených zákonem (zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), a to zejména v těchto případech:
 - 3.1. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, že:
 - objednatel ani po předchozím písemném upozornění neposkytuje potřebnou součinnost, kterou uvádí Článek 4 této smlouvy, nebo
 - objednatel ani po písemné urgenci nezaplatí v přiměřené zhotovitelem stanovené dodatečné lhůtě řádně vystavenou fakturu v plném rozsahu finančního plnění, jež je zhotovitel oprávněn požadovat.
 - 3.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že:
 - zhotovitel neumožní ani po písemné výzvě provádět kontrolu tak, jak uvádí Článek 5 této smlouvy,
 - zhotovitel neodstraní nedostatky z kontrol tak, jak určuje Článek 5 této smlouvy, ve stanovené lhůtě,
 - zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, resp. jeho jednotlivých částí/výstupů o více jak 30 dnů,
 - vůči majetku zhotovitele bude probíhat insolvenční řízení nebo bude insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo
 - zhotovitel vstoupí do likvidace.
 - 3.3. Dále může objednatel odstoupit od smlouvy v případě, že:
 - dílo nebude ani v dodatečném termínu schváleno orgánem státní správy lesů, a to z důvodů na straně zhotovitele.
4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy ani nároku na zaplacení smluvních pokut či úroku z prodlení.
5. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v Článku 14 odst. 3.1. a 3.2. smlouvy předloží zhotovitel objednateli dílo v odpovídajícím stupni rozpracovanosti a veškeré podklady. Zhotovitel má v takovém případě právo na část ceny za dílo v rozsahu odpovídajícím rozpracovanosti díla a jeho využitelnosti pro objednatele. Vyúčtování musí být odsouhlaseno oběma smluvními stranami. Obě smluvní strany se zavazují provést vyrovnání přeplatku nebo nedoplatku do jednoho měsíce od odsouhlasení vyúčtování.
6. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu uvedeného v Článku 14 odst. 3.3. smlouvy, nemá zhotovitel nárok na úhradu ceny díla dle této smlouvy, ani dosud vynaložených nákladů, přičemž veškeré platby přijaté od objednatele na základě této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli vrátit ve lhůtě 30 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.



Článek 15

Ostatní ujednání

1. Dílo bude zhotoveno v kvalitativní úrovni:
 - 1.1 vymezené technickými dokumenty, které jsou nedílnou součástí této smlouvy,
 - 1.2 odpovídající stavu předaných podkladů.
2. Zhotovitel je povinen plnit veškeré své povinnosti vyplývající z této smlouvy s odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a pokyny objednatele.
3. Bez ohledu na ostatní ustanovení této smlouvy je zhotovitel povinen zapracovat do prováděného díla nové poznatky a skutečnosti zjištěné v průběhu jeho provádění po sjednaných termínech předání jeho jednotlivých výstupů, a to až do předání řádně zhotoveného díla v jeho úplnosti objednateli. Další úpravy řádně zhotoveného a objednateli předaného díla jsou věcí dohody obou smluvních stran a budou případně řešeny dodatkem k této smlouvě.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku 2 roky (slovy: dva roky) ode dne jeho kompletního předání ve smyslu Článku 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit vady díla, resp. jeho části, zjištěné v průběhu záruční doby, a to v přiměřené lhůtě stanovené mu k tomu objednatelem. Neučiní-li tak, je objednatel oprávněn nechat zjištěné a zhotoviteli oznámené vady odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu případně vzniklé škody. Vadou díla není změna údaje LHP podléhajícího vývoji po řádném zhotovení díla a jeho předání objednateli dle této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje do určeného termínu bezplatně odstranit závady, které objednatel zjistí při kontrole práce zhotovitele. Neučiní-li tak, je objednatel oprávněn zadat odstranění závad jinému subjektu na náklady zhotovitele. Tím není dotčeno právo objednatele požadovat zaplacení smluvní pokuty.
6. Smluvní strany souhlasí s tím, že veškeré spory z této smlouvy budou řešit především vzájemnou dohodou. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit smírně, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem, ve znění pozdějších předpisů.
7. Veškeré práce budou zhotovitelem prováděny na jeho nebezpečí.
8. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, nedodržením nebo porušením jakékoliv povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy.
9. Zhotovitel je oprávněn plnit povinnosti dle této smlouvy prostřednictvím subdodavatele či subdodavatelů. Zhotovitel je v takovém případě povinen zajistit, aby takový subdodavatel či subdodavatelé dodržovali veškeré povinnosti, k nimž se zhotovitel zavázal touto smlouvou, zejména povinnosti stanovené v Článku 8 a 9 smlouvy; za porušení těchto povinností subdodavatelem odpovídá objednateli zhotovitel. Za řádné a včasné splnění smluvních závazků týkajících se realizace předmětu díla dle této smlouvy, jakož i za plnění dalších povinností vyplývajících ze smlouvy odpovídá objednateli zhotovitel, a to i tehdy, plní-li povinnosti dle této smlouvy prostřednictvím subdodavatele.
10. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými oprávněními a licencemi potřebnými k poskytování plnění dle této smlouvy, resp. že příslušnými oprávněními a licencemi disponuje subdodavatel zhotovitele, realizující příslušné plnění.
11. Zhotovitel dále prohlašuje, že svou činnost zajišťuje a bude zajišťovat v souladu s platnými právními předpisy a prostřednictvím zaměstnanců nebo třetích osob s potřebnými odbornými znalostmi a schopnostmi a odbornou způsobilostí. Oprávnění či licence budou platné a budou odpovídat skutečnosti po celou dobu trvání smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání této smlouvy sjednáno platné a účinné pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to minimálně tak, aby celkový limit pojistného plnění, resp. **celková pojistná částka**, ve smyslu ustanovení § 2813 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, činila **minimálně 5.000.000,- Kč**. Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu trvání smluvního vztahu předložit na předchozí žádost objednatele uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v tomto odstavci smlouvy.


Článek 16 Závěrečná ustanovení

1. Změny smlouvy včetně jejích příloh je možné provést pouze písemnou formou se souhlasem obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv změny této smlouvy mohou být činěny pouze při dodržení požadavků stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
2. Veškerá závažná sdělení vztahující se k předmětu této smlouvy se podávají písemnou formou na adresu druhé strany.
3. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné ujednání mezi smluvními stranami.
4. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane nebo ukáže být neplatným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy smlouvou výslovně neupravené se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel bude při plnění smlouvy postupovat v souladu s ust. § 147a Zákona o veřejných zakázkách. Objednatel uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je povinen dle ust. § 147a Zákona o veřejných zakázkách, tedy včetně smlouvy a všech jejích příloh, které jsou nedílnou součástí smlouvy, a to v termínech dle ust. § 147a Zákona o veřejných zakázkách.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této smlouvy připojují pověření zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
8. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto její přílohy:
Příloha č. 1 – Zadávací protokol 2018 (v elektronické podobě)
Příloha č. 2 – Katalog výstupů LHP 2018 (v elektronické podobě)
Příloha č. 3 – Závazné rozpočtové členění ceny za dílo
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech; po dvou pro každou smluvní stranu.

Za objednatele:	Za zhotovitele:
V Hradci Králové	Ve Frýdku-Místku
Datum: 12.1.2017	Datum: 10.1.2017
	 Lesnická projekce

Příloha č. 1 – Zadávací protokol 2018 (v elektronické podobě)

Příloha č. 2 – Katalog výstupů LHP 2018 (v elektronické podobě)

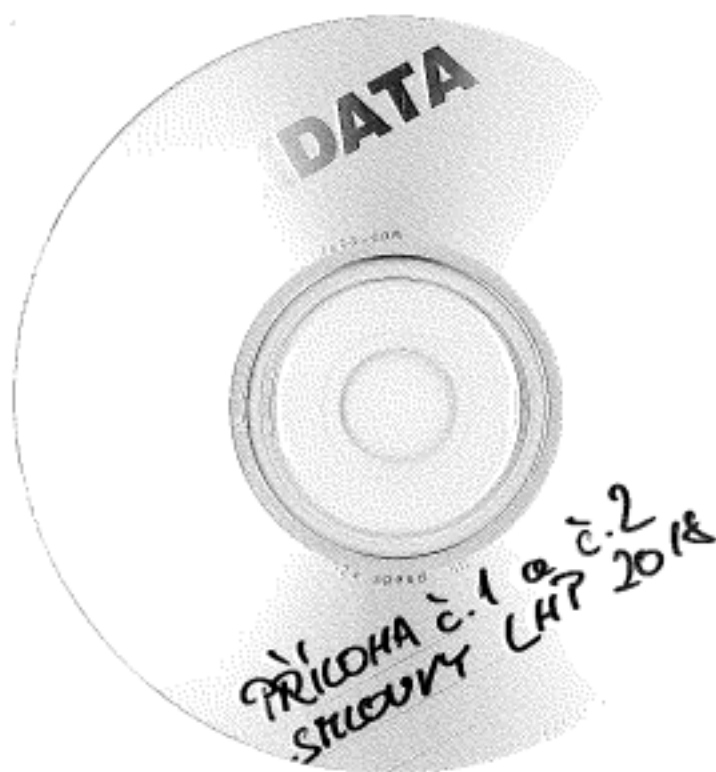

ZÁVAZNÉ ROZPOČTOVÉ ČLENĚNÍ CENY ZA DÍLO

NÁZEV ČÁSTI ZAKÁZKY:	Ostrava
PŘEDBĚŽNÝ PLOŠNÝ ROZSAH (ha)	9 416
POŽADOVANÝ ROZSAH RELASKOPOVÁNÍ (ha)	0
POŽADOVANÝ ROZSAH PRUMERKOVÁNÍ NAPLNO (ha)	250

SLOVNÍ POPIS SKUTEČNOSTÍ VÝZNAMNĚ OVLIVŇUJÍCÍCH PRACNOST VYHOTOVENÍ LHP

Zde upozorní uchazeč na skutečnosti, které odlišují vyhotovení LHP od běžného standardu a mají významný vliv na tvorbu rozpočtu.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU:

Podkladem pro zpracování rozpočtu jsou požadavky objednatele na vyhotovení LHP uvedené ve smlouvě o dílo. Požadavky na způsob vyhotovení, obsah a kvalitu výstupů definuje příloha č.1 smlouvy ZP 2018 a pro část kartografickou příloha č.2 smlouvy Katalog výstupů pro LHP 2018.

Na závěr rozpočtu uvede uchazeč přehledné sestavení všech kalkulovaných nákladů a celkový výsledek. Na závěr bude rozpočet podepsán oprávněnou osobou uchazeče.

1. VYHOTOVENÍ DIGITÁLNÍ POZEMKOVÉ MAPY

Obsah: Zahrnuje veškeré náklady potřebné k vyhotovení digitální pozemkové mapy, včetně vytištění prozatímní pozemkové mapy a zapracování všech připomínek objednatele, tvorbu skupin parcel pro vyrovnání.

Náklady celkem (Kč bez DPH)	135 000
-----------------------------	---------

2. VYHOTOVENÍ ZÁKLADNÍ LESNICKÉ MAPY, PŘÍPRAVA VŠECH PODKLADŮ NEZBYTNÝCH PRO ZAHÁJENÍ VENKOVNÍCH PRACÍ

Obsah: Zahrnuje veškeré činnosti spojené s tvorbou základního rozdělení, včetně zajištění požadované přesnosti základního rozdělení, dále všechny činnosti spojené se základním šetřením a činnosti spojené s přípravou podkladů pro venkovní šetření.

Náklady celkem (Kč bez DPH)	230 000
-----------------------------	---------

3. VENKOVNÍ ZAŘIZOVACÍ PRÁCE

Obsah: Zahrnuje veškeré náklady spojené s činnosti taxátorů při venkovním šetření dle technologie uplatněné uchazečem.

Uchazeč popíše rozsah činností, které vyžaduje od taxátorů v rámci venkovního šetření

Kalkulovaná norma na venkovní zařízení (ha/člověkoden)	13
--	----

Náklady celkem (Kč bez DPH)	2 791 000
-----------------------------	-----------

4. ZJIŠŤOVÁNÍ ZÁSOB RELASKOPICKOU METODOU

Obsah: Zahrnuje veškeré náklady spojené se zjišťováním zásob relaskopickou metodou dle plošného rozsahu požadovaného objednatelem.

Kalkulovaná norma na relaskopování (ha/člověkoden)	0
--	---

Náklady celkem (Kč bez DPH)	0
-----------------------------	---

5. ZJIŠŤOVÁNÍ ZÁSOB POMOCÍ PRUMĚRKOVÁNÍ NAPLNO

Obsah: Zahrnuje veškeré náklady spojené se zjišťováním zásob metodou průměrkování naplno dle plošného rozsahu požadovaného objednatelem.

Kalkulovaná norma na průměrkování naplno (ha/člověkoden)	2
--	---

Náklady celkem (Kč bez DPH)	225 000
-----------------------------	---------

6. FINALIZACE LHP, KROMĚ TIŠTĚNÝCH VÝSTUPŮ

Obsah: Zahrnuje veškeré náklady spojené s kancelářským dokončením LHP po ukončení venkovních prací, včetně přípravě návrhu LHP ke schválení OSSL, včetně předání kompletních dat LHP (včetně PLT) - etapa 5 a včetně všech podkladů potřebných pro schválení LHP.

Náklady celkem (Kč bez DPH)	569 000
-----------------------------	---------

7. TISK FINÁLNÍCH ALFANUMERICKÝCH A MAPOVÝCH VÝSTUPŮ

Obsah: Zahrnuje veškeré náklady na vytištění všech požadovaných finálních alfanumerických a mapových výstupů.

Náklady celkem (Kč bez DPH)	437 500
-----------------------------	---------

8. REŽIE A DALŠÍ SPOLEČNÉ NÁKLADY

Obsah: V této části budou zahrnuty režie a další blíže nespecifikované náklady, neuvedené v předchozích položkách.

Energie a nájem za kancelářské prostory, leasing, licenční poplatky a upgrade SW, odpisy, investice, pracovní pomůcky, taxační vybavení, pojištění (odpovědnosti, vybavení, vozidel), právní a ekonomické poradenství, účetní práce, audity a revize dle ISO, marketing a reklama, telekomunikace.

Náklady celkem (Kč bez DPH)	668 892
-----------------------------	---------

Předběžná celková cena (Kč bez DPH)	5 056 392
-------------------------------------	-----------

Jednotková nabídková cena (Kč bez DPH / 1 ha)	537,00
---	--------


Přehledné sestavení všech požadovaných nákladů a celkový výsledek

1. Vyhotovení DPM	135 000
2. ZLM, základní šetření, podklady pro venkovní šetření	230 000
3. Venkovní šetření	2 791 000
4. Relaskopování	0
5. Průměrkování naplno	225 000
6. Finalizace LHP	569 000
7. Finální tisky	437 500
8. Režie a další	668 892
Předběžná celková cena	5 056 392

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

V *Fryšbátu - Místku*

Dne *10.7.2014*



P
