

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 3 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE

DÍL 3, ČÁST 1 TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Název zakázky: D11 Oprava AB vozovky Exit 39
Číslo: 01PU-002490

Nedílnou součástí tohoto Dílu 3, části 1 zadávací dokumentace jsou následující Technické kvalitativní podmínky („TKP“):

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Kapitola 1 TKP

Všeobecně

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1

ze dne 6.8.2007 s účinností od 1. září 2007,

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK, č.j. 23299/98-120 ze dne 30. 6. 1998

a její přílohy č. 9 schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120

ze dne 21.2.2000.

Praha květen 2007

Kapitola 2 TKP

Příprava staveniště

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1

ze dne 20.4.2007, s účinností od 1. května 2007

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK, č.j. 23299/98-120

ze dne 30.6.1998

Praha 2006

Kapitola 3 TKP

Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1

ze dne 23.3.2009 s účinností od 1.4.2009

se současným zrušením znění této kapitoly TKP

schválené MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/1

ze dne 15.12.2003.

Praha, prosinec 2008

Kapitola 4 TKP

Zemní práce

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/1

ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č. j. 474/053-120-RS/1
Praha, prosinec 2009

Kapitola 5 TKP

Podkladní vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/2,
ze dne 21.1.2015 s účinností od 1.2.2015
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1
ze dne 12.3.2008
Praha, leden 2015

Kapitola 6 TKP

Cementobetonový kryt

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/3
ze dne 21.1.2015 s účinností od 1.2.2015
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OPK č.j. 440/06-120-RS/1 ze dne 3.8.2006
Praha, leden 2015

Kapitola 7 TKP

Hutněné asfaltové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1
ze dne 8.4.2008 s účinností od 1.5.2008
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120
ze dne 19.3.1999
Praha, duben 2008

Kapitola 8 TKP

Litý asfalt

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1
ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schválené MD-OPK, č.j. 619/03-120-RS/1
ze dne 15.12.2003
Praha, duben 2008

Kapitola 9 TKP

Kryty z dlažeb a dílců

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1
Ze dne 13.8.2010, s účinností od 1.9.2010
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1
ze dne 20.12.2002
Praha, srpen 2010

Kapitola 10 TKP

Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1
ze dne 13.8.2010 s účinností od 1.9.2010
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1
ze dne 20.12.2002
Praha, srpen 2010

Kapitola 11

Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/1
ze dne 8.3.2010 s účinností od 1.4.2010
se současným zrušením pátého znění této kapitoly
TKP schváleno MD-OPK č.j. 474/05-120-RS/1
ze dne 29.8.2005
Praha, leden 2010

Kapitola 12 TKP

Trvalé oplocení

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1

ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120
ze dne 21.2.2000
Praha, březen 2008

Kapitola 13 TKP **Vegetační úpravy**

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK, č.j. 440/06-120-R/1
ze dne 3.8.2006 s účinností od 1.9.2006
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 24610/97-120
ze dne 27.10.1997
Praha, srpen 2006

Kapitola 14 TKP **Dopravní značky a dopravní zařízení**

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/6, ze dne 27.3.2015,
s účinností od 1.4.2015 se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/2 ze dne 2.2.2015
Praha, březen 2015

Kapitola 15 TKP **Osvětlení pozemních komunikací**

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,
s účinností od 15.2.2015 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č.j. 341/07-910-IPK/1 ze dne 20.4.2007 a Dodatku č. 1
schváleného MD-OPK č.j. 49/2013-120-TN/1 ze dne 30.5.2013
Praha, únor 2015

Kapitola 16 TKP **Piloty a podzemní stěny**

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/1
ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1

ze dne 20.12.2002
Praha, prosinec 2010

Kapitola 18 TKP **Beton pro konstrukce**

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK č. j. 2/2016-120-TN/2
ze dne 12.1.2016 s účinností od 15.1.2016,
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č. j. 474/05-120-RS/1 ze dne 29.8.2005
Praha, leden 2016

Kapitola 19 TKP **ČÁST A - Ocelové mosty a konstrukce** **ČÁST B - Protikoroze ochrana ocelových mostů a konstrukcí**

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ČÁST A
Schváleno MD-OPK č.j. 37/2015-120-TN/3
ze dne 13.dubna 2015 s účinností od 23.4.2015,
se současným zrušením znění této kapitoly TKP, část A
schválené MDS-OI, č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12.3.2008
Praha, duben 2015

ČÁST B
Schváleno: MD-OPK, č. j. 107/2013-120-TN/1 ze dne 23. 12. 2013, s účinností od 1. 1. 2014,
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP schválené MD-OI, č. j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12. 3. 2008
Praha, prosinec 2013

Kapitola 20 TKP **Pylony a mostní závěsy**

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1
Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK, č.j. 17236/00-120
ze dne 21.2.2000
Praha, duben 2008

Kapitola 21 TKP

Izolace proti vodě

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/1

ze dne 8.3.2010, s účinností od 1.4.2010

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MD OPK č.j. 619/03-120-RS/1

ze dne 15.12.2003

Praha, leden 2010

Kapitola 22 TKP

Mostní ložiska

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD - OI, č.j. 653/07-910-IPK/1

ze dne 6. 8. 2007 s účinností od 1. září 2007

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120

ze dne 21. 2. 2000.

Praha, duben 2007

Kapitola 23 TKP

Mostní závěry

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI, č.j. 653/ 07/910-IPK/1

ze dne 6. 8. 2007, s účinností od 1. září 2007.

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120

ze dne 21. 2. 2000

Praha, květen 2007

Kapitola 24 TKP

Tunely

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1

ze dne 20. 4.2007 s účinností od 1. května 2007.

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP

schváleno MD-OPK, č.j. 19811/99-120

ze dne 19.3.1999

Praha, prosinec 2006

Kapitola 25 TKP

Protihlukové clony

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1

ze dne 23.3.2009, s účinností od 1.4.2009

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1

ze dne 20.12.2002

Praha, únor 2009

Kapitola 26 TKP

Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek

MINISTERSTVO DOPRAVY

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/4, ze dne 2.2.2015,

s účinností od 15.2.2015 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12.3.2008

Praha, únor 2015

Kapitola 27 TKP

Emulzní kalové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/5, ze dne 2.2.2015,

s účinností od 15.2.2015 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12.3.2008 a zrušením čtvrtého znění

kapitoly 28 TKP schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12.3.2008

Praha, únor 2015

Kapitola 29 TKP

Zvláštní zakládání

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/1

ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011

se současným zrušením znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/1

ze dne 15.12.2003

Praha, prosinec 2010

Kapitola 30 TKP

Speciální zemní konstrukce

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/1
ze dne 17.12.2009, s účinností od 1.1.2010
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 24610/97-120
Praha, prosinec 2009

Kapitola 31 TKP

Opravy betonových konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1
Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008
Se současným zrušením prvního znění této kapitoly TKP
Schváleného MDS-OPK, č.j. 198/11/99-120
Ze dne 19.3.1999
Praha, květen 2009

TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.

TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 3, ČÁST 2 ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Název zakázky: D11 Oprava AB vozovky Exit 39

Číslo: 01PU-002490

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 4 – SOUPIS PRACÍ

DÍL 4, ČÁST 1 SOUPIS PRACÍ V TIŠTĚNÉ FORMĚ

Název zakázky: D11 Oprava AB vozovky Exit 39

Číslo: 01PU-002490

1. Nedílnou součástí tohoto Dílu 4, části 1 zadávací dokumentace je soubor dokumentů označený:

H_Soupis_praci_bez_cen_nove.pdf

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 4, ČÁST 2 SOUPIS PRACÍ V ELEKTRONICKÉ FORMĚ (FORMÁT *.xc4)

Název zakázky: D11 Oprava AB vozovky Exit 39

Číslo: 01PU-002490

Nedílnou součástí tohoto Dílu 4, části 2 zadávací dokumentace je níže přiložený kompaktní disk (CD-R) označený (-) obsahující kompletní soupis prací všech částí stavby.

NEPOUŽÍJE SE!

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 5 – DOKUMENTACE STAVBY

Název zakázky: D11 Oprava AB vozovky Exit 39

Číslo: 01PU-002490

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

	A_01_Přehledná situace		20.7.2015 13:47	Adobe Acrobat D...	2 349 kB
	A_02_1_Kordinacni_Situace		21.8.2015 13:10	Adobe Acrobat D...	14 298 kB
	A_02_2_Kordinacni_Situace		21.8.2015 13:10	Adobe Acrobat D...	11 711 kB
	A_03.1_Geodetické_podklady_Technicka_zprava		17.7.2015 13:47	Adobe Acrobat D...	236 kB
	A_04_Bilance_zemních_prací		30.7.2015 14:59	Adobe Acrobat D...	287 kB
	A_05_01_Zasady_organizace_vystavby		30.7.2015 15:02	Adobe Acrobat D...	338 kB
	B_SO_110_04_VzorZmena022016		9.2.2016 11:35	Adobe Acrobat D...	1 260 kB
	B_SO110_01_TZZmena2016		9.2.2016 11:35	Adobe Acrobat D...	349 kB
	B_SO110_02_Situace		21.8.2015 14:12	Adobe Acrobat D...	14 446 kB
	B_SO110_03_01_podelnak_so110_vetev_a_dr_001		30.7.2015 17:50	Adobe Acrobat D...	908 kB
	B_SO110_03_02_podelnak_so110_vetev_b_dr_001		30.7.2015 17:50	Adobe Acrobat D...	905 kB
	B_SO110_05_Vykaz_vymer_nove		9.2.2016 11:35	Adobe Acrobat D...	286 kB
	B_SO111_01_TZ	21.8.2015 10:42	Adobe Acrobat D...	344 kB	
	B_SO111_02_Situace	21.8.2015 14:12	Adobe Acrobat D...	11 736 kB	
	B_SO111_03_01_podelnak_so111_vetev_c...	30.7.2015 17:49	Adobe Acrobat D...	886 kB	
	B_SO111_03_02_podelnak_so111_vetev_d...	30.7.2015 17:50	Adobe Acrobat D...	857 kB	
	B_SO111_04_Vzor	9.9.2015 10:19	Adobe Acrobat D...	1 223 kB	
	B_SO111_05_Vykaz_vymer	3.2.2016 15:26	Adobe Acrobat D...	288 kB	
	B_SO180_01_TZ	31.7.2015 8:28	Adobe Acrobat D...	2 147 kB	
	B_SO180_02_1_Situace D.I.O. MÚK Kluk - ...	30.7.2015 17:24	Adobe Acrobat D...	11 942 kB	
	B_SO180_02_2_Situace D.I.O. MÚK Kluk - ...	30.7.2015 17:24	Adobe Acrobat D...	11 950 kB	
	B_SO180_02_4_Situace D.I.O. MÚK Libice - ...	30.7.2015 17:24	Adobe Acrobat D...	9 298 kB	
	B_SO180_03_Vykaz_vymer	31.7.2015 13:16	Adobe Acrobat D...	285 kB	
	B_SO190_1_01_TZ	30.7.2015 17:00	Adobe Acrobat D...	285 kB	
	B_SO190_1_02_1_Situace	21.8.2015 14:12	Adobe Acrobat D...	1 447 kB	
	B_SO190_1_02_2_Situace	21.8.2015 14:12	Adobe Acrobat D...	1 156 kB	
	B_SO190_1_03_Vykaz_vymer	3.2.2016 15:26	Adobe Acrobat D...	275 kB	
	00_Rozpiska_D_11_MUK_Kluk	21.7.2015 12:45	Adobe Acrobat D...	1 808 kB	
	D11_exit39_Seznam_Priloh_SO	29.7.2015 16:12	Adobe Acrobat D...	59 kB	
	G_01_00_BOZP_rozpiska		21.7.2015 14:14	Adobe Acrobat D...	150 kB
	G_01_Projektová dokumentace D11 oprava AB vozovky Exit 39-BOZP		20.7.2015 10:43	Adobe Acrobat D...	452 kB
	G_02_Diagnostika vozovky - D11 Exit39		31.7.2015 9:55	Adobe Acrobat D...	1 388 kB
	00_D11_exit39_Seznam_Priloh_desky	30.7.2015 15:11	Adobe Acrobat D...	25 kB	
	d11_exit_39_bez_cen_nove	8.2.2016 14:02	Dokument ve for...	159 kB	
	d11_exit_39_oceněný_nove	8.2.2016 14:03	Dokument ve for...	159 kB	
	F_Doklady	27.8.2015 15:07	Adobe Acrobat D...	864 kB	
	H_Soupis_praci_bez_cen_nove	9.2.2016 11:35	Adobe Acrobat D...	395 kB	
	H_Soupis_praci_bez_cen_nove	8.2.2016 13:54	List aplikace Micr...	96 kB	
	H_Soupis_praci_oceneny_nove	9.2.2016 11:35	Adobe Acrobat D...	397 kB	
	H_Soupis_praci_oceneny_nove	8.2.2016 14:14	List aplikace Micr...	96 kB	

Soupis objektů

Stavba: 15-188.250 - Projektová dokumentace, D11 oprava AB vozovky Exit 39

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena [Kč]

Objekt	Popis	OC
SO 110	Oprava vozovky severních větví D11 MÚK Kluk	
SO 111	Oprava vozovky jižních větví D11 MÚK Kluk	
SO 180	Přechodné dopravní značení na dálnici/silnici I. třídy	
SO190.1	Definitivní dopravní značení D11 MÚK Kluk	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 15-188.250 Projektová dokumentace, D11 oprava AB vozovky Exit 39

Objekt: SO 110 Oprava vozovky severních větví D11 MÚK Kluk

Rozpočet: SO 110 Oprava vozovky severních větví D11 MÚK Kluk

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15-188.250 Projektová dokumentace, D11 oprava AB vozovky Exit 39
 Objekt: SO 110 Oprava vozovky severních větví D11 MÚK Kluk
 Rozpočet: SO 110 Oprava vozovky severních větví D11 MÚK Kluk

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- 0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU - drn z položky č. 12922				
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU - drn z položky č. 12931 a 12932				
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU - betonová suť z položky č. 966158 (odstranění bet. žlabu) - délka odměřena ze situace (CAD)				
4	014102	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU - betonová suť z položky č. 967118 (odstranění poškozených žlabovek - předpoklad 15% rozsahu) - POLOŽKA BUDE POUŽITA POUZE NA PŘÍMÝ PŘÍKAZ TDI A INVESTORA				
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
5	11372	1	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - frézování stávající vozovky na tl. 0,11m - u větve Hradec Králové - Nymburk frézování na tl. 0,05m - plocha odměřena ze situace (CAD) - frézing odkoupí zhotovitel na místě				
6	11372	2	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - POLOŽKA BUDE POUŽITA POUZE NA PŘÍMÝ PŘÍKAZ TDI A INVESTORA - frézování pro položku č. 577407 - Oprava podkladní vrstvy - předpoklad 10% plochy vozovky, o rozsahu rozhodne TDI při místním šetření - odborný odhad frézování na tl. 0,07m - frézing odkoupí zhotovitel na místě				
7	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM - skládkovné v položce 014102.1				
8	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15-188.250 Projektová dokumentace, D11 oprava AB vozovky Exit 39
 Objekt: SO 110 Oprava vozovky severních větví D11 MÚK Kluk
 Rozpočet: SO 110 Oprava vozovky severních větví D11 MÚK Kluk

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	12932	- čištění příkopů zpevněných žlabovkou - délka odměřena ze situace v CAD - skládkovné v položce 014102.2 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M				
10	129958	- čištění nezpevněných příkopů - délka odměřena ze situace (CAD) - skládkovné v položce 014102.2 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM				
11	17180	- pročištění zatrubněného sjezdu - délka změřena ze situace v CAD ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - zasypání děr po odstranění svodidla (pol. 9113A3)				
1	Zemní práce					
5	Komunikace					
12	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM - Krajnice budou zhutněny deskou				
13	572214	1 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 - rozsah viz. položky 574J54 a 574D68				
14	572214	2 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 - rozsah viz. položka č. 577407 - POLOŽKA BUDE POUŽITA POUZE NA PŘÍMÝ PŘÍKAZ TDI A INVESTORA - Oprava podkladní vrstvy - předpoklad 10% plochy vozovky, o rozsahu rozhodne TDI při místním šetření - odborný odhad				
15	574D68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM - ACP 22 S PmB 25/55-60 - ložná vrstva na větví A (Kolín - Praha) - tl. 70mm - plocha odměřena ze situace v CAD				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15-188.250 Projektová dokumentace, D11 oprava AB vozovky Exit 39
Objekt: SO 110 Oprava vozovky severních větví D11 MÚK Kluk
Rozpočet: SO 110 Oprava vozovky severních větví D11 MÚK Kluk

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16 574J54		ASFALTOVÝ KOBEC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM - SMA 11 S Pmb 45/80-60 - ohrusná vrstva na větví A - plocha odměřena ze situace v CAD				
17 574J64		ASFALTOVÝ KOBEC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 45MM - SMA 11 S Pmb 45/80-60 - ohrusná vrstva na větví B - plocha odměřena ze situace v CAD				
18 577407		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL MODIFIK - POLOŽKA BUDE POUŽITA POUZE NA PŘÍMÝ PŘÍKAZ TDI A INVESTORA - Oprava podkladní/ložné vrstvy - předpoklad 10% plochy vozovky, o rozsahu rozhodne TDI při místním šetření - odborný odhad - ACL 22 S Pmb 25/55-60				
19 58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM - odborný odhad - vyplnění spár z položky 919111 - výplň spár u opravy úzkých a širokých trhlin - POLOŽKA BUDE POUŽITA POUZE NA PŘÍMÝ PŘÍKAZ TDI A INVESTORA				
5	Komunikace					
8	Potrubí					
20 899123		MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ POLOŽKA BUDE POUŽITA POUZE NA PŘÍMÝ PŘÍKAZ TDI A INVESTORA. - výměna poškozených a náhrada chybějících mříží vpustí				
8	Potrubí					
9	Ostatní konstrukce a práce					
21 9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ - jednostranné ocelové svodidlo zadržení N2, , prac. š. W5 - včetně odrazek v pásnici dle TP 58				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15-188.250 Projektová dokumentace, D11 oprava AB vozovky Exit 39
Objekt: SO 110 Oprava vozovky severních větví D11 MÚK Kluk
Rozpočet: SO 110 Oprava vozovky severních větví D11 MÚK Kluk

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM - odstranění stávajícího jednostranného svodidla - délka odměřena ze situace v CAD - vč. odvozu na předepsané místo určené investorem (předpoklad do 20 km)				
23	9114B1		SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA / MONTÁŽ - úroveň zadržení min. H1, prac. š. W5 - konstrukční š. 0,566 m - včetně odrazek v pásnici dle TP 58				
24	9114B3		SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM - odstranění stávajícího oboustranného svodidla - délka odměřena ze situace v CAD - vč. odvozu na předepsané místo určené investorem (předpoklad do 20 km)				
25	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM - výplň spár u opravy úzkých a širokých trhlin - POLOŽKA BUDE POUŽITA POUZE NA PŘÍMÝ PŘÍKAZ TDI A INVESTORA - odborný odhad				
26	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TI 100MM - výměna poškozených kusů žlabovky po vyčištění zpevněného příkopu - předpokladaná výměra 15% z celkového množství - POLOŽKA BUDE POUŽITA POUZE NA PŘÍMÝ PŘÍKAZ TDI A INVESTORA				
27	93530		ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ - obnova žlabu Curb King - plocha v řezu 0,12m2 - délka odměřena ze situace (CAD)				
28	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM - odstranění stávajících odvodňovacích žlabů (CURB KING) - plocha z řezu 0,12m2 - délka odměřena ze situace (CAD) - včetně odvozu na skládku - skládkovné v položce 014102.3				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15-188.250 Projektová dokumentace, D11 oprava AB vozovky Exit 39
Objekt: SO 110 Oprava vozovky severních větví D11 MÚK Kluk
Rozpočet: SO 110 Oprava vozovky severních větví D11 MÚK Kluk

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29	967118		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM - odstranění poškozených žlabovek po vyčištění zpevněných příkopů - předpokladaná výměra 15% z celkového množství - POLOŽKA BUDE POUŽITA POUZE NA PŘÍMÝ PŘÍKAZ TDI A INVESTORA - plocha z řezu (včetně lože) - 0,148m2				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 15-188.250 Projektová dokumentace, D11 oprava AB vozovky Exit 39

Objekt: SO 111 Oprava vozovky jižních větví D11 MÚK Kluk

Rozpočet: SO 111 Oprava vozovky jižních větví D11 MÚK Kluk

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15-188.250 Projektová dokumentace, D11 oprava AB vozovky Exit 39
Objekt: SO 111 Oprava vozovky jižních větví D11 MÚK Kluk
Rozpočet: SO 111 Oprava vozovky jižních větví D11 MÚK Kluk

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU - drn z položky č. 12922				
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU - drn z položky č. 12931 a 12932				
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU - betonová suť z položky č. 966158 (odstranění bet. žlabu) - délka odměřena ze situace (CAD)				
4	014102	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU - betonová suť z položky č. 967118 (odstranění poškozených žlabovek - předpoklad 15% rozsahu) - POLOŽKA BUDE POUŽITA POUZE NA PŘÍMÝ PŘÍKAZ TDI A INVESTORA				
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
5	11372	1	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - frézování stávající vozovky na tl. 0,11m - plocha odměřena ze situace (CAD) - frézování odkoupí zhotovitel na místě				
6	11372	2	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - POLOŽKA BUDE POUŽITA POUZE NA PŘÍMÝ PŘÍKAZ TDI A INVESTORA - frézování pro položku č. 577407 - Oprava podkladní vrstvy - předpoklad 10% plochy vozovky, o rozsahu rozhodne TDI při místním šetření - odborný odhad frézování na tl. 0,07m - frézování odkoupí zhotovitel na místě				
7	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM - odkop pro sanaci vozovky ve vrcholu ostrůvku mezi větvemi C a D				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15-188.250 Projektová dokumentace, D11 oprava AB vozovky Exit 39
Objekt: SO 111 Oprava vozovky jižních větví D11 MÚK Kluk
Rozpočet: SO 111 Oprava vozovky jižních větví D11 MÚK Kluk

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM - skládkovné v položce 014102.1				
9	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M - čištění příkopů zpevněných žlabovkou - délka odměřena ze situace v CAD - skládkovné v položce 014102.2				
10	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M - čištění nezpevněných příkopů - délka odměřena ze situace (CAD) - skládkovné v položce 014102.2				
11	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM - pročištění zatrubněného sjezdu - délka změřena ze situace v CAD				
12	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - zasypání děr po odstranění svodidla (pol. 9113A3)				
1		Zemní práce					
5		Komunikace					
13	561441		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM - SC8/10 - sanace vozovky ve vrcholu ostrůvku mezi větví C a D - plocha odměřena ze situace				
14	56330	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI - ŠDa 0/32 - sanace vozovky ve vrcholu ostrůvku mezi větví C a D - plocha odměřena ze situace				
15	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM - Krajnice budou zhutněny deskou				
16	572214	1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 - rozsah viz. položky 574J54 a 574D68				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15-188.250 Projektová dokumentace, D11 oprava AB vozovky Exit 39
Objekt: SO 111 Oprava vozovky jižních větví D11 MÚK Kluk
Rozpočet: SO 111 Oprava vozovky jižních větví D11 MÚK Kluk

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17 572214	2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 - rozsah viz. položka č. 577407 - POLOŽKA BUDE POUŽITA POUZE NA PŘÍMÝ PŘÍKAZ TDI A INVESTORA - Oprava podkladní vrstvy - předpoklad 10% plochy vozovky, o rozsahu rozhodne TDI při místním šetření - odborný odhad				
18 574D68		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM - ACL 22 S PmB 25/55-60 - ložná vrstva tl. 70mm - plocha odměřena ze situace v CAD				
19 574F68		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 70MM - ACP 22 S PmB 25/55-60 - tl. 70mm - sanace vozovky ve vrcholu ostrůvku mezi větví C a D - plocha odměřena ze situace v CAD				
20 574J54		ASFALTOVÝ KOBREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM - SMA 11 s Pmb 45/80-60 - obrušná vrstva na větvích A a B - plocha odměřena ze situace v CAD				
21 577407		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL MODIFIK - POLOŽKA BUDE POUŽITA POUZE NA PŘÍMÝ PŘÍKAZ TDI A INVESTORA - Oprava podkladní vrstvy - předpoklad 10% plochy vozovky, o rozsahu rozhodne TDI při místním šetření - odborný odhad - ACL 22 S PmB 25/55-60				
22 58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM - odborný odhad - vyplnění spár z položky 919111 - výplň spár u opravy úzkých a širokých trhlin - POLOŽKA BUDE POUŽITA POUZE NA PŘÍMÝ PŘÍKAZ TDI A INVESTORA				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15-188.250 Projektová dokumentace, D11 oprava AB vozovky Exit 39
Objekt: SO 111 Oprava vozovky jižních větví D11 MÚK Kluk
Rozpočet: SO 111 Oprava vozovky jižních větví D11 MÚK Kluk

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	23 899123	Potrubí	MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ POLOŽKA BUDE POUŽITA POUZE NA PŘÍMÝ PŘÍKAZ TDI A INVESTORA. - výměna poškozených a náhrada chybějících mříží vpustí				
8		Potrubí					
9	24 9114B1	Ostatní konstrukce a práce	SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA / MONTÁŽ - úroveň zadržení min. H1, prac. š. W5 - konstrukční š. 0,566 m - včetně odrazek v pásnici dle TP 58				
	25 9114B3		SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM - odstranění stávajícího oboustranného svodidla - délka odměřena ze situace v CAD - vč. odvozu na předepsané místo určené investorem (předpoklad do 20 km)				
	26 919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM - výplň spár u opravy úzkých a širokých trhlin - POLOŽKA BUDE POUŽITA POUZE NA PŘÍMÝ PŘÍKAZ TDI A INVESTORA - odborný odhad				
	27 935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TI 100MM - výměna poškozených kusů žlabovky po vyčištění zpevněného příkopu - předpokladaná výměra 15% z celkového množství - POLOŽKA BUDE POUŽITA POUZE NA PŘÍMÝ PŘÍKAZ TDI A INVESTORA				
	28 93530		ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ - obnova žlabu Curb King - plocha v řezu 0,12m2 - délka odměřena ze situace (CAD)				
	29 966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15-188.250 Projektová dokumentace, D11 oprava AB vozovky Exit 39
Objekt: SO 111 Oprava vozovky jižních větví D11 MÚK Kluk
Rozpočet: SO 111 Oprava vozovky jižních větví D11 MÚK Kluk

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30 967118		- odstranění stávajících odvodňovacích žlabů (CURB KING) - plocha z řezu 0,12m² - délka odměřena ze situace (CAD) - včetně odvozu na skládku - skládkovné v položce 014102.3 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM - odstranění poškozených žlabovek po vyčištění zpevněných příkopů - předpokladaná výměra 15% z celkového množství - POLOŽKA BUDE POUŽITA POUZE NA PŘÍMÝ PŘÍKAZ TDI A INVESTORA - plocha z řezu (včetně lože) - 0,148m²				
9		Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 15-188.250 Projektová dokumentace, D11 oprava AB vozovky Exit 39

Objekt: SO 180 Přechodné dopravní značení na dálnici/silnici I. třídy

Rozpočet: SO 180 Přechodné dopravní značení na dálnici/silnici I. třídy

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15-188.250 Projektová dokumentace, D11 oprava AB vozovky Exit 39
Objekt: SO 180 Přechodné dopravní značení na dálnici/silnici I. třídy
Rozpočet: SO 180 Přechodné dopravní značení na dálnici/silnici I. třídy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- 9			Ostatní konstrukce a práce				
1	91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK - přelepení neplatných cílů				
2	914134		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DOD, MONT, DEMONT - včetně stojky - pronájem				
3	914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ - předpokládaná doba DIO 14 dní				
4	914434		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - DOD, MONT, DEMONT - IP 22a - včetně stojky - pronájem				
5	914434x		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - DOD, MONT, DEMONT - doplnění symbolu B1 a E13 na stávající značku IP19 - odstranění symbolu B1 a E13 po ukončení DIO				
6	914439		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ - předpokládaná doba DIO 14 dní				
7	916124		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ - pronájem - na dopravní zábrany Z2				
8	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ - předpokládaná doba DIO 14 dní - na dopravní zábrany Z2				
9	916314		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ - pronájem - označení úseků s úplnou uzavírkou				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15-188.250 Projektová dokumentace, D11 oprava AB vozovky Exit 39
Objekt: SO 180 Přejídné dopravní značení na dálnici/silnici I. třídy
Rozpočet: SO 180 Přejídné dopravní značení na dálnici/silnici I. třídy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	916319		- použito v sestavě B1+E12+Z2 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ - předpokládaná doba DIO 14 dní - včetně stojek				
11	916344		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD,MONT,DEMON - včetně stojky - pronájem				
12	916349		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ - předpokládaná doba DIO 14 dní - včetně stojek				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** 15-188.250 Projektová dokumentace, D11 oprava AB vozovky Exit 39**Objekt:** SO190.1 Definitivní dopravní značení D11 MÚK Kluk**Rozpočet:** SO190.1 Definitivní dopravní značení D11 MÚK Kluk**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:****Cena celková:****DPH:****Cena s daní:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 15-188.250 Projektová dokumentace, D11 oprava AB vozovky Exit 39
Objekt: SO190.1 Definitivní dopravní značení D11 MÚK Kluk
Rozpočet: SO190.1 Definitivní dopravní značení D11 MÚK Kluk

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
-	9		Ostatní konstrukce a práce				
1	912282		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ: - demontáž směrových sloupků před prováděním OŽK a čištěním krajnice - zpětná montáž po provedení prací				
2	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 1. značení na nový kryt - nevyzrálý - plochy a délky odměřeny ze situace (CAD)				
3	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA 2. značení na nový kryt - definitivní - plochy a délky odměřeny ze situace (CAD)				
4	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA 2. značení na nový kryt - definitivní - plochy a délky odměřeny ze situace (CAD)				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

DÍL 1, ČÁST 4 FORMULÁŘ 4.4.2 ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha,
IČ: 60838744
Na Bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „D11 Oprava AB vozovky Exit 39“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 65993390 (dále „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy (dále „Smlouva“) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

- **Úplatkářství** (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.
- **Podvodné jednání** (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
- **Objednatel** (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.
- **Veřejný činitel** (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- **Zakázané praktiky** (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

Za STRABAG a.s.

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.5
ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Název veřejné zakázky: D11 Oprava AB vozovky Exit 39

Společnost **STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha,**
se sídlem: Na Bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČ: 60838744,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D11 Oprava AB vozovky Exit 39, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 65993390 (dále jen „uchazeč“), prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena
Vyfrézované asfaltové souvrství		
Ocel (svodidla)		

Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Uchazeč se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Uchazeč tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

Za STRABAG a.s.

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.6
HARMONOGRAM, SCHÉMA STAVENIŠTĚ A ROZDĚLENÍ PRACÍ

Společnost **STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha,**
se sídlem: Na Bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČ: 60838744,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D11 Oprava AB vozovky Exit 39, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 65993390 (dále jen „uchazeč“), tímto

uvádí, že

při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:

1. vycházet při umístění hlavní kanceláře, zařízení, výroben (ocelových konstrukcí / betonu / živíc), laboratoří a dalších jednotek na staveništi ze schématu, které je přílohou tohoto dokumentu,

– viz přiložený plán umístění zařízení staveniště

2. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem dokončení stavby v následujících krocích: *osazení dopravních opatření, demontáž svodidel, frézování vozovky a bourací práce, čištění krajnic, příkopů a propustků, realizace příkopových žlabů z tvárnic, oprava trhlin, pokládka podkladních asfaltových vrstev, demolice Curb King, pokládka Curb King, pokládka obrusné asfaltové vrstvy, provedení krajnic, osazení svodidel, realizace vodorovného dopravního značení, odstranění dopravních opatření (realizace ve dvou etapách, 1.etapa – jižní větev, 2.etapa – severní větev)*

– viz přiložený harmonogram prací a technologických činností

3. dodržovat časový plán realizace stavby představovaný programem prací, a harmonogram technologických činností, viz příloha. Program prací bude blíže konkretizován prostřednictvím podrobného programu prací vypracovaného v souladu s požadavky stanovenými ve Smluvních podmínkách pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek.

– viz přiložený harmonogram prací a technologických činností

4. realizovat minimálně níže uvedené části díla vlastními kapacitami, přičemž za vlastní kapacity se považují (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky:

- pokládka hutněných asfaltových vrstev

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce rozsah prací, které v souladu se Smlouvou zamýšlí zadat subdodavatelům:

Práce zadávané subdodavateli	Obchodní jméno a sídlo subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny díla	Zkušenosti z obdobných staveb (uvést detaily)
Dopravní opatření, dopravní značení	PROZNAK Praha s.r.o., Pikovická 244/17, Praha 147 00; IČO 27166392	9,03%	D11 – Oprava AB a CB vozovky v km 18,0 – 18,73 vpravo – realizace dopravních opatření a dopravního značení
CELKEM %		9,03 %	


Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu prací.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odeprýt, a to i bez uvedení důvodů.

Přílohy:

- *Plán umístění zařízení staveniště*
- *Harmonogram postupu prací a technologických činností*

Za STRABAG a.s.

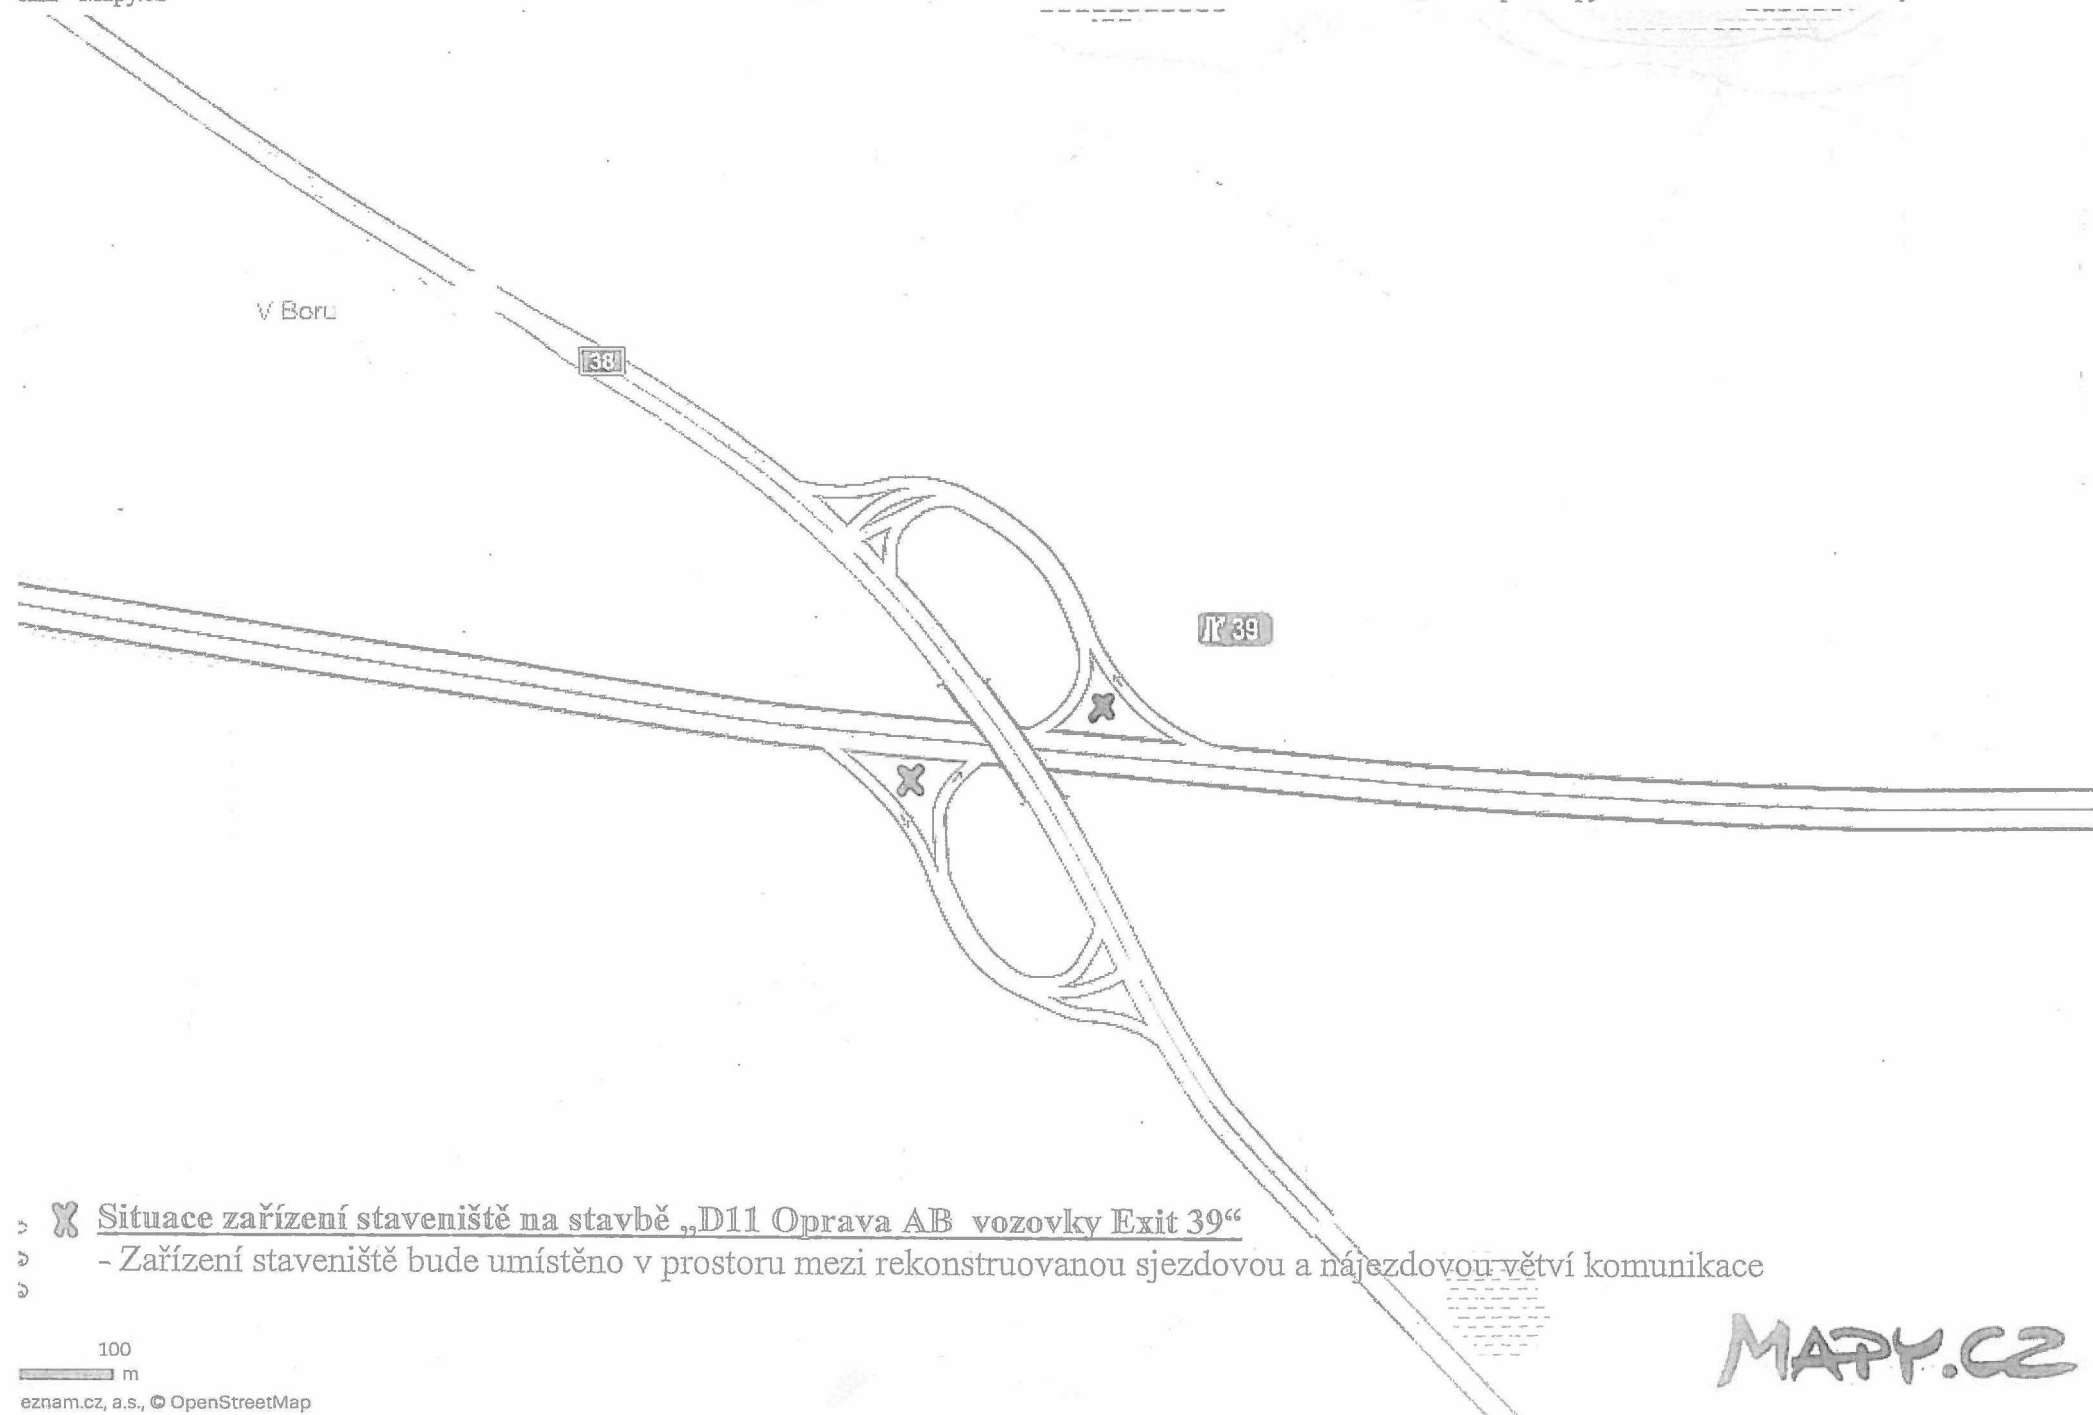

X Situace zařízení staveniště na stavbě „D11 Oprava AB vozovky Exit 39“

- Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru mezi rekonstruovanou sjezdovou a nájezdovou větví komunikace

100

m

ID		Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	6		
							4.	7.	10.
1			D11 - oprava AB vozovky Exit 39						
2			Jižní větev						
3			Demontáž svodidel						
4			Frézování AB tl. 11cm						
5			Frézování sanací tl. 7cm - příkaz 1						
6			Čištění krajnic						
7			Čištění příkopů						
8			Čištění propustku						
9			Příkopové žlaby z bet. tvárnic						
10			Oprava trhlin - příkaz TDI						
11			Pokládka sanace ACP - příkaz TDI						
12			Pokládka ACL 22 S						
13			Demolice Curb King						
14			Pokládka Curb King						
15			Pokládka SMA 11						
16			Provedení krajnic						
17			Montáž svodidla - oboustranné						
18			Pracovní spáry						
19			SDZ + VDZ						
20			Severní větev						
21			Demontáž svodidel						
22			Frézování AB tl. 11cm a 5cm						
23			Frézování sanací tl. 7cm - příkaz T						
24			Čištění krajnic						
25			Čištění příkopů						
26			Čištění propustku						
27			Příkopové žlaby z bet. tvárnic						
28			Oprava trhlin - příkaz TDI						
29			Pokládka sanace ACP - příkaz TDI						
30			Pokládka ACL 22 S						
31			Demolice Curb King						
32			Pokládka Curb King						
33			Pokládka SMA 11						
34			Provedení krajnic						
35			Montáž svodidla - oboustranné						
36			Pracovní spáry						
37			SDZ + VDZ						

							říjen 2016							lis		
3.	16.	19.	22.	25.	28.	1.	4.	7.	10.	13.	16.	19.	22.	25.	28.	31.

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.11
PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A
PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

Společnost **STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha,**
se sídlem: **Na Bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5**
IČ: 60838744,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „D11 Oprava AB vozovky Exit 39“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 65993390 (dále jen „uchazeč“), tímto závazně

prohlašuje, že

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) patentu či užitného vzoru	Popis zařízení či technologického procesu, který je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k patentu či užitnému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy	Termín expirace právní ochrany patentu či užitného vzoru na území České republiky
1.	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
2.	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

-netýká se

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) průmyslového vzoru	Popis věci, výrobku či zařízení, které je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k průmyslovému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy	Termín expirace právní ochrany průmyslového vzoru na území České republiky
1.	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
2.	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

-netýká se

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

-netýká se

Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném v Pod-článku 17.5 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelům ve znění Zvláštních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

Čestně prohlašujeme, že nedisponujeme žádnými patenty, užitnými a průmyslovými vzory pro ČR.

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.12
SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Společnost **STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha,**
se sídlem: Na Bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČ: 60838744,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce D11 Oprava AB vozovky Exit 39, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 65993390 (dále jen „dodavatel“),

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % a v případě významné veřejné zakázky více než 5 % z celkové ceny veřejné zakázky.

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení subdodavatele	IČ (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	Údaj v %, kolik bylo subdodavateli uhrazeno za plnění subdodávky [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok]
bude doplněno	bude doplněno	bude doplněno
bude doplněno	bude doplněno	bude doplněno
bude doplněno	bude doplněno	bude doplněno
bude doplněno	bude doplněno	bude doplněno
bude doplněno	bude doplněno	bude doplněno

alternativa A

Žádný se subdodavatelů nemá formu akciové společnosti.

nebo

alternativa B

Dodavatel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele:

Identifikační údaje subdodavatele	Identifikační údaje akcionáře
-----------------------------------	-------------------------------

[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]

Zavazujeme se tímto nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy, nebo v případě, že plnění Smlouvy přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložit zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 10 % a v případě významné veřejné zakázky více než 5 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavateli stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost. Výše uvedené údaje budou předloženy dle struktury uvedené v tomto formuláři.
