

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

č. SRM : _____

č. SAP : _____

uzavřená dle ustanovení § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění

Vlastník sítě elektronických komunikací:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623

Zastoupená _____ ředitelem útvaru Přístupová síť

- (dále jen „CETIN“)

a

Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací:

Město Sokolov

Se sídlem Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

IČ : 00259586

DIČ : CZ00259586

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy o dílo a jejích dodatků :

Bc. Jan Pícka, starosta města

- (dále jen „Stavebník“)

uzavírají tuto smlouvu:

Definice pojmů

Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) se rozumí stavba spočívající ve změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení veřejné komunikační sítě.

Městský úřad Sokolov odbor rozvoje města		č. dop.
DOŠLO	15 -02- 2017	Zprac.
č.j.		Ukl.zn.
přílohy		
č.ev		

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy. Stavebník ve smyslu Vyjádření o existenci SEK a Všeobecných podmínek ochrany SEK č.j. 533099/16 ze dne 11.2.2016 vyvolává ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. překládku dotčeného úseku SEK.

Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením :

- **„VPI Sokolov, cyklostezka Dolní Rychnov“**

Čl. 2

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je požadavek Stavebníka na překládku SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, závazek společnosti CETIN zajistit si překládku SEK a s ní související záležitosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek Stavebníka, jež překládku SEK vyvolal, uhradit všechny náklady, které společnosti CETIN v souvislosti se zajištěním překládky SEK vzniknou.

Čl. 3

Překládka SEK, podmínky překládky SEK

3.1 Překládka SEK dle této smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickým) a na nemovitostech dle dokumentace generální DUR nosné stavby **„Projekt cyklostezek po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině, Cyklotrasa P1 – úsek 113 Dolní Rychnov – Sokolov, SO 461 Přeložka sdělovacího vedení TČR“**, kterou pro Stavebníka zpracovala projekční kancelář [redacted] Situační výkres překládky SEK je Přílohou č.1 této smlouvy (dále jen „Překládka“).

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

- zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu (Překládka),
- zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě s vlastníky nemovitostí dotčených překládkou SEK nebo vyvlastnění takového práva.

(to vše dále jen „Předpoklady pro realizaci překládky SEK“).

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci překládky SEK nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

Čl. 4

Závazky spojené s překládkou SEK

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje

a) před realizací Překládky:

- zajistit zpracování prováděcí PD Překládky;
- pokusit se uzavřít smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy v souladu s § 5 zákona č. 184/2006 Sb.

b) po realizaci Překládky:

- zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky;
- zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou dotčených nemovitostech, uzavření smluv zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a zápis služebnosti do katastru nemovitostí;
- zajistit vydání příslušného kolaudačního souhlasu stavby Překládky.

4.2 V souvislosti s provedením překládky se Stavebník zavazuje :

Před realizací Překládky:

- zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky);
- poskytnout veškerou potřebnou součinnost při zpracování prováděcí PD Překládky a přípravě Překládky;

Stavebník ke dni uzavření této smlouvy převádí na společnost CETIN některá práva a povinnosti z **Územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby „Projekt cyklostezek po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině, Cyklotrasa P1 – úsek 113 Dolní Rychnov – Sokolov“, vydaného dne 17.8.2015 Městským úřadem Sokolov – stavebním úřadem pod č.j. 65416/2015/OSÚP/JADU**, a to toliko práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN – **SO 461 Přeložka sdělovacího vedení TČR** - za podmínek v tomto územním rozhodnutí stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto územním rozhodnutí stanoveny. CETIN tato převáděná práva ke dni uzavření této smlouvy přijímá. Stavebník ke dni uzavření této smlouvy předal společnosti CETIN toto územní rozhodnutí.

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky **nejpozději do 30.6.2017**, a to za předpokladu, že nejpozději 2 měsíce před tímto datem budou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci překládky SEK uvedené v Čl. 3 bodu 3.2 této smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v Čl. 4. bodu 4.2 této smlouvy vyjma ustanovení o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 2 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 Sb. k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě event. zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou, stejně tak v případě nákladů společnosti CETIN za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do Katastru nemovitostí event. případně nákladů vzniklých společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a po realizaci Překládky při uzavírání smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě potřebnou součinnost.

4.6 Sjednaná lhůta realizace Překládky dle Čl. 4 bodu 4.3 této smlouvy se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.

4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v Čl. 8 této smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

Čl. 5

Náklady spojené s překládkou SEK

5.1 Stavebník je na základě zákona č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k překládce nedošlo.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě zpracovaného rozpočtu cenového a technického návrhu Překládky ke dni uzavření této smlouvy činí **1.084.547,- Kč** bez DPH (slovy jeden milion, osmdesátčtyři tisíce, pětsetčtyřicet sedm Kč).

Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy.

Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena na základě měrných nákladů společnosti CETIN známých ke dni zpracování této smlouvy, a to v rozsahu podle zadání generální DUR zajištěné Stavebníkem. Vzhledem k tomu, že stávající kabelové trasy SEK nejsou digitálně zaměřeny, mohou se přesné délky úseků SEK kolidující s nosnou stavbou Stavebníka, u kterých bude nutné zajistit Překládku, od zadání generální DUR odchylovat. S ohledem na tuto skutečnost a s ohledem na nutnost koordinace Překládky s nosnou stavbou Stavebníka, jejíž rozsah nelze zejména v rámci nákladového druhu „zemní práce“ předem jednoznačně vymezit, je nutné uvedenou specifikaci nákladů chápat jako orientační. **Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací a nákladů v době výstavby.**

5.3 K této ceně bude připočtena DPH v sazbě nebo sazbách podle platných právních předpisů.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Může se jednat například o:

- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene služebnosti inženýrské sítě vlastníků Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti inženýrské sítě, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti inženýrské sítě rozhodnutím (blíže specifikovány v Čl. 4 bodu 4.4. této smlouvy),
- náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 bodu 4.4 této smlouvy,
- náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti inženýrské sítě (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z Katastru nemovitostí,
- náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- náklady na identifikaci parcel,
- náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou zhotoviteli v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací předmětného díla podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

Čl. 6

Platební podmínky

6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a nákladů dle Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě daňového dokladu (faktury) po realizaci Překládky ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho vystavení.

K ceně nákladů za Překládku bude připočtena DPH v sazbě nebo sazbách podle platných právních předpisů. Stavebník se zavazuje DPH ve výši dle platných právních předpisů zaplatit současně s platbou dle tohoto odstavce.

6.2 Daňový doklad dle čl. 6, bod 6.1 bude vystaven do 30 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4, bod. 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit jej ve lhůtě splatnosti.

6.3 Daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Daňový doklad bude Stavebníkovi zasílán na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy.

6.4 Případné náklady společnosti CETIN uvedené v Čl. 5, bod 5.4 budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatného daňového dokladu vystaveného společností CETIN a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dní od jeho vystavení.

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této smlouvy, pokud nebude daňovým dokladem vystaveným společností CETIN stanoveno jinak.

Dnem úhrady daňového dokladu (zaplacením fakturovaných nákladů) se rozumí den připsání účtované (fakturované) částky na účet společnosti CETIN.

Čl. 7 Sankce

7.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Stavebníka s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebníka zaplatit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.2. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.

7.3. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 a 7.2 tohoto článku, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

7.4. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 až 7.3 tohoto článku, trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

Čl. 8 Kontaktní osoby

a) Za CETIN :

ve věcech smluvních:

[REDACTED]

ve věcech technických: [REDAKCE]
[REDAKCE]

b) Za Stavebníka :

ve věcech smluvních: Bc. Jan Picka, starosta města
[REDAKCE]

ve věcech technických: Jana Kožíšková, stavební technik odboru rozvoje města
[REDAKCE]

Čl. 9

Rozvazovací podmínka

9.1. Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.

9.2. Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. Zánikem smlouvy touto rozvazovací podmínkou není dotčeno právo společnosti CETIN na zaplacení smluvní pokuty dle Čl. 7 bodů 7.1. až 7.4. této smlouvy, a tomu odpovídající povinnost Stavebníka tuto pokutu zaplatit. Právo na náhradu škody zůstává zachováno.

Čl. 10

Závěrečná ustanovení

10.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření.

10.2. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

10.3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

10.4. Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští.

10.5. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

10.6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude zasílána doporučeně na adresy uvedené v hlavičce této smlouvy nebo na adresy elektronické pošty uvedené v Čl. 8 této smlouvy, ustanovení § 573 občanského zákoníku se neuplatní.

10.7. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy,

ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

10.8. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku na tuto smlouvu,

10.9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

10.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.


10.11. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

10.12. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy

10.13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.


Přílohy :

1. Situační polohopisný výkres Překládky
2. Specifikace nákladů Překládky
3. Územní rozhodnutí (titulní strana)
4. Zápis usnesení Rady města Sokolov ze dne 7.6.2016



ruktura a.s.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.



0,6
178/29

80,00

60,00

40,00

KÁCENÍ NÁLETŮ

q6C

C9a

KONEC PŘELOŽKY VO

0,57481

NOVÉ CHRÁNIČKY
NA STÁVAJÍCÍM VEDENÍ TČR

682/15

693

689C

686

688

68

E

plechová hala

Sběrné suroviny

panely

chodník

obrubník

A31a

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487



ČEZ TEPLÁRENSKÁ

nadzhládka

KÁCENÍ STROMU

KONEC PŘELOŽKY TČR
1,22439

40,00

20,00

80,00

3877/8

60,00

40,00

20,00

80,00

60,00

40,00

asfalt

asfalt

dlažba

3895/1

SO 102

3833/17

3833/19


KÁCENÍ STROMU

VRATA SE BUDOU OTEVÍRAT DOVNITŘ
NEBO BUDOU VYMĚNĚNA ZA POSUVNÁ

SO 461

KÁCENÍ STROMU

SOK.STROJIRNY

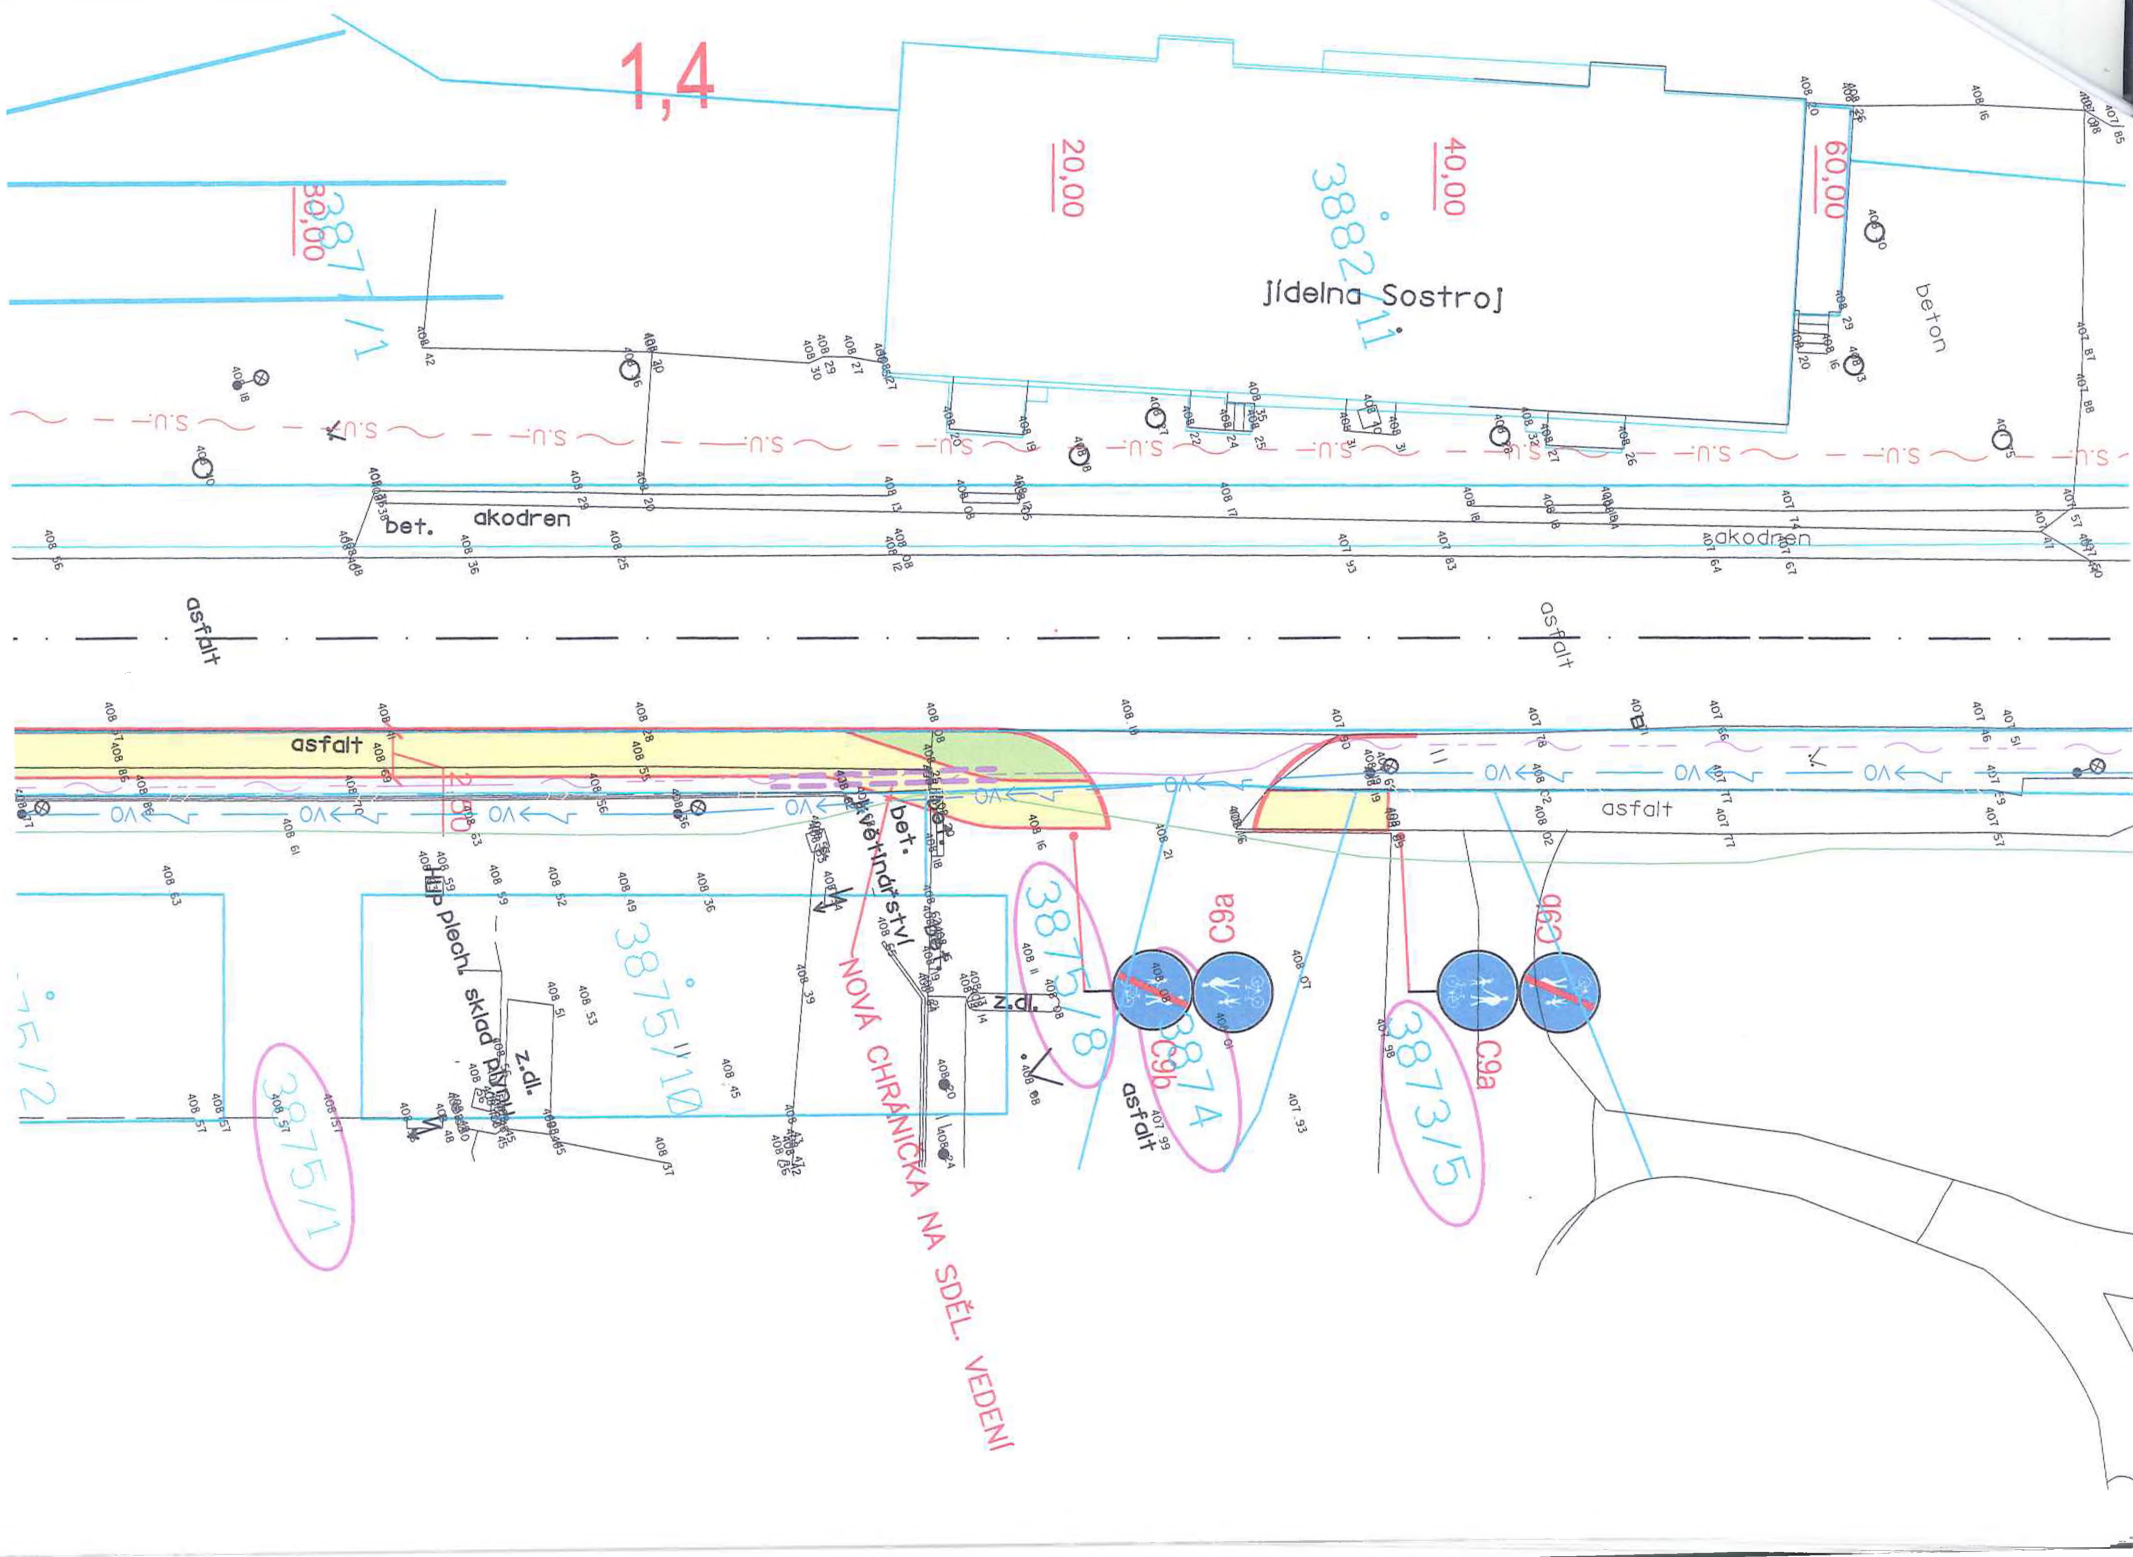

1,4

20,00

40,00

3882/11

Jedlna Sostro

60,00

beton

3877/1

38,00

bet. akodren

akodren

asfalt

asfalt

asfalt

asfalt

bet. akodren

NOVÁ CHRÁNIČKA NA SDEĽ. VEDENÍ

3875/10

3875/8

3874


3873/5


3875/1

3875/12

z. dl. sklad

plech

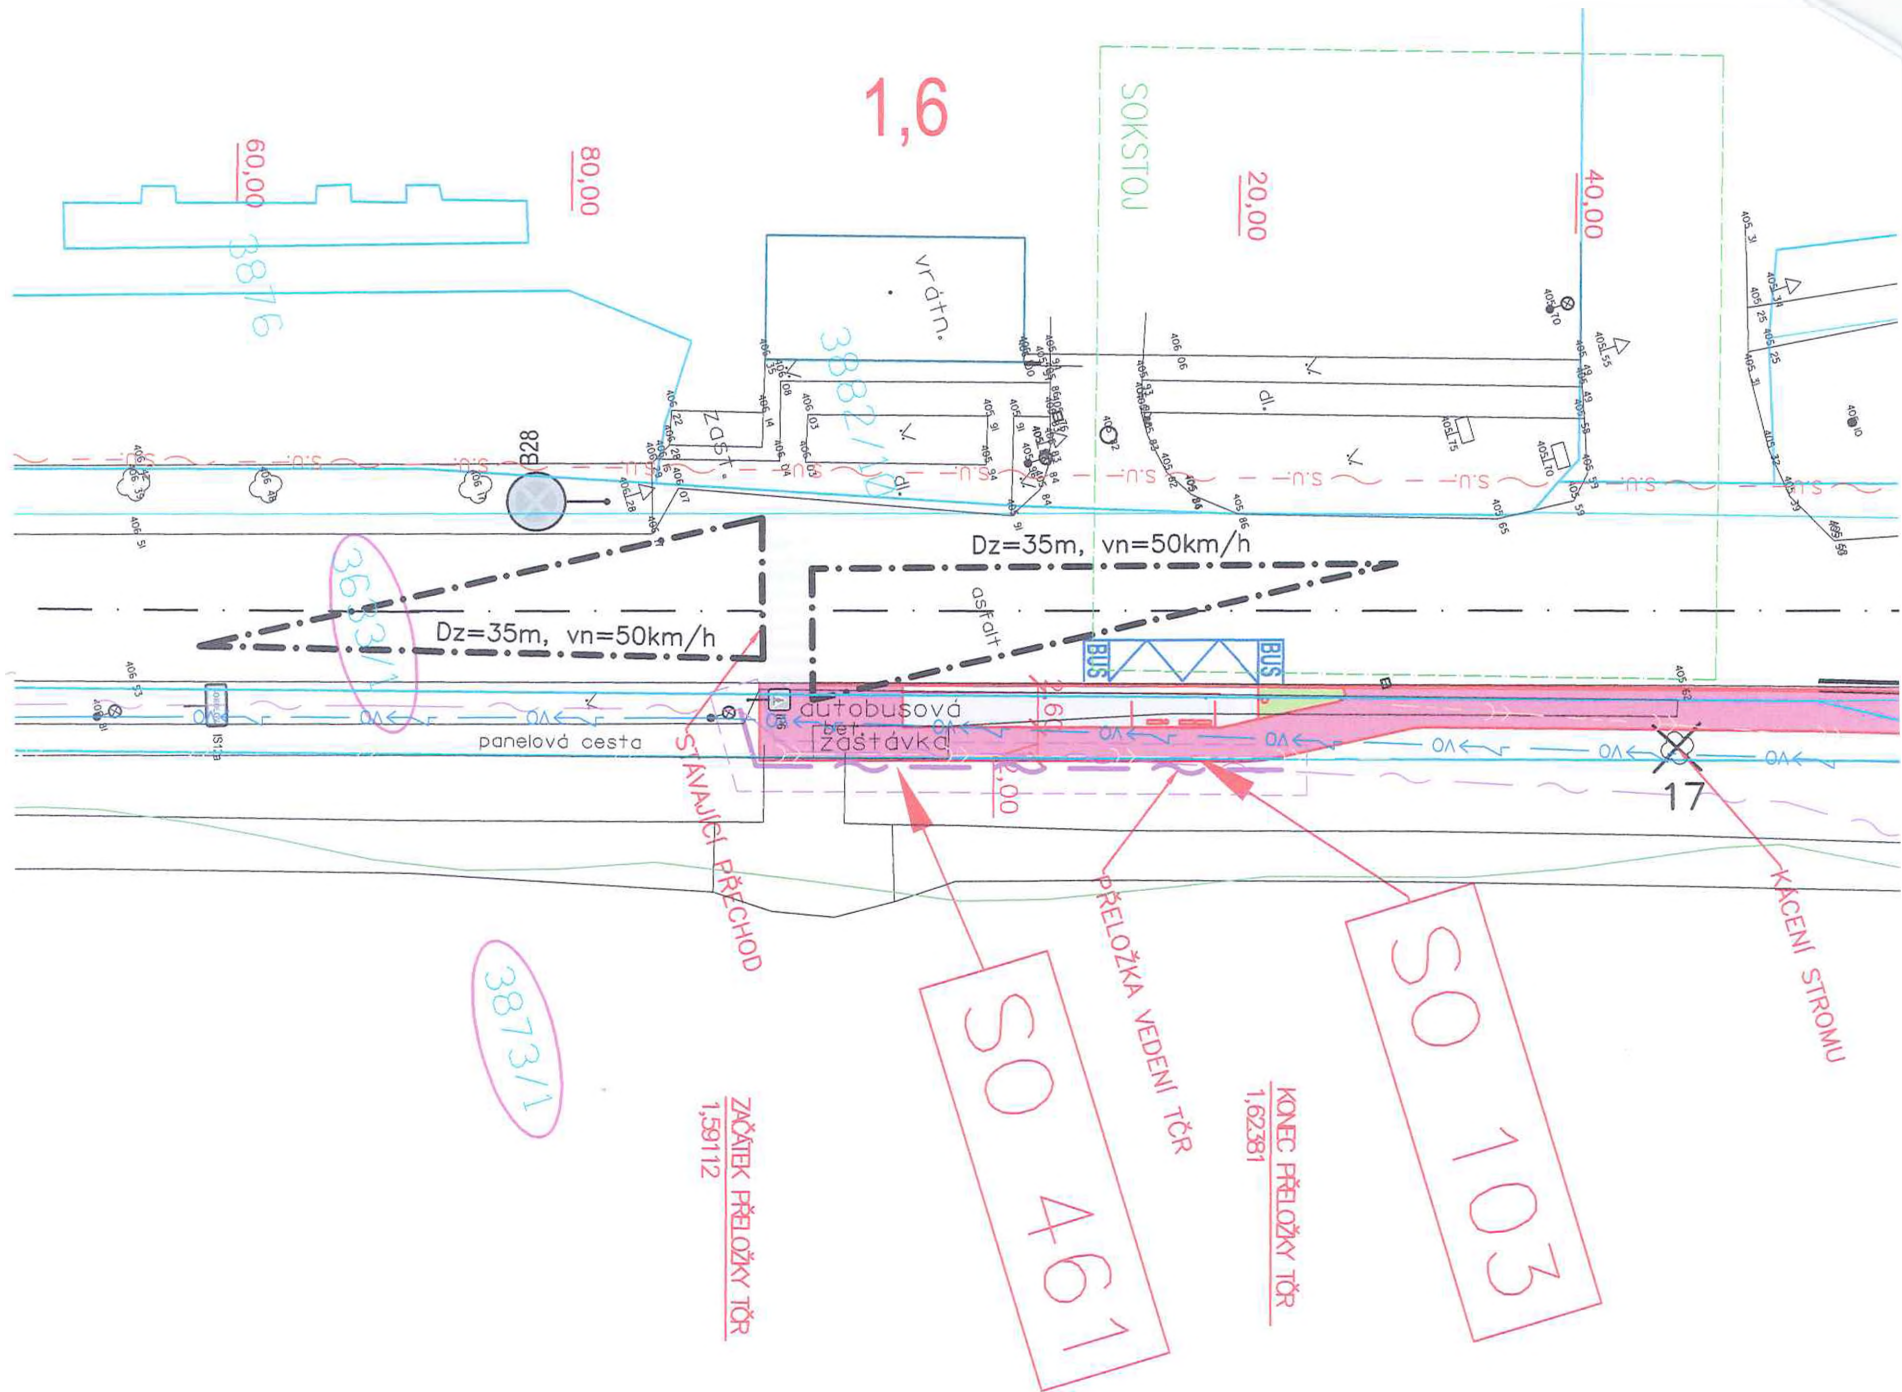

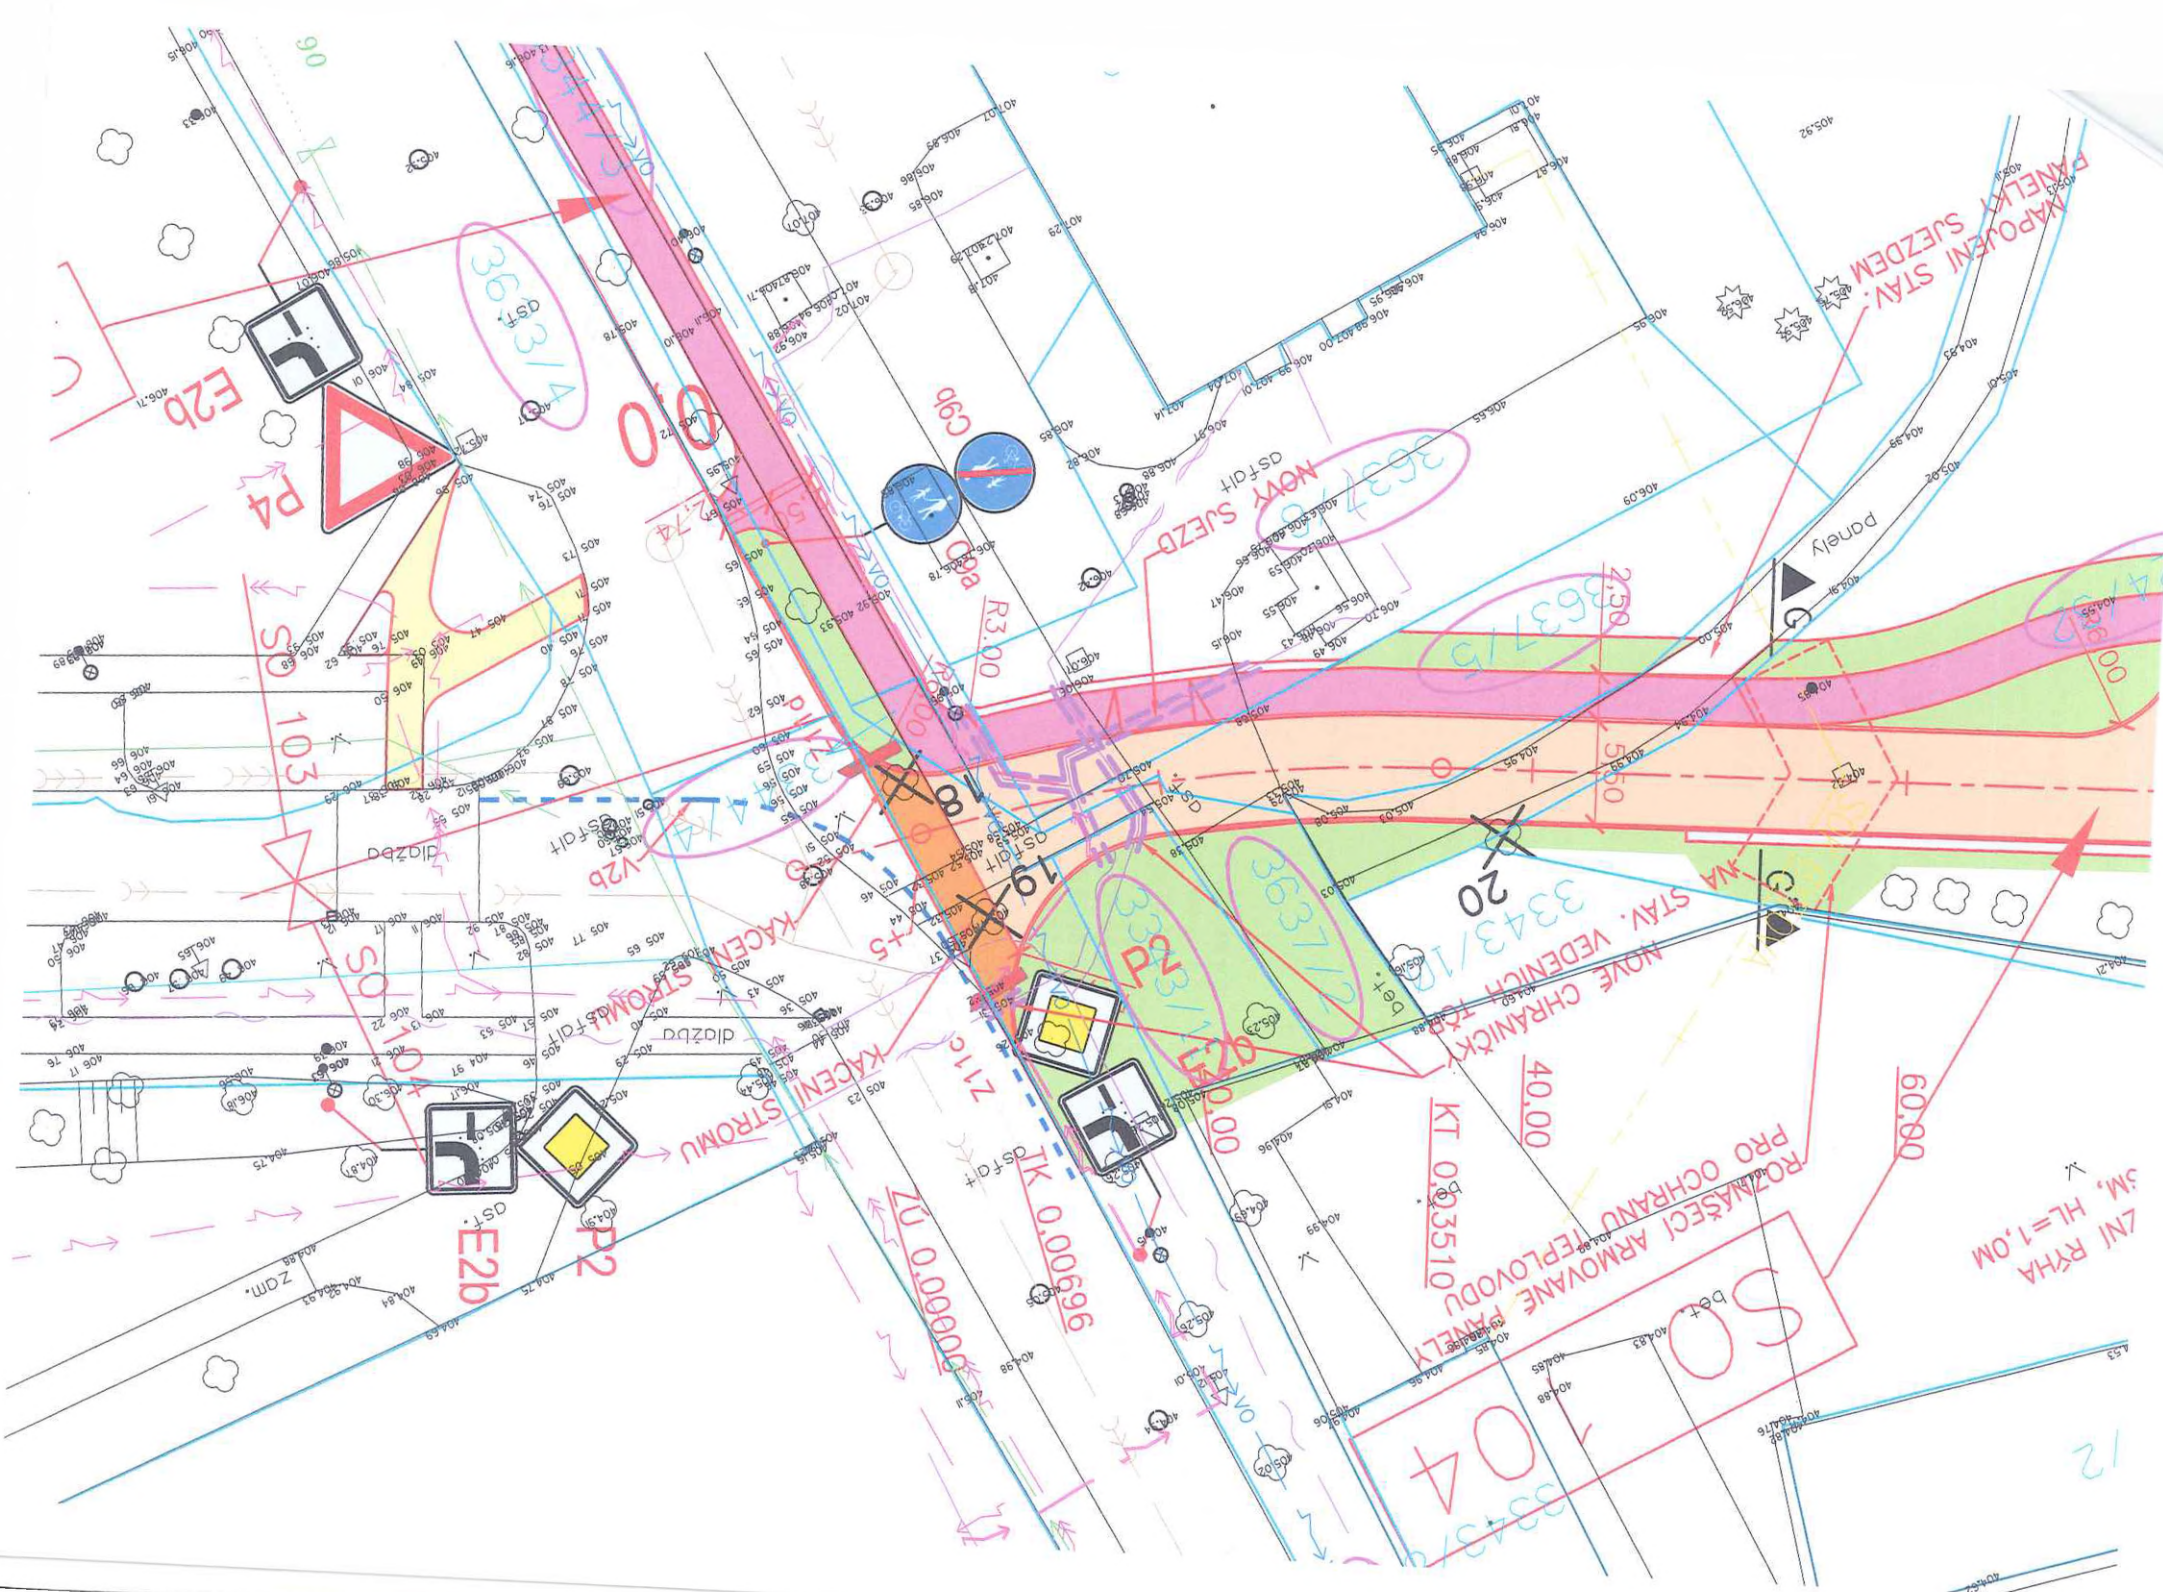

Název stavby: **VPI Sokolov, cyklostezka Dolní Rychnov**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: Rozpočet sumarizace všechny úseky

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.487	KMP:	393.750	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.006	KMMK:	1.295	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

REKAPITULACE:

PŘÍPRAVA	31 607,40 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	160 761,40 Kč
MONTÁŽ	146 285,55 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	38 631,95 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 851,45 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	3 431,37 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	701 977,68 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč
CELKEM:	1 084 546,80 Kč
STAVEB. ČINNOST	1 047 656,58 Kč
NESTAVEB. ČINNOST	36 890,22 Kč

.....
Zhotovil

.....
Kontroloval
Vytisknuto: 17-04-2016 23:02:04

SAP	Stav. čin.	Název položky Popis	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084	S	Návrh cenový a technický	1.00 ks	9 442,40 Kč
953634	S	Projekt tlkm liniové metalické sítě PD úložné sítě, zóna I, trasa do 0,6 km	17875.00 JV	22 165,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	18.00 m	271,08 Kč
952367	S	Pokládka žlabů TK1	82.00 m	4 919,18 Kč
954951	S	Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70	18.00 m	11 433,24 Kč
952360	S	Rýha v chodníku litý beton 35/50-70	6.00 m	3 503,70 Kč
952362	S	Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70	5.00 m	2 561,20 Kč
952345	S	Rýha v trávě 35/70-100	452.00 m	126 532,88 Kč
955574	S	Rýha ve vozovce litý beton 50/100	6.00 m	6 540,12 Kč
955054	S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	500.00 m	5 000,00 Kč
MONTÁŽ				
952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	7.00 ks	887,39 Kč
952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	628.00 ks	18 375,28 Kč
952644	S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	628.00 ks	12 252,28 Kč
952643	S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	7.00 ks	477,82 Kč
954999	S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	1965.00 ks	38 337,15 Kč
955282	S	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	17.00 ks	23 207,38 Kč
954992	S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	885.00 m	25 895,10 Kč
954991	S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	410.00 m	8 400,90 Kč
958469	S	Uvedení stavby do provozu Zajištění kolaudace stavby	3000.00 JV	3 720,00 Kč
955630	S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	14.00 ks	12 177,48 Kč
955066	S	Zrušení spojky smrštiteľné do 50 čtyř.	1.00 ks	643,57 Kč
955067	S	Zrušení spojky smrštiteľné nad 50 čtyř	2.00 ks	1 911,20 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE				
956281	S	Doměření trasy do 100 m	3.00 ks	12 589,86 Kč
955198	S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 308,15 Kč
955199	S	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	4.00 ks	7 973,60 Kč
956284	S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	4 196,62 Kč
956286	S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	390.00 m	7 367,10 Kč
956285	S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	4 196,62 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313	S	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	1 851,45 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
955315	S	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	1 777,40 Kč
958085	S	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	1 505,85 Kč
958459	S	Zápis dokumentu do systému Objednatele	1.00 ks	148,12 Kč

SAP	Stav. čin.	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918	S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	481.00 ks	17 623,84 Kč
303795	S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	12.00 m	44,52 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	481.00 m	2 049,06 Kč
300123	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 200x4x0,6	885.00 m	576 754,50 Kč
300108	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,4	25.00 m	1 165,25 Kč
300109	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4	385.00 m	31 015,60 Kč
302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball	15.00 ks	3 552,30 Kč
312425	S	Modul konektor. 9700-10P	393.00 ks	11 542,41 Kč
407578	S	Souprava čistící 4413L	3.00 ks	1 846,35 Kč
320312	S	Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	1.00 ks	149,48 Kč
312889	S	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	5.00 ks	3 660,65 Kč
320299	S	Spojka smršťovací XAGA 550 92/25-500	12.00 ks	13 835,16 Kč
319209	S	Trubka dělená SYSPRO 160/110	82.00 m	36 477,70 Kč
302672	S	Trubka PE 110/6,3/6000mm	3.00 ks	2 260,86 Kč

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Odbor stavební a územního plánování

ČÍSLO SPISU: SUP/23270/2015/JADU
ČÍSLO JEDNACÍ: 65416/2015/OSÚP/JADU
ČÍSLO EVIDENČNÍ: 74110
VYŘIZUJE: Duřková Jana
TEL.:
E-MAIL:
DATUM: 17.srpna 2015

Městský úřad Sokolov odbor rozvoje města	
DOŠLO	25-08-2015
Číslo	
Přílohy	
Číslo	

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 16.03.2015 podal

Město Sokolov, Bc. Jan Pícka, IČO 002 59 586, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 1, kterého zastupuje MěÚ Sokolov, odbor rozvoje města, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

Projekt cyklostezek po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině

Cyklotrasa P 1 - úsek 113 Dolní Rychnov – Sokolov

(dále jen "stavba")

na pozemcích parc. č. 3343/11 (ostatní plocha), parc. č. 3344/1 (ostatní plocha), parc. č. 3344/2 (ostatní plocha), parc. č. 3344/3 (ostatní plocha), parc. č. 3344/4 (ostatní plocha), parc. č. 3518 (ostatní plocha), parc. č. 3538 (ostatní plocha), parc. č. 3633/1 (ostatní plocha), parc. č. 3633/3 (ostatní plocha), parc. č. 3633/4 (ostatní plocha), parc. č. 3633/8 (ostatní plocha), parc. č. 3633/16 (ostatní plocha), parc. č. 3633/17 (ostatní plocha), parc. č. 3633/18 (ostatní plocha), parc. č. 3633/19 (ostatní plocha), parc. č. 3633/20 (ostatní plocha), parc. č. 3633/21 (ostatní plocha), parc. č. 3633/22 (ostatní plocha), parc. č. 3633/23 (ostatní plocha), parc. č. 3633/24 (ostatní plocha), parc. č. 3637/1 (ostatní plocha), parc. č. 3637/2 (ostatní plocha), parc. č. 3637/3 (ostatní plocha), parc. č. 3637/5 (ostatní plocha), parc. č. 3637/6 (ostatní plocha), parc. č. 3869/1 (ostatní plocha), parc. č. 3873/1 (ostatní plocha), parc. č. 3873/5 (ostatní plocha), parc. č. 3874 (ostatní plocha), parc. č. 3875/1 (ostatní plocha), parc. č. 3875/8 (ostatní plocha), parc. č. 3906/2 (ostatní plocha), parc. č. 4024/7 (ostatní plocha), parc. č. 4024/27 (lesní pozemek), parc. č. 4024/30 (ostatní plocha), parc. č. 4024/32 (lesní pozemek), parc. č. 4024/132 (lesní pozemek) v katastrálním území Sokolov,

na pozemcích parc. č. 88 (vodní plocha), parc. č. 158/3 (ostatní plocha), parc. č. 682/15 (ostatní plocha), parc. č. 685/1 (ostatní plocha), parc. č. 693 (ostatní plocha), parc. č. 704 (ostatní plocha), st. p. 716 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 724/2 (ostatní plocha), parc. č. 725 (ostatní plocha), parc. č. 733/1 (ostatní plocha), parc. č. 733/2 (ostatní plocha), parc. č. 808 (ostatní plocha), parc. č. 824/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Dolní Rychnov.



RADA MĚSTA SOKOLOVA

Usnesení

13. schůze rady, konané dne 07.06.2016

č. 343/13RM/2016

Stezka pro cyklisty a chodce, Dolní Rychnov - Sokolov - smlouvy o přeložkách inženýrských sítí

I. schvaluje

1. znění a uzavření Smlouvy č. Z_S14_12_8120054420 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce energie se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 247290335, v rámci realizace projektu Stezka pro cyklisty a chodce, Dolní Rychnov - Sokolov.

Z: Hana Špičková

T: 21.06.2016

R: Náklady ve výši 122 576,44 Kč jsou kryty schváleným rozpočtem města pro rok 2016, kap. 7, akce č. 064: Stezka pro cyklisty a chodce, Dolní Rychnov - Sokolov.

II. schvaluje

1. znění a uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací se společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČ: 04084063, v rámci realizace projektu Stezka pro cyklisty a chodce, Dolní Rychnov - Sokolov.

Z: Hana Špičková

T: 21.06.2016

R: Náklady ve výši 1 312 301,63 Kč jsou částečně kryty schváleným rozpočtem města pro rok 2016, kap. 7, akce č. 064: Stezka pro cyklisty a chodce, Dolní Rychnov - Sokolov. V případě přiznání dotace bude z rozpočtu města nárokována částka na realizaci.
