

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2020/00170
Číslo smlouvy Stavebníka: 141464

SAP S/4 Hana: 8030001666
Registr smluv: ANO



KUJIP01HJRI0

10379/20

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. VPI/MJ/2020/00170**

mezi

CETIN a.s.

a

Kraj Vysočina

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2020/00170
Číslo smlouvy Stavebníka: 141464

SAP S/4 Hana: 8030001666
Registr smluv: ANO

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená dle pověření Josefem Slovákem, manažerem, Výstavba pevné přístupové

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „**CETIN**“)

a

Kraj Vysočina

se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČO: 70890749

zastoupený hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem

k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje, Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Hana Matulová

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

číslo účtu: 4 211 071 069/6800

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označování jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Telč spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 28.4.2020 vydané pod čj. 592432/20, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC II/406 Dvorce-Telč, Telč SO451, SO452**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.

(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektu,
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však sedm (7) měsíců od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník se zavazuje, nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí a převést na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky. Ve lhůtě dle předchozího odstavce je Stavebník povinen předat společnosti CETIN územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
- (c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 bodu (i) Smlouvy.

- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.
- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **908.054,- Kč** (slovy: devět set osm tisíc padesát čtyři korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do šesti (6) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty

v nákladech překládky stanovených po vyhotovení Projektu dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy. Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit na základě dodatku k této smlouvě, přičemž smluvní strany se zavazují takový dodatek uzavřít před provedením prací nebo vznikem nákladů souvisejících s překládkou SEK a to do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jeho uzavření Stavebníkovi. Pokud k uzavření takového dodatku v uvedené lhůtě nedojde, uhradí Stavebník tyto náklady společnosti CETIN na základě jejich uplatnění.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vážnoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „Faktura“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:

- (a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši **47.657,- Kč** (slovy: čtyřicet sedm tisíc šest set padesát sedm korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy,
 - (b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.
- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: Ludmila Uhrová
funkce: specialista pro výstavbu sítě - překládky SEK
e-mail: ludmila.uhrova@cetin.cz ,tel.: 238 462 454

ve věcech technických: Ing. Milan Baránek
funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: milan.baranek@cetin.cz, tel.: 602 760 320

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Ing. Jan Hylíš
funkce: člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
e-mail: hylis.j@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 135

ve věcech technických: Ing. Miroslav Dokulil
funkce: úředník na úseku investic 02
e-mail: dokulil.m@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 222, 734 694 517

9. Odstoupení od Smlouvy

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle Čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.
- 9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. Rozvazovací podmínka

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.

- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „**Osobní údaje**“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**GDPR**“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přijímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přijímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přijímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přijímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přijímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přijímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv

ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- (a) v listinné podobě;
- (b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;
- (c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy, věta první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem (b) a (c).

12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.

12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:

- § 557;
- § 1767 odst. 2;
- § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
- § 1743.

12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.

12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).
- Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv delikt ní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.
- Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis. Aniž by byla dána jakákoliv souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.
- Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.
- 12.13 Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy: Příloha č. 1 - CTN

CETIN:

Stavebník:

V Praze dne 3. 11. 2020

V Jihlavě dne 11. 11. 2020


CETIN a.s.

Josef Slovák

manažer, Výstavba pevné přístupové sítě
na základě pověření

CETIN a.s.
Českomoravská 2310/15, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084053

224


Kraj Vysočina

Ing. Jan Hyliš

člen rady kraje pro oblast
dopravy a silničního hospodářství

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Technická zpráva

Název stavby : VPIC II406 Dvorce-Telč, Telč SO451, SO452

Stručný popis:

Vynucená překládka SEK SO 451 Přeložka trasy SEK CETIN a.s.
Stavební úpravy křižovatky silnic II/112 a II/406, oprava silnice II/406 v úseku mezi křižovatkami silnic II/112 - I/23 včetně vegetačních úprav, vyvolaných přeložek a ochrany všech dotčených sítí a zařízení dopravní a technické infrastruktury.

Dotčené prvky PVSEK :

HDPE O - OK 669 052 05; 24f

HDPE O/B – OK 669 011 02

HDPE C –prázdná

kabel PPFLE35XN0,4, PPFLE10XN0,6, PPFLE5XN0,4

Technické řešení :

Úpravou vidlicové křižovatky silnic II/112 a II/406 na okružní křižovatku dojde k zásahu do stávajících kabelových vedení i páteřní optické sítě.

Pro přeložení páteřní sítě musí být položena kabelová komora PKOR, do které budou propojeny stávající a nově položené optochráničky HDPE ve stejných barvách, jakou jsou stávající. Od dělicí spojky S401 bude stávající kabelová trasa i s 3 ks HDPE odhalena v délce 20,0 m. Stávající spojky HDPE u S401 budou demontovány a optické kabely se zde vyfouknou z RSU Telč. Po vyfouknutí OK se stávající optochráničky před domem č.p.122 odhalí v délce cca 2,0 m a demontují se stávající spojky HDPE. Konce stávajících HDPE se ukončí v PKOR. Po propojení na stávající HDPE můžou být zafouknuty optické kabely do PKOR kde budou naspojkovány na nově zafouknuté optokabely z PKOR do RSU Telč. Tím vznikne dostatečná délková rezerva na obou OK.

Přeložení metalické trasy kabelu TCEPKPFLE 35XN 0,4 budou dotčeny dvě dělicí spojky S401 a S796, které budou demontovány. TCEPKPFLE 35XN 0,4 se nově přeloží v celé délce 170,0 m z TELČ108 do koncové kabelové spojky v místě S401 s naspojkováním na stávající trasu kabelu TCEPKPFLE 25XN 0,4, která pokračuje dále podél silnice II/112.

Z rozváděče TELČ 108 bude vyměněn kabel TCEPKPFLE 5XN 0,4 v délce 100,0 m, který se ukončí naspojkováním na stávající přívodní vedení pro TELČ569 č.p.79.

Nově samostatně bude vyveden TCEPKPFLE 10XN 0,6 v délce 85,0 m z rozváděče TELČ108. Kabel se ukončí naspojkováním na stávající kabelovou trasu shodného typu kabelu, která dále pokračuje podél silnice II/406.

Stavbou dotčená trasa neprovozované sítě bude v rámci stavby demontována bez náhrady. Vedení mimo provoz 30P 0,6 bude přerušeno na hranicích stavby.

V terénu a v chodníku se kabel uloží do výkopu do pískového lože s krytím výstražnou folií PVC oranžové barvy.

Křížení s komunikacemi se provede uložením kabelu do chráničky z trubek PE125/7,1 mm, jedna chránička se uloží jako rezervní. Chráničky budou ve výkopu obetonovány. Chráničky budou přesahovat prostor tělesa místních komunikací alespoň o 0,6 m. Konce chrániček budou utěsněny proti vnikání zeminy a vody. V chráničkách bude vložen ocelový pozinkovaný drát minimálního průměru 3 mm nebo sílonové lanko pro pozdější zatažení kabelu. Drát musí na obou koncích přesahovat rouru nejméně o 1,0 m. Konce rezervních chrániček budou zasypány pískem.

Přeložky SEK budou provedeny dle základních podmínek SEK vydaných společností CETIN, a. s. Před započítáním stavby bude uzavřena smlouva o přeložku vedení s vlastníkem sítě.

Při provádění prací nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy pro práci s telekomunikačními zařízeními.

Konce chrániček se označí uložením minimarkerů do výkopu

ÚR - Ano
PD - Ano
Geo - ANO
GP - ANO
VBŘ - ANO

Stavebník:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant:

TRANSCONSULT s.r.o.

Nerudova 37
500 02 Hradec Králové
IČ: 47455292

Technická zpráva

Název stavby : VPIC II406 Dvorce-Telč, Telč SO451, SO452

Stručný popis:

Vynucená překládka SEK SO 451 Přeložka trasy SEK CETIN a.s.
Stavební úpravy křižovatky silnicí II/112 a II/406, oprava silnice II/406 v úseku mezi křižovatkami silnic II/112 - I/23 včetně vegetačních úprav, vyvolaných přeložek a ochrany všech dotčených sítí a zařízení dopravní a technické infrastruktury.

Dotčené prvky PVSEK :

HDPE O - OK 669 052 05; 24f

HDPE O/B - OK 669 011 02

HDPE C -prázdná

HDPE Z -prázdná

HDPE B -prázdná

kabel PPFLE100XN0,8, PPFLE100XN0,6,

Technické řešení :

Křížení s vjezdem se provede uložením vedení do kabelových žlabů TK2. Jedna chránička PE110/6,3 se uloží jako rezervní. Kabelové žlaby a chráničky budou ve výkopu obetonovány. Chránička a kabelové žlaby budou přesahovat prostor vjezdu alespoň o 0,6 m. Konce chráničky a kabelových žlabů budou utěsněny proti vnikání zeminy a vody. V kabelových žlabech a v chráničce bude vložen ocelový pozinkovaný drát minimálního průměru 3 mm nebo silonové lanko pro pozdější zatažení kabelu. Drát musí na obou koncích přesahovat rouru nejméně o 1,0 m. Konce rezervních chrániček budou zasypány pískem.

Přeložky SEK budou provedeny dle základních podmínek SEK vydaných společností CETIN, a. s. Před započítím stavby bude uzavřena smlouva o přeložku vedení s vlastníkem sítě.

Při provádění prací nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy pro práci s telekomunikačními zařízeními.

Konce chráničky s kabelovými žlaby se označí uložením minimarkerů do výkopu.

ÚR - Ne
PD - Ne
Geo - ANO
GP - ANO
VBŘ - Ne

Stavebník:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava


Projektant:

TRANSCONSULT s. r. o.

Nerudova 37
500 02 Hradec Králové
IČ: 47455292

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<u>93/7</u>
Obec:	<u>Telč [588024]/7</u>
Katastrální území:	<u>Telč [765546]</u>
Číslo LV:	<u>10001</u>
Výměra [m ²]:	1285
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	trvalý travní porost

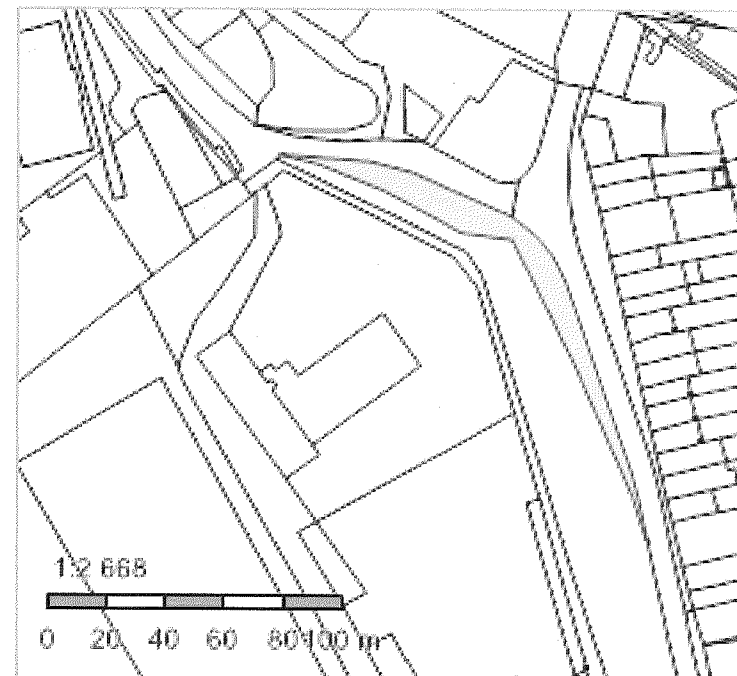

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč-Vnitřní Město, 58856 Telč

Způsob ochrany nemovitosti

Název

ochr.pásma nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
------	--------

<u>76701</u> ↗	1285
----------------	------

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava↗

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 08.09.2020 21:00:01.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<u>115</u>
Obec:	<u>Telč [588024]</u>
Katastrální území:	<u>Telč [765546]</u>
Číslo LV:	<u>1564</u>
Výměra [m ²]:	996
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	zahrada

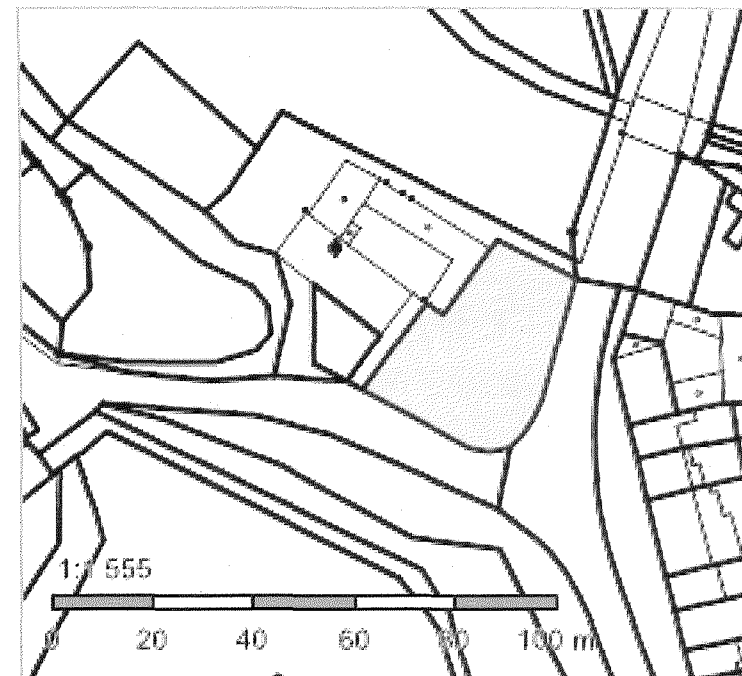

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Dolský František Ing., Na Výsluní 113, 59214 Nové Veselí

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ Výměra

76701 996

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 08.09.2020 21:00:01.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1187
Obec:	Telč [588024]7
Katastrální území:	Telč [765546]
Číslo LV:	10001
Výměra [m²]:	914
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha

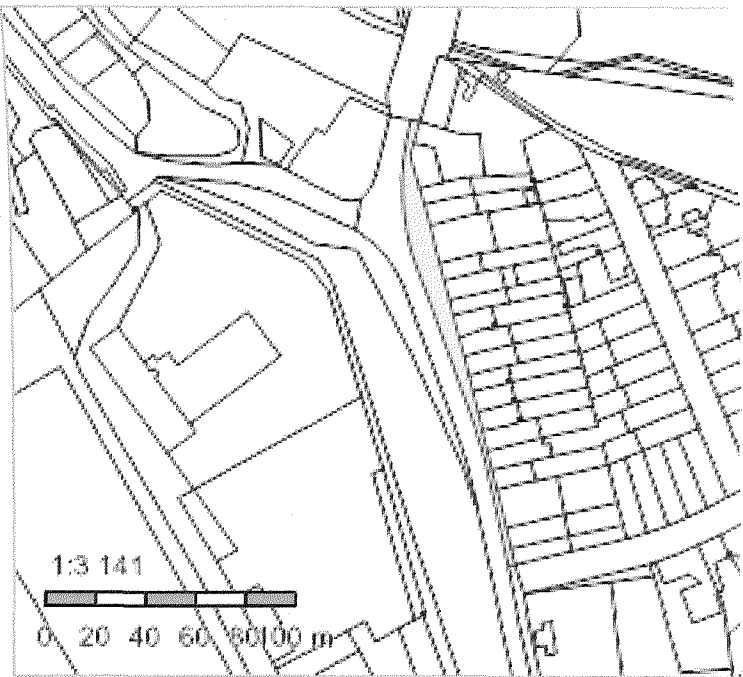

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč-Vnitřní Město, 58856 Telč	

Způsob ochrany nemovitosti

Název

Název

ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava[↗](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 08.09.2020 21:00:01.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<u>7362/1</u>
Obec:	<u>Telč [588024]</u>
Katastrální území:	<u>Telč [765546]</u>
Číslo LV:	<u>556</u>
Výměra [m ²]:	4092
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	silnice
Druh pozemku:	ostatní plocha

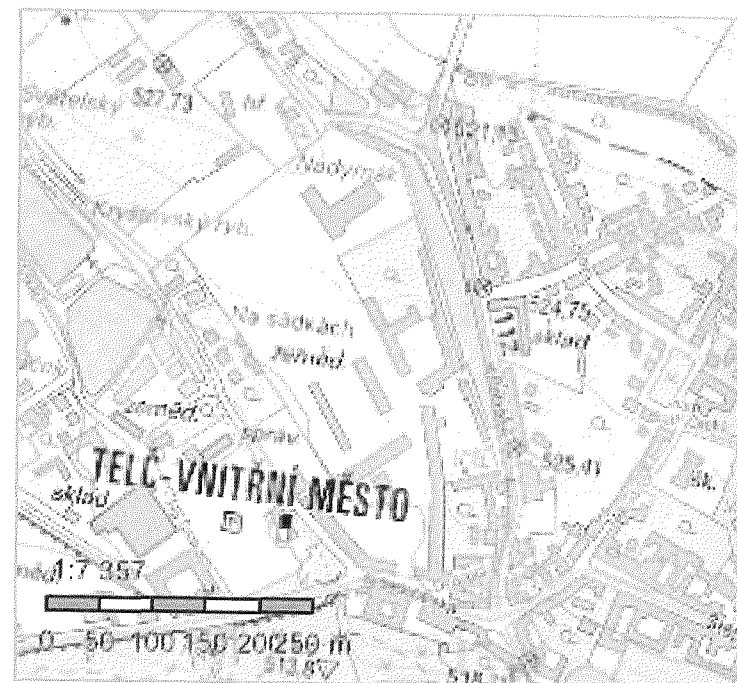

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Podíl

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

Podíl

Způsob ochrany nemovitosti

Název

ochr.pásma nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 08.09.2020 21:00:01.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<u>7482/2</u>
Obec:	<u>Telč [588024]</u>
Katastrální území:	<u>Telč [765546]</u>
Číslo LV:	<u>556</u>
Výměra [m ²]:	16662
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	silnice
Druh pozemku:	ostatní plocha

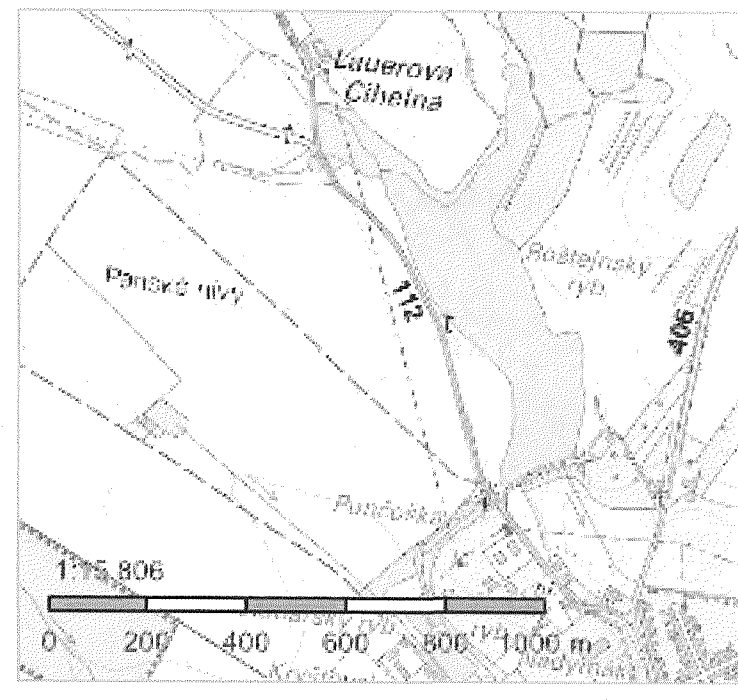

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení; v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 08.09.2020 21:00:01.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<u>7482/10</u>
Obec:	<u>Telč [588024]</u>
Katastrální území:	<u>Telč [765546]</u>
Číslo LV:	<u>10001</u>
Výměra [m²]:	559
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč-Vnitřní Město, 58856 Telč	

Způsob ochrany nemovitosti

Název

Název

ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 08.09.2020 21:00:01.

 TRANSCONSULT s.r.o. Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové		Sříděisko:		1
		Vedoucí:		Ing. Hodek
Vedoucí projektu	Ing. Hodek		Zak. číslo	191/13/10100
Odpovědný projektant	Ing. Hodek		Arch. č.	01119
Zpracovatel	Ing. Hodek		Formát: B A4	
Průzkoušel	Ing. Šejbal		Datum:	03/2020
Kontroloval	Ing. Hodek		Účel:	DUSP
Objednatel:	Kraj Vysočina			

[illegible]

Technical drawing of a sewerage system layout. The top part shows a plan view of the sewer network with various pipes, manholes, and a building labeled "DUBOVÁ KUCHYŇKA". The bottom part shows a cross-section of the sewer system with two vertical pipes, labeled "G - G'" and "H - H'", showing the internal structure and dimensions.

SCHÉMA PROPOJENÍ - NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ

KABLOVÁ VLOŽKA
PŘE SŽKD
DĚLKY 170,8 m

KABLOVÁ VLOŽKA
PŘE SŽKD
DĚLKY 100,0 m

KABLOVÁ VLOŽKA
PŘE SŽKD
DĚLKY 85,0 m

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ TRASA CER
BUDE ODHÁLENA
A S TRÁSNÝM PŘEMÍSTĚNÍM
V DĚLCE 17,0 m

STÁVAJÍCÍ TRASA VOZU 40/33 S 0 m

STÁVAJÍCÍ TRASA SŽKD 0 m

STÁVAJÍCÍ TRASA VOZU 40/33 S 0 m

STÁVAJÍCÍ TRASA HDPE 40/33 S OM

STÁVAJÍCÍ TRASA SRH KM

OPRAVA STÁVAJÍCÍ TRASY HDPE 40/33

NAPOJENÁ TRASA S OM KM

NAPOJENÁ TRASA S OM

STÁVAJÍCÍ SPOJKY HDPE

NAPOJENÉ SPOJKY OM HDPE TRASA HDPE

NAPOJENÉ NAPOJENÉ SPOJKY

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ, ΕΙΣ ΤΗΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΝ ΠΡΑΞΙΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΝ ΠΡΑΞΙΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΝ ΠΡΑΞΙΝ

[illegible][illegible]

SOUPŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSX
VÝŠKOVÝ SYSTÉM B/W

[illegible]


STÁVAJÍCÍ DÉLČÍ SPOJKA NA
NEZAPOJENÝ KABEL FLE 10XN
- BUDE NAHRAZENA ZA ROVNOU
SPOJKU S NASPOJKOVANÍM NA
KABELOVOU VLOŽKU FLE 35X4
VYVEDENOU Z TELC108 NA DOMĚ
Č.P. 335

STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ PATKOVÝ
SLOUP S TELC_568 NEBUDE
STAVBOU ZASAŽEN 2

STAVAJÍCÍ TRASA 3ks OPTOTRUBEK
HDPE 40/33 BUDE PO ÚPRAVĚ TRASY UKONČENA
V NOVE KABELOVÉ KOMOŘE KK2

PRO ZPĚTNÉ ZAFOUKNUTÍ STÁVAJÍCÍCH OPTICKÝCH KABELŮ MUSÍ BÝT
POLOŽENY NOVÉ OPTOCHRÁNIČKY HDPE 40/33 V NOVÉ TRASE MEZI KK1 - KK2

26m obnazeň a snížení uložení trasy
z toho 18m uloženo do chráničů

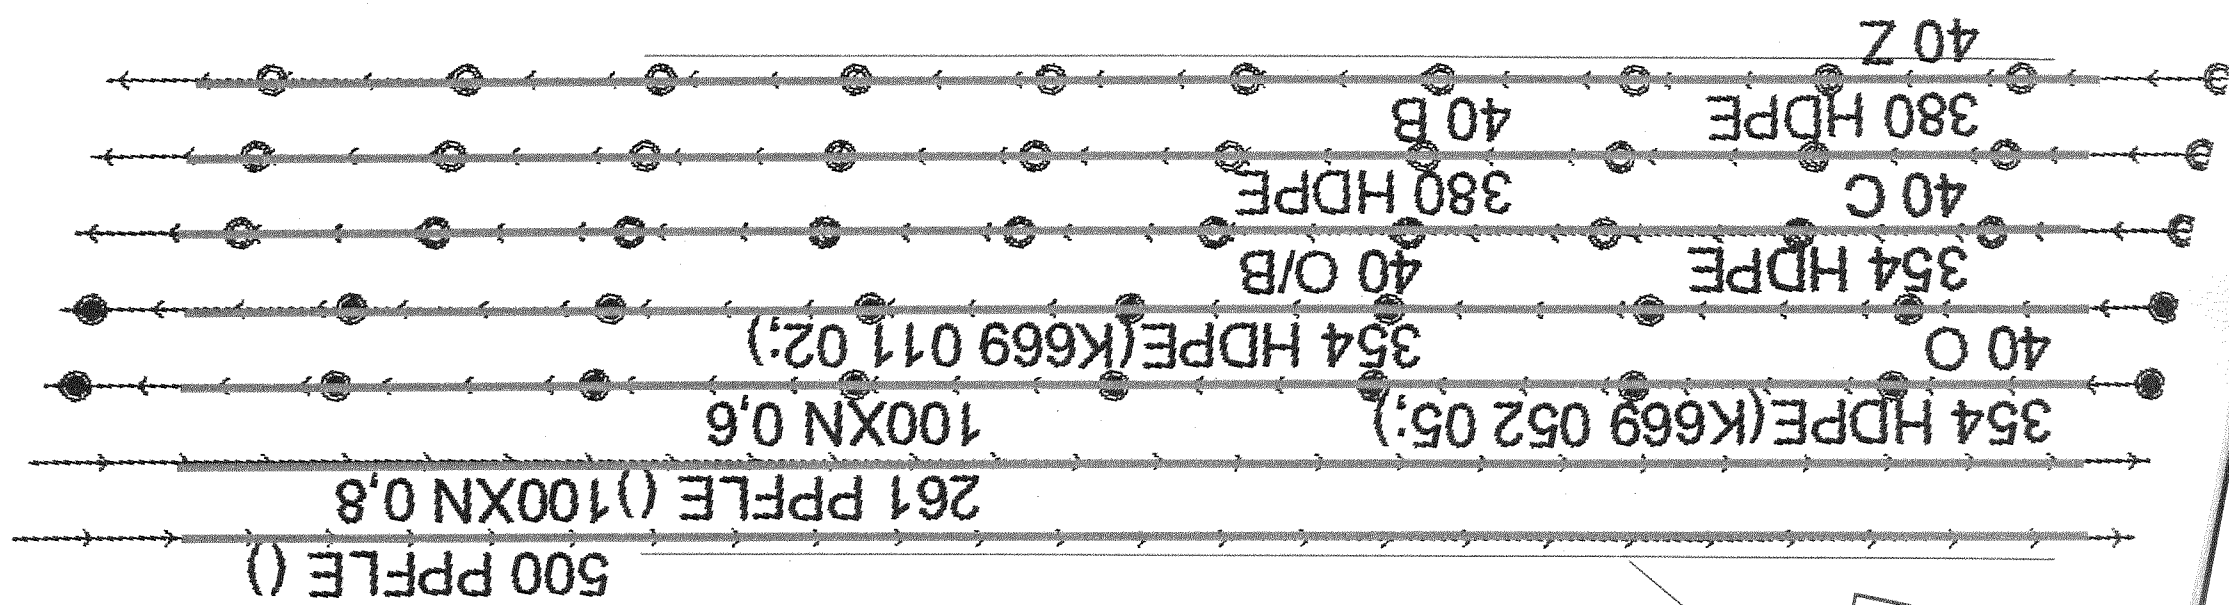

XAGA500
43/8-150

70

TEL108

335

122


nová OS
COYOTE RUNT inLine
v novém krytu PKOR

95

12

Op. 121

TELC1HR

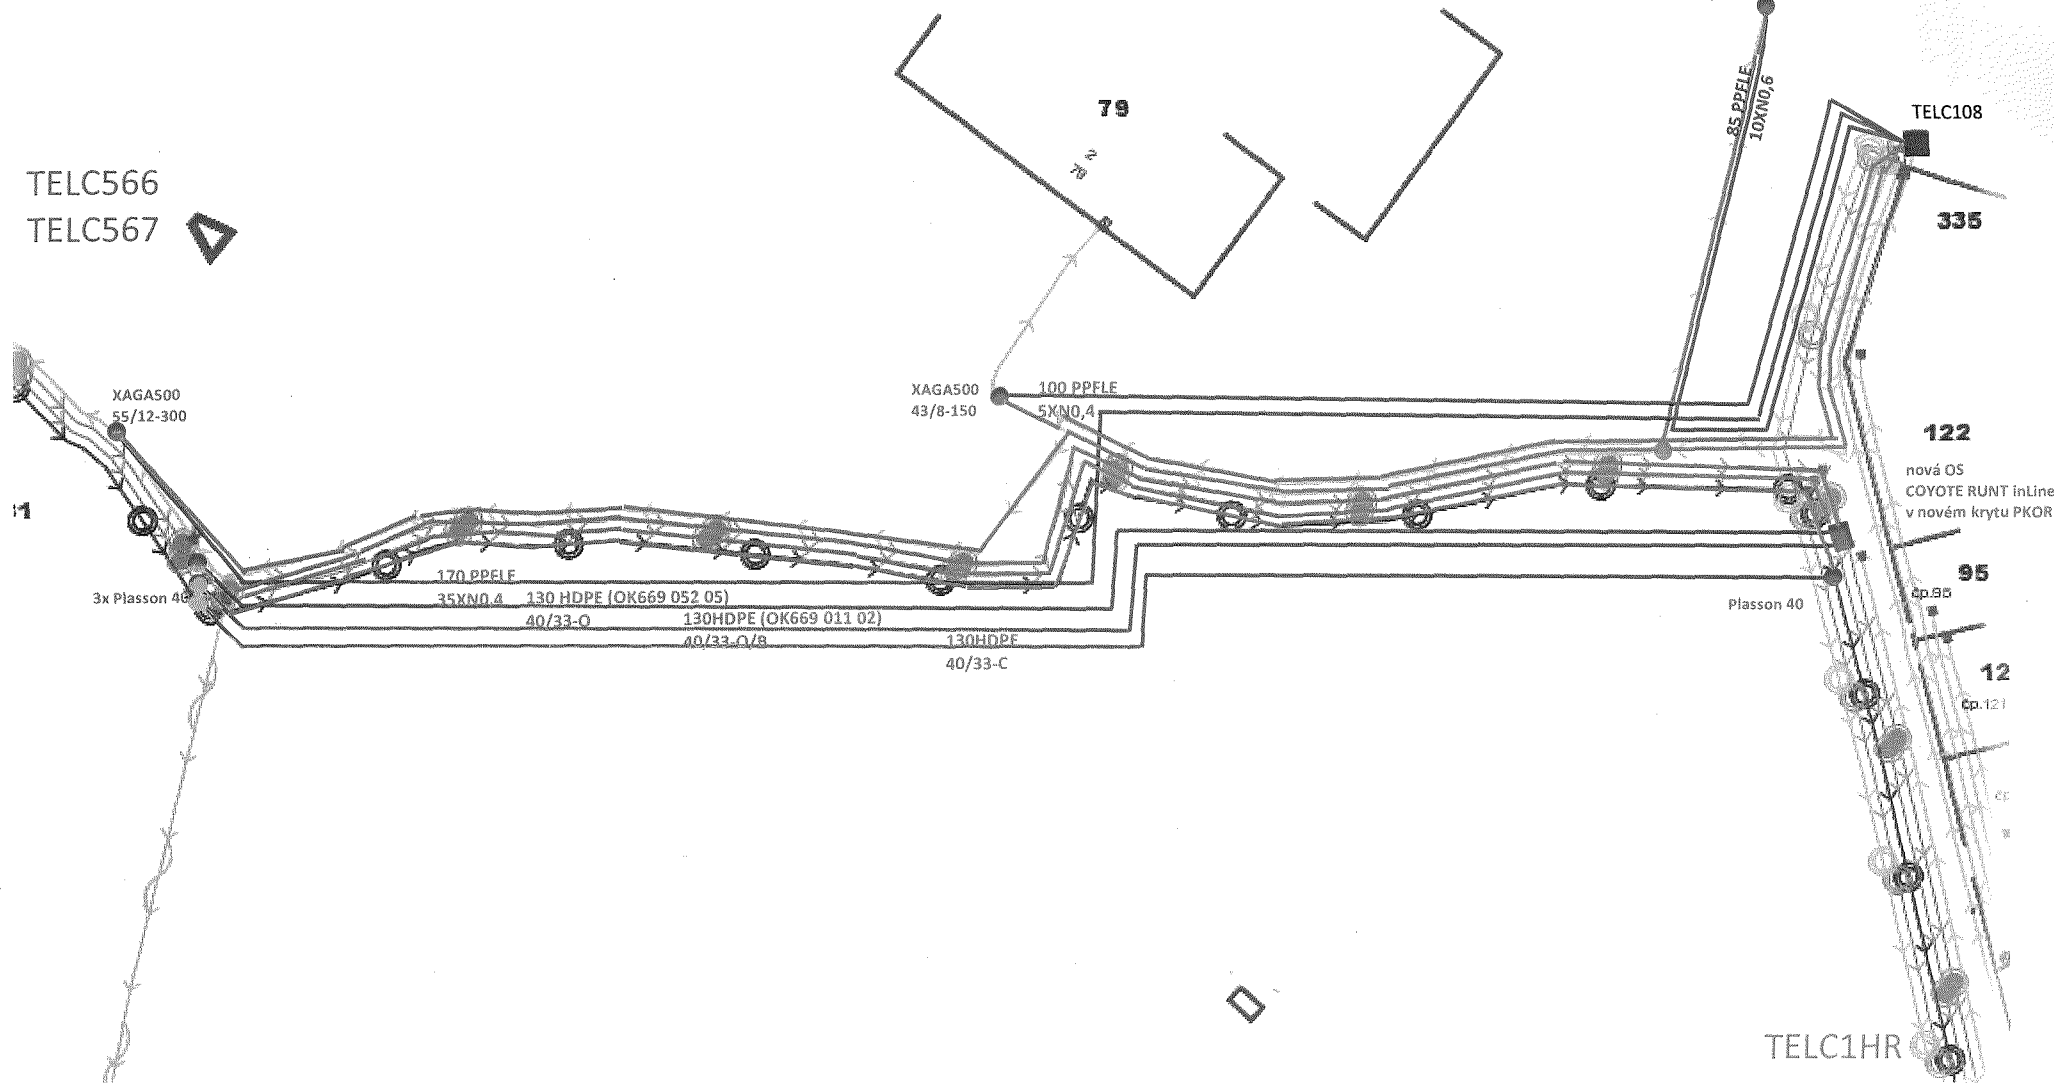

PPD - Propočet projektové dokumentace
Specifikace nákladů dle CTN

Ceník: VP-Východ 2018-TEM - STAND. - 2020.09a
Položková databáze: 2020.09a

Název stavby: VPIC II406 Dvorce-Telč,Telč SO451,SO452

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

Roman Vlč

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	41 965,90 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	196 982,58 Kč
MONTÁŽ	347 702,51 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	8 513,39 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	15 405,37 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	5 691,27 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	55 896,10 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	2 448,70 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	230 647,90 Kč
POPLATKY	2 800,00 Kč

Celkové náklady:

908 053,72 Kč

Číslo SAP	Seznam položek	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA	Název položky		
958084	Návrh cenový a technický	1.00 ks	10 750,14 Kč
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě	20672.00 JV	20 672,04 Kč
	Zóna I - 0,1 - 0,4km		
953635	Projekt tlkm liniové optické sítě	10543.70 JV	10 543,72 Kč
	Trasa OK 0,1 - 0,4km		
ZEMNÍ PRÁCE			
954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	58.00 m	1 100,84 Kč
952368	Pokládka žlabů TK2,T2N	36.00 m	3 414,96 Kč
955550	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	36.00 m	2 823,12 Kč
954959	Rýha v chodn.zám.dlaž.35/50-70rozš.ø10cm	50.00 m	9 739,00 Kč
955577	Rýha v chodníku 35/50-70	20.00 m	11 053,80 Kč
952351	Rýha v chodníku zámková dlažba 25/50	45.00 m	25 041,60 Kč
952362	Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70	25.00 m	17 390,25 Kč
952345	Rýha v trávě 35/70-100	246.00 m	87 115,98 Kč
954958	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	18.00 m	1 821,24 Kč
954952	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130	20.00 m	34 780,00 Kč
955053	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	215.00 m	2 448,85 Kč
951349	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	2.00 ks	252,94 Kč
MONTÁŽ			
958306	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	510.00 m	1 932,90 Kč
958310	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	48.00 ks	17 957,28 Kč
958314	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	48.00 ks	3 715,68 Kč
952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	3.00 ks	493,23 Kč
952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	47.00 ks	1 783,65 Kč
952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	47.00 ks	1 189,10 Kč
952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	3.00 ks	265,62 Kč
954999	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	50.00 ks	1 265,00 Kč
955003	Montáž ochranného boxu pro spojku	1.00 ks	709,52 Kč
955286	Montáž spojky bez montáže vláken	2.00 ks	2 058,48 Kč
955281	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	3.00 ks	3 604,44 Kč
955284	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	4.00 ks	196,32 Kč
952602	Montáž trubky úložné	510.00 m	6 257,70 Kč
954990	Montáž úložných kabelů do 15 XN	4065.00 m	87 438,15 Kč
958557	Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks	16 512,21 Kč
957753	Realizace tratě síťové dohodou	12400.00 JV	12 400,00 Kč
	Projektová rezerva		
958331	Svažení jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti	96.00 ks	37 152,96 Kč
955298	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	50.00 ks	1 265,00 Kč
955259	Ukončení kabelu v rozvaděči	3.00 ks	1 100,34 Kč
958469	Uvedení stavby do provozu	5262.56 JV	5 262,56 Kč
958336	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	7580.00 m	132 346,80 Kč
958558	Zkouška trhací	2.00 ks	3 096,06 Kč
958556	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 731,81 Kč
955066	Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř.	2.00 ks	1 669,46 Kč

955081	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	45.00 ks	797,40 Kč
955083	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	2.00 ks	303,54 Kč
955012	Zrušení úložné trubky	510.00 m	4 197,30 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA			
956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km	210.00 m	3 454,50 Kč
956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	5 058,89 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955198	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	5 564,78 Kč
956286	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	210.00 m	4 781,70 Kč
956285	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	5 058,89 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	3.00 ks	5 691,27 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	40000.00 JV	40 000,00 Kč
	Náhrady za VBŘ		
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	3.00 ks	6 829,50 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	3.00 ks	9 066,60 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE			
955204	Zrušení převodu v rozvaděči - 1.pár	4.00 ks	773,52 Kč
955205	Zrušení převodu v rozvaděči - další pár	10.00 ks	347,90 Kč
955208	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	4.00 ks	840,28 Kč
955209	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár	10.00 ks	487,00 Kč
POPLATKY			
955368	Poplatky k podzemním tratím síť.optickým	2800.00 JV	2 800,00 Kč
	Zábor veř.prostranství		

Číslo SAP	Limitka materiálu		
	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303857	Deska krycí plast. 250x1000 mm	45.00 ks	1 293,30 Kč
303918	Deska krycí plast. 300x1000 mm	297.00 ks	10 882,08 Kč
303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	110.00 m	408,10 Kč
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	297.00 m	1 265,22 Kč
303777	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	400.00 m	880,00 Kč
323551	Kabel optický 24vl. s CU párem Sterlite	3600.00 m	74 880,00 Kč
300118	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,6	85.00 m	3 770,60 Kč
300264	Kabel plastový TCEPKPFLE 35x4x0,4	170.00 m	11 055,10 Kč
300105	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4	3980.00 m	63 998,40 Kč
400299	Kapesníček čistící S 4557 - Z201 A 267	96.00 ks	340,80 Kč
318863	Kazeta24 svárůCoyoteRunt modré držáky4x6	2.00 ks	1 011,10 Kč
312240	Konektor UY2 přímý - plněný	6.00 ks	8,34 Kč
321713	Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x300	1.00 ks	7 562,31 Kč
302550	Mini Marker 1401 3M Ball	16.00 ks	3 140,16 Kč
312425	Modul konektor. 9700-10P	10.00 ks	222,20 Kč
323050	Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm	96.00 ks	503,04 Kč
305356	Poklop žlabu beton 50x23x6 cm k TK 2	72.00 ks	3 768,48 Kč
306776	Průchodka spojky Coyote s 4 vst. 8-11mm	2.00 ks	1 369,86 Kč
303251	Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon	4.00 ks	390,80 Kč
312845	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	2.00 ks	838,20 Kč
312881	Spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FLE	1.00 ks	727,75 Kč
306732	Spojka opt.univerzál.Coyote RUNT In-Line	2.00 ks	9 932,28 Kč
303003	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	4.00 ks	565,24 Kč
309380	Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400	2.00 ks	244,26 Kč
300023	Trubka HDPE 40/33 černá	170.00 m	4 204,10 Kč
300032	Trubka HDPE 40/33 oranžová -bílý pruh	170.00 m	4 204,10 Kč
300030	Trubka HDPE 40/33 oranžová	170.00 m	4 204,10 Kč
302672	Trubka PE 110/6,3/6000mm	3.00 ks	2 260,86 Kč
302752	Trubka PE 125/7,1/6000mm	7.00 ks	6 978,79 Kč
309759	Vodič prop. SM-clip-volný B6 10114-B6U50	4.00 ks	280,36 Kč
303222	Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35	3.00 ks	269,73 Kč
315502	Vodič sděl. nf U 2x0,5	100.00 m	239,00 Kč
305232	Žlab kabelový beton 100x23x19 cm TK 2	36.00 ks	8 949,24 Kč
