

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2017/00004

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění

Vlastník sítě elektronických komunikací:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Se sídlem Olšanská 2661/6, 130 00 PRAHA 3 - Žižkov

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623

Zastoupená Ing. Zdeňkem Šulcem, manažerem, M B A, Výstavba pevné přístupové sítě dle pověření

Bankovní spojení: \

Číslo účtu:

(dále je n „CETIN“)

a

Stavebník žadající o překládku sítě elektronických komunikací:

Město Pelhřimov

se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov

IČ: 00248801

DIČ: CZ00248801

Zapsaná v obchodním rejstříku

Zastoupená: Ing. Františkem Kučerou - starostou města a Ladislavem Medem - místostarostou

Bankovní spojení: v

Číslo účtu:

(dále je n „Stavebník“)

uzavírají tuto smlouvu:

Definice pojmů

Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) se rozumí stavba spočívající v e změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení veřejné komunikační sítě.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy. Stavebník v e smyslu Vyjádření o existenci SEK a Všeobecných podmínek ochrany SEK vydaného dne 30.8.2016 pod č. 695803/16 vyvolává v e smyslu § 104 odst. 17 zákona č. č. 127/2005 Sb. překládku dotčeného úseku SEK.

Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením
„VPIC Pelhřimov okr.křižovatka Tř.Legilí.“

ČI. 2

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je požadavek Stavebníka na překládku SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, závazek společnosti CETIN zajistit si překládku SEK a s ní související záležitosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek Stavebníka, jež překládku SEK vyvolal, uhradit všechny nezbytné náklady, které společnosti CETIN v souvislosti se zajištěním překládky SEK vzniknou.

ČI. 3

Překládka SEK, podmínky překládky SEK

3.1 Překládka SEK dle této smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech dle Cenového a technického návrhu překládky SEK VPIC Pelhřimov okr.křižovatka Tř.Legilí, který je Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Překládka“).

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

- zajištění pravomocného územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu (Překládky),
- zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s vlastníky nemovitostí dotčených překládkou SEK nebo vyvlastnění takového práva.

(to vše dále jen „Předpoklady pro realizaci překládky SEK“).

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci překládky SEK nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

ČI. 4

Závazky spojené s překládkou SEK

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje

- před realizací Překládky:

zajistit vyhotovení Projektu,

- pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.
- po realizaci Překládky:

- zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky.

4.2 V souvislosti s provedením překládky se Stavebník zavazuje

- před realizací Překládky:

- zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky),
- písemně oznámit společnosti CETIN, nejpozději 6 týdnů před zahájením realizace Překládky, stavební připravenost a vyzvat CETIN k realizaci Překládky s tím, že tato výzva může být učiněna nejdříve 5 měsíců po uzavření této smlouvy.

P o nabytí právní moci územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky), převést na společnost CETIN práva a povinnosti z tohoto územního rozhodnutí týkající se Překládky (uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby dle vzoru viz. příloha č. 3 této smlouvy) a předat toto územní rozhodnutí společnosti CETIN, to vše nejpozději do 15 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky do 2 měsíců od doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce a to za předpokladu, že ke dni doručení písemné výzvy stavebníka dle předchozího odstavce jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci překládky SEK uvedené v Čl. 3 bodu 3.2 této smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v Čl. 4. bodu 4.2 této smlouvy vyjma ustanovení o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 2 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 Sb. k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě event. zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou, stejně tak v případě nákladů společnosti CETIN za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do Katastru nemovitostí event. případně nákladů vzniklých společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a po realizaci Překládky při uzavírání smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě potřebnou součinnost.

4.6 Sjednaná lhůta realizace Překládky dle Čl. 4 bodu 4.3 této smlouvy se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.

4.7 Závazky (povinnosti) společnosti CETIN z této smlouvy týkající se realizace Překládky a souvisejících záležitostí, jež Překládce předcházejí, jsou rozděleny do dvou etap. První etapa je co do rozsahu stanovena položkami uvedenými v Příloze č. 3 této smlouvy (dále jen „První etapa“) a bude považována za ukončenou dnem ukončení První etapy tj. dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v Čl. 8 této smlouvy oznámení o ukončení První etapy. Druhá etapa bude stanovena co do rozsahu Projektem (dále jen „Druhá etapa“) a považována za

dokončenou dnem ukončení realizace Překládky tj. dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v Čl. 8 této smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

Čl. 5 **Náklady spojené s překládkou SEK**

5.1 Stavebník je na základě zákona č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k překládce nedošlo.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu ke dni uzavření této smlouvy činí **477.372,- Kč**. Překládka na základě zákona č. 127/2005 Sb. je mimo předmět daně z přidané hodnoty.

Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením projektové dokumentace Překládky (dále jen Projekt") na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační),

5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále je n „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu"). Společnost CETIN písemně oznámí do 4 měsíců od uzavření této smlouvy Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit za předpokladu, že nebudou zahrnuty v nákladech Překládky stanovených po vyhotovení Projektu v e smyslu čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy.

Může se jednat například o:

- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti inženýrské sítě vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti inženýrské sítě, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti inženýrské sítě rozhodnutím (blíže specifikovány v Čl. 4 bodu 4.4. této smlouvy),
- náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 bodu 4.4 této smlouvy,
- náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti inženýrské sítě (vážnoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z Katastru nemovitostí,
- náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- náklady na identifikaci parcel,

- náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Přebkládky,
- náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Přebkládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,- náklady, související s e zvláštním užíváním komunikace v e smyslu § 2 5 zákona č. 13/1997 Sb..
- náklady n a peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Přebkládky,
- náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Přebkládky,
- náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

Čl. 6 Platební podmínky

6.1 Náklady na Přebkládku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle Čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy je Stavebník povinen uhradit takto:

- a) Fakturu č. 1 ve výši **26.470,- Kč** do 30 dnů ode dne jejího vystavení,
- b) Fakturu č. 2 ve výši doplatku nákladů za Přebkládku do 30 dnů od jejího vystavení.

6.2 Faktura dle bodu 6.1 písm. a) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od ukončení První etapy , faktura dle bodu 6.1 písm. b) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Přebkládky ve smyslu Čl. 4 bodu 4.7 této smlouvy a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti.

6.3 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy.

6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v Čl. 5 bod 5.4 této smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně n a základě samostatných faktur vystavených společností CETIN a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne vystavení každé jednotlivé faktury

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny n a účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak. Dnem úhrady faktury (zaplacením fakturovaných nákladů) s e rozumí den připsání účtované (fakturované) částky na účet společnosti CETIN.

6.7 Sankce

7.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodloužení Stavebníka s úhradou některé částky, k jejíž úhradě j e dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebníka zaplatit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodloužení.

7.2. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.

7.3. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 a 7.2 tohoto článku, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případné náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

7.4. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 až 7.3. tohoto článku, trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení o ní některou ze stran či oběma stranami.

Či. 8 Kontaktní osoby

a) Za CETIN :

v e věcech smluvních Ludmila Uhrová funkce : specialista pro výstavbu sítě Morava

v e věcech technických Petr Bílek funkce :specialista p ro výstavou sítě - přístupová síť

b) Za stavebníka:

ve věcech smluvních: Ing. František Kučera funkce : starosta města

Ladislav Med - místostarosta

ve věcech technických: Ing. Jan Menhard. funkce : technik

ČI. 9 Odstoupení od smlouvy

9.1 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou některé platby dle této smlouvy a toto prodlení trvá déle než 60 dní, poruší Stavebník smlouvu podstatným způsobem a společnost CETIN je oprávněna od této smlouvy odstoupit nejpozději do 80. dne prodlení.

9.2 Pokud výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu je Stavebník oprávněn odstoupit od této smlouvy do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle ČI. 5 bodu 5.3 této smlouvy.

9.3 V případě, že dojde k odstoupení dle bodu 9.1 nebo 9.2 tohoto článku je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této smlouvy.

Čl. 10 Rozvazovací podmínka

10.1. Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy v e smyslu ustanovení § 648 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.

10.2. Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. Zánikem smlouvy touto rozvazovací podmínkou není dotčeno právo společnosti CETIN n a zaplacení smluvní pokuty dle Čl. 7 bodů 7.1.až 7.4. této smlouvy, a tomu odpovídající povinnost Stavebníka tuto pokutu zaplatit. Právo n a náhradu škody zůstává zachováno. V případě, že dojde k zániku smlouvy touto rozvazovací podmínkou j e Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této smlouvy.

Čl. 11 Závěrečná ustanovení

11.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření.

11.2. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, s e řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v e znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

11.3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

11.4. Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští.

11.5. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

11.6. Veškerá korespondence mezi smiuvními stranami bude zasílána doporučené n a adresy uvedené v hlavičce této smlouvy nebo na adresy elektronické pošty uvedené v Čl. 8 této smlouvy, ustanovení § 573 občanského zákoníku se neuplatní.

11.7. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím s e předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11.8. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku n a tuto smlouvu,

11.9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly v e smlouvě ujednat, a které považují z a důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný p o uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

11.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky n a uzavření této smlouvy, a ni když podstatně nemění podmínky nabídky.

11.11. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

11.12. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy

11.13. Tato smlouva je vyhotovena v e dvou originálech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města na schůzi Č. 47/18/2017/R dne 18.1.2017

Přílohy:

1. Cenový a technický návrh Překládky
2. Specifikace nákladů
3. Specifikace první etapy Překládky
3. Vzor dohody o převodu práv z územního rozhodnutí

V Brně dne 7 -02- 2017

V Pelhřimov... dne 14.2.2017

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.:
Ing. Zdeněk Šulc, M B A
manažer, Výstavba pevné přístupové sítě

Stavebník : Ing. František Kučera
stž

...../
Ladislav Med
místostarosta města

Technická zpráva

Název: VPIC Pelhřimov okr.křižovatka Tř.Legíí

Stručný popis:

Akce řeší přeložení tlk.vedení z prostoru budoucího kruhového objezdu v Pelhřimově. Budou přeloženy tyto kabely 2x DCKO 7RP U+108DM -kabelová vložka 11 Om kabelem F L E 100XN 0,8 +1 IOm F L E 10XN 0,8-dle provozu musí být zachován celý profil, DCKO 61DM 0,9 - kabelová vložka 1 IOm kabelem F L E 50XN 0,8 a kabel TCKOPV 600p 0,5 kabelová vložka 1 IOm kabelem F L E 300XN 0,6, Spojka budou použity X A G A . Přechod přes komunikaci bude v PVC 1 IOmm + náhradní chránička. Přechody a spojky osazeny markery

PD-Ano

Geo -Ano

VBŘ-Ano

GP-Ano

ÚR zajistí investor


Stavebník: Město Pelhřimov

ÚR zajistí stavebník

Kontakt na projektanta :Ing. Martin Líska, Nad Žlábkem 3757,580 01 Havlíčkův Brod

Tel.: 605530859, martin.liska.hb@tiscali.cz

Kontakt na stavebníka: Ing. Jan Menhard, investiční referent, Telefon : 565 351 482

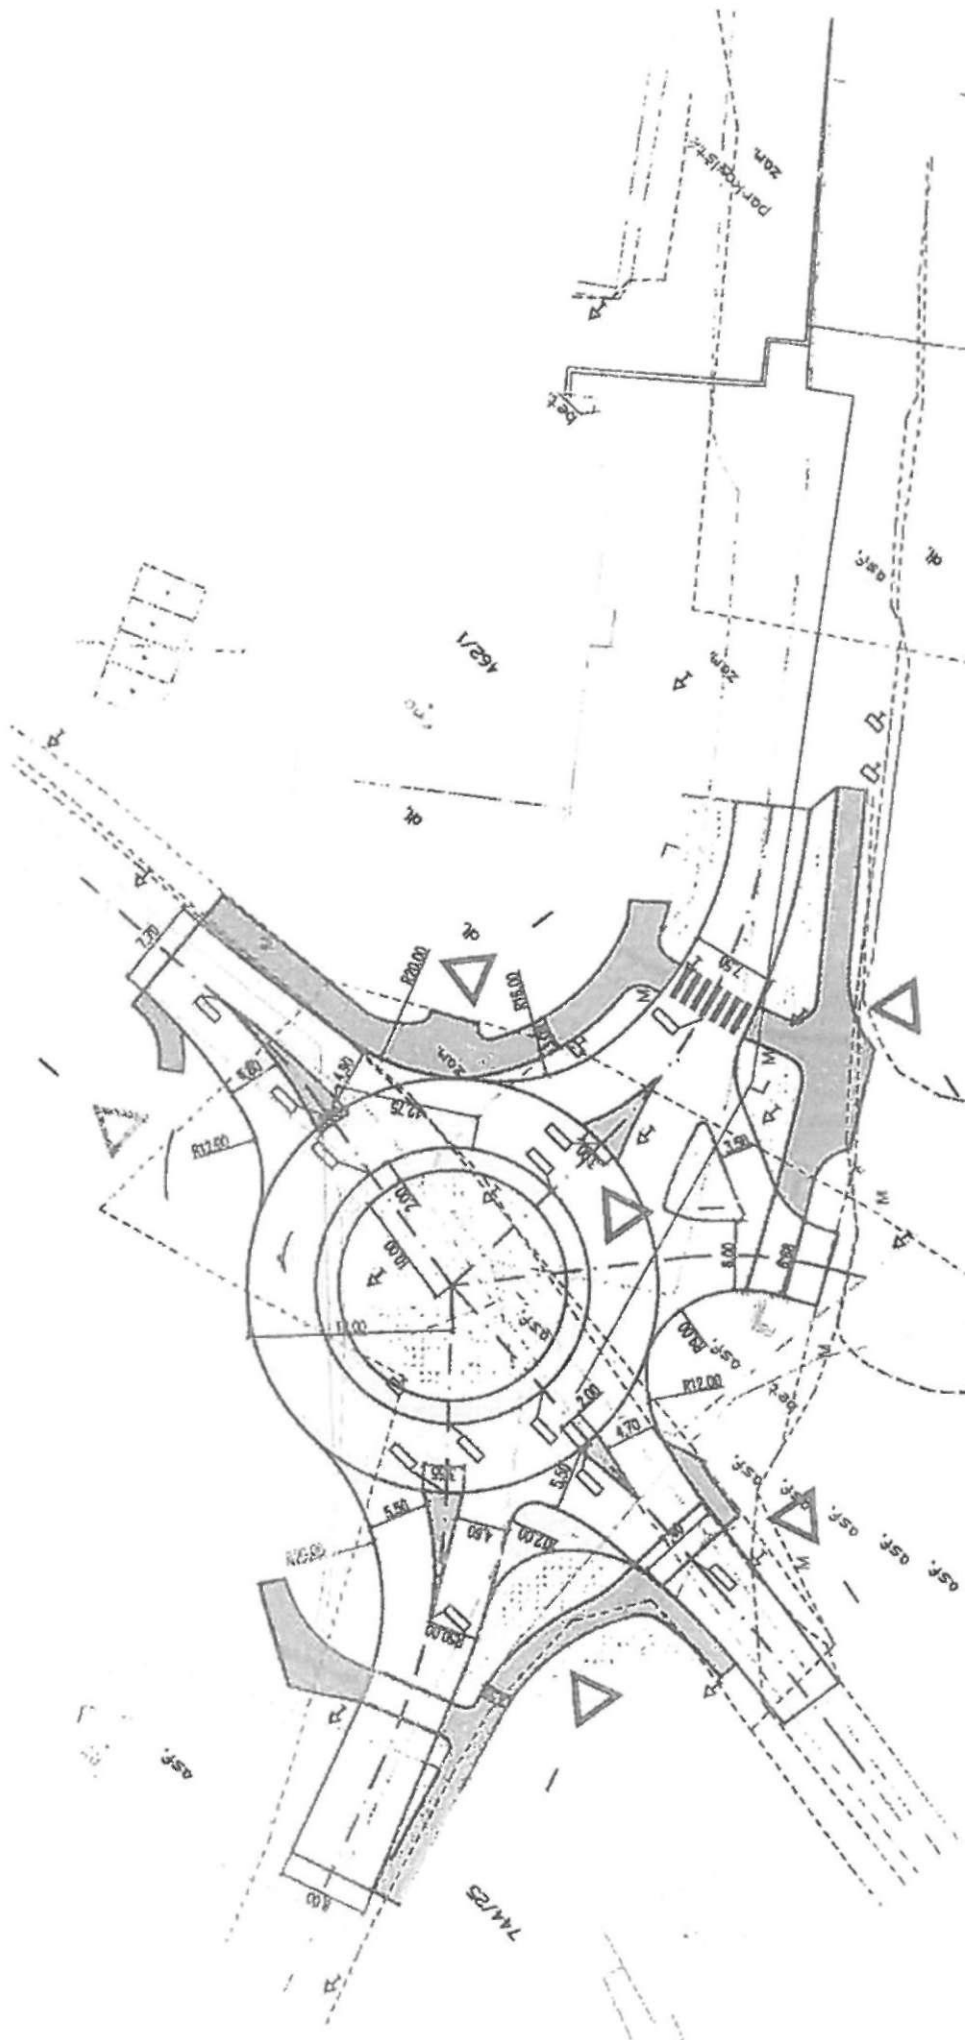

» R "i:

Č1

r.

5/0/8_Pod_Kalvárii
PELH712
xHELH131/» 2&1-40

2x 3 m TK2

7m
5xPVC 110mm

9 m

5xPVC110mm 61

FLE60XN0.8-110m 2x XAGA 75/15
FLE 100XN 0,8 -110m 2x XAGA 100/25
FLE 100XN 0,8 -110m 2xXAGA 100/25
FLE10XN 0,8 -110m
FLE 300XN 0.8 -110m 2x XAGA 125/30

My6AI_P(XI_K&Ivár1'
PELH708
XPELH707/1.2/1-10

5OW

tI_Kino
PLLM8C3
xPř.L;-]MR(Pe:h.-iioi'28 :;/61-70

VPIC Pelhřimov okr.křižovatka Tř.Legii - specifikace nákladů .příloha č.2

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP - Východ - TEM - ST AND. - 2016.10

Název stavby: VPIC Pelhřimov okr.křižovatka Tř.Legii

Číslo SPP prvku:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	24 618,28 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	58 013,69 Kč
MONTÁŽ	82 988,17 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	9 190,72 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 851,45 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REAUZACE	8 616,51 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE	292 093,18 Kč

Celkové náklady: 477 372,00 Kč

Seznam položek			
Číslo SAP	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA			
958210	Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 443,48 Kč
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě	1.00 ks	20174,80 Kč
ZEMNÍ PRÁCE			
954970	Pokládka PE nebo vrapované chránicky	80.00 m	1185,60 Kč
952368	Pokládka žlabů TK2J2N	6.00 m	444,36 Kč
954974	Povrchy nad rámeč zámková dlažba	8.00 m2	4 858,24 Kč
955577	Rýha v chodníku 35/50-70	44.00 m	18 986,88 Kč
952360	Rýha v chodníku litý beton 35/50-70	3.00 m	1 730,76 Kč
952362	Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70	16.00 m	8 097,12 Kč
952345	Rýha v trávě 35/70-100	22.00 m	6 082,78 Kč
955570	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	15.00 m	16 153,95 Kč
955052	Vytyčení trasy ve volném terénu	120.00 m	474,00 Kč
MONTÁŽ			
952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	4.00 ks	513,48 Kč
952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	554.00 ks	16 415,02 Kč
952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	554.00 ks	10 941,50 Kč
952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	4.00 ks	276,52 Kč
952647	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	4.00 ks	513,48 Kč
954999	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	558.00 ks	11 020,50 Kč
955268	Montáž podzemní tratě síťové metalické	1.00 ks	12400,37 Kč
955282	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	8.00 ks	11 059,36 Kč
954990	Montáž úložných kabelů do 15 XN	110.00 m	1 846,90 Kč
954992	Montáž úložných kabelů do 300 XN	330.00 m	9 777,90 Kč
954991	Montáž úložných kabelů do 50 XN	110.00 m	2 281,40 Kč
958469	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	3 720,00 Kč
958556	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 221,74 Kč

GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE

955198	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	4 616,30 Kč
956286	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	20.00 m	377,80 Kč
956285	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevn;	1.00 ks	4 196,62 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313	Uzavření smi. o SB o VBŘ	1.00 ks	1 851,45 Kč
--------	--------------------------	---------	-------------

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

954830	Projednáni Smlouvy o zřizeni věcného břemene náhrada za VBŘ - oddhadovaná	1.00 ks	5 000,00 Kč
--------	--	---------	-------------

Přesná výše náhrad za zřizeni služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřizeni služebnosti se všemi vlastníky dotčených ílemovitostí.

955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	1 999,57 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	1 616,94 Kč

Číslo SAP	Limitka materiálu Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE			
303918	Deska krycí plast. 300x1000 mm	85.00 ks	3 114,40 Kč
303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	30.00 m	111,30 Kč
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	85.00 m	362,10 Kč
300131	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,8	220.00 m	121437,80 Kč
300127	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,8	110.00 m	7 108,20 Kč
300124	Kabel plastový TCEPKPFLE 300x4x0,6	110.00 m	103 220,70 Kč
300130	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,8	110.00 m	30 287,40 Kč
302550	Mini Marker 14013M Ball	6.00 ks	1420,92 Kč
312425	Modul konektor. 9700-10P	118.00 ks	3 465,66 Kč
305356	Poklop žlabu beton 50x23x6 cm k TK 2	12.00 ks	628,08 Kč
320313	Souprava odbočovací BOKT-5L-160/42-200/50	2.00 ks	1 368,38 Kč
312889	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	2.00 ks	1462,48 Kč
303501	Spojka plastová 110/94 mm	10.00 ks	335,00 Kč
320294	Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460	4.00 ks	3 224,96 Kč
320295	Spojka smršťovací XAGA 500-125/30-460	2.00 ks	2 421,90 Kč
302672	Trubka PE 110/6,3/6000mm	14.00 ks	10 550,68 Kč
303465	Víčko plastové trubky 110/100 mm	4.00 ks	81,68 Kč
305232	Žlab kabelový beton 100x23x19 cm TK 2	6.00 ks	1491,54 Kč

VPIC Pelhřimov okr.křižovatka Tř.Legii - specifikace nákladů_dflčí fakturace_PD

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP - Východ - TEM - STAND. - 2016.10

Název stavby: VPIC Pelhřimov okr.křižovatka Tř.Legii

Číslo SPP prvku:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA 24 618,28 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 1851,45 Kč

Celkové náklady: 26 469,73 Kč

Číslo SAP	Seznam položek Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA			
958210	Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 443,48 Kč
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě	1.00 ks	20174,80 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavřenísmi.oSBoVBŘ	1.00 ks	1851,45 Kč

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ Z ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 - Žižkov

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623

Zastoupená Ludmilou Uhrovou, specialistou pro výstavbu sítě dle pověření

na straně jedné

(dále jen „Nabyvatel“)

a

IČ:.....DIČ:.....

se sídlem.....

zapsaná v obchodním rejstříku.....o d....., vložce.....

zastoupena jednatelem.....

na straně druhé

(dále jen „Převodce“)

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby („dále jen „tato dohoda“).

au.

Převodce je na základě rozhodnutí o umístění stavby „.....“ kteréžto bylo vydáno dne.....(kým) pod čj.....a nabylo právní moci dne..... (dále jen „Rozhodnutí o umístění stavby“) oprávněn k umístění.....(dále jen „Stavba“/ event. „Stavební objekt“).

Předmětem převodu jsou některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby a to právo k umístění Stavby (event. „Stavebního objektu“) za podmínek v citovaném rozhodnutím stanovených, a dále s ním související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby (event. „Stavebního objektu“), tak jak jsou stanoveny v Rozhodnutí o umístění stavby.

čl. II.

Převodce ke dni podpisu této dohody převádí na Nabyvatele některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to toliko právo k umístění Stavby (event. „Stavebního objektu“)

z a podmínek v Rozhodnutí o umístění stavby stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou z e stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto Rozhodnutí o umístění stavby stanoveny.

čl. III.

Převodce a Nabyvatel prohlašují, že si celý text této dohody pozorně přečetli, plně mu rozumějí a bezvýhradně s ním souhlasí. Připojením svých vlastnoručních podpisů stvrzují, že text této dohody věrně vyjadřuje jejich pravou, vážnou a svobodnou vůli a že tato dohoda není uzavírána za nápadně nevýhodných podmínek pro kteréhokoliv z nich.

čl. IV.

- (1) Tato dohoda byla sepsána v e dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží Převodce a po jednom Nabyvatel.
- (2) Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Převodcem a Nabyvatelem.

V Brně dne V dne.....

za společnost
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Ludmila Uhrová
specialista pro výstavbu sítě
