

## Smlouva o dílo

(dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

**Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.,**

IC: 61389030,

DIČ: CZ61389030,

se sídlem Rozvojová 263, 165 02 Praha 6

instituce zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR,

zastoupena RNDr. Martinem Vágnerem, CSc., ředitelem

(dále jen jako „*objednatel*“)

a

**SVITAP J. H. J. spol. s r. o.,**

IC: 46509755,

DIČ: CZ46509755,

se sídlem Kijevská 423/8, Předměstí, 568 02 Svitavy,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C

2327, zastoupena jednatelem,

e-mail:

(dále jen jako „*zhotovitel*“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen jako „*smluvní strany*“ či každý samostatně jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo  
(tato smlouva včetně všech příloh, které tvoří její nedílnou součást, dále jen jako „*smlouva*“)

### I.

#### Předmět závazku

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve výstavbě ochranné konstrukce pěstební plochy - typové mobilní stanové konstrukce o půdorysných rozměrech 12.000 mm x 25.000 mm a výšce 6.054 mm, tvořené z hliníkových profilů kotvených do země a kompletně opláštěné snímatelnou sítovinou – protikroupovou sítí, které je blíže specifikováno v **příloze č. 1** k této smlouvě – **technické specifikaci díla**, a to na místě vymezeném v **příloze č. 2 – situačním katastrálním výkresu**, které se nachází na pozemku parc. č. 1721/12 zapsaném na listu vlastnictví č. 2573 vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, pro katastrální území Holice u Olomouce, obec Olomouc (dále jen jako „*dílo*“ či „*stavba*“).
2. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré díly a součástky určené ke zhotovení díla budou nové a nepoužité.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu sjednanou v čl. II. této smlouvy.

### II.

#### Cena díla

1. Cena, kterou objednatel uhradí zhotoviteli za realizaci díla, činí celkem **750.000,-Kč** (slovy: *sedmsetpadesát tisíc korun českých*) bez DPH (dále jen jako „*cena*“). K ceně bude zhotovitelem vyčíslena a připočtena DPH, a to ve výši a za podmínek stanovených právními předpisy. Cena je blíže specifikována v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří **přílohu č. 3** této smlouvy. Cena je nicméně konečná a zahrnuje veškeré vedlejší náklady související s provedením díla včetně nákladů na dopravu, to však s výjimkou nákladů na elektrickou energii spotřebovanou při provádění díla v místě realizace, která jde k tíži objednatele.

2. Smluvní strany ujednaly, že (i) **část ceny díla ve výši 585.000,- Kč bez DPH** bude zaplacená na základě faktury vystavené zhotovitelem **po protokolárním předání části díla odpovídající první hlavní etapě** spočívající v dodání rozložené stanové konstrukce, tj. všech dílů určených k montáži stanové konstrukce včetně všech hliníkových profilů a spojů v pozinkované oceli objednateli, a to bez vad a nedodělků a (ii) **část ceny díla ve výši doplatku** do její výše dle čl. II., odst. 1. této smlouvy bude zaplacená na základě faktury vystavené zhotovitelem **po protokolárním předání kompletního díla** bez vad a nedodělků. Cena díla, resp. její příslušná část se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
3. Splatnost faktur nebude kratší než 14 dní ode dne doručení příslušné faktury objednateli. Každá faktura bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy. Obligatorní součástí každé z faktur bude rovněž předávací protokol k příslušné hlavní etapě díla, potvrzující, že daná hlavní etapa byla předána a převzata objednatelem bez vad a nedodělků. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v tomto odstavci, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit, aniž by se přitom dostal do prodlení se zaplacením ceny díla.
4. V případě, že bude objednatel v prodlení s úhradou ceny dle faktur vystavených v souladu s čl. II. odst. 2 a 3 této smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

### III. Provedení díla

1. Smluvní strany ujednaly, že dílo bude provedeno ve dvou etapách blíže definovaných **v příloze č. 3** k této smlouvě – cenové nabídce (jinde v této smlouvě také jen jako „**hlavní etapy**“ nebo každá samostatně jako „**hlavní etapa**“).
2. Zhotovitel je povinen dokončit **první hlavní etapu** a dodat objednateli rozloženou konstrukci, tj. všechny díly určené k montáži stanové konstrukce včetně všech hliníkových profilů a spojů v pozinkované oceli **nejpozději do 18. 12. 2020**, a to jejím dodáním do skladu objednatele na adrese: Šlechtitelů 31, Olomouc. Konkrétní termín a čas dodání rozložené konstrukce je zhotovitel povinen projednat s objednatelem nejpozději pět pracovních dnů před tímto dodáním. O předání a převzetí rozložené konstrukce sepiší smluvní strany předávací protokol.
3. Zhotovitel je dále povinen zahájit montážní práce, které jsou součástí **druhé hlavní etapy** na výzvu objednatele, zaslánou na e-mailovou adresu zástupce zhotovitele uvedenou v čl. X. odst. 1. této smlouvy, s tím, že zhotovitel zahájí práce na druhé hlavní etapě **nejpozději do 15 pracovních dnů** od odeslání tohoto oznámení. Výzva dle předchozí věty nicméně nebude zhotoviteli zaslána dříve než 4. 1. 2021 a nikoli později než 8. 3. 2021. Konkrétní termín a čas zahájení prací je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejpozději pět pracovních dnů před zahájením prací. Celou druhou hlavní etapu včetně příslušných montážních prací je zhotovitel povinen dokončit **nejpozději do 20 pracovních dnů** ode dne zahájení prací na druhé hlavní etapě. Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany ujednaly, že dokončením druhé hlavní etapy je současně míněno dokončení kompletního díla dle této smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že při stanovení doby provádění prací vzal v potaz možnost klimatických podmínek, které jsou v daném zeměpisném pásmu předvídatelné.
5. Montáž stavby jako součást **druhé hlavní etapy** bude v souladu s čl. I. odst. 1 této smlouvy prováděna na místě, které je vyznačeno v **příloze č. 2** k této smlouvě – situačním katastrálním výkresem (dále jen jako „**místo realizace**“). Zhotovitel v rámci sjednané ceny zajišťuje rovněž přepravu všech dílů rozložené konstrukce (dodaných v rámci první hlavní etapy) na místo realizace.
6. Zhotovitel odpovídá za řízení a koordinaci činností v místě realizace. Zhotovitel je povinen dodržet příslušné právní předpisy, technická pravidla, předpisy a normy (České republiky a EU) při provádění díla. Zhotovitel se zavazuje poskytnout kompletní stavební služby odpovídající nejmodernějším technologiím v době podpisu této smlouvy.

7. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli a jeho pracovníkům, stavebnímu doзору příp. dalším osobám přístup na místo plnění a k poskytnutí nezbytné součinnosti.
8. Zhotovitel si řádně prohlédl a zkontroloval místo realizace, jeho okolí, výše uvedené údaje a další informace, které jsou k dispozici, a je řádně seznámen se situací v místě realizace (typ a povaha místa) a s rozsahem a povahou prací dle smlouvy, zvláště pak s povahou místa plnění, tedy i s vlastním stavenišťem. Zhotovitel potvrzuje, že místo realizace splňuje veškeré předpoklady pro stavbu a není potřeba jeho dalších úprav ze strany objednatele, to však s **výjimkou** terénních úprav v podobě srovnání území do nivelety a zhutnění podloží v oblasti umístění kotvicích patek, které jsou podmínkou zahájení montážních prací prováděných v rámci druhé hlavní etapy.
9. Zhotovitel je při plnění svých povinností a závazků ohledně díla povinen postupovat s péčí řádného hospodáře a v souladu se všemi příslušnými právními předpisy a stavebními normami. Dílo provedené zhotovitelem bude plně v souladu s touto smlouvou a jeho jednotlivé prvky budou způsobilé k účelům, ke kterým je dílo určeno. Dílo zahrnuje veškeré práce, které vyplývají z této smlouvy nebo závazků zhotovitele.
10. Zhotovitel se zavazuje v co nejvyšší možné míře udržovat místo určené k provedení díla i jeho okolí v dobrém stavu, upravené a bez znečištění, včetně odpadového materiálu a odpadů. Zhotovitel se v tomto směru zavazuje zejména k provádění denního úklidu stavební činností znečištěných přístupových venkovních a vnitřních komunikací. Zhotovitel bere výslovně na vědomí a souhlasí, že je odpovědný za udržování místa realizace a přilehlých ploch v čistotě bez nebezpečných látek a čehokoliv, co by představovalo nebezpečí vzniku újmy na zdraví či škody na majetku nebo životním prostředí.
11. Zhotovitel se zavazuje poskytnout stavebnímu doзору neomezenou přítomnost na místě realizace (dále rovněž jako „**staveniště**“ ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/), a to po předchozím oznámení jeho vstupu na místo - staveniště, a to v kteroukoliv dobu. Zhotovitel je současně povinen umožnit stavebnímu doзору maximální součinnost a informovanost o průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob na staveniště a odcizení materiálu.

### ***Stavební dozor***

12. Stavební dozor je objednatelem zmocněn, aby za objednatele činil veškeré úkony související s technickým provedením díla včetně předání a převzetí staveniště, kontrolní činnosti a protokolárního převzetí díla.

### ***Stavební deník***

13. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník, do kterého budou zaznamenány práce jím prováděné a jejich postup. Objednatel a stavební dozor jsou oprávněni zaznamenávat do stavebního deníku jimi zjištěné nedostatky. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v listinné podobě a případně i v elektronické podobě, ke které umožní objednateli a stavebnímu doзору dálkový přístup pomocí sítě internet. Stavební deník v listinné podobě bude uložen na staveništi, a to na místě, které při předání staveniště společně určí stavební dozor a oprávněný zástupce zhotovitele.

### ***Předání Staveniště***

14. Ke dni zahájení montážních prací jako součástí druhé hlavní etapy předá stavební dozor zhotoviteli staveniště na základě protokolu o předání staveniště, ve kterém se mimo jiné vyznačí odběrové místo elektrické energie. Podpisem předávacího protokolu se má současně za potvrzené, že objednatel provedl řádně veškeré terénní úpravy a práce, které jsou podmínkou zahájení druhé hlavní etapy dle čl. III. odst. 8 (poslední věty) této smlouvy.

#### IV. Předání díla

1. Předání části díla odpovídající **první hlavní etapě** bude provedeno na základě předávacího protokolu potvrzujícího, že první hlavní etapa spočívající v dodání rozložené stanové konstrukce, tj. všech dílů určených k montáži stanové konstrukce včetně všech hliníkových profilů a spojů v pozinkované oceli byla dodána bez vad a nedodělků. S ohledem na povahu plnění v rámci první hlavní etapy nicméně bude objednatel při převzetí vycházet především ze soupisu dílů (určených k montáži stanové konstrukce) a schématu stanové konstrukce s popisem umístění jednotlivých dílů předložených zhotovitelem před předáním.
2. Před potvrzením dokončení **druhé hlavní etapy** a převzetím kompletního díla provedou objednatel a zhotovitel společnou kontrolu díla, aby se dohodli na odstranění případného nesouladu díla se smlouvou či jakýmkoliv dalšími podklady, zejména pak s přílohami smlouvy, které tvoří její nedílnou součást. Tyto závady se uvedou v seznamu závad (dále jen „*seznam závad*“).
3. Zhotovitel dokončí veškeré nedokončené práce podle seznamu závad v co nejkratším termínu, nejpozději však do 10 pracovních dní ode dne sepsání seznamu závad.
4. Kompletní dílo se má za předané na základě protokolu o předání díla, ve kterém se uvede, že dílo bylo řádně prohlédnuto stavebním dozorem a na díle nebyly shledány žádné vady.
5. Objednatel je oprávněn (nikoliv povinen) přijmout dílo, resp. každou z jeho hlavních etap, s vadami, které nemají vliv na užívání díla a neohrožují podstatným způsobem jeho užívání. Ustanovením předchozí věty není dotčena povinnost zhotovitele odstranit vady a nedostatky díla, které jsou uvedené v seznamu závad či v protokolu o předání, ve stanovené lhůtě.

#### V. Přechod nebezpečí škody a vlastnictví k dílu

1. Není-li dále stanoveno jinak, platí, že každá součást prací, zařízení a materiálů, která je součástí díla se stává vlastnictvím objednatele v okamžiku, kdy je fyzicky zabudována do díla. Rozložená konstrukce, tj. všechny díly určené k montáži stanové konstrukce včetně všech hliníkových profilů a spojů v pozinkované oceli, která byla objednateli dodána v rámci první hlavní etapy, se stává vlastnictvím objednatele již okamžikem dodání této rozložené konstrukce na místo dle čl. III. odst. 2 této smlouvy a zaplacením první části ceny dle čl. II. odst. 2 této smlouvy.
2. Dílo a všechny jeho části jsou vždy vlastnictvím objednatele a žádná jiná osoba k němu nemá žádná práva. Na díle ani žádné jeho části nevážnou žádná zástavní práva zřízená zhotovitelem. Zhotovitel zajistí, že všechny smlouvy s případnými subdodavateli budou obsahovat obdobné ustanovení.
3. Na objednatele přechází nebezpečí škody odpovídající příslušné hlavní etapě, až v okamžiku potvrzení protokolu o předání dané hlavní etapy. Do té doby nese nebezpečí škody na stavbě zhotovitel.

#### VI. Smluvní pokuta za prodlení se zhotovením díla

1. Pokud nedoručí ke splnění první hlavní etapy, tj. dodání rozložené konstrukce, a/nebo k dokončení kompletního díla ke stanovenému datu, uhradí zhotovitel objednateli na jeho písemnou žádost smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení (dále jen jako „*smluvní pokuta*“); tím není dotčeno ustanovení čl. IV. odst. 3 této smlouvy, pokud se jedná o dokončení kompletního díla. V případě, že však zhotovitel nedodrží lhůtu dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, bude příslušná smluvní pokuta počítána ode dne, který byl původně touto smlouvou určen k dokončení kompletního díla.

2. Zhotovitel dále uhradí smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady díla v termínu určeném dle této smlouvy a/nebo způsobem v této smlouvě stanoveným.
3. Nepředá-li zhotovitel staveniště a již provedené dílo objednateli v případě odstoupení od smlouvy do 10 dnů dle čl. IX. odst. 5 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli na jeho písemnou žádost smluvní pokutu.
4. Jakýmkoliv ustanovením o právu objednatele na smluvní pokutu není dotčeno jeho právo na náhradu škody.

## **VII. Pojištění**

1. Zhotovitel je dále povinen mít na svůj náklad uzavřenu pojistnou smlouvu, která bude kryt případnou škodu vzniklou činností zhotovitele při provádění díla, a to škodu na majetku, zdraví osob a pojištění podnikatelského rizika pro případ přerušování podnikání, přičemž pojistné plnění musí být sjednáno ve výši minimálně 500.000,-Kč na každý rozsah uvedeného pojistného rizika. Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojištění na základě této pojistné smlouvy bylo udržováno po celou dobu provádění díla a délky záruční doby k dílu.
2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu uvedenou v čl. VII. odst. 1. smlouvy ke dni podpisu smlouvy.

## **VIII. Záruka na dílo**

1. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že dílo bude provedeno řádným a řemeslně profesionálním způsobem dle této smlouvy. Pokud objednatel a zhotovitel neodsouhlasí písemně jinak, bude materiál za provedení díla nový.
2. Zhotovitel je před dokončením díla povinen na vlastní náklady odstranit a/nebo opravit veškeré drobné vady díla, které lze zjistit při běžné prohlídce, a to neprodleně poté, co mu bude existence takových vad oznámena objednatelem nebo stavebním dozorem. Pokud zhotovitel neodstraní a/nebo neopraví tyto vady neprodleně nebo dle termínů uvedených v seznamu závad či protokolu, je objednatel na základě předchozího oznámení zhotoviteli oprávněn odstranit nebo opravit vady sám nebo odstranění vad nebo oprav zajistit, a to na náklady zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen k náhradě škody vůči objednateli za veškeré vady díla. Záruční lhůta na dílo činí 24 měsíců. Záruční lhůta na dílo se počítá od data předání kompletního díla bez vad a nedodělků. Záruka se prodlužuje o dobu, která uplyne ode dne uplatnění reklamace do odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka dle této smlouvy.
4. Smluvní strany tímto souhlasí, že zhotovitel bude mít při dodání díla a po dobu výše stanovené záruční lhůty (dále jen „záruční doba“) povinnost bezplatně odstranit veškeré vady díla kromě vad způsobených v důsledku běžného opotřebení nebo objednatelem (dále jen „záruka“). Smluvní strany výslovně ujednaly, že se poskytnutá záruka v uvedeném rozsahu vztahuje rovněž na všechny části rozložené konstrukce, která bude objednateli dodána v rámci první hlavní etapy.
5. Zhotovitel se zavazuje přijímat písemná oznámení o vadách, na které se vztahuje záruka dle smlouvy, přičemž za písemná oznámení o vadách bude považováno též oznámení na e-mail zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. I oznámení o vadách odeslané objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas odeslané. Objednatel je povinen písemně oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistí. Zhotovitel je povinen vznést námitku proti takovému oznámení nejpozději do deseti (10) dnů od doručení oznámení o vadě. Pokud tak zhotovitel neučiní, platí, že plně souhlasí s rozsahem a druhem vady uvedené v oznámení.

6. Zhotovitel se zavazuje vady, na něž se vztahuje záruka dle smlouvy, odstranit v termínech písemně dohodnutých s objednatelem při zahájení řešení. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, činí maximální termín pro odstranění vady 14 pracovních dnů ode dne následujícího po dni oznámení vady. Nezapočne-li zhotovitel s prací na odstranění vady díla nejpozději ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne oznámení vady, je objednatel oprávněn zajistit odstranění díla u jiného dodavatele, a to plně na náklady zhotovitele.
7. Zhotovitel a jeho nástupci či postupníci jsou vázáni zárukou po celou záruční dobu.

## **IX. Porušení a odstoupení**

1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě prodlení objednatele s platbou ceny díla, popř. její části, na základě faktur vystavených dle čl. II. této smlouvy o více než 30 dnů.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v následujících případech:
  - a) Zhotovitel je v prodlení oproti jakýmkoli lhůtám či uzávěrkám stanoveným v této smlouvě o více než patnáct (15) dnů;
  - b) Zhotovitel bez písemného souhlasu objednatele přeruší nebo pozastaví provádění díla o více než 10 dnů;
  - c) Zhotovitel opakovaně porušuje předpisy vztahující se k bezpečnosti práce a požární ochraně a tato porušení jsou zaznamenána ve stavebním deníku;
  - d) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo byly učiněny úkony k zahájení likvidačního řízení ohledně zhotovitele, neprokáže-li zhotovitel objednateli, že je takový návrh nebo úkon svévolný a neodůvodněný.
3. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a stává se účinným ke dni, v němž je oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé smluvní straně.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstanou nadále v platnosti ustanovení smlouvy, kterými se řídí odpovědnost za vady, záruka, ustanovení o výši ceny, smluvních pokutách, vlastnictví díla, náhradách škody, stanovených v této smlouvě, včetně jejich příslušných příloh.
5. Dojde-li k odstoupení od této smlouvy v průběhu druhé hlavní etapy, Objednatel převezme a zhotovitel předá jak veškeré provedené dílo, tak staveniště do deseti (10) dnů po datu účinnosti odstoupení od této smlouvy. Převzetí staveniště bude zaznamenáno ve stavebním deníku a v protokolu o předání staveniště. Smluvní strany vyhotoví protokol o tomto předání a převzetí díla či jeho části a dodrží požadavky tohoto protokolu o předání a převzetí díla, uvedou detailně stav díla na základě jeho dokončení a zhodnocení, určení vad a nedokončených součástí, včetně způsobu jejich nápravy/dokončení. V případě odstoupení od smlouvy bude mít objednatel právo, i s ohledem na odstranitelné vady, žádat o snížení ceny místo nápravy vad.

## **X. Stavební dozor objednatele a zástupci zhotovitele**

1. Níže jsou uvedeni řádně oprávnění zástupci stavebního dozoru objednatele a zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni měnit své zástupce a jejich náhradníky kdykoliv, pokud o tom předem písemně uvědomí druhou smluvní stranu.
- Stavební dozor objednatele:

- Zástupce objednatele:
  
- Zástupce zhotovitele:

## **XI. Ostatní závazky zhotovitele**

1. Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen obdobnou povinností smluvně zavázat také své subdodavatele, které bude využívat k zajištění zhotovení díla dle této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti z této smlouvy na jinou osobu dle ustanovení § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (ve znění pozdějších předpisů).

## **XII. Závěrečná ustanovení**

1. Celá tato smlouva se řídí a je vykládána v souladu s platným právem České republiky, zejména ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (ve znění pozdějších předpisů). Tato smlouva nahrazuje veškerá ujednání smluvních stran týkajících se jejího předmětu, a to ústní i písemná.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst si nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy a nárok na náhradu škody, který mu vznikl zaviněným jednáním zhotovitele oproti nároku zhotovitele na uhrazení ceny díla.
3. Smluvní strany mají zájem vyřešit vzájemně každý spor nebo neshodu smírně, neprodleně a co nejefektivněji z hlediska nákladů za daných okolností; kromě toho se smluvní strany dohodly, že tam, kde to bude možné, nebude spor ani neshoda překážkou v realizaci díla.
4. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata smlouvy.
5. Pokud by některé ustanovení této smlouvy bylo neplatným či se stalo neplatným, pak to zásadně nezpůsobuje neplatnost této smlouvy jako celku či jiných jejích ustanovení jako celku. Smluvní strany nahradí po vzájemné dohodě případné neplatné ustanovení novým ustanovením, které se bude v nejbližší možné míře blížit ustanovení nahrazovanému s přihlédnutím ke smyslu a účelu této smlouvy. Nedojde-li k dohodě, nahradí takové ustanovení na návrh některé ze stran soud při splnění podmínek daných k tomu příslušnými právními předpisy.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti ke dni uveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily, souhlasí s ním, a proto tuto smlouvu uzavírají připojením svých podpisů.
8. Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou shodných stejnopisech v českém jazyce. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

V Praze, dne

Ve Svitavách, dne

.....  
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.  
RNDr. Martin Vágner, CSc., ředitel

.....  
SVITAP J. H. J. spol. s r. o. ,  
jednatel

*Přílohy:*

- č. 1 – *technická specifikace díla (výkres konstrukce, detail kotvení profilů stanu do země)*
- č. 2 - *katastrální situační výkres,*
- č. 3 – *cenová nabídka s detailním popisem hlavních etap provádění díla.*





SVITAP J. H. J. spol. s r.o.  
Kijevská 423/8, 568 02 Svitavy  
Česká republika

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C. vložka 2327

IČO: 465 09 755, DIČ: CZ 465 09 755  
Bankovní spojení: KB Svitavy, č.ú.: 7300591/0100



[www.svitap.cz](http://www.svitap.cz)

Ústav experimentální botaniky A V ČR

VYŘIZUJE:

TEL./FAX:

E-MAIL:

MÍSTO/DATUM:

Svitavy 04.11.2020

Cenová nabídka na dodávku a montáž stanu o partystanové konstrukci v rozměrech 12\*25m se 4m boční výškou:

1. hlavní etapa – dodávka konstrukce v rozloženém stavu

- 579.000Kč – konstrukce, hliníkové profily + spoje v pozinkované oceli
- 6.000Kč – doprava
- termín nejpozději do 18.12.2020

2. hlavní etapa – dodávka síťoviny + montážní práce

- 60.000Kč – montáž konstrukce dodané v 1. hlavní etapě
- 16.000Kč – dodávka síťoviny v množství potřebném pro opláštění konstrukce z 1. hlavní etapy – protikroupová síť šedá, velikost oka 2,9\*8mm, stínění 13%, síla vlákna 0,32mm, materiál 100%HDPE – UV stabilizovaný, typ vlákna krystal podélně / černá příčně
- 89.000Kč – montáž síťoviny včetně doplňujících úchyťových prvků a vratových rámců
- termín v rozmezí 04.01.2021 – 16.04.2021

Nabídka je platná 45 dní od data vystavení.

Krodes s.r.o.  
 Cerhýnky 136  
 Cerhenice 28 102  
 Czech Republic


**Jiří Nedbal: +420 603 265 970**  
 krodes@email.cz  
**www.krodes.com**




# Gray

CZ	ENG	DE	RUS
Protikroupová síť	Anti-hail net	Hagelschutz netz	Сетки для защиты от града
Šedá	Gray	Grau	серый
Velikost oka 2,9x8mm	Mesh 2,9x8mm	Masche 2,9x8mm	размер ячеи 2,9x8mm
Stínění 13%	Shading 13%	Beschattung 13%	Щит 13%
Síla vlákna 0,32mm	Monofil 0,32mm	Monofil 0,32mm	Толщина волокна составляет 0,32 мм.
Materiál 100% HDPE - UV stabilizovaný	100% HDPE - UV stabilized	100% HDPE - UV Stabilisierung	материал 100% HDPE - УФ-стабилизированного
Typ vlákna krystal podélně/ černá příčně	Type of fiber crystal /black cross	Art der Faser Kristall längs / quer schwarz	Тип волокна кристалл вдоль / поперек черный


BOČNÍ POHLED

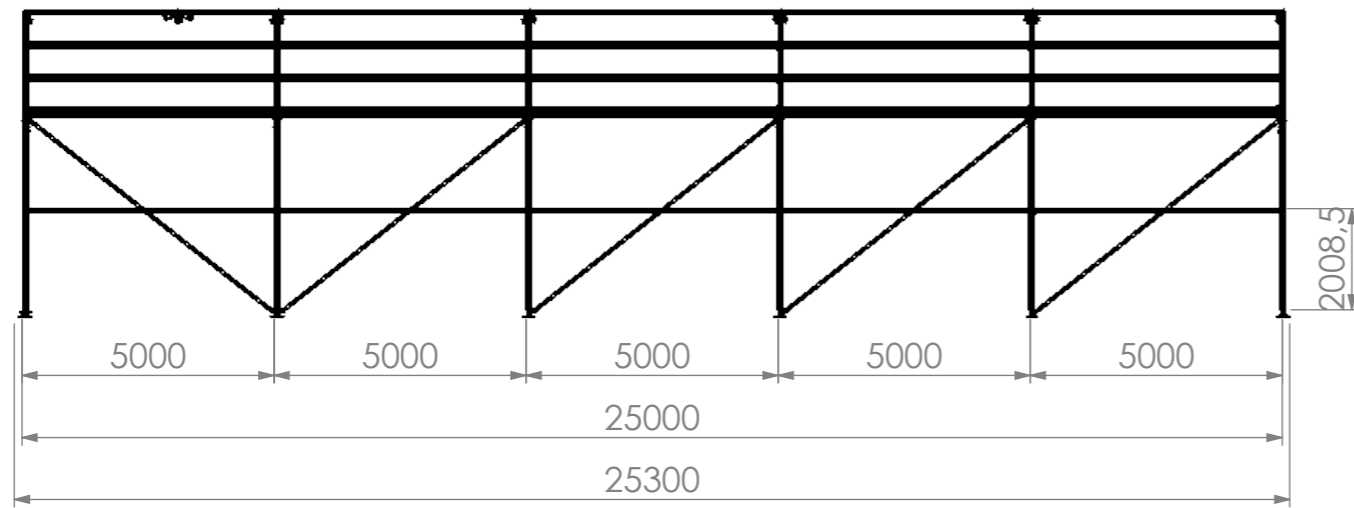


ZADNÍ POHLED

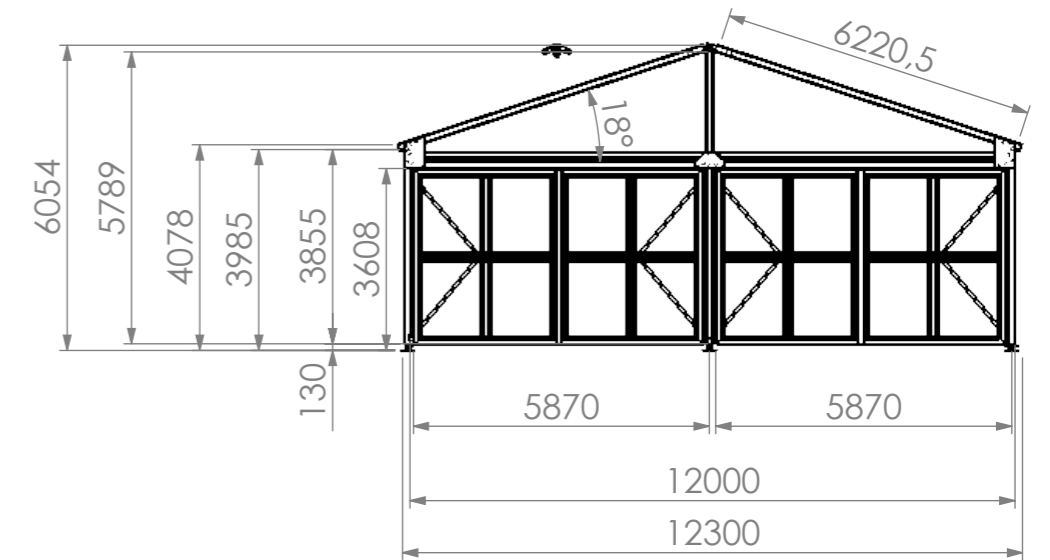

PŮDORYS

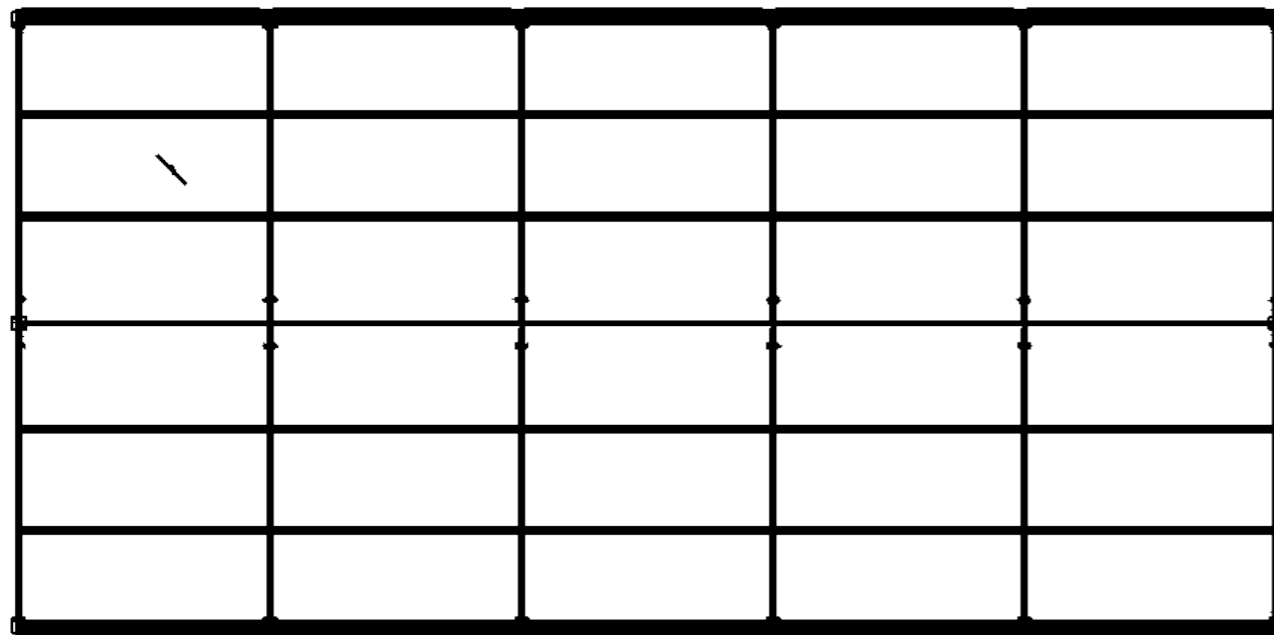

ČELNÍ POHLED

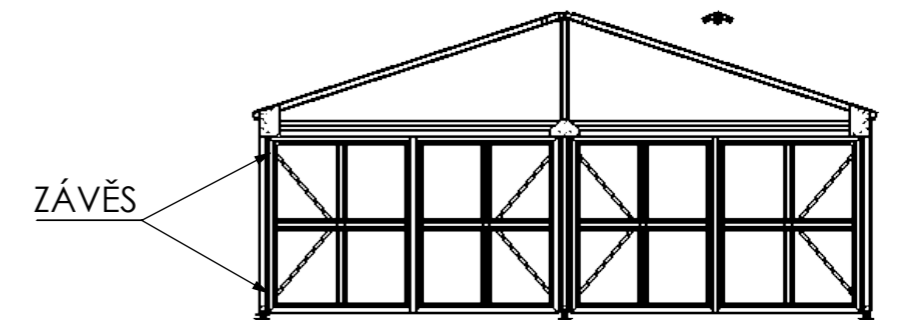

NÁHLED 3D NA LISTĚ Č.2

POZ.	MN OŽ.	ČÍSLO VÝKRESU	POLOTOVAR	MATERIAL	NORMA	NÁZEV
1	1	SESTAVA RÁMU ČELNÍ				
2	4	SESTAVA RÁMU STŘEDOVÝ				
3	25	SESTAVA VZPĚRY STŘEŠNÍ				
4	10	SESTAVA OKAPOVÝ PROFIL 15m				
5	10	SESTAVA VZPĚRY BOČNÍ				VZPĚRA BOČNÍ 15m
6	4	PAŽDÍK ŠTÍTOVÝ 15m		HLINÍK		
7	10	SESTAVA ZAVĚTROVÁNÍ 15m				
8	1	ZrcadleníSESTAVA RÁMU ČELNÍ				



KRESLIL / DRAWN BY: SCHVÁLIL / RELEASED BY: PĚRNOST / ACCURACY: ISO 2768-mK TOLERANCE / TOLERANCE: PROMÍTÁNÍ / PROJECTION ISO E MĚŘÍTKO / SCALE 1:150  
 PETR PAČLÍK DATUM / DATE: 30.09.2020 STAV / STATUS: Under Change


NÁZEV / NAME  
**KONSTRUKCE 12x25x4**

ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING No. REVIZE / REVISION

Výkres 1  
 A

POČET LISTŮ / PAGES 1/2 HMOTNOST / WEIGHT: 3200.69 Kg



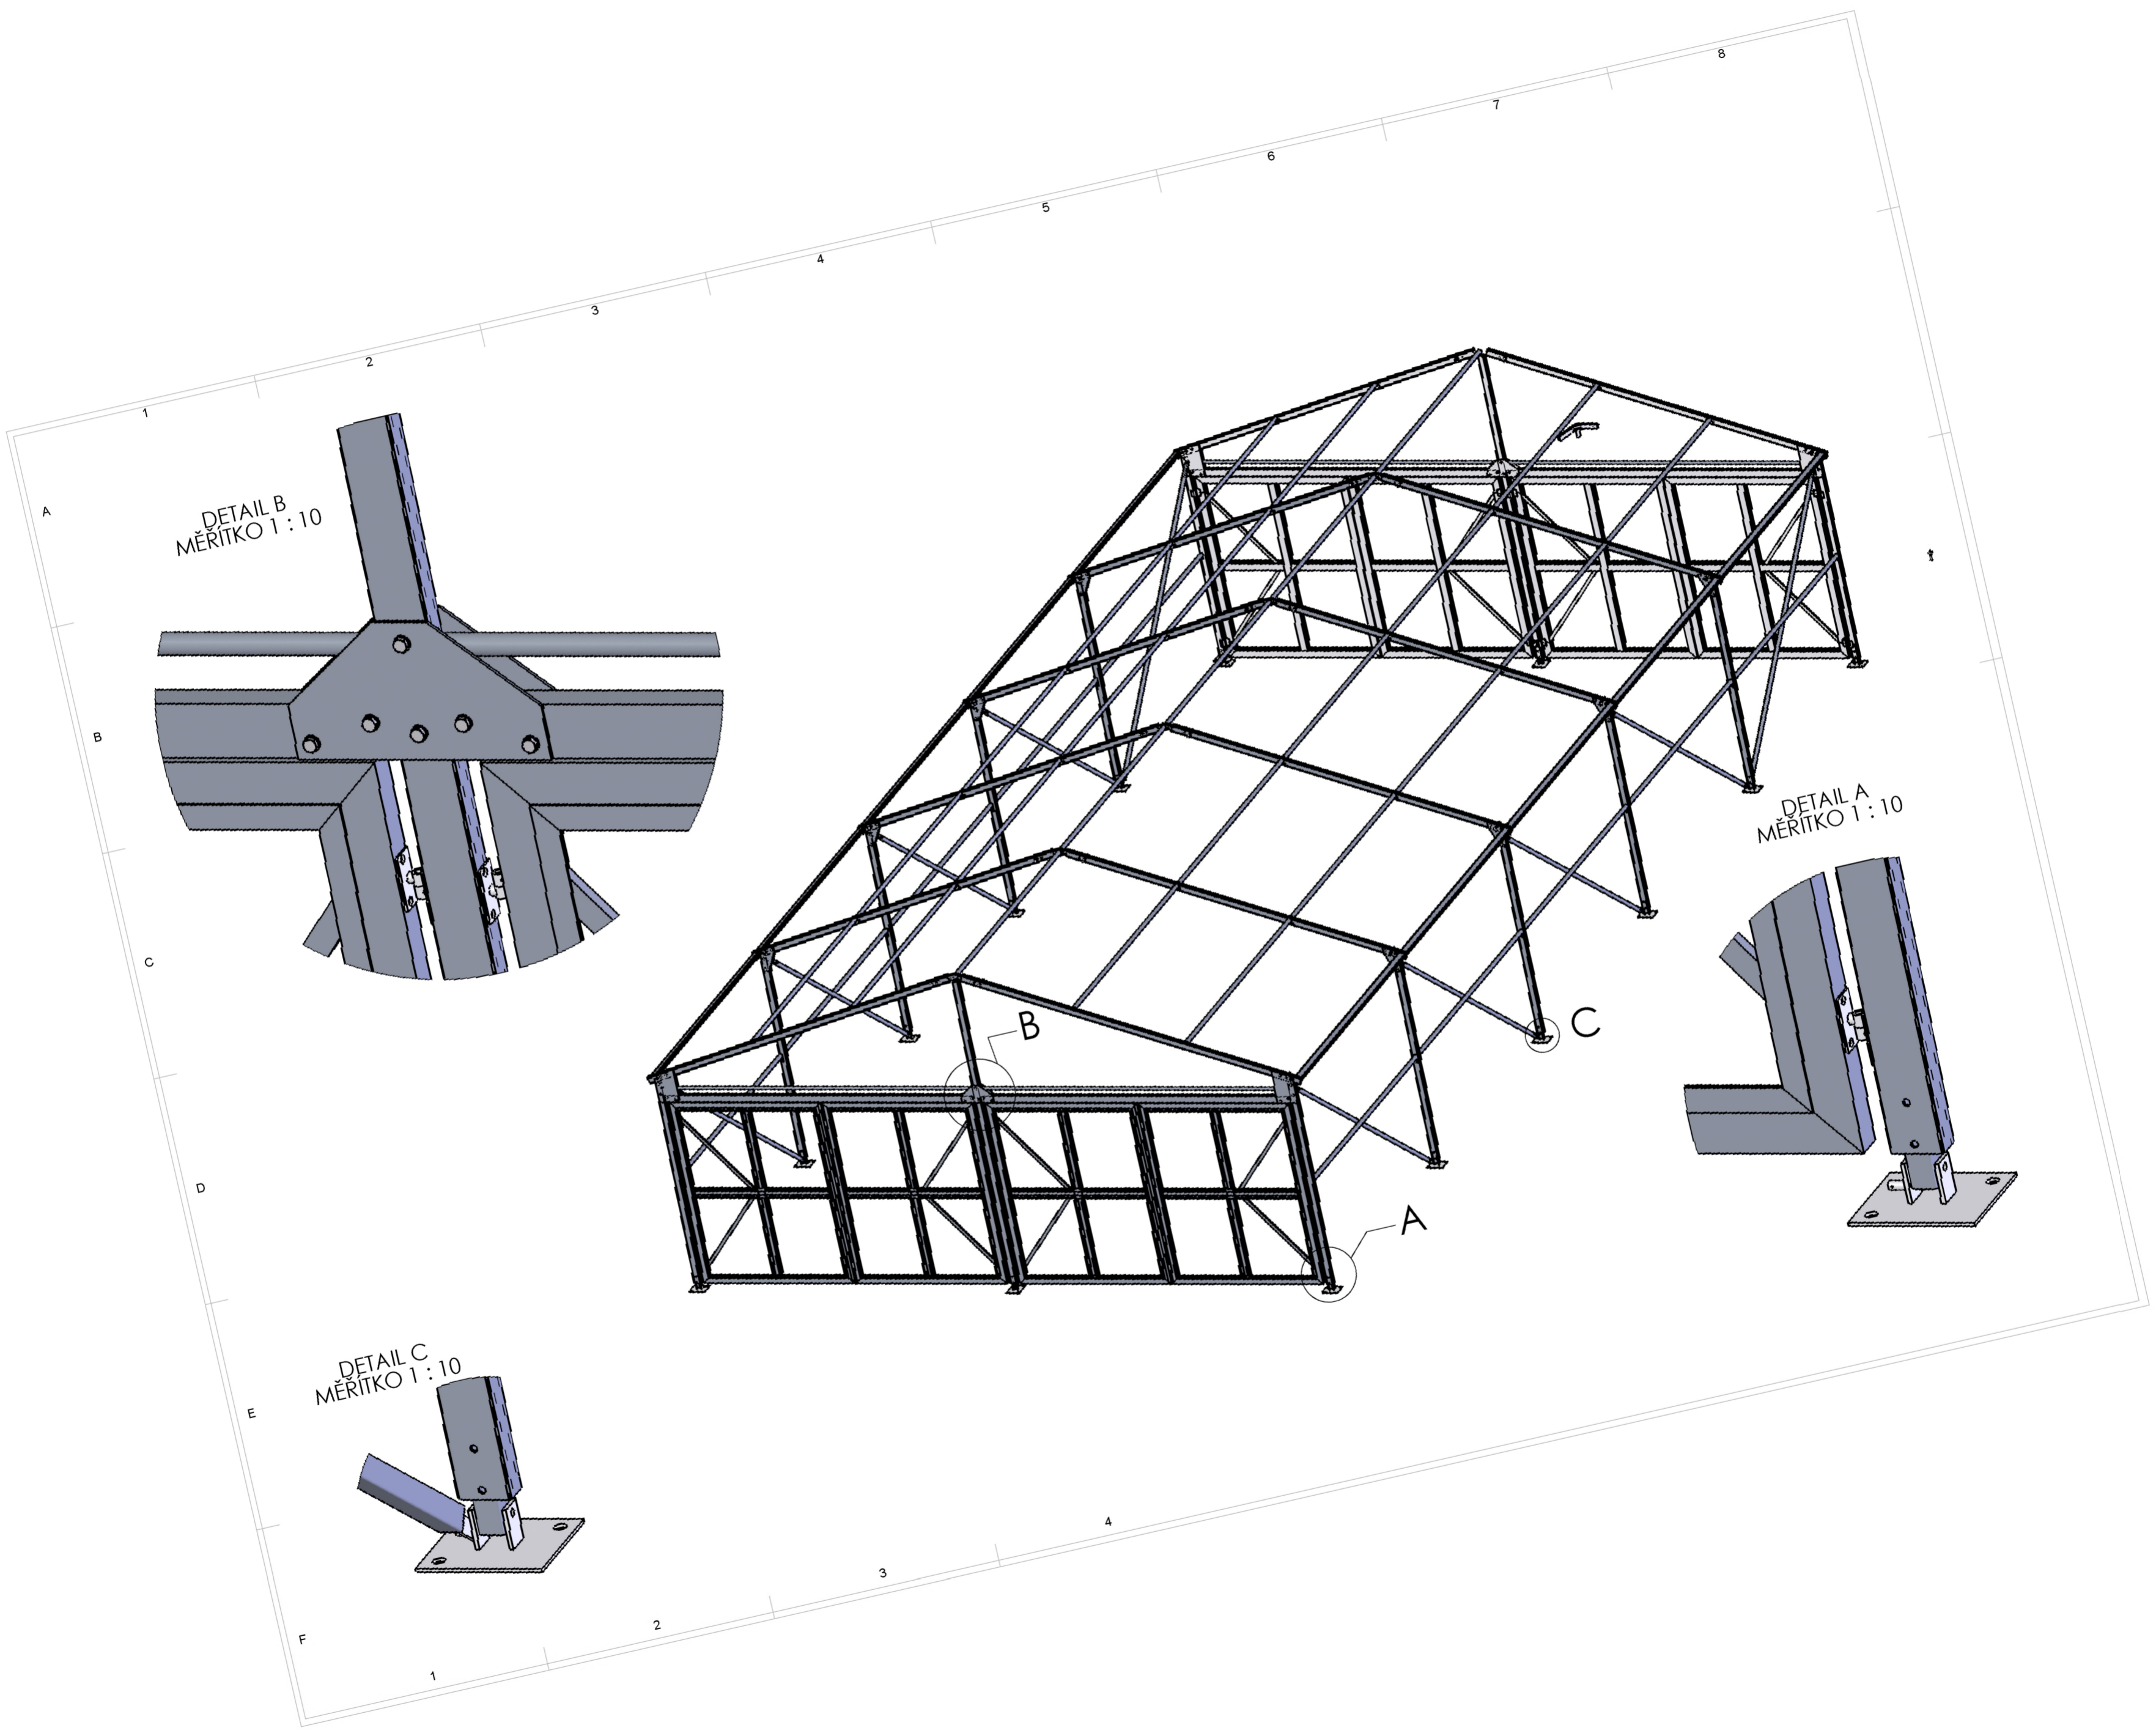

DETAIL B  
MÉRITKO 1:10

DETAIL A  
MÉRITKO 1:10

DETAIL C  
MÉRITKO 1:10

A

B

C

D

E

F

1

2

3

4

5

6

7

8

B

C


A

4

3

2

1


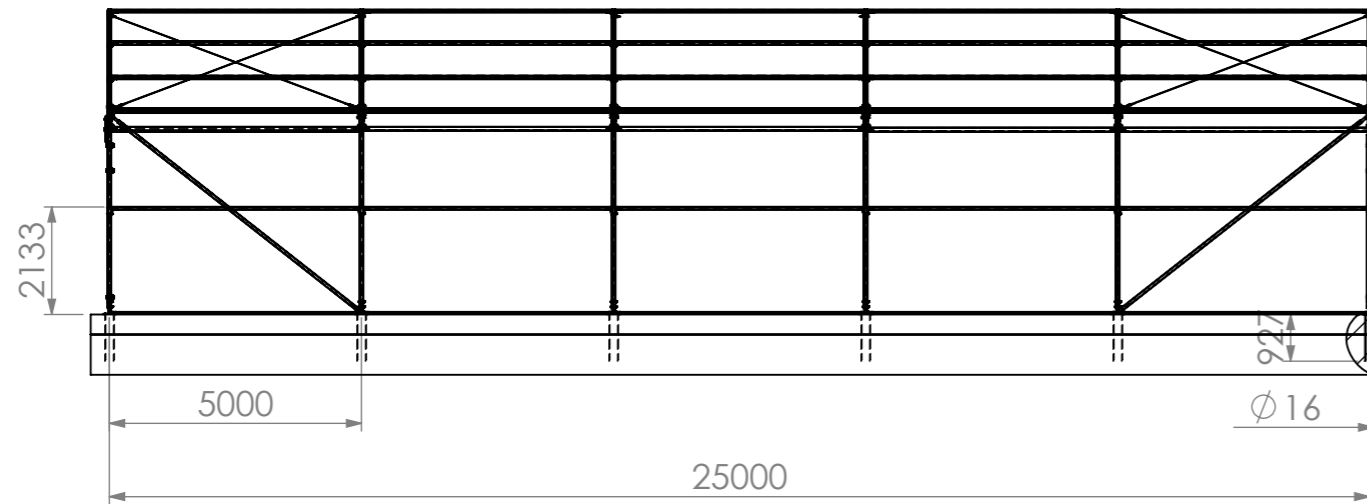


ZHUTNĚNÁ  
ČERNOZEM


400  
JÍL

Ø 16

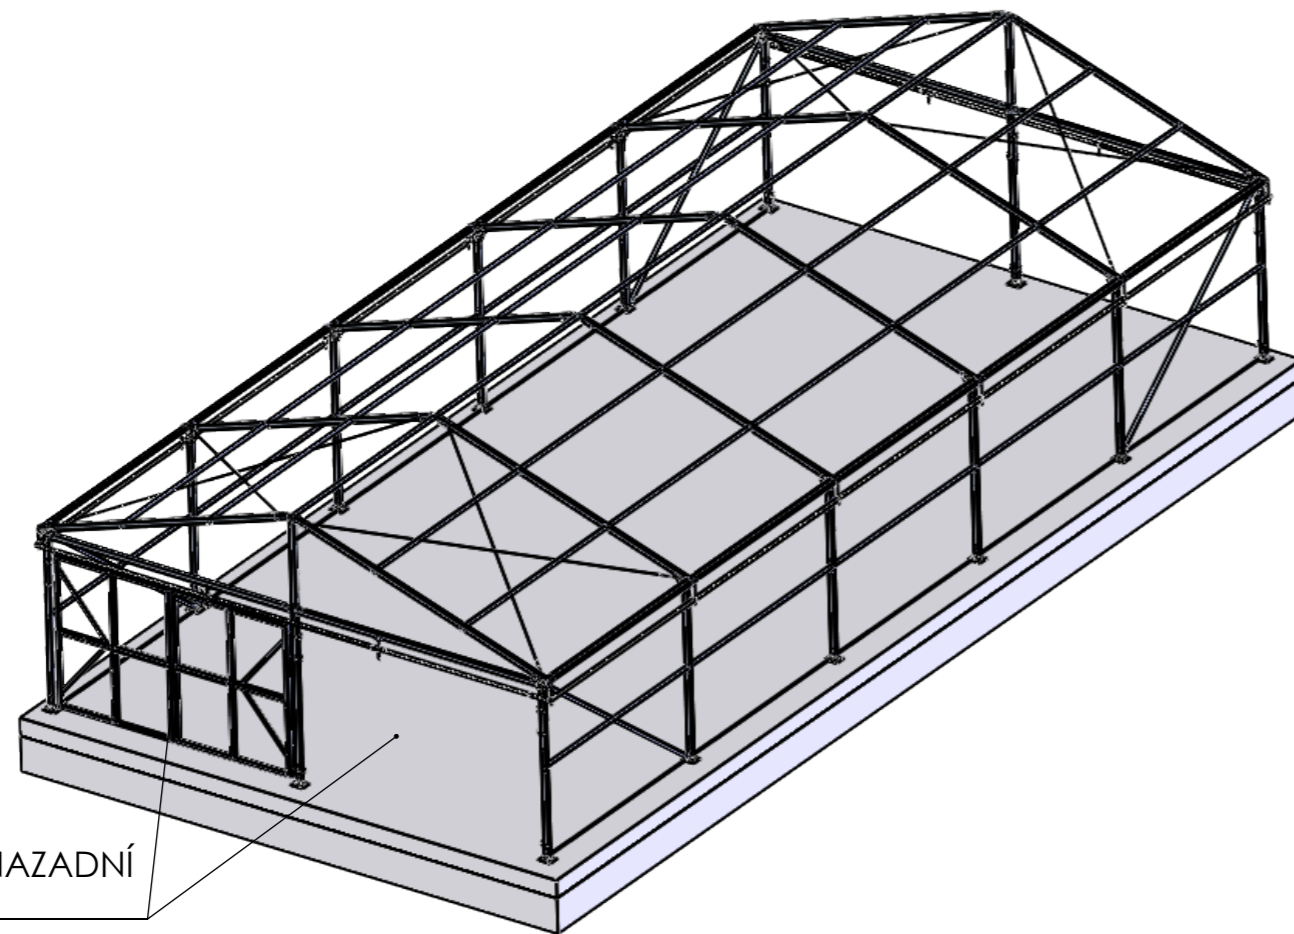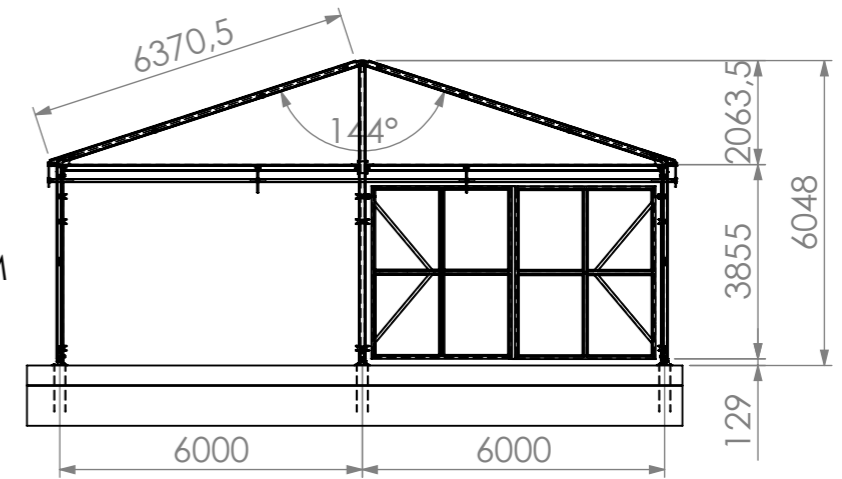

KOTVÍCÍ HŘEB-4KS NA JEDNU PATKU  
BETON.OCEL

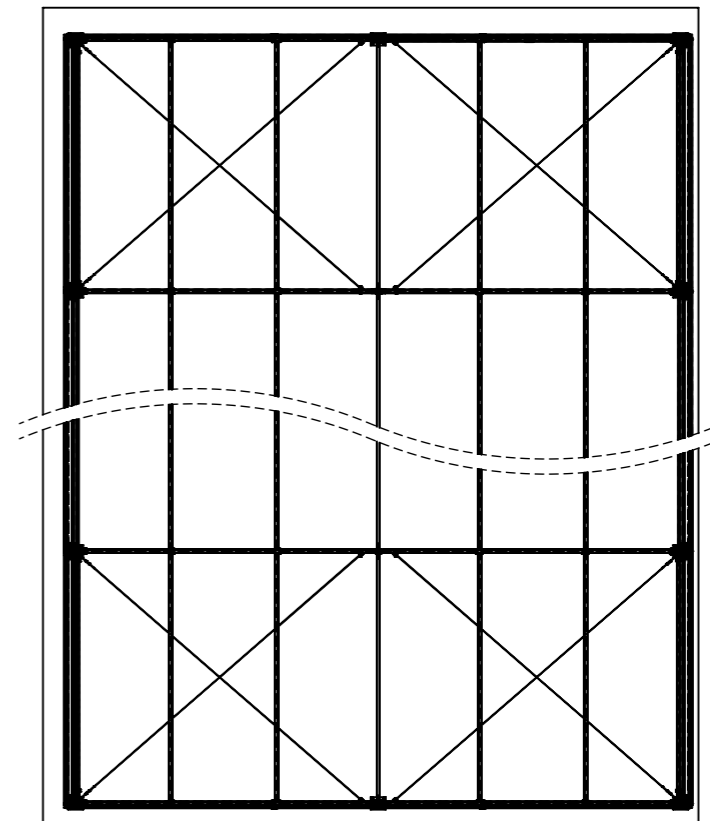

BRÁNY I NAZADNÍ  
STRANĚ



CELÁ KONSTRUKCE VČETNĚ BRÁN BUDE POTAŽENA-  
PROTIKROUPOVÁ SÍŤ, VEL.OKA 2,9x8mm, STÍNĚNÍ 13%  
SÍLA VLAKNA 0,32mm  
MATERIAL 100% HDPE-UV STABILIZOVANÝ


	KRESLIL / DRAWN BY:	SCHVÁLIL / RELEASED BY:	PŘESNOST / ACCURACY: ISO 2768-mK	TOLERANCE / TOLERANCE: ISO 8015	PROMÍTÁNÍ / PROJECTION	MĚŘÍTKO / SCALE
	PETR PAČLÍK		DATUM / DATE: 02.11.2020	STAV / STATUS: Under Change		1:150
NÁZEV / NAME KONSTRUKCE 12x25x4 m			ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING No.		REVIZE / REVISION	
			BOT-0000.00		A	
POČET LISTŮ / PAGES 1/1			HMOTNOST / WEIGHT: 2287.66 Kg			



# OCHRANNÁ KONSTRUKCE PĚSTEBNÍ PLOCHY U CENTRA STRUKTURNÍ A FUNKČNÍ GENOMIKY ROSTLIN V OLOMOUCI HOLICÍCH

## KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES – M 1:500

### Příloha č.2

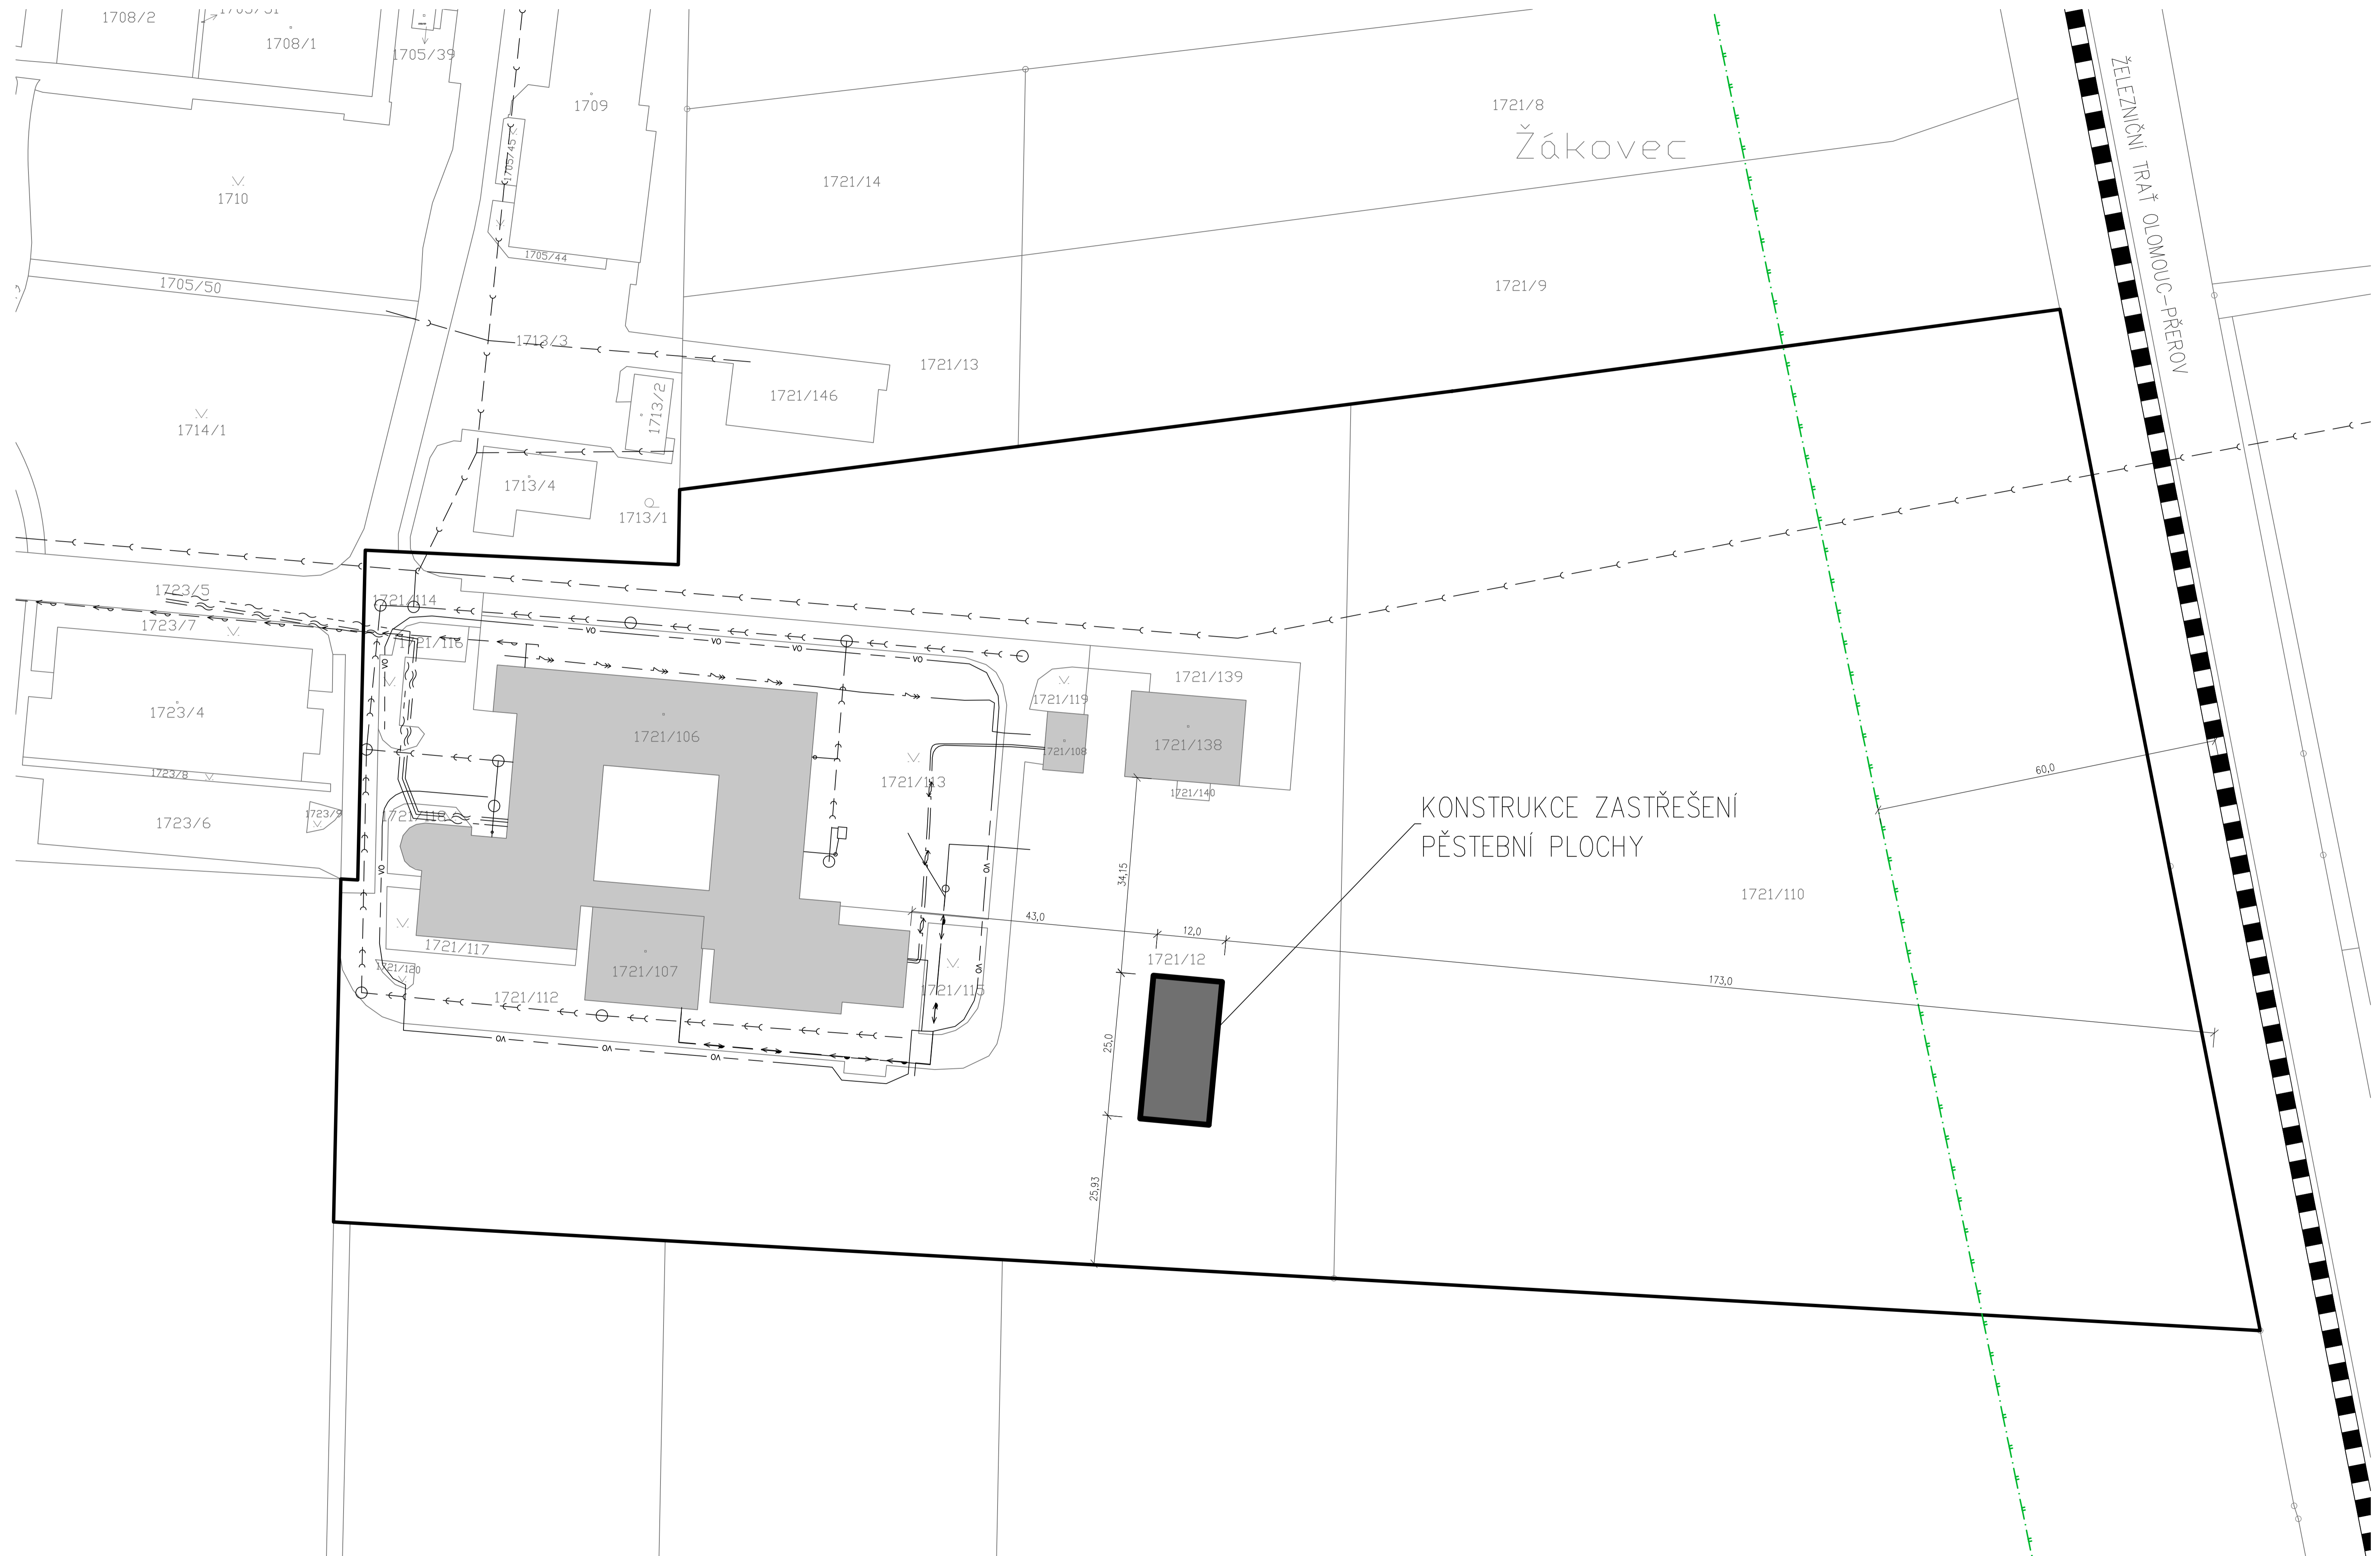


**LEGENDA ČAR – STÁVAJÍCÍ**

- JEDNOTNÁ KANALIZAČNÍ STOKA, PROVOZOVATEL MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN DO 35kV, PROVOZOVATEL ČEZ Distribuce s.r.o.
- AREÁLOVÝ VODOVOD PEHD 110/6,6 SDR 17
- AREÁLOVÉ ROZVODY JEDNOTNÉ KANALIZACE, PP DN400 A DN300
- AREÁLOVÉ ROZVODY DEŠŤOVÉ KANALIZACE, NÁPOJENO DO JEDNOTNÉ KANALIZACE
- PODZEMNÍ AREÁLOVÉ ROZVODY NN DO 0,4 kV
- PODZEMNÍ VEDENÍ AREÁLOVÉ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ CYKY 4x10 + FeZn
- AREÁLOVÉ ROZVODY ÚŽÍTKOVÉ ZÁVLAHOVÉ VODY PEHD ø63
- AREÁLOVÉ SDĚLOVACÍ KABELY TCEPKPFLE
- AREÁLOVÉ VEDENÍ OPTICKÉHO KABELU 12 VLÁKEN SM
- HRANICE POZEMKU V MAJETKU STAVEBNÍKA
- OCHRANNÉ PÁSMO ŽELEZNICE, 60,0 m OD OSY KOLEJE
- ŽELEZNIČNÍ TRÁŤ OLOMOUC – PŘEROV

**LEGENDA ŠRAF**

- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- NOVÉ NAVRŽENÝ OBJEKT KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ PĚSTEBNÍ PLOCHY

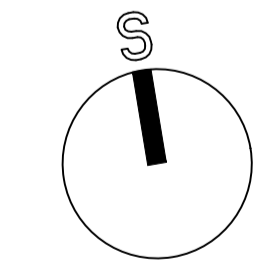

±0,000 = čistá podlaha I.N.P = +210,80 BpV

NÁZEV AKCE:	OCHRANNÁ KONSTRUKCE PĚSTEBNÍ PLOCHY U CENTRA STRUKTURNÍ A FUNKČNÍ GENOMIKY ROSTLIN V OLOMOUCI HOLICÍCH			
STAVEBNÍK:	Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. Rozvojova 253, Praha 6 165 02			
STUPĚN PD:	DOKUMENTACE PRO OZNAMENÍ ZÁMĚRU			
VYPRACOVAL:	Ing. Vratislav Salaba PROJEKČNÍ ATELIER - Palackého 493, Turnov 511 01 IČ: 068 16 843 tel: +420 773 95 20 95 e-mail: vratislav@atelier.salaba.cz			
VÝKRES:	Katastrální situační výkres	PÁREČ:		
ZAKÁZKA:	DATUM:	MĚŘÍTKO:	FORMÁT:	ČÍSLO VÝKRESU:
2020-005	06/2020	1:500	8x A4	C.2



SVITAP J. H. J. spol. s r.o.  
Kijevská 423/8, 568 02 Svitavy  
Česká republika

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2327

IČO: 465 09 755, DIČ: CZ 465 09 755  
Bankovní spojení: KB Svitavy, č.ú.: 7300591/0100



[www.svitap.cz](http://www.svitap.cz)

Ústav experimentální botaniky A V ČR

VYŘIZUJE:

TEL./FAX:

E-MAIL:

MÍSTO/DATUM:

Svitavy 04.11.2020

Cenová nabídka na dodávku a montáž stanu o partystanové konstrukci v rozměrech 12\*25m se 4m boční výškou:

1. hlavní etapa – dodávka konstrukce v rozloženém stavu

- 579.000Kč – konstrukce, hliníkové profily + spoje v pozinkované oceli
- 6.000Kč – doprava
- termín nejpozději do 18.12.2020

2. hlavní etapa – dodávka síťoviny + montážní práce

- 60.000Kč – montáž konstrukce dodané v 1. hlavní etapě
- 16.000Kč – dodávka síťoviny v množství potřebném pro opláštění konstrukce z 1. hlavní etapy – protikroupová síť šedá, velikost oka 2,9\*8mm, stínění 13%, síla vlákna 0,32mm, materiál 100%HDPE – UV stabilizovaný, typ vlákna krystal podélně / černá příčně
- 89.000Kč – montáž síťoviny včetně doplňujících úchytových prvků a vratových rámců
- termín v rozmezí 04.01.2021 – 16.04.2021

Nabídka je platná 45 dní od data vystavení.
