



Město Český Brod

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

„Český Brod - Instalace přípojení rozšíření městského kamerového systému“

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 202000277/OR

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená dle ustanovení § 1764, 1765, 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: Město Český Brod
se sídlem: Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod
zastoupený: Bc. Jakubem Nekolným, starostou města
IČ: 00235334
DIČ: CZ00235334
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bc. Jakub Nekolný, starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Karel Zajíček, projektový manažer

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: AVE Kolín s.r.o.
se sídlem: Třídvorská 1501, 280 02 Kolín 5
zastoupený: Mgr. Věrou Suchomelovou a Ing. Martinem Tichým
IČ: 25148117
DIČ: CZ25148117
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Věra Suchomelová
a Ing. Martin Tichý, jednatele společnosti
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Zdeněk Slavík

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu smlouvy o dílo.



Preambule

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem na realizaci investiční akce „**Český Brod - Instalace přípoří rozšíření městského kamerového systému**“, na pozemcích parc. č.: 228/61, 228/66, 228/26, 228/70, 901/2, 901/3 a 1079/1 v obci a k.ú. Český Brod.

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je uložení přípoří optochtáničků a mikrotrubiček IT, napájecích kabelů NN a kabelových komor určených pro rozšíření městského kamerového systému, v trase realizované investiční akce „Český Brod - Výměna kabelů NN pro VO - 2. etapa, II.“ Stavební práce budou provedeny dle situačního výkresu „Instalace přípoří rozšíření městského kamerového systému při realizaci investiční akce „Český Brod - Výměna kabelů NN pro VO - 2. etapa, II.“, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

1.2. Při výstavbě budou zajištěna dopravně inženýrská opatření při výstavbě společně se zajištěním zařízení staveniště.

1.3. Dílo dále zahrnuje :

- a) zajištění realizační dokumentace stavby dle vlastní potřeby a na vlastní náklady.
- b) zajištění veškerých atestů, prohlášení o shodě, revizních zprávy, zkušebních protokoly, rozborů, zkoušek a dokladů dle zákona č. 22/1997 o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů,
- c) Zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních v listinné podobě. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli dodána také 1x v elektronické podobě ve formátech *.pdf a zároveň ve formátech *.doc, *.xls, *.dwg příp. *.dgn na nosiči CD nebo DVD,
- d) zpracování geodetického zaměření vč. všech nově budovaných objektů a zjištěných stávajících inženýrských sítí. Zaměření bude dodáno 2x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátech *.pdf a zároveň ve formátu *.dwg příp. *.dgn na nosiči CD nebo DVD.
- e) zajištění, zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě a vybudování mechanického oddělení prostor stavby od ostatních pozemků z hlediska bezpečnosti.
- f) Zajištění osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách, zajištění výchozí revizní zprávy zemních kabelových rozvodů a kalibrace trubkování HDPE,
- g) zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany zdraví při práci.
- h) provedení všech blíže nespecifikovaných prací, které jsou však nezbytné k řádnému provedení a následnému provozování díla.
- i) likvidaci, odvoz a uložení komunálního odpadu na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů včetně vedení průběžné evidence odpadů.



1.4. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v tomto článku zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

1.5. Zhotovitel se zavazuje dodržet termín předání hotového díla dle článku II. smlouvy

Článek II. Doba zhotovení díla

2.1. Zhotovitel začne práce na provádění díla bez zbytečných odkladů po nabytí účinnosti této smlouvy a po písemném předání stavby.

2.2. Zhotovitel předá kompletně dokončené dílo objednateli nejpozději do 31. 1. 2021.

2.3. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.

Článek III. Cena za dílo

3.1. Cena za dílo dle článku I je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v celkové výši 335.828,00 Kč bez DPH v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to jako cena nejvýše přípustná. Tato cena je dána DPS pro výběr zhotovitele a specifikována položkovým rozpočtem, který je součástí nabídky ze dne 06. 10. 2020 „Český Brod - Instalace přípojení rozšíření městského kamerového systému“ a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH ve výši 70.523,88 Kč.

Cena za dílo včetně DPH činí 406.351,88 Kč.

3.2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

3.3. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy, bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.

3.4. Veškeré případné vícepráce budou naceněny dle položkových cen nabídky. V případě, že tyto tam nebudou, budou naceněny dle ceníků URS.

3.5. Cenu díla bude možné měnit pouze:

- nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“),
- přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci



nebo položkovém rozpočtu. Dále také přičtením nákladů víceprací, pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla. Totéž platí pro zjištěné skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. geologické údaje). Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo dle Sborníku stavební prací URS pro rok 2020 ve výši 100% těchto sborníkových cen, podle toho, která z těchto částek bude nižší;

3.6. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

Článek IV. Platební podmínky

4.1. Realizované práce a dodávky budou objednateli hrazeny zhotoviteli na základě faktur, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohu.

4.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že práce a dodávky budou hrazeny na základě soupisu provedených prací do výše 80 % ceny díla na základě dílčích soupisů provedených prací. Pozastávka ve výši 20 % z částky bude uvolněna po předání díla bez vad a nedodělků, vždy na základě písemné žádosti zhotovitele a dodání příslušných dokladů (protokol o předání a převzetí díla s odstraněním vad a nedodělků).

4.4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílčí plnění díla v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc, nedílnou součástí faktury musí být zjišťovací protokol a dílčí soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářním měsíci, písemně odsouhlasený zmocněným zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor stavebníka.

4.5. Vícepráce schválené objednatelem budou fakturovány samostatně po jejich provedení na základě schváleného změnového listu stavby a písemného dodatku ke smlouvě o dílo.

4.6. Faktura je splatná ve lhůtě **30 kalendářních dnů** od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, jsou objednatelé oprávněni fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

4.7. Faktura musí obsahovat identifikaci projektu (název, registrační číslo).

4.8. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele.

4.9. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.



Článek V. Oprávnění zástupci objednatele

- 5.1. Ve věcech smluvních zastupuje objednatele statutární zástupce Bc. Jakub Nekolný, starosta města.
- 5.2. Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou za Město Český Brod: Ing. Karel Zajíček, tel: 732 735 291, a TDS.
- 5.3. Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni ve věcech smluvních projednávat pouze obsah návrhu dodatků ke smlouvě o dílo.

Článek VI. Oprávnění zástupci zhotovitele

- 6.1. Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech smluvních jsou: Mgr. Věra Suchomelová a Ing. Matin Tichý, jednatel společnosti
- 6.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech technických jsou: Zdeněk Slavík

Článek VII. Provádění díla a nebezpečí škody na díle

- 7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 7.2. Průběh stavby nesmí ohrozit provoz na dotčených i sousedních komunikacích. Prostory stavby zajistí zhotovitel na své náklady.
- 7.3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami.
- 7.4. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla podle článku I. jinou osobu. Zhotovitel díla může provádět dílo prostřednictvím svých zaměstnanců nebo může pověřit k provedení části díla jinou osobu. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 7.5. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a vyhláškou MMR č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona a která stanovuje obsah a náležitosti stavebního deníku.
- 7.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy.
- 7.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.



7.8. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré písemné doklady o provádění díla.

7.9. Objednatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi kontrolní dny v průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce zhotovitele a objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne.

7.10. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy ve smyslu § 2002, odst. 2 občanského zákoníku, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

7.11. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby podkladů a pokynů, které předal objednatel zhotoviteli.

7.12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoliv ze stran od smlouvy odstoupit.

7.13. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi dodržování předpisů k zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a k zajištění požární ochrany s tím, že je zhotovitel povinen provést příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam. Zhotovitel byl upozorněn a bere na vědomí, že je povinen dodržovat při realizaci prací bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy.

7.14. Zhotovitel prohlašuje, že má předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro stavební práce dle projektové dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že použité stroje a zařízení odpovídají příslušným technickým a bezpečnostním předpisům včetně stanovených limitů pro nejvýše přípustnou hladinu hluku a limitů nejvýše přípustných množství emisí škodlivin ve výfukových plynech.

7.15. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny překážky, které by svou polohou, pohybem nebo působením ohrožily bezpečný průběh pracovní činnosti.

7.16. Zhotovitel bude při své činnosti respektovat veškeré sítě uložené v prostorách staveniště a kořenový systém stromů. Při kolizi provádění díla se stromy, jejich kořenovým systémem nebo nadzemní částí je zhotovitel povinen počínat si s maximální opatrností, tak aby části stromů a keřů nepoškodil ani neporušil, případně navrhne objednateli alternativní řešení provádění díla.



7.17. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli na základě písemného předávacího protokolu, jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.

7.18. Všechny škody včetně škod na inženýrských sítích, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, a vlastníkům inženýrských sítí, je povinen uhradit zhotovitel.

7.19. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem činnosti pojištěného a to v celé délce provádění stavby, a to pojistnou smlouvou č. CZ00000877LI19A uzavřenou s XL Insurance Company SE pojišťovnou, se sídlem Zweigniederlassung für Österreich, Tuchlauben3, 1010 Vienna, Pojistná částka z tohoto pojištění činí 25.000.000,00,- Kč.

Článek VIII. Splnění a předání díla

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo podle Článku I a v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli mezi jinými atesty na použitý materiál, revize, originálů stavebních deníků, doklady o ekologickém nakládání s odpady, které je povinen zhotovitel dokládat, a to buď jejich originály, nebo fotokopie a řádné vyklidí a kompletně uklidí celou stavbu.

Požadované doklady k převímce dokončené stavby:

- a) geodetické zaměření díla vč. zaměření inženýrských sítí ve 2 paré v listinné podobě a 1x elektronicky na nosiči CD/DVD,
- b) atesty, doklady o shodě na použité materiály,
- c) originály stavebních deníků,
- d) doklady o nakládání s odpady - tzv. průběžná evidence odpadů,
- e) průběžná fotodokumentace z provedení stavby na nosiči CD / DVD,
- f) dokumentace skutečného provedení stavby 2 paré v listinné podobě a 1x elektronicky na nosiči CD / DVD,
- g) revizní zprávy všech dotčených a požadovaných elektrických zařízení,
- h) protokol předání díla, příp. protokol o odstranění vad a nedodělků.

8.2. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít.

8.3. Provedené dílo zhotovitelem podle článku I bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“).

8.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 8.1. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít nebo převzít dílo s vadami nebo nedodělky nebo při



nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 8.1., jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.

8.5. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději tři pracovní dny přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

Článek IX. Záruka za jakost díla

9.1. Záruční doba za jakost díla je sjednána na dobu **60 měsíců** a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže dílo bylo převzato s vadami a nedodělků, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.

9.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro použití díla ke stanovenému účelu.

9.3. V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady díla nebo nedodělků díla do 15 dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli.

9.4. V případě, že zhotovitel nedoručí objednatelům do 7 dnů od doručení písemné reklamace objednatelů zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla nebo nedodělků díla, jsou reklamované vady díla nebo nedodělků díla považovány za uznané zhotovitelem.

9.5. Jestliže v případě oprávněné reklamace objednatelů neodstraní zhotovitel reklamované vady díla nebo nedodělků díla ve lhůtě stanovené v bodě 9.3., jsou objednatelé oprávněni nechat odstranit reklamované vady díla a nedodělků díla jiným zhotovitelem a zhotovitel je povinen uhradit objednatelům náklady s tím spojené.

9.6. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek X. Odstoupení od smlouvy

10.1. Objednatelé mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednatelům vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

10.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkurzu na zhotovitele, popř. provádění díla osobami neuvedenými jako subdodavatel.

10.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu bodu 10.2. této smlouvy.



10.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušení smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

Článek XI. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla stanoveném v článku II., nebo nedodrží lhůtu pro odstranění vad podle bodu 9.3 má objednatel právo nárokovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s realizací díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

11.3. Zhotovitel je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý den z částky, která nebyla uhrazena ve stanovené lhůtě splatnosti

11.4. Smluvní pokuty uvedené v tomto článku hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

11.5. Smluvní pokuta bude hrazena zápočtem proti úhradě konečné faktury.

Článek XII. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

12.1. Zhotovitel byl upozorněn a bere na vědomí, že je povinen dodržovat při realizaci prací bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy.

12.2. Zhotovitel prohlašuje, že má předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro stavební práce dle projektové dokumentace.

12.3. Zhotovitel prohlašuje, že použité stroje a zařízení odpovídají příslušným technickým a bezpečnostním předpisům včetně stanovených limitů pro nejvýše přípustnou hladinu hluku a limitů nejvýše přípustných množství emisí škodlivin ve výfukových plynech.

12.4. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny překážky, které by svou polohou, pohybem nebo působením ohrozily bezpečný průběh pracovní činnosti.

12.5. Zhotovitel bude při své činnosti respektovat veškeré sítě uložené v prostorách staveniště.



Článek XIII. Závěrečná ustanovení

13.1. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

13.2. Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím nepřevzetí adresátem se řídí analogicky ustanovením § 47 odst. 3 občanského soudního řádu.

13.3. V případě změny údajů uvedených v identifikaci objednatele a zhotovitele této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila tuto nahradit.

13.4. Realizace díla bude spolufinancována ze Státního fondu rozvoje a bydlení, z Programu Regenerace sídliště.

13.5. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění veškerých povinností z tohoto vyplývajících.

13.6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejich zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Osobou zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv je město Český Brod. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy.

13.7. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem v platném znění.

13.8. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

13.9. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis oceněných stavebních prací (položkový rozpočet)

Příloha č. 2 - Situační výkres „Instalace přípojí rozšíření městského kamerového systému při realizaci investiční akce „Český Brod - Výměna kabelů NN pro VO - 2. etapa, II.“



Město Český Brod

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

„Český Brod - Instalace přípoloží rozšíření městského kamerového systému“

V Českém Brodě dne 09-11-2020

Ve Kolíně 18.11.2020

Objednatel:

Bc. Jakub
starosta m



Zhotovitel:

MÍSTO PRO OVĚŘOVACÍ DOLOŽKY

Doložka: Usnesení RMČ. 164/2020 ze dne 09/11/2020
potvrzuje se, že podmínky podmiňující
platnost tohoto právního úkonu obce
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.
jsou splněny.
Datum: 9.11.2020 Podpis VO

SOMMER PROJEKT, s.r.o.

Žižkova 278, 282 01 Český Brod

tel./fax +420

+420

e-mail:

C21M - Elektromontáže

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
	trubka HDPE dn40 oranž.	28,00	1 700,00 m	47 600,00 Kč
	spojka HDPE dn 40	285,00	18,00 ks	5 130,00 Kč
	koncovky HDPE dn 40	265,00	14,00 ks	3 710,00 Kč
	kabel. komora 800x1000, plast víko	1 250,00	4,00 ks	5 000,00 Kč
	mikro trubka HDPE dn14	12,00	280,00 m	3 360,00 Kč
	chránička kabel. dn 25	12,00	810,00 m	9 720,00 Kč
	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (VU)	18,00	810,00 m	14 580,00 Kč
Montáž celkem:				89 100,00 Kč

C46M - Zemní práce

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
	vytyč.trati kab. vedení v zastavěném prostoru	1 500,00	0,08 km	120,00
	sejmutí drnu	10,00	13,00 m2	130,00
	ruční výkop jámy zem.tř.3-4 pro komory	550,00	4,00 m3	2 200,00
	betonový základ do bednění	3 380,00	1,00 m3	3 380,00
	kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.5	185,00	42,00 m	7 770,00
	kabel.lože 35cm bez zakrytí	20,00	42,00 m	840,00
	kabel.rýha 10cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.5	55,00	830,00 m	45 650,00
	folie výstražná z PVC šířky 33cm	4,00	100,00 m	400,00

ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.60cm hl.zem.tř.5	19,00	42,00 m	798,00
odvoz zeminy do 1km	135,00	15,00 m3	2 025,00
položení dřnu	12,00	13,00 m2	156,00
ruč.zához.kab.rýhy 10cm šíř.60cm hl.zem.tř.5	6,00	830,00 m	4 980,00
betonový podklad chodník	185,00	27,00 m2	4 995,00
hutnění zeminy vrstvy 20cm	38,00	17,00 m3	646,00
zákl.pro komoru v trase 1000x1200mm	785,00	4,00 ks	3 140,00
zához jámy zem.tř. 3-4	48,00	0,75 m3	36,00
Montáž celkem:			77 266,00 Kč

Materiály

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
	kopaný písek	222,00	5,00 m3	1 110,00
	chránička kabel. dn 25	12,50	810,00 m	10 125,00
	spojka epoxidová SVpe 1 1kV 3x2.5	215,00	3,00 ks	645,00
	CYKY 3Cx2.5mm2	18,80	810,00 m	15 228,00
	trubka HDPE dn40 oranž.	26,70	1 700,00 ks	45 390,00
	spojka HDPE dn 40	166,00	18,00 ks	2 988,00
	koncovky HDPE dn 40	152,00	14,00 ks	2 128,00
	kabel. komora 800x1000, plast víko	11 323,00	4,00 ks	45 292,00
	mikro trubka HDPE dn14	10,20	280,00 ks	2 856,00
				125 762,00 Kč

VRN


Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
	kalibrace HDPE+ protokoly	7,00	1 700,00 m	11 900,00
	geodetické zaměření stavby	27 200,00	1,00 ks	27 200,00
	revize kamer.systém	2 850,00	1,00 ks	2 850,00
	dokumentace provedení stavby	1,00	1 750,00 ks	1 750,00
				43 700,00 Kč

335 828,00 Kč

06 - 10 - 2020




 Poloha
 nových kamer
 na stožárech VO
 4x

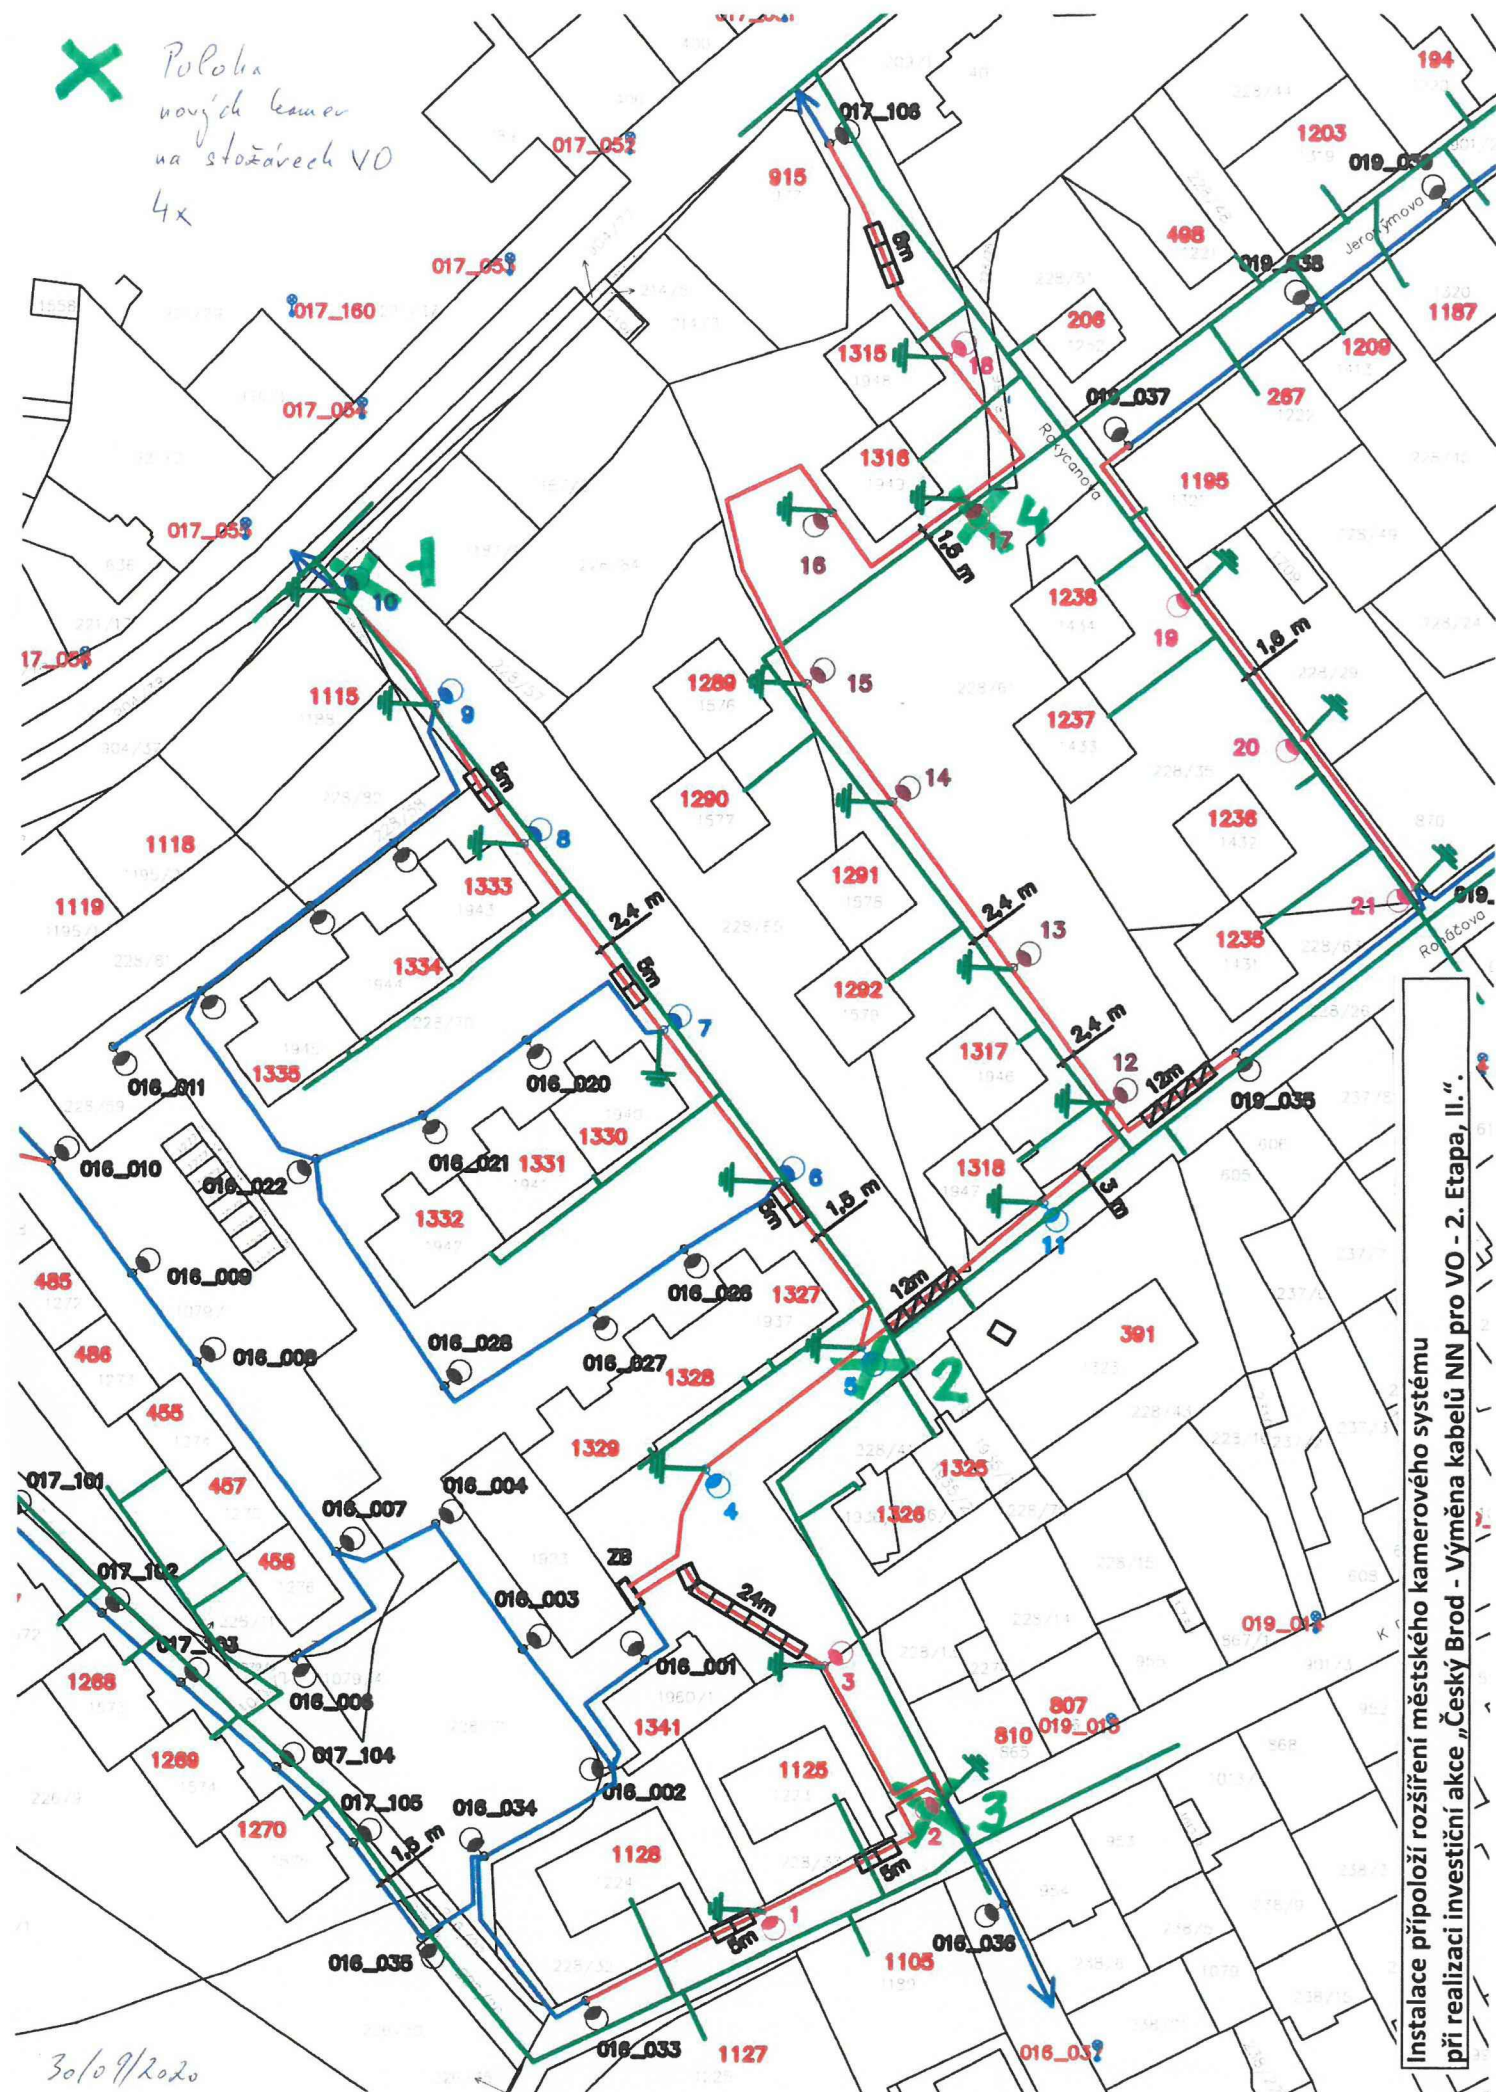

Instalace přípojení rozšíření městského kamerového systému
 při realizaci investiční akce „Český Brod - Výměna kabelů NN pro VO - 2. Etapa, II.“

30/09/2020

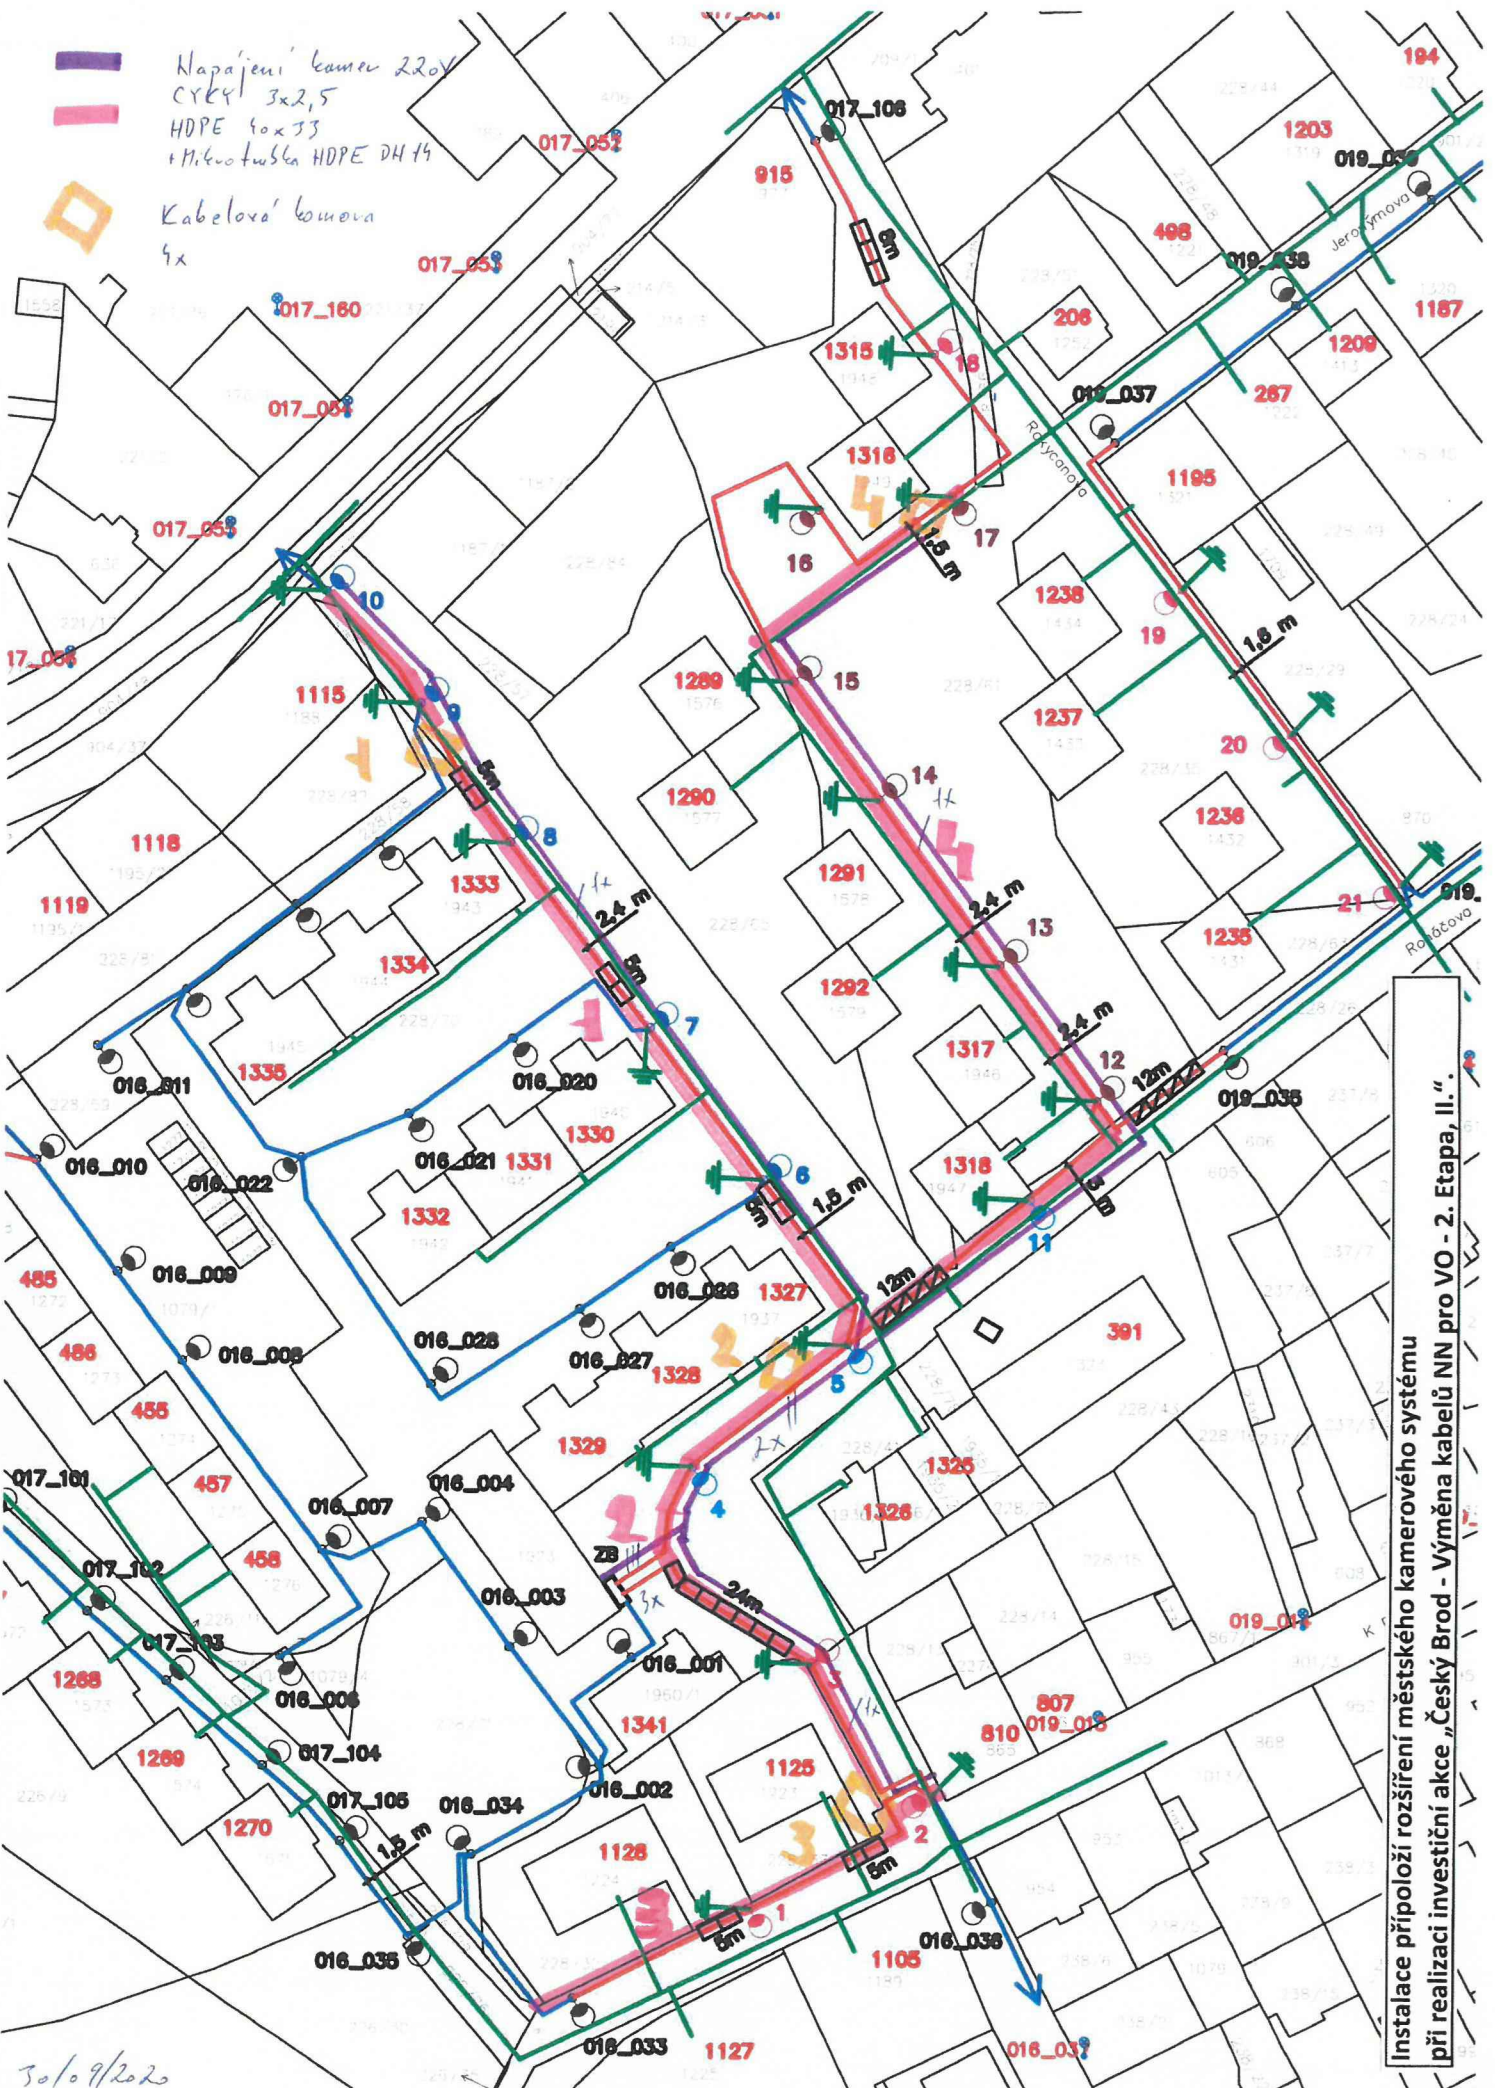

Napájení kamer 220V
CPEK 3x2,5
HDPE 40x33
+ M. k. tv. HDPE DH 14

Kabelová komora
4x

Instalace přípojení rozšíření městského kamerového systému
při realizaci investiční akce „Český Brod - Výměna kabelů NN pro VO - 2. Etapa, II.“

30/09/2020
