

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2020/00171
Číslo smlouvy Stavebníka: 141774

SAP S/4 Hana: 8030001737
Registr smluv: ANO



KUJIP01B9YVY

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. VPI/MJ/2020/00171**

mezi

CETIN a.s.

a

Kraj Vysočina

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „**CETIN**“)

a

Kraj Vysočina

se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČO: 70890749

DIČ: CZ70890749

zastoupený Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA – hejtmanem kraje

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Brtnice spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Etapa Překládky je jakákoliv část Překládky v CTN označená za etapu, vymezená v CTN a co do rozsahu určená položkami v CTN; Etapa Překládky je pro účely Smlouvy samostatným plněním;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.3 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*“ ze dne 29.4.2019 vydané pod čj. 593941/19, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC II_405_Brtnice obchvat SO463**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Je-li Smlouvou ujednána pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci Překládky a dokončení Překládky jakákoliv lhůta, podmínka nebo povinnost a/nebo pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci Překládky a dokončení Překládky stanoven počátek běhu lhůty ke splnění podmínky nebo povinnosti, má se za to, že lhůta, podmínka nebo povinnost je ujednána rovněž pro Etapu překládky a počátek běhu lhůty ke splnění podmínky nebo povinnosti je stanoven rovněž pro Etapu překládky, není-li Smlouvou výslovně sjednáno jinak.
- 3.3 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;

- (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva,
(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.4 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.5 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.6 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizaci Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektu;
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje před realizací Překládky:

- (i) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však sedm (7) měsíců od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“);
- (ii) Kvalifikovanou výzvu učinit pro každou Etapu Překládky.

Stavebník se zavazuje uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí a převést na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky. Ve lhůtě dle předchozího odstavce je Stavebník povinen předat společnosti CETIN územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci každé Etapy Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;

(c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 bodu (ii) Smlouvy.

- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení dle Zákona o vyvlastnění. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle Zákona o vyvlastnění.
- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Etapy Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Etapy Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **1.080.848,- Kč** (slovy: jeden milion osmdesát tisíc osm set čtyřicet osm korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do šesti (6) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.

- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v nákladech překládky stanovených po vyhotovení Projektu dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy. Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit na základě dodatku k této smlouvě, přičemž smluvní strany se zavazují takový dodatek uzavřít před provedením prací nebo vznikem nákladů souvisejících s překládkou SEK a to do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jeho uzavření Stavebníkovi. Pokud k uzavření takového dodatku v uvedené lhůtě nedojde, uhradí Stavebník tyto náklady společnosti CETIN na základě jejich uplatnění.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníků Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím;
 - (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázanoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí;
 - (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu;
 - (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými;
 - (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty;
 - (f) náklady na identifikaci parcel;
 - (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky;
 - (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění;
 - (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění;
 - (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky;
 - (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky;
 - (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu;
 - (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.
- 5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:
- (a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši **97.804,- Kč** (slovy: devadesát sedm tisíc osm set čtyři korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy;
 - (b) Faktura za Etapu Překládky bude vystavena do patnácti (15) dnů od ukončení realizace té které Etapy Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.
- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních:

funkce: specialista pro výstavbu sítě - překládky SEK

e-mail:

ve věcech technických:

funkce: specialista pro výstavbu sítě

e-mail:

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA

funkce: hejtman kraje

e-mail: posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111

ve věcech technických: Ing. Karel Liška
funkce: investiční technik
e-mail: liska.k@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 216, 724 650 221

9. Odstoupení od Smlouvy

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 nebo 9.3 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Vznikne-li společnosti CETIN právo odstoupit od Smlouvy dle předchozího odstavce, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit i částečně, s účinky pro každou Etapu Překládky v odstoupení označenou.
- 9.4 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 nebo 9.3 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.5 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle Čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude o 10 % a více vyšší než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.
- 9.6 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.5 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.7 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.8 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. Rozvazovací podmínka

- 10.1 Kvalifikovaná výzva pro každou Etapu Překládky musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí lhůty je dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti části Smlouvy v rozsahu každé Etapy Překládky, pro kterou ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy nebyla společnosti CETIN doručena Kvalifikovaná výzva.
- 10.2 Dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy zanikne Smlouva:

- (a) zčásti, a to v rozsahu každé Etapy Překládky, pro kterou nebyla společnosti CETIN doručena Kvalifikovaná výzva ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy;
- (b) v celém rozsahu, nebyla-li společnosti CETIN doručena žádná Kvalifikovaná výzva ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy.

10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy. Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou jen zčásti, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze zaniklé části Smlouvy.

10.4 Zánikem Smlouvy nebo její části rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy nebo její části.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přijímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přijímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přijímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přijímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přijímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přijímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zprávy jedním z těchto způsobů:
- (a) v listinné podobě;
 - (b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;
 - (c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.
- Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy, věta první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem (b) a (c).
- 12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:

- § 557;
- § 1767 odst. 2;
- § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
- § 1743.

12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.

12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv delikt ní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13 Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

CETIN:

14.12.2020

V Praze dne _____



CETIN a.s.



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

212

Stavebník:

V Jihlavě dne 8.1.2021



Kraj Vysočina
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA
Hejtman kraje

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

15

Technická zpráva první etapa

Název stavby : SD_VPIC II_405_Brtnice obchvat SO461

Stručný popis:

Vynucená překládka SEK SO 461 Přeložka trasy SEK CETIN a.s. v km 0,162

Dotčené prvky PVSEK :

HDPE O - OK DOK 669 016 02; 24f OS 02

HDPE O/BB - prázdná

HDPE C –prázdná

kabel DCKOPV (S805) 7RP 1,3 + 20DM 0,9

Technické řešení :

Nová trasa: HDPE O + HDPE –C v délce 380m.

pofuk 500m OK z směr pofuku od spojky 02

HDPE O do které bude přefouknut stáv. OK SAM.24f. Cu (navýšení délky o cca 13m)

HDPE C –prázdná.

na HDPE spojky Plasson. Spojky označeny Markery.

Nová trasa: HDPE O/BB (prázdná) 205m zakončena koncovkou, spojka a koncovka

na HDPE označeny Markery.

Kabel DCKOPV (S805) 7RP 1,3 + 20DM 0,9 nebude touto přeložkou řešen – dojde k jeho zrušení.

ÚR - NE – UR již vydáno

PD - Ano

Geo – ANO

GP - ANO

VBŘ –ANO obec +Kraj Vysočina

Stavebník:


Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant:

Ing. Stanislav Marhold, V. Nezvala 1329, 565 01 Chocẽň
projekce telekomunikačních sítí

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	2414/12
Obec:	Brtnice [586943]
Katastrální území:	Brtnice [612952]
Číslo LV:	606
Výměra [m ²]:	38
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	orná půda

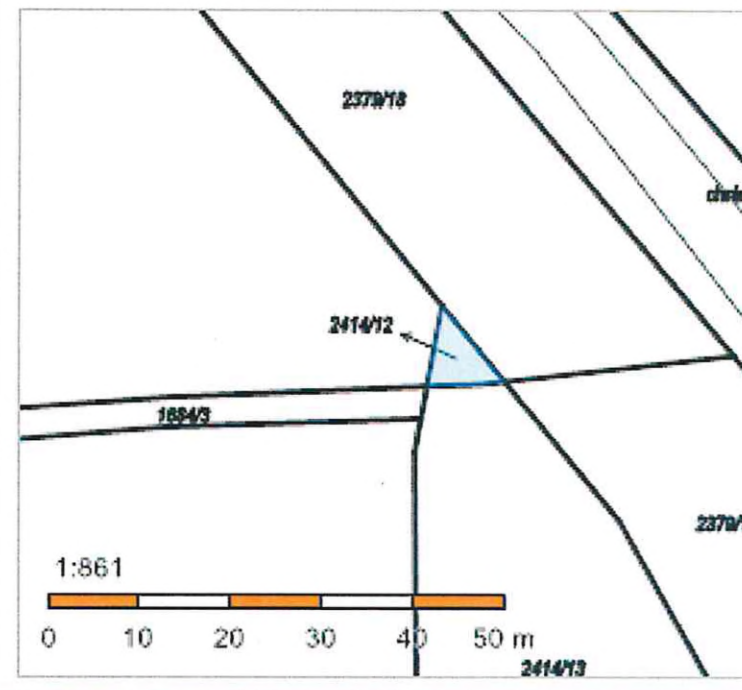

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Římskokatolická farnost Brtnice, Valdštejská 49, 58832 Brtnice

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
------	--------

83444	38
-----------------------	----

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 04.08.2020 21:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	2414/13
Obec:	Brtnice [586943]
Katastrální území:	Brtnice [612952]
Číslo LV:	410
Výměra [m ²]:	1646
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	orná půda

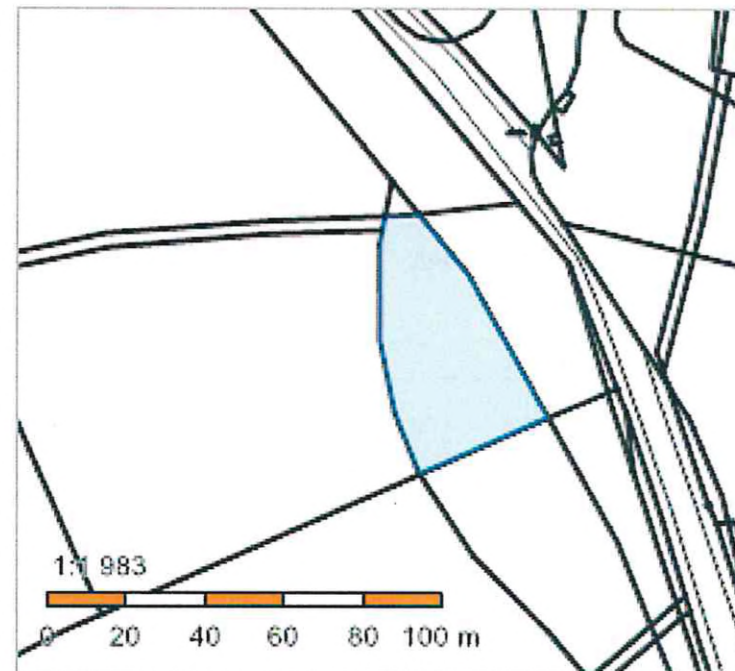

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Hons Miroslav, č. p. 120, 58901 Hodice

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
83444	1646

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 04.08.2020 21:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	2414/14
Obec:	Brtnice [586943]
Katastrální území:	Brtnice [612952]
Číslo LV:	1668
Výměra [m ²]:	1848
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	orná půda

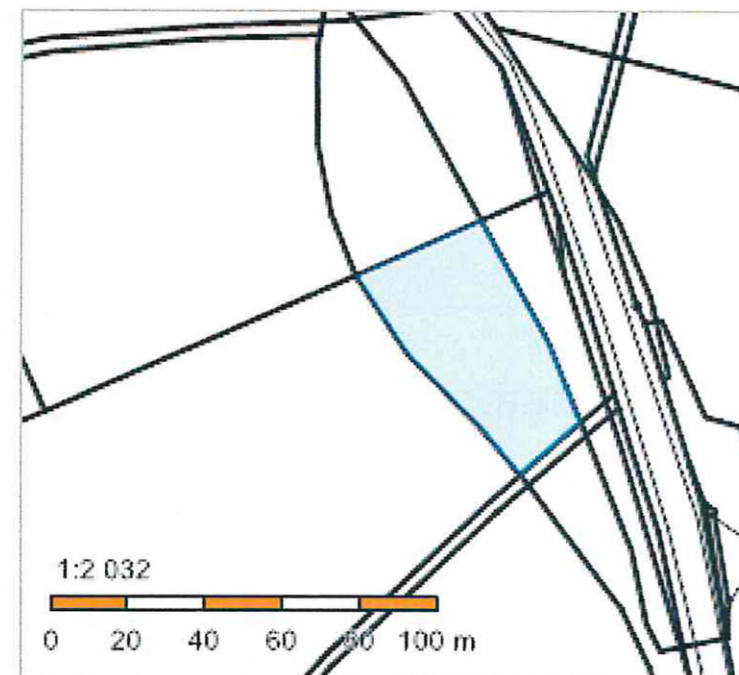

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Zelený Vlastimil, Zemědělská 454, 58832 Brtnice

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
------	--------

83444	1848
-----------------------	------

Omezení vlastnického práva

Typ

Zákaz zcizení

Zástavní právo smluvní

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 04.08.2020 21:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	2414/15
Obec:	Brtnice [586943]
Katastrální území:	Brtnice [612952]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	69
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	orná půda

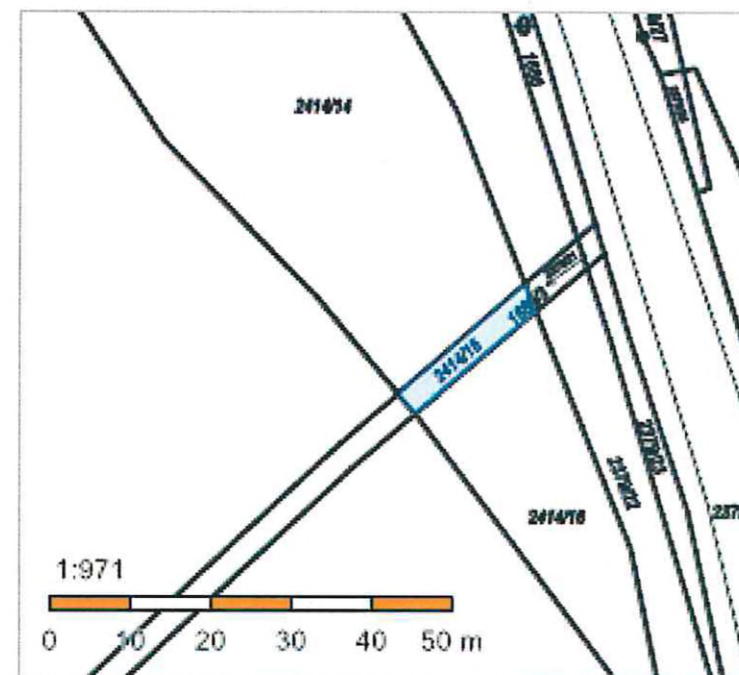

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Město Brtnice, nám. Svobody 379, 58832 Brtnice

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
------	--------

83444	69
-----------------------	----

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 04.08.2020 21:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	2414/16
Obec:	Brtnice [586943]
Katastrální území:	Brtnice [612952]
Číslo LV:	1668
Výměra [m ²]:	856
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	orná půda

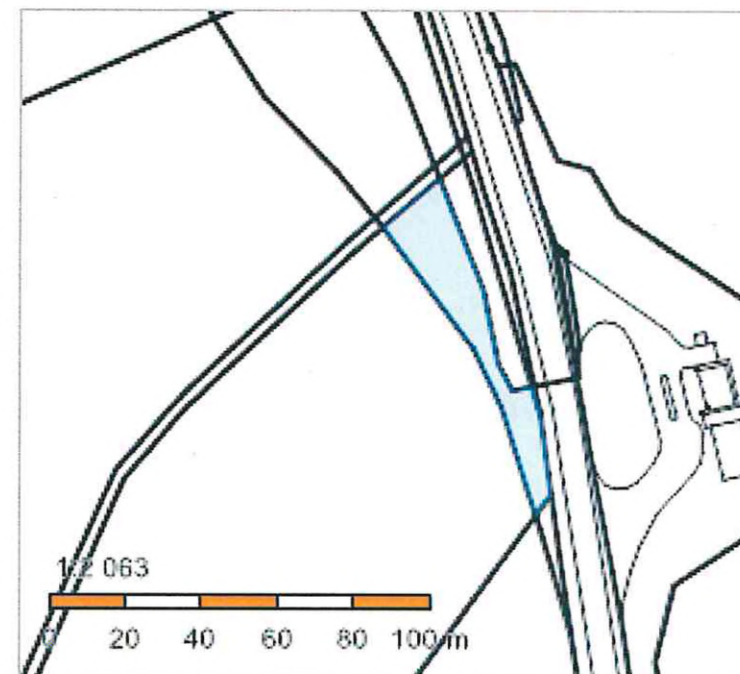

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Zelený Vlastimil, Zemědělská 454, 58832 Brtnice

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
------	--------

83444	856
-----------------------	-----

Omezení vlastnického práva

Typ

Zákaz zcizení

Zástavní právo smluvní

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 04.08.2020 21:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	2379/18
Obec:	Brtnice [586943]
Katastrální území:	Brtnice [612952]
Číslo LV:	736
Výměra [m ²]:	2231
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	orná půda

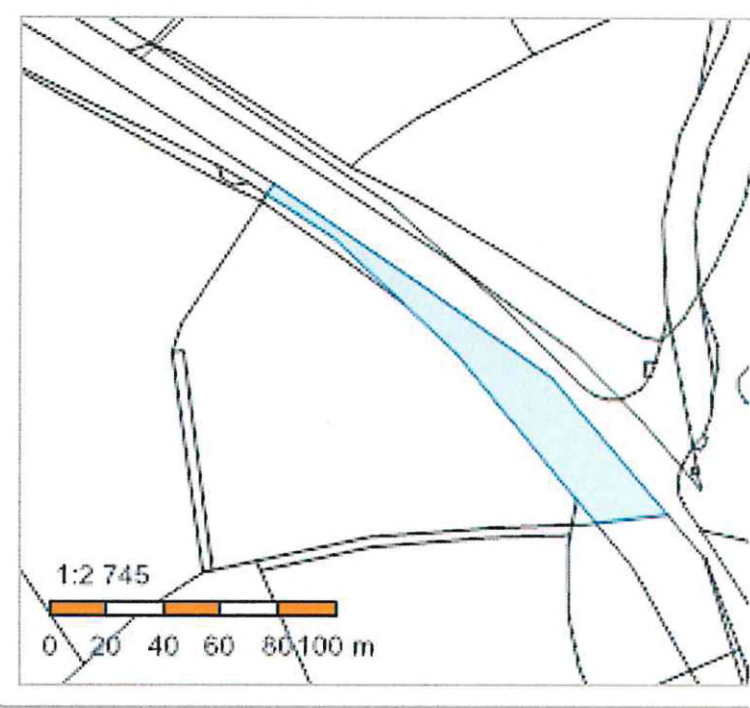

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava	

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
------	--------

83715	197
-----------------------	-----

83444	2034
-----------------------	------

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy


Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 04.08.2020 21:00:00.



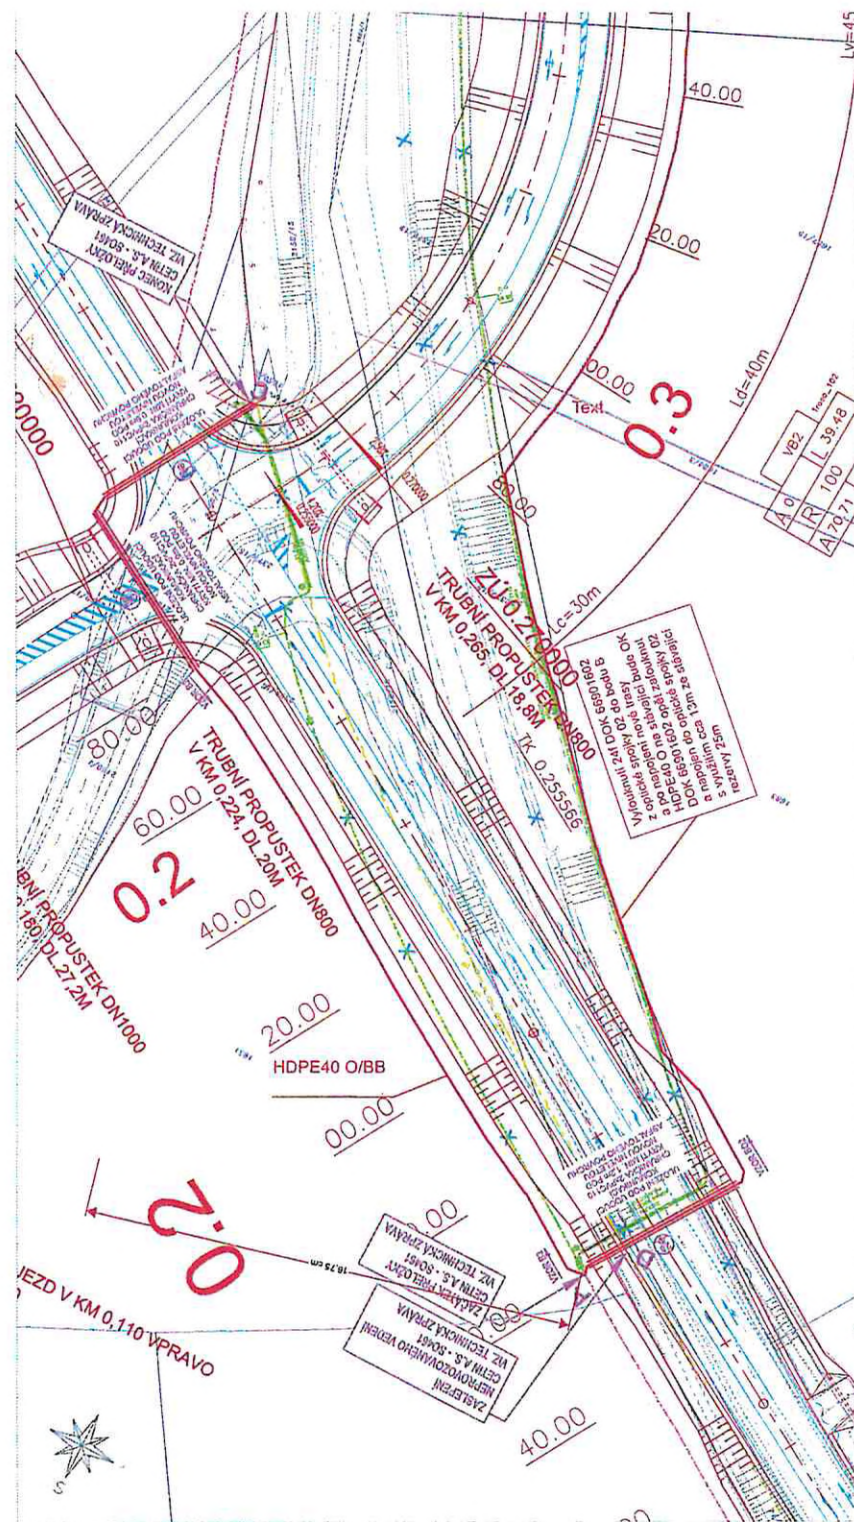

(32-0000)



Technická zpráva druhá etapa

Název stavby : SD_VPIC II_405_Brtnice obchvat SO462

Stručný popis:

Vynucená překládka NVSEK vyvolaná stavbou - SD_VPIC II_405_Brtnice obchvat SO462

Dotčené prvky NVSEK :

Kabel met. FLES 15XN 0,6

Technické řešení :

Stávající nadzemní vedení met. kabelu FLES 15XN 0,6 bude v obci Brtnice u ČOV v délce 50m (mezi dvěma vedle sebe stojícími sloupy) zrušeno a bude nahrazeno zemním kabelem PPFLE15XN0,6.

Oba dva krajní sloupy překládaného vedení budou nahrazeny novými, na kterých budou nově osazeny skříně MRS3 QT. Do těchto skříní bude vyveden nově položený kabel PPFLE15XN0,6 a budou do nich zavedeny stávající nadzemní kabely z nadzemní kabelové tratě. Taktéž dojde k přepojení kabelu PFLES1XN0,6 vedoucího do KR BRCE24 (ČOV) na nově vybudovaný UR MRS3QT na sloupě u ČOV (přepojení kabelu z UR BRCE951)

Nové rozvaděče budou uzemněny dle předpisu a osazeny rozpojovacími pásky a bleskojistkami.

ÚR – NE (zajistil investor)

PD - ANO

Geo – ANO

GP - ANO

VBŘ –ANO

Stavebník:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant:

Ing. Stanislav Marhold, V. Nezvala 1329, 565 01 Choceň
projekce telekomunikačních sítí

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	2134/4
Obec:	Brtnice [586943]
Katastrální území:	Brtnice [612952]
Číslo LV:	736
Výměra [m ²]:	19866
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	silnice
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje

Podíl

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)



Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu](#), [Katastrální pracoviště Jihlava](#) ↗

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 07.08.2020 21:00:00.

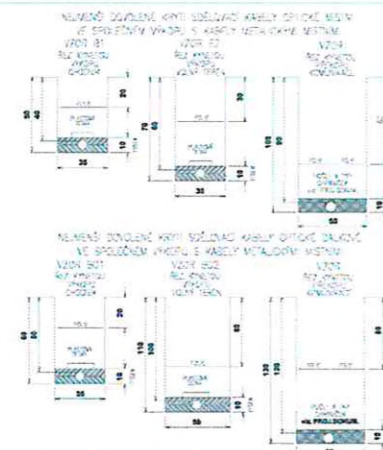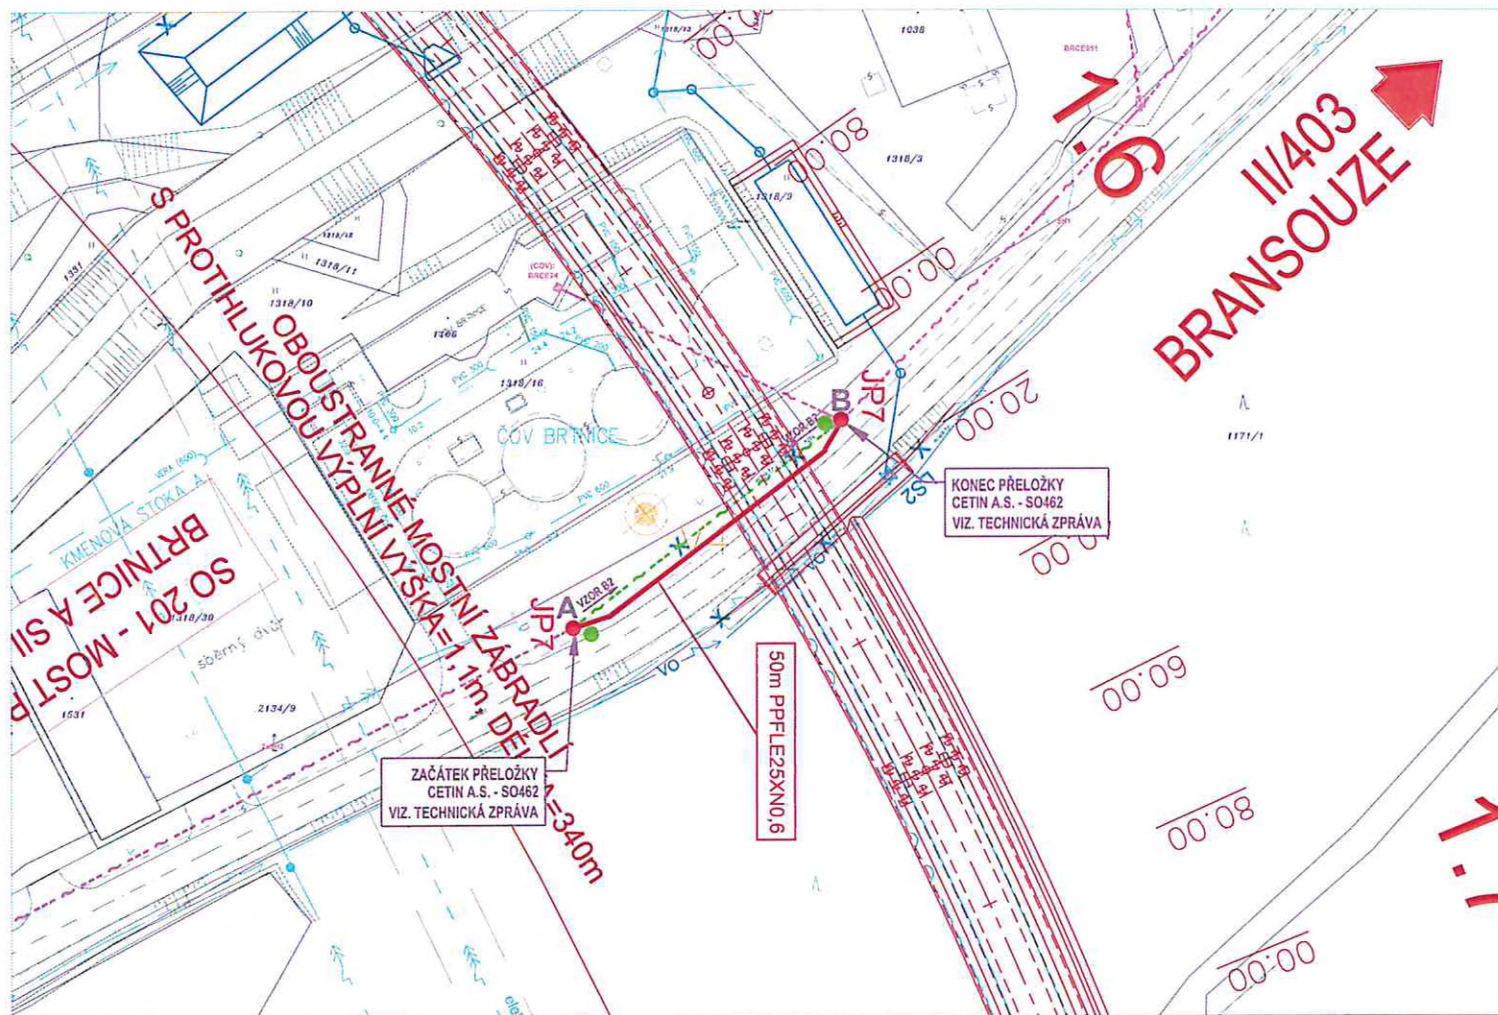

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Česká telekomunikační infrastruktura a.s.:

- NAVRŽENÁ TRASA PŘELOŽEK ZEMNÍHO VEDENÍ
- STÁVAJÍCÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ ZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ SAMONOSNÉ
- PŘEKLÁDANÉ, RUŠENÉ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ ZEMNÍ
- PŘEKLÁDANÉ, RUŠENÉ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ SAMONOSNÉ
- NEPROVOZOVANÉ PODZEMNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ

POZNÁMKA:


PŘED ZAČÁTKEM VÝKOPOVÝCH PRACÍ PRO POKLÁDKU SOUŘADIC KABELŮ JE NUTNO VYTÝČIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ NACHÁZEJÍCÍ SE V ZÁJMOVÉ OBLASTI POKLÁDKY TĚCHTO SOUŘADIC KABELŮ - SONDAŽNÍ A VYTÝČENÍ. NORMATIVNÍ ULožENÍ KABELŮ A TRUBEK HOPE V PŘEKOPECH A VÝKOPECH JE PATRNO NA TOTO VÝKRES.

ZAKRESLENÍ VEŠKERÝCH INŽ. SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ. TRASA TLK KABELŮ JE OKÓTOVÁNA POUZE ORIENTAČNĚ, SKUTEČNÁ TRASA BUDE STANOVĚNA V DOBĚ VÝSTAVBY NA ZÁKLADĚ PROVEDENÝCH SOND.

SOUŘADICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

HLAVNÍ PROJEKTANT:	FORSTEDRA 135, 568 01 VODNÉ MŮRO (MIL) - NEBOHODPŘEDSTAVITEL		
ZPRACOVATEL:	ING. DAVID KRAMER		
ZÚP. PROJEKTANT:	ING. STANISLAV MARHOLD		
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. STANISLAV MARHOLD		
KRAJ: VYSOČINA	OKRES: JIHLAVA	OBEC: BRNICE	STUPEŇ: DÚR
INVESTOR: KRAJ VYSOČINA, ŽYDHOVA 57, 587 33 JIHLAVA			
AKCE:			
II/405 BRNICE - OBCHVAT			
OBJEKT: SO 462 Přeložka trasy SEK CETIN a.s. v km 1,615			
OSAH:			
SITUACE TRASY		ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍL. VÝKRESU:
			02.

SO462
DÚR

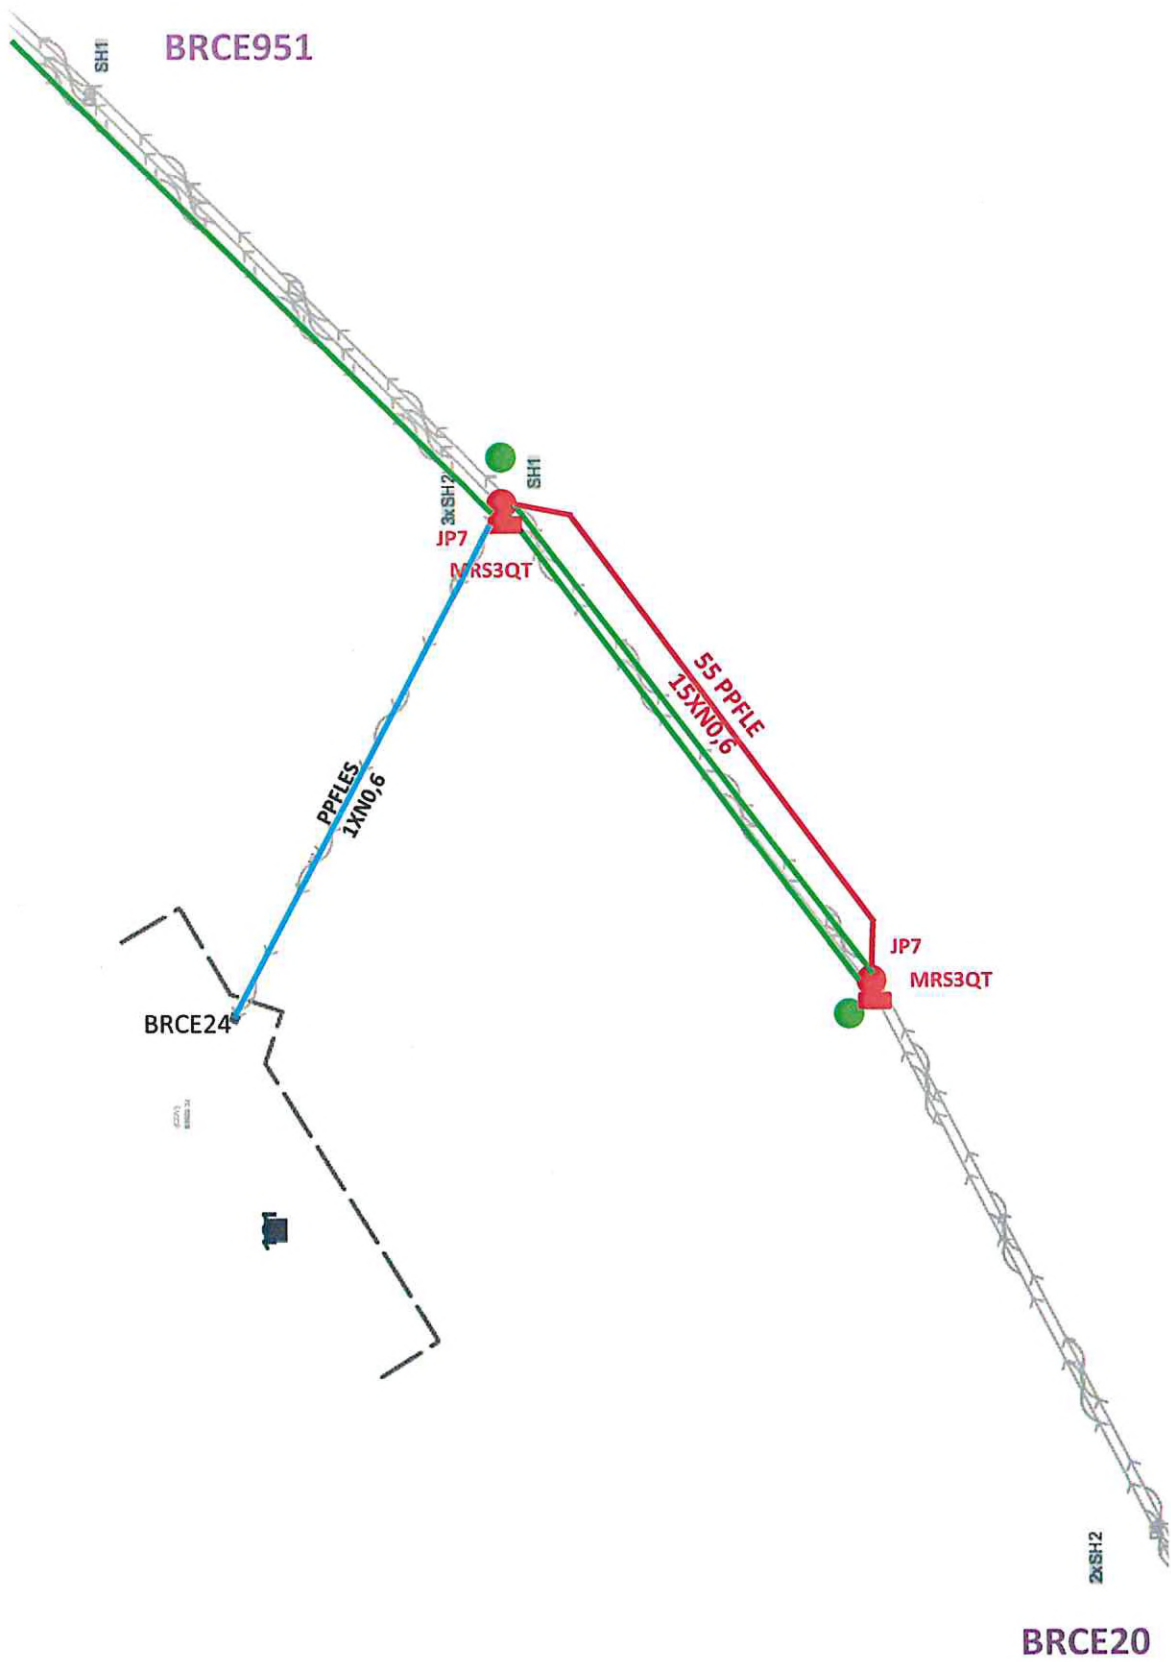

14

Technická zpráva třetí etapa

Název stavby : SD_VPIC II_405_Brtnice obchvat SO463

Stručný popis:

Vynucená překládka SEK SO 463 Přeložka trasy SEK CETIN a.s. v km 2,460
Projekt řeší přeložku vedení společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na okraji obce Brtnice. Jedná se o stávající kabely, které jsou uloženy po levé straně ulice Rokštejská. Stávající kabely kříží navrhovaný obchvat ve staničení 2,460.

Dotčené prvky PVSEK :

kabel TCEPKPFLE25XN0,8 a TCEPKPFLE3XN0,6

Technické řešení :

Mezi body „A“ a „B“ budou do nové trasy uloženy nové metalické kabely TCEPKPFLE 25XN0,8 a TCEPKPFLE 3XN0,6 a v bodech „A“ a „B“ naspojovány na kabely stávající.

Nová trasa bude vedena zeleným prostranstvím mimo nově budovanou komunikaci.

V místech křížení telekomunikačního vedení s novou komunikací budou tato vedení uložena do chráničky PVC110 (jedna chránička PVC110 založena rezervní). V místě křížení s protihlukovou stěnou bude nová trasa vedena uprostřed pole mezi piloty, které jsou od sebe vzdáleny 4m.

K montáži metalických kabelů budou použity smršťovací spojky typu XAGA. Po ukončené montáži bude na metalických kabelech provedeno kompletní stejnosměrné a střídavé měření.

Vybudování nové kabelové trasy je podmíněno provedením terénních úprav stavbou na konečnou niveletu. Teprve potom bude možno provést výkop nové trasy a pokládku překládaných kabelů PVSEK.

Nové trasy budou geodeticky zaměřené včetně spojek a chráničků.

ÚR - NE – zajistil investor stavby

PD - Ano

Geo – ANO

GP - ANO

VBŘ –ANO obec +Kraj Vysočina

Stavebník:


Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Projektant:

Ing. Stanislav Marhold, V. Nezvala 1329, 565 01 Choceň
projekce telekomunikačních sítí

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1125/2
Obec:	Brtnice [586943]
Katastrální území:	Brtnice [612952]
Číslo LV:	902
Výměra [m ²]:	497
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	orná půda

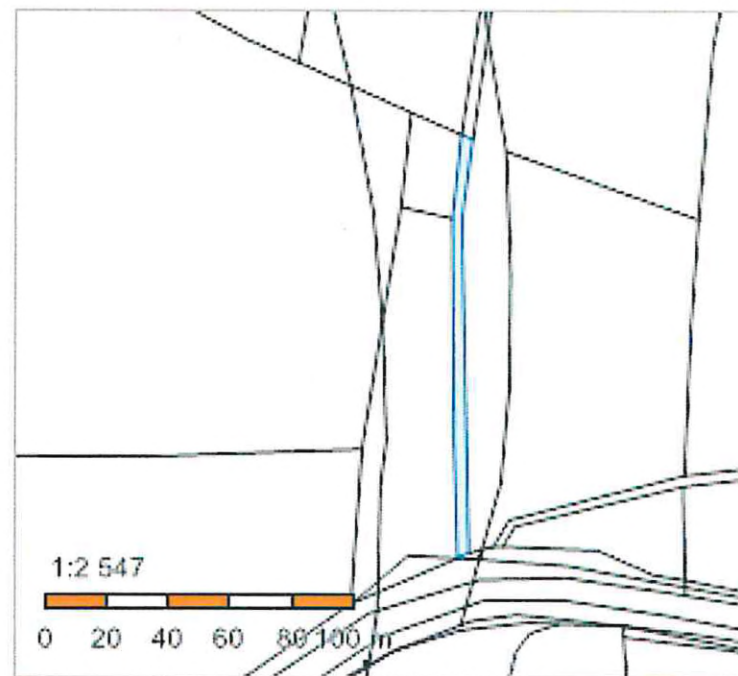

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Šindelka Josef Ing., Zemědělská 648, 58832 Brtnice

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ Výměra

[83444](#) ↗ 497

Omezení vlastnického práva

Typ

Předkupní právo

Jiné zápisy

Typ

Omezení dispozičních práv


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava](#) ↗

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 11.08.2020 19:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1126/2
Obec:	Brtnice [586943]
Katastrální území:	Brtnice [612952]
Číslo LV:	902
Výměra [m ²]:	6089
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	orná půda

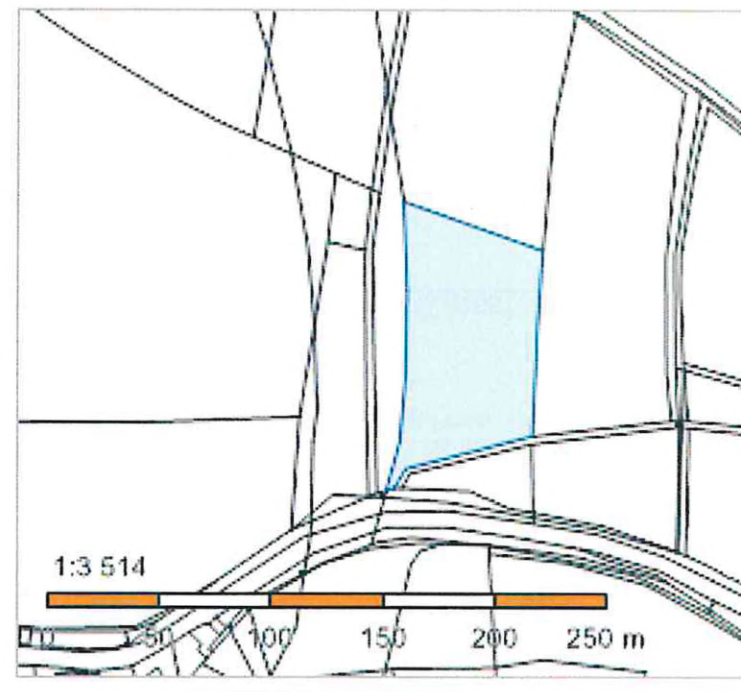

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Šindelka Josef Ing., Zemědělská 648, 58832 Brtnice

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ Výměra

[83444](#) ↗ 6089

Omezení vlastnického práva

Typ

Předkupní právo

Zástavní právo zákonné

Jiné zápisy

Typ

Omezení dispozičních práv


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava](#) ↗

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 11.08.2020 19:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1145/13
Obec:	Brtnice [586943]
Katastrální území:	Brtnice [612952]
Číslo LV:	1389
Výměra [m ²]:	520
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	orná půda

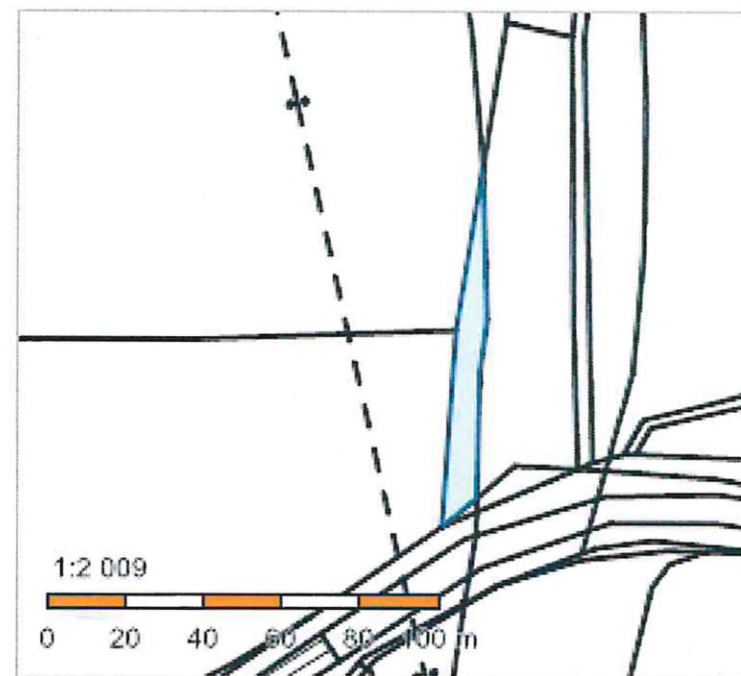

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

AGRA Brtnice, a.s., Horní Město 460, 58832 Brtnice

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
------	--------

83444	520
-----------------------	-----

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 11.08.2020 19:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1145/15
Obec:	Brtnice [586943]
Katastrální území:	Brtnice [612952]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	299
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	orná půda

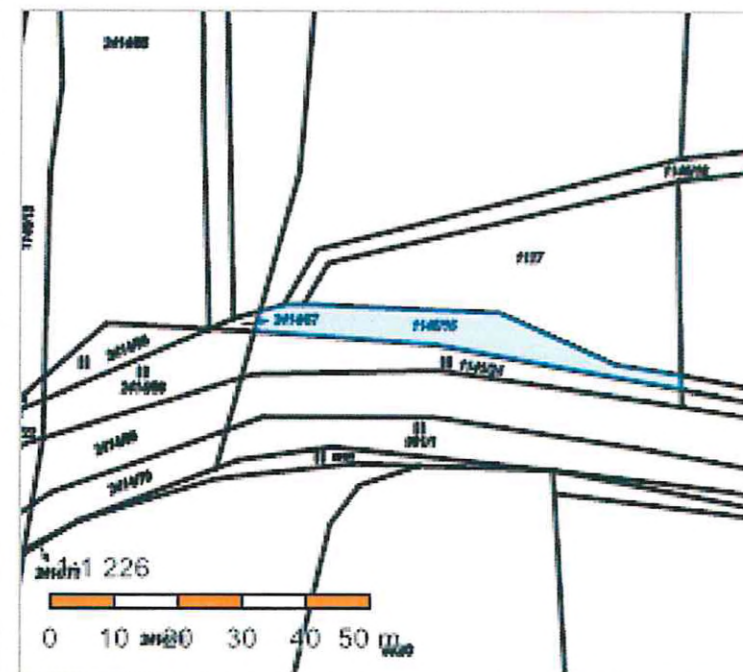

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Město Brtnice, nám. Svobody 379, 58832 Brtnice

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
------	--------

83444	299
-----------------------	-----

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 11.08.2020 19:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	2414/63
Obec:	Brtnice [586943]
Katastrální území:	Brtnice [612952]
Číslo LV:	902
Výměra [m ²]:	1869
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	orná půda

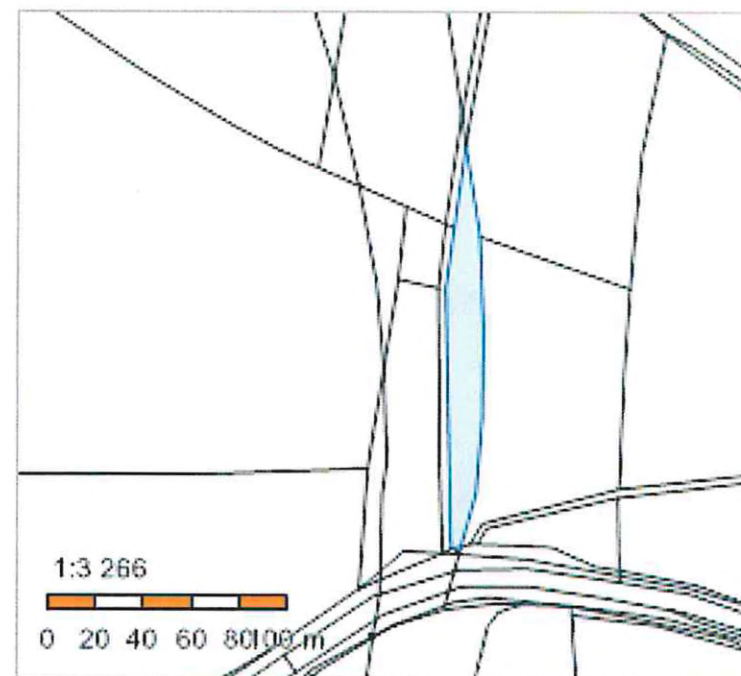

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Šindelka Josef Ing., Zemědělská 648, 58832 Brtnice

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ Výměra

[83444](#) ↗ 1869

Omezení vlastnického práva

Typ

Předkupní právo

Zástavní právo zákonné

Jiné zápisy

Typ

Omezení dispozičních práv


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava](#) ↗

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 11.08.2020 19:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	2414/65
Obec:	Brtnice [586943]
Katastrální území:	Brtnice [612952]
Číslo LV:	1389
Výměra [m ²]:	2525
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	orná půda

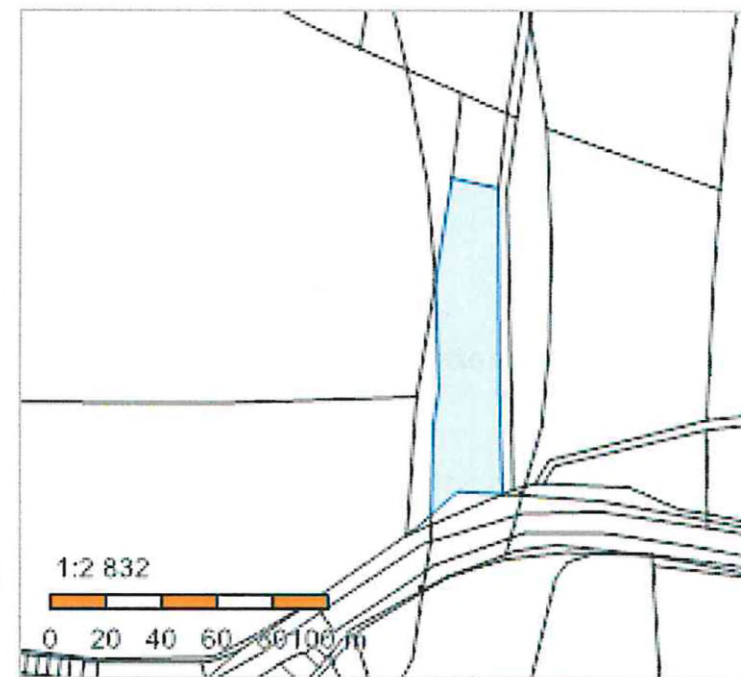

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

AGRA Brtnice, a.s., Horní Město 460, 58832 Brtnice

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
------	--------

83444	2525
-----------------------	------

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.



Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 11.08.2020 19:00:00.

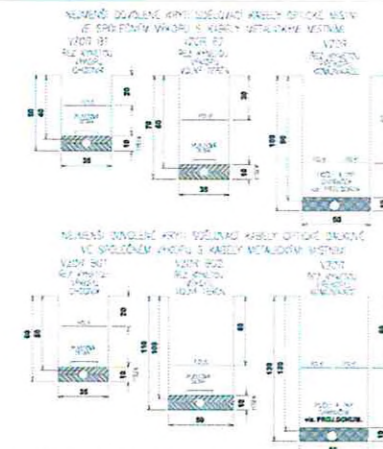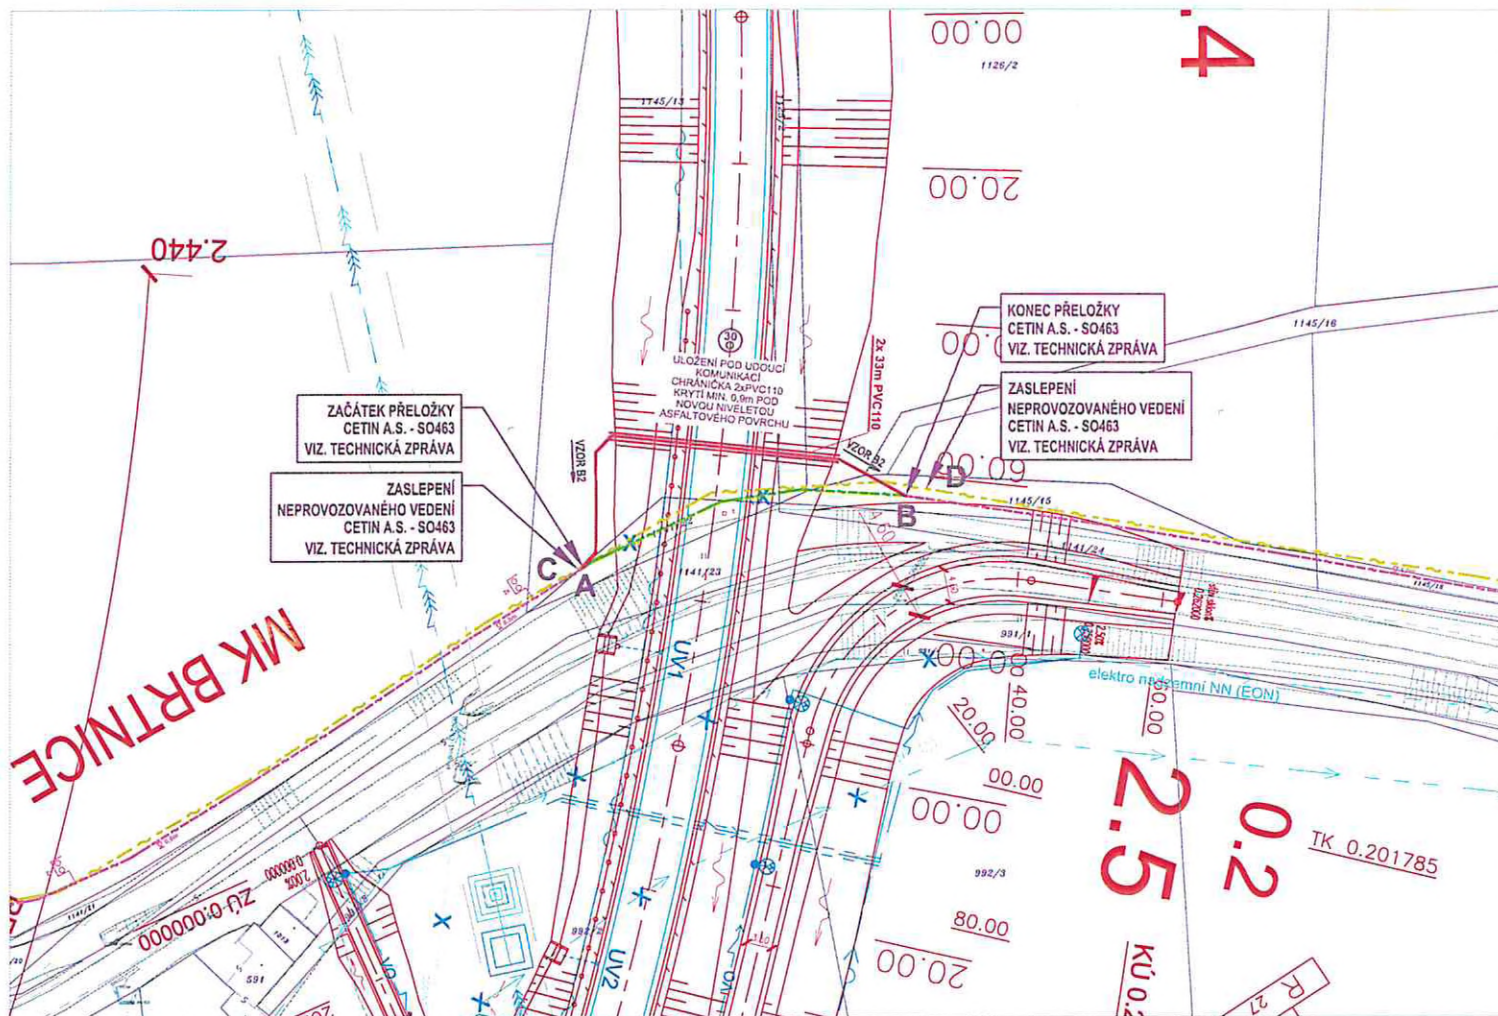

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Česká telekomunikační infrastruktura a.s.:


- NAVRŽENÁ TRASA PŘELOŽEK ZEMNÍHO VEDENÍ
- STÁVAJÍCÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ ZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ SAMONOSNÉ
- PŘEKLÁDANÉ, RUŠENÉ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ ZEMNÍ
- PŘEKLÁDANÉ, RUŠENÉ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ SAMONOSNÉ
- NEPROVOZOVANÉ PODZEMNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ


POZNÁMKA:

PŘED ZAHLÁŠENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ PRO POKLÁDKU SOUČASNĚ KRYTÍ KABELU JE NUTNO VYTÝČIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ NACHÁZÍCÍ SE V ZÁKONNÉ OBLASTI POKLÁDKY TĚCHTO SOUČASNĚ KRYTÝCH KABELU - SONDAŘI A VYTÝČENÍ. NORMATIVNÍ ULOKENÍ KABELU A TRUBEK HOPE V PŘEKOPĚCH A VÝKOPĚCH JE PATRNO NA TOMTO VÝKRESU.

ZAKRESLENÍ VEŠKERÝCH INŽ. SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ. TRASA TLK KABELU JE OKOTOVÁNA POUZE ORIENTAČNĚ, SKUTEČNÁ TRASA BUDE STANOVENA V DOBĚ VÝSTAVBY NA ZÁKLADĚ PROVEDENÝCH SOND.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BIV

HLAVNÍ PROJEKTANT:	FORTEKON 173, 566 01 VYSOKÉ MŮRO (DHL): MORNOSPROJEKT.CZ	
ZPRACOVNĚL:	ING. DAVID KLAMONOVÁ	
ZODP. PROJEKTANT:	BULENA PETR	
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. STANISLAV MARHOLD	
KRAJ: VYSOČINA	OKRES: JHLAVA	OBEC: BRNICE
INVESTOR: KRAJ VYSOČINA, ŽÁKOVA 57, 587 33 JHLAVA		STUPEŇ: DUR
AKCE: II/405 BRNICE - OBCHVAT		ZAK. Č.: 1861
OBJEKT: SO 463 Přeložka trasy SEK CETIN a.s. v km 2,460		AROK. Č.: 1861-18-2
OBES:		DATUM: 05/2019
		FORMÁT: A4
		MĚŘITVO: 1:500
		ČÍSLO SOUPRAVY: ČÍSLO PŘÍL. VÝKRESU:
		02.

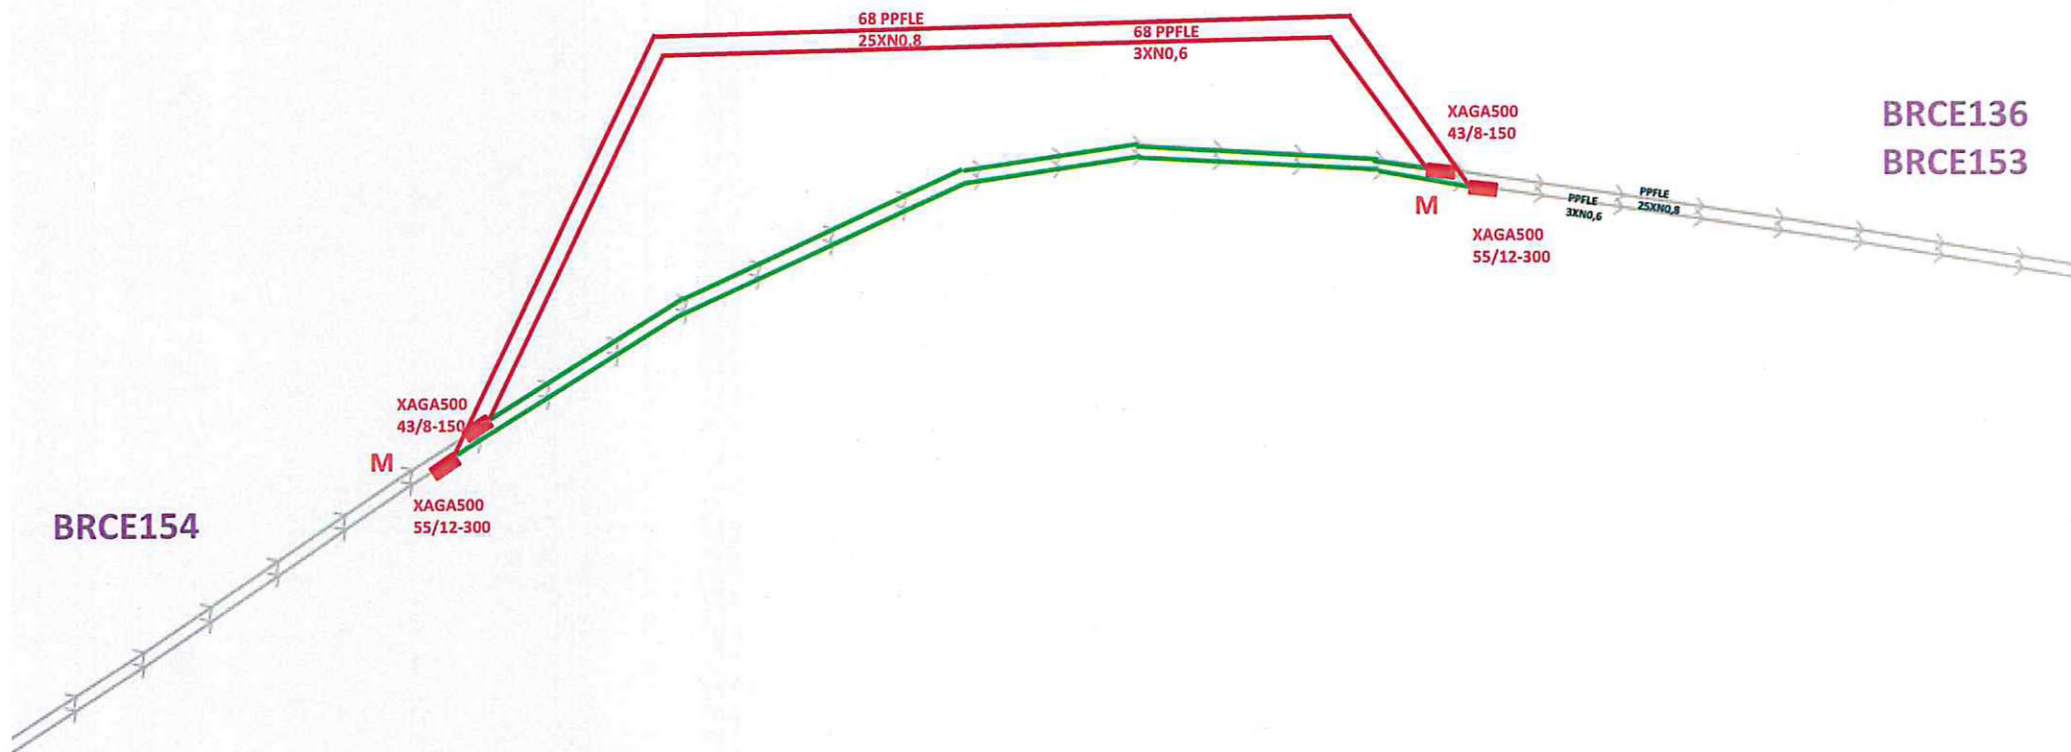



Specifikace nákladů_ první etapa_VPIC II_405_Brtnice obchvat SO461

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Východ 2018-TEM - STAND. - 2020.08

Specifikace nákladů dle CTN

Položková databáze: 2020.08

Název stavby:	VPIC II_405_Brtnice obchvat SO461- první etapa		
Číslo SPP prvku:			
Zhotovitel PD:	L.N.		
Rekapitulace nákladů:			
PŘÍPRAVA		33 886,41 Kč	
ZEMNÍ PRÁCE		389 001,04 Kč	
MONTÁŽ		96 233,83 Kč	
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA		12 543,64 Kč	
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE		29 837,12 Kč	
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA		9 485,45 Kč	
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE		81 993,50 Kč	
PROVOZNÍ PRÁCE		0,00 Kč	
MATERIÁL DOD. CETIN		0,00 Kč	
MATERIÁL VYŘAZENÝ		0,00 Kč	
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný		74 603,77 Kč	
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný		0,00 Kč	
POPLATKY		2 000,00 Kč	
Celkové náklady:	729 584,76 Kč		

Číslo SAP	Seznam položek Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA			
958210	Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	5 058,89 Kč
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě Zóna II, 0,550km	18283.80 JV	18 283,80 Kč
953635	Projekt tlkm liniové optické sítě Trasa OK 0,130km	10543.72 JV	10 543,72 Kč
ZEMNÍ PRÁCE			
954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	198.00 m	3 758,04 Kč
952355	Rýha v trávě 50/110	460.00 m	215 257,00 Kč
954952	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130	96.00 m	166 944,00 Kč
955052	Vytyčení trasy ve volném terénu	600.00 m	3 042,00 Kč
MONTÁŽ			
955079	Demontáž spojky bez demontáže vláken	1.00 ks	910,47 Kč
958306	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	965.00 m	3 657,35 Kč
958310	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	24.00 ks	8 978,64 Kč
958314	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	24.00 ks	1 857,84 Kč
955255	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	1.00 ks	36,81 Kč
955284	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	5.00 ks	245,40 Kč
952602	Montáž trubky úložné	965.00 m	11 840,55 Kč
958557	Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks	16 512,21 Kč
957753	Realizace tratě síťové dohodou Projektová rezerva	12400.00 JV	12 400,00 Kč
958331	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti	24.00 ks	9 288,24 Kč
955306	Úprava spojky	1.00 ks	1 583,32 Kč
958469	Uvedení stavby do provozu	5262.56 JV	5 262,56 Kč
958336	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	1110.00 m	19 380,60 Kč
958558	Zkouška trhací	1.00 ks	1 548,03 Kč
958556	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 731,81 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA			
956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km	455.00 m	7 484,75 Kč
956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	5 058,89 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955199	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	6.00 ks	14 417,88 Kč
956286	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	455.00 m	10 360,35 Kč
956285	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	5 058,89 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	5.00 ks	9 485,45 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene Náhrada za VBŘ - 100Kč/bm	55500.00 JV	55 500,00 Kč
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	5.00 ks	11 382,50 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	5.00 ks	15 111,00 Kč
POPLATKY			
955368	Poplatky k podzemním tratím síť.optickým	2000.00 JV	2 000,00 Kč

Číslo SAP	Limitka materiálu Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303918	Deska krycí plast. 300x1000 mm	460.00 ks	16 854,40 Kč
303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	652.00 m	2 418,92 Kč
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	460.00 m	1 959,60 Kč
303777	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	1200.00 m	2 640,00 Kč
400299	Kapesníček čistící S 4557 - Z201 A 267	24.00 ks	85,20 Kč
302788	Koncovka trubky 40 mm Plasson	1.00 ks	98,13 Kč
302550	Mini Marker 1401 3M Ball	5.00 ks	981,30 Kč
323050	Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm	24.00 ks	125,76 Kč
303003	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	5.00 ks	706,55 Kč
300023	Trubka HDPE 40/33 černá	380.00 m	9 397,40 Kč
300036	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	205.00 m	5 069,65 Kč
300030	Trubka HDPE 40/33 oranžová	380.00 m	9 397,40 Kč
302672	Trubka PE 110/6,3/6000mm	33.00 ks	24 869,46 Kč

Specifikace nákladů_druhá etapa_VPIC II_405_Brtnice obchvat SO462

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Východ 2018-TEM - STAND. - 2020.08

Specifikace nákladů dle CTN

Položková databáze: 2020.08

Název stavby:	VPIC II_405_Brtnice obchvat SO462
Číslo SPP prvku:	
Zhotovitel PD:	Roman Vlč
Rekapitulace nákladů:	
PŘÍPRAVA	20 305,93 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	23 651,34 Kč
MONTÁŽ	46 577,33 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	7 841,28 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 897,09 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	10 298,70 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	907,14 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	1 557,44 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	31 606,31 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkazaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady:	144 642,56 Kč
-------------------------	----------------------

Číslo SAP	Seznam položek	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA	Název položky		
958210	Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	5 058,89 Kč
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě Zóna I, 0,050km	15247.04 JV	15 247,04 Kč
ZEMNÍ PRÁCE			
958554	Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks	5 311,84 Kč
952345	Rýha v trávě 35/70-100	50.00 m	17 706,50 Kč
955054	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	50.00 m	633,00 Kč
MONTÁŽ			
955018	Demontáž jednod.patkov.stož.se vzpěrou	2.00 ks	5 160,08 Kč
955015	Demontáž samonos. kabelů do 5 XN	55.00 m	1 530,65 Kč
955016	Demontáž samonos. kabelů nad 5 XN	100.00 m	3 668,00 Kč
952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	2.00 ks	328,82 Kč
952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	24.00 ks	910,80 Kč
952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	24.00 ks	607,20 Kč
952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	2.00 ks	177,08 Kč
955296	Montáž rozvaděče sloupového	2.00 ks	2 180,40 Kč
954990	Montáž úložných kabelů do 15 XN	55.00 m	1 183,05 Kč
955303	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	2.00 ks	2 306,86 Kč
957753	Realizace tratě síťové dohodou Projektová rezerva	12400.00 JV	12 400,00 Kč
955298	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	91.00 ks	2 302,30 Kč
955259	Ukončení kabelu v rozvaděči	7.00 ks	2 567,46 Kč
958469	Uvedení stavby do provozu	5335.72 JV	5 335,72 Kč
954985	Vystrojení jednoduchého patkov.stožáru	2.00 ks	4 780,66 Kč
958555	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	1.00 ks	1 138,25 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955198	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 782,39 Kč
956284	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	5 058,89 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	1 897,09 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene Náhrada za VBŘ - 100_kč/bm	5000.00 JV	5 000,00 Kč
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 276,50 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	3 022,20 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE			
955208	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	2.00 ks	420,14 Kč
955209	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár	10.00 ks	487,00 Kč

Číslo SAP	Limitka materiálu		
MATERIÁL DOD. CETIN	Název položky	Množství	Celková cena
323839	Zásobník blesk.SID-C3pól.vč.bleskojistek	2.00 ks	1 557,44 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303918	Deska krycí plast. 300x1000 mm	50.00 ks	1 832,00 Kč
305833	Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m	30.00 kg	1 432,80 Kč
305789	Drát ocelový pozink. D 4,0 mm	0.60 kg	34,94 Kč
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	50.00 m	213,00 Kč
300119	Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,6	55.00 m	3 521,10 Kč
306701	Napínač šroubový oko-hák M 16	2.00 ks	180,56 Kč
303174	Objímka stožár. D 140 mm rozvodná	2.00 ks	253,04 Kč
309698	Očnice kovová FeZn pro lano 10mm	2.00 ks	185,80 Kč
305506	Patka stožárová EZP 16x20x290 cm	2.00 ks	3 166,24 Kč
306356	Skříň rozváděče MRS 3-QT 100p-na sloup	2.00 ks	11 374,88 Kč
301339	Sloup dřevěný 7m-impregnace Korasit CK	2.00 ks	3 323,24 Kč
307033	Svorka lanová D 9-12 mm	4.00 ks	62,56 Kč
309974	Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm	2.00 ks	87,66 Kč
309380	Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400	12.00 ks	1 465,56 Kč
306843	Svorník M 20x410x90x25	4.00 ks	182,64 Kč
309665	Vana mont. SID-C 40P 22175-040 CZ	2.00 ks	484,22 Kč
309759	Vodič prop. SM-clip-volný B6 10114-B6U50	7.00 ks	490,63 Kč
306188	Zámek skříně 1370 L2 Morava-42113	2.00 ks	214,58 Kč
309814	Zemnič tyčový D25 1500 mm FeZn	6.00 ks	3 100,86 Kč

Specifikace nákladů_třetí etapa_VPIC II_405_Brtnice obchvat SO463

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Východ 2018-TEM - STAND. - 2020.10

Položková 2020.10

Název stavby: **VPIC II_405_Brtnice obchvat SO463**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: L.N.

KPO:

HOST:

VUJ:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	20 846,94 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	53 116,18 Kč
MONTÁŽ	33 807,93 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	5 058,89 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	5 058,89 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	11 382,54 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	46 792,20 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	28 557,42 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	2 000,00 Kč

Celkové náklady: 206 620,99 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST	120 540,42 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	86 080,57 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	5 058,89 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	1.00 ks	15 788,05 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	66.00 m	1 252,68 Kč
955265 S		Práce zemní pro podzemní tratě síťové	18600.00 J	18 600,00 Kč
Rezerva pro úpravu terénu pro výkop nové trasy a pokládku kabelů popř. provizorní překládku v místě plánovaných terénních úprav stavby				
952355 S		Rýha v trávě 50/110	70.00 m	32 756,50 Kč
955052 S		Vytyčení trasy ve volném terénu	100.00 m	507,00 Kč
MONTÁŽ				
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	2.00 ks	328,82 Kč
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	54.00 ks	2 049,30 Kč
952644 S		Měření střídavé během stavby - další čtyřka	54.00 ks	1 366,20 Kč
952643 S		Měření střídavé během stavby - první čtyřka	2.00 ks	177,08 Kč

954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	56.00 ks	1 416,80 Kč
955281 S	Montáž spojky smršťitelné do 50 čtyřek	4.00 ks	4 805,92 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	68.00 m	1 462,68 Kč
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	68.00 m	1 806,76 Kč
957753 S	Realizace tratě síťové dohodou	12400.00 J	12 400,00 Kč
projektová rezerva			
958469 S	Uvedení stavby do provozu	5262.56 JV	5 262,56 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 731,81 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA			
956278	Předměření trasy do 100 m	1.00 ks	5 058,89 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	5 058,89 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	6.00 ks	11 382,54 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	15000.00 J	15 000,00 Kč
Náhrada za VBŘ - odhadovaná			
Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	6.00 ks	13 659,00 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	6.00 ks	18 133,20 Kč
POPLATKY			
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	2000.00 JV	2 000,00 Kč
Limitka materiálu			
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	70.00 ks	2 564,80 Kč
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	70.00 m	259,70 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	70.00 m	298,20 Kč
303777 S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	200.00 m	440,00 Kč
300129 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,8	68.00 m	11 747,00 Kč
300116 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,6	68.00 m	1 444,32 Kč
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball	2.00 ks	392,52 Kč
312425 S	Modul konektor. 9700-10P	12.00 ks	266,64 Kč
312845 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	2.00 ks	838,20 Kč
312881 S	Spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FLE	2.00 ks	1 455,50 Kč
302672 S	Trubka PE 110/6,3/6000mm	11.00 ks	8 289,82 Kč
309759 S	Vodič prop. SM-clip-volný B6 10114-B6U50	8.00 ks	560,72 Kč
