
**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍŤE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. PN 2020_0060**

mezi

CETIN a.s.

a

obec Sulislav

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená Ing. Zdeňkem Šulcem MBA, supervizorem, Výstavba PPS Čechy

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „**CETIN**“)

a

obec Sulislav

se sídlem Sulislav č.p. 42, 349 01 Stříbro

IČO: 00868965

DIČ: CZ00868965

zastoupená Milanem Strohschneiderem, starostou

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

Překládka je stavba v k.ú. Sulislav spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v Projektu;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování Projektu, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize,

bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*“ ze dne 14.2.2019 vydané pod čj. 542721/19, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Sulislav**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v Projektu.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizaci Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektu;
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však čtyři (4) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí Městského úřadu Stříbro – rozhodnutí o umístění stavby Sulislav, TC, 6x RD – vVN, DTS, kNN č.j. 557/OVÚP/19-3/106 ze dne 17.4.2019, které nabylo právní moci dne 22.5.2019 (dále jen „**Územní rozhodnutí**“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v Územním rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Územním rozhodnutí výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Územní rozhodnutí je Přílohou č. 2 Smlouvy.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy;
- (c) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník

povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu činí ke dni uzavření Smlouvy **268 102,00 Kč** (slovy: dvě stě šedesát osm tisíc jedno sto dva korun českých) (dále jen „**Náklady překládky stanovené na základě Projektu**“). Specifikace těchto nákladů je uvedena v Projektu.
- 5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoací na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované

- dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,
 - (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
 - (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
 - (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
 - (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
 - (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
 - (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
 - (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě daňového dokladu (dále jen „**Faktura**“). Faktura bude společností CETIN vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.
- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Za společnost CETIN:
ve věcech smluvních: Theodor Valenta
funkce: specialista pro výstavbu sítě
tel. 606 694 076, e-mail: theodor.valenta@cetin.cz

ve věcech technických: Pavel Švarc
funkce: specialista pro výstavbu sítě
tel. 602 241 160, e-mail: pavel.svarc@cetin.cz

- 8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních: Milan Strohschneider
funkce: starosta
tel. 602116134 e-mail: ou.sulislav@seznam.cz

ve věcech technických: Milan Strohschneider
funkce: starosta
tel., e-mail: ou.sulislav@seznam.cz

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník doprodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy,

kteřá vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „**Osobní údaje**“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**GDPR**“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu

údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- (a) v listinné podobě;
- (b) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zaručený elektronický podpis**“);
- (c) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
- (d) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.7, věty první Smlouvy a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmeny (c) a (d).

12.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.

12.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

12.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

12.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznamení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.

12.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského

zákoníku:

- § 557;
- § 1767 odst. 2;
- § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
- § 1743.

12.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.

12.10 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

12.11 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

12.12 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

12.13 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností ze Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.14 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.

12.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - Projekt

Příloha č. 2 - Územní rozhodnutí Městského úřadu Stříbro – rozhodnutí o umístění stavby č.j. 557/OVÚP/19-3/106 ze dne 17.4.2019

Doložka

Smlouva byla schválena zastupitelstvem obce Sulistav na schůzi č. 5/5/2020 dne 28.12.2020

Číslo smlouvy společnosti CETIN: PN 2020_0060
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030001846
Registr smluv: NE

CETIN

Stavebník

V Praze dne



V Sulislavi dne

CETIN a.s.

Ing. Zdeněk Šulc, MBA
supervizor, Výstavba PPS Čechy

obec Sulistav

Milan Strohschneider
starosta

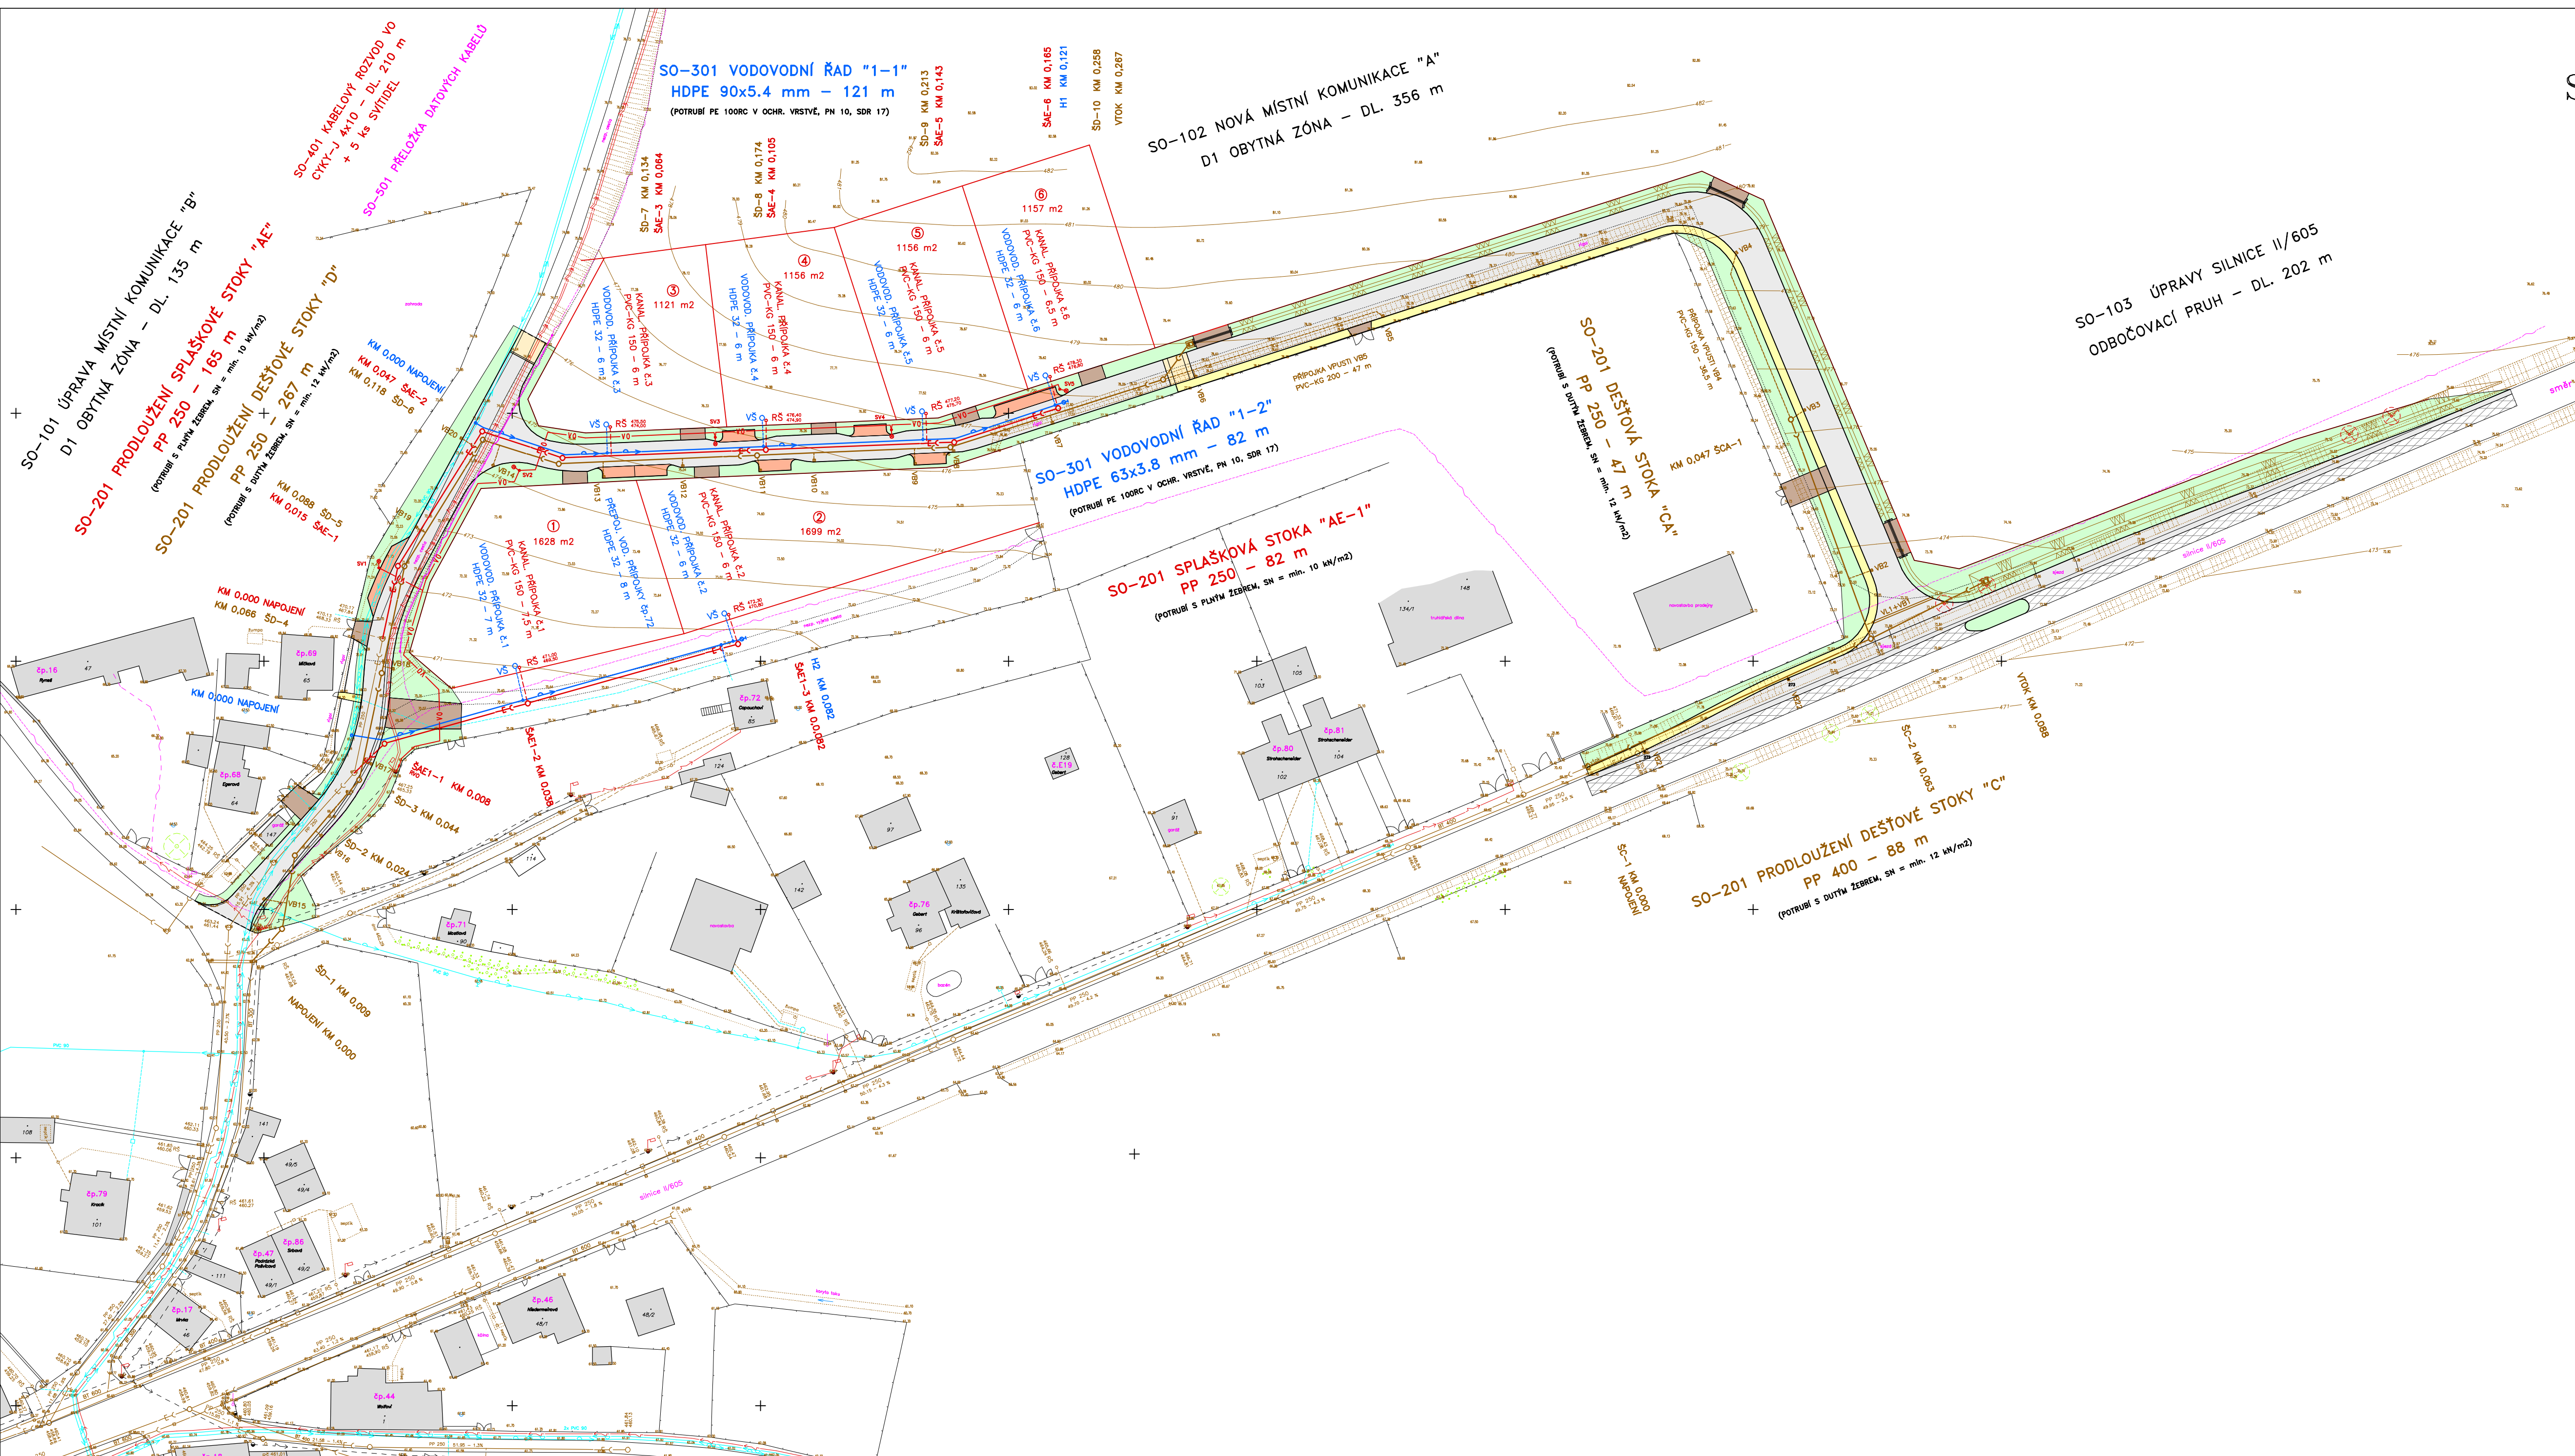

LEGENDA – STÁVAJÍCÍ SÍŤ:



- SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ STOKY
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
- DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ STOKY A PŘÍPOJKY VPUSTÍ
- DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ SVODY
- VODOVODNÍ ŘÁDY A PŘÍPOJKY
- TELEKOMUNIKAČNÍ KABELY VE SPRÁVĚ CETIN, o.s.
- KABELY NN 0,4 kV VE SPRÁVĚ ČEZ Distribuce, o.s.
- VZDUŠNÉ VEDENÍ NN 0,4 kV + SLOUPY
- SLOUPY VZDUŠNÉHO VEDENÍ TELEFONU

LEGENDA – NOVÉ OBJEKTY:

- NAVRŽENÉ ROZDĚLENÍ PARCEL
- 1628 m² VÝMĚRA + OZNAČENÍ NAVRŽENÉ PARCELY
- SO-101 KOMUNIKACE OBYTNÉ ZÓNY – VĚTEV "A"
- SO-102 KOMUNIKACE OBYTNÉ ZÓNY – VĚTEV "B"
- SO-103 ÚPRAVY SILNICE II/605
- NAVRŽENÉ MÍSTNÍ KOMUNIKACE OBYTNÉ ZÓNY – KRYTÝ ZMČNÝ
- NAVRŽENÁ PARKOVACÍ STÁNÍ – KRYTÝ DLÁŽDENÝ
- NAVRŽENÉ SJEZDY K PARCELÁM – KRYTÝ DLÁŽDENÝ
- NAVRŽENÉ PŘÍČNÉ PRAHY, CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD
- NAVRŽENÉ CHODNÍKY – KRYTÝ DLÁŽDENÝ
- NAVRŽENÉ PLOCHY PRO VEŘEJNOU ZELEN
- SO-201+211+212 KANALIZACE, PŘÍPOJKY
- NAVRŽENÉ SPLAŠKOVÉ STOKY
- NAVRŽENÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY NOVÝCH PARCEL
- NAVRŽENÉ DEŠŤOVÉ STOKY
- NAVRŽENÉ PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ (vpusti soudržst komunikací)
- SO-301+311 VODOVOD, PŘÍPOJKY
- NAVRŽENÉ VODOVODNÍ ŘÁDY
- NAVRŽENÉ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY NOVÝCH PARCEL
- SO-401 KABELOVÝ ROZVOD VO
- NAVRŽENÉ KABELOVÉ ROZVODY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- SO-501 PŘELOŽKA DATOVÉHO KABELU
- NAVRŽENÁ PŘELOŽKA DATOVÝCH KABELŮ CETIN, o.s.


Souřadnicový systém: S-JTSK; Výškový systém: Baltický p.v.

Upraveno: Ing. MOSES, RÍHA	Projekce: Ing. MOSES, RÍHA	Václav RÍHA
Míst: PLZEŇSKÝ	Obec: TACHOV	Funkce: 6. 248 01 Středo
Město: SULISLAV	úř: SULISLAV	tel: 379 493 201-202 (včetně mobilního)
Investor: OBEC SULISLAV, Sulislav 42, 349 01 Sůbrno		číslo: 611 30 484
Stavba: SULISLAV KOMUNIKACE A INFRASTRUKTURA OBYTNÉ ZÓNY		Datum: 10/2017
Měřítko: KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY		Stupeň: DŮR+DSP
		Legenda: 1:500
		Arch. číslo: 044 výtvar
		289/2017
		C3.

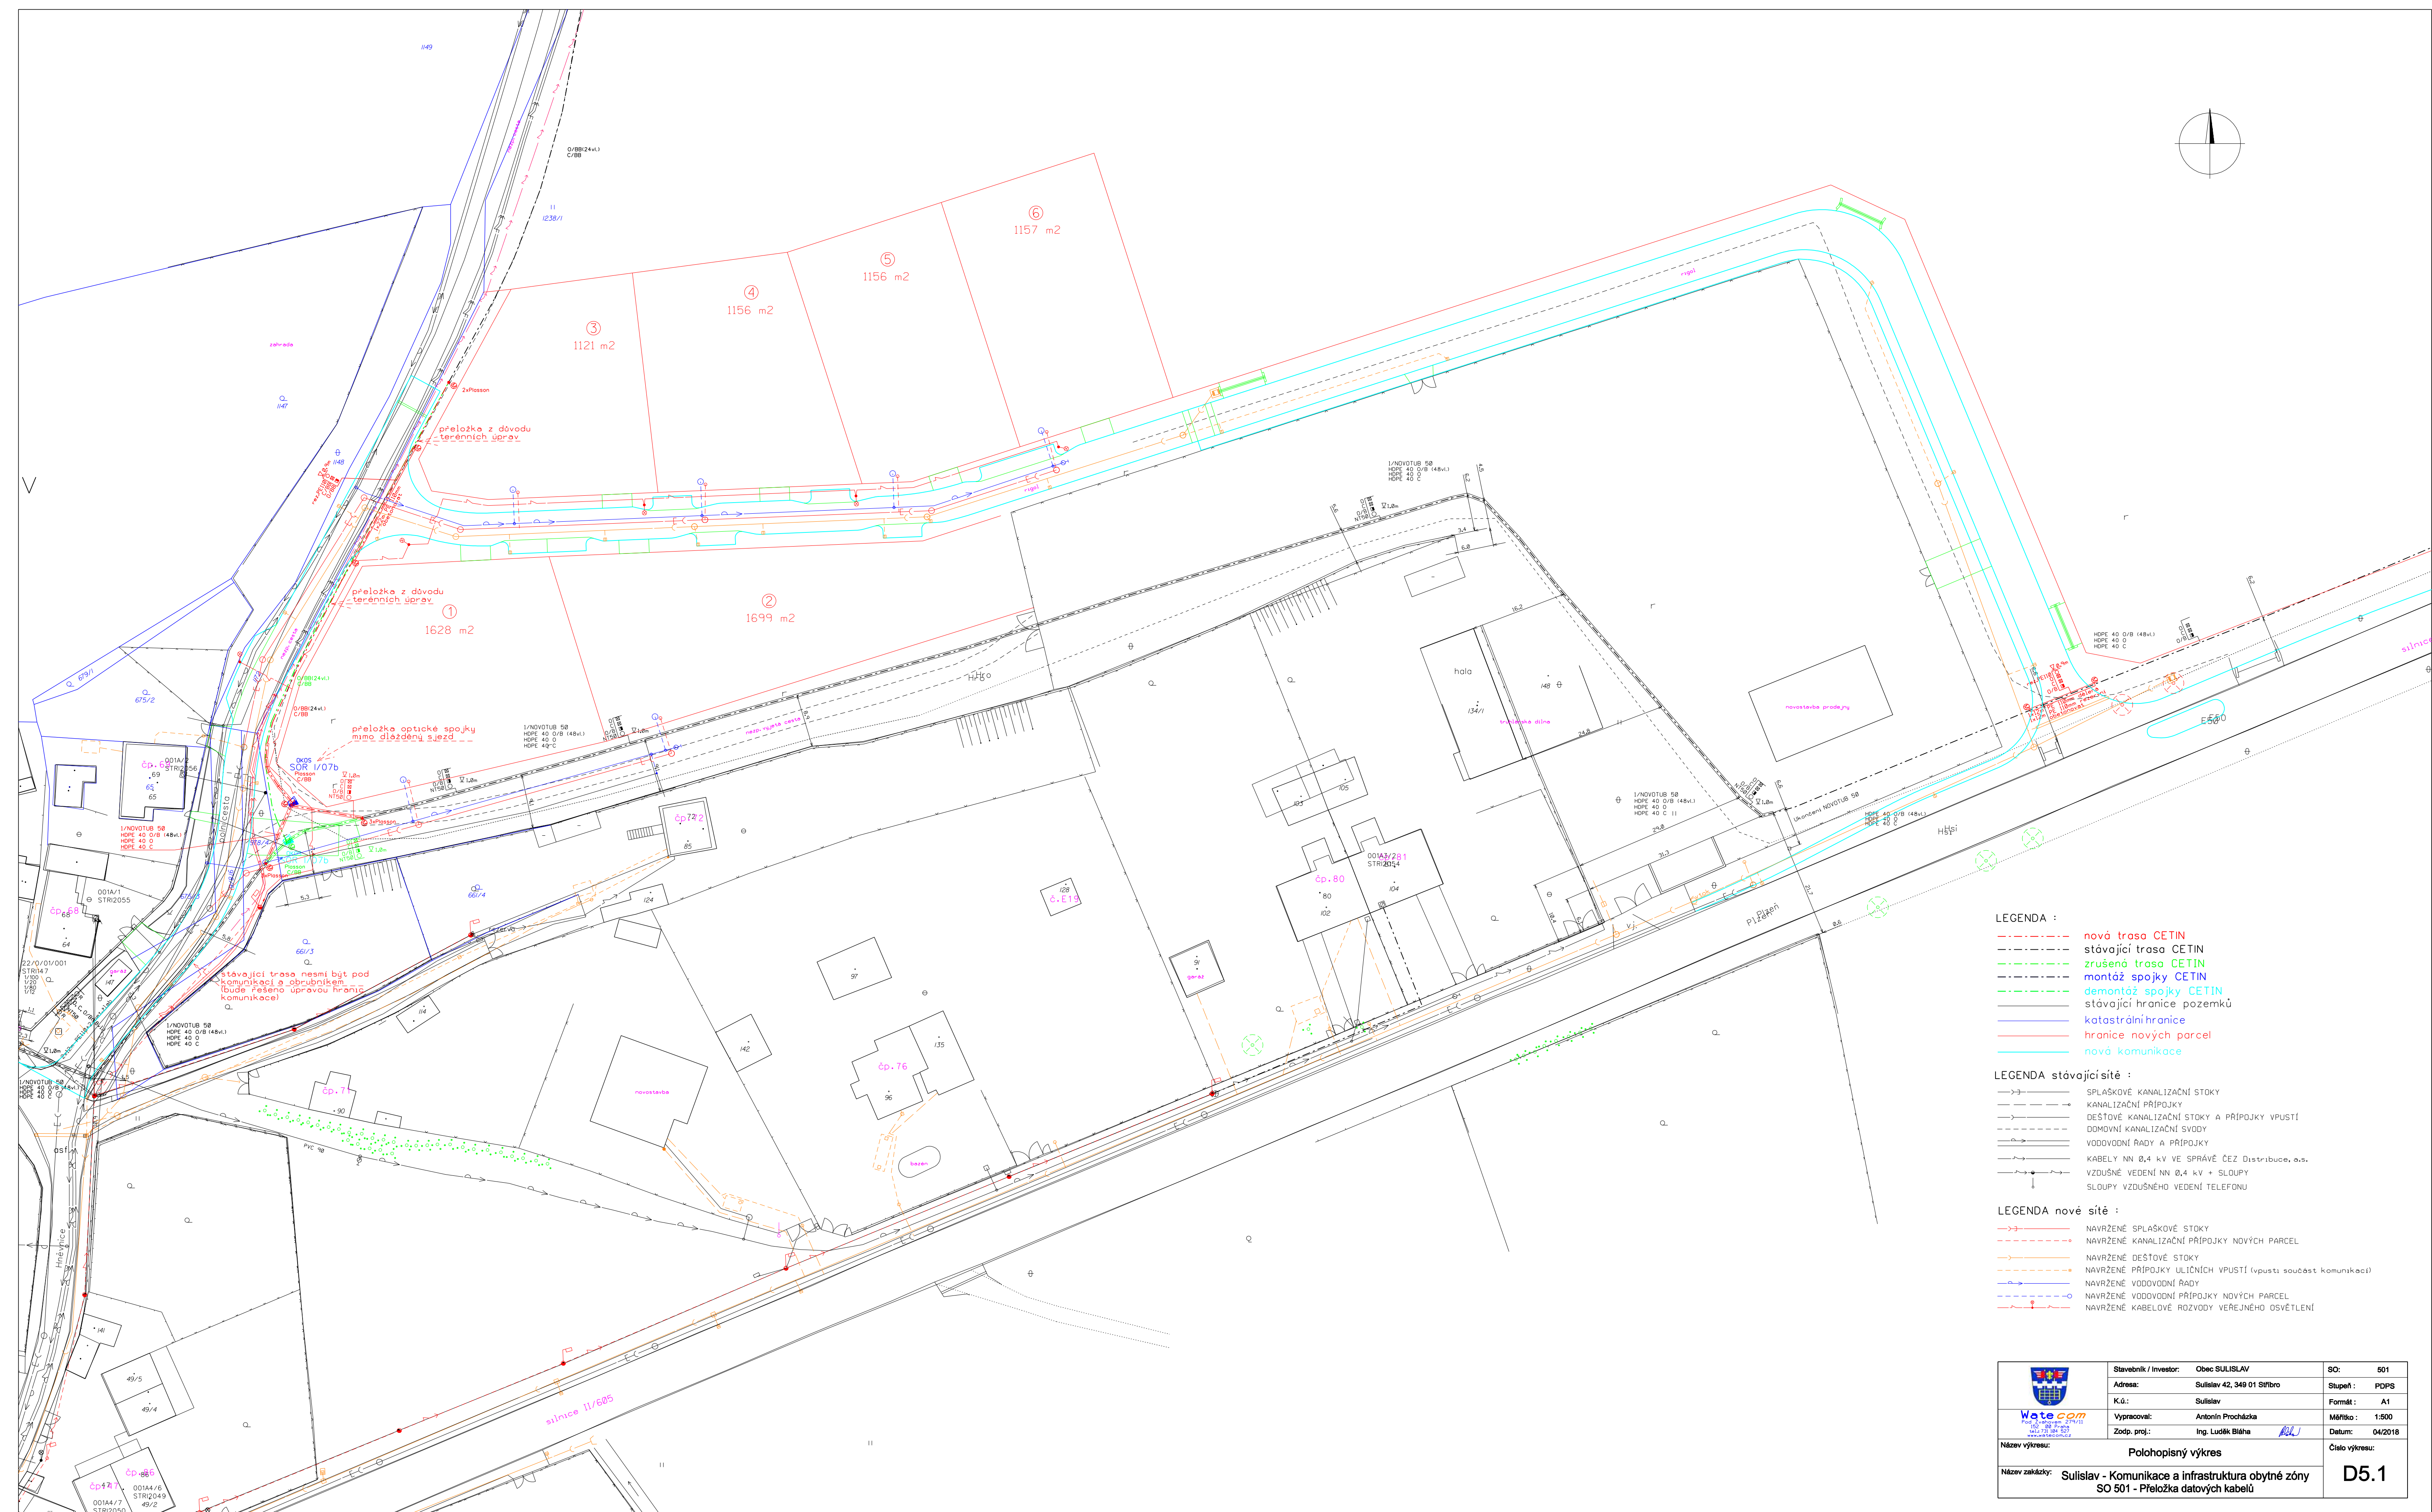

- LEGENDA :**
- nová trasa CETIN
 - - - stávající trasa CETIN
 - · - · zrušená trasa CETIN
 - · - · montáž spojky CETIN
 - · - · demontáž spojky CETIN
 - - - stávající hranice pozemků
 - - - katastrální hranice
 - - - hranice nových parcel
 - - - nová komunikace
- LEGENDA stávající sítě :**
- SPLÁŠKOVÉ KANALIZAČNÍ STOKY
 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
 - DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ STOKY A PŘÍPOJKY VPUSTÍ
 - DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ SVODY
 - VODOVODNÍ RÁDY A PŘÍPOJKY
 - KABELY NN 0,4 kV VE SPRÁVĚ ČEZ Distribuce, a.s.
 - VZDUŠNÉ VEDENÍ NN 0,4 kV + SLoupY
 - SLoupY VZDUŠNÉHO VEDENÍ TELEFONU
- LEGENDA nové sítě :**
- NAVRŽENÉ SPLÁŠKOVÉ STOKY
 - NAVRŽENÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY NOVÝCH PARCEL
 - NAVRŽENÉ DEŠŤOVÉ STOKY
 - NAVRŽENÉ PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ (vpusti součást komunikací)
 - NAVRŽENÉ VODOVODNÍ RÁDY
 - NAVRŽENÉ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY NOVÝCH PARCEL
 - NAVRŽENÉ KABELOVÉ ROZVODY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

	Stavebník / Investor: Obec SULISLAV	SO: 501
	Adresa: Sulislav 42, 349 01 Stříbro	Stupeň: PDPS
	K.ú.: Sulislav	Formát: A1
	Vypracoval: Antonín Procházka	Mřítko: 1:500
Zodp. proj.: Ing. Luděk Bláha	Datum: 04/2018	
Název výkresu: Polohopisný výkres		
Název zakázky: Sulislav - Komunikace a infrastruktura obytné zóny SO 501 - Přeložka datových kabelů		
D5.1		

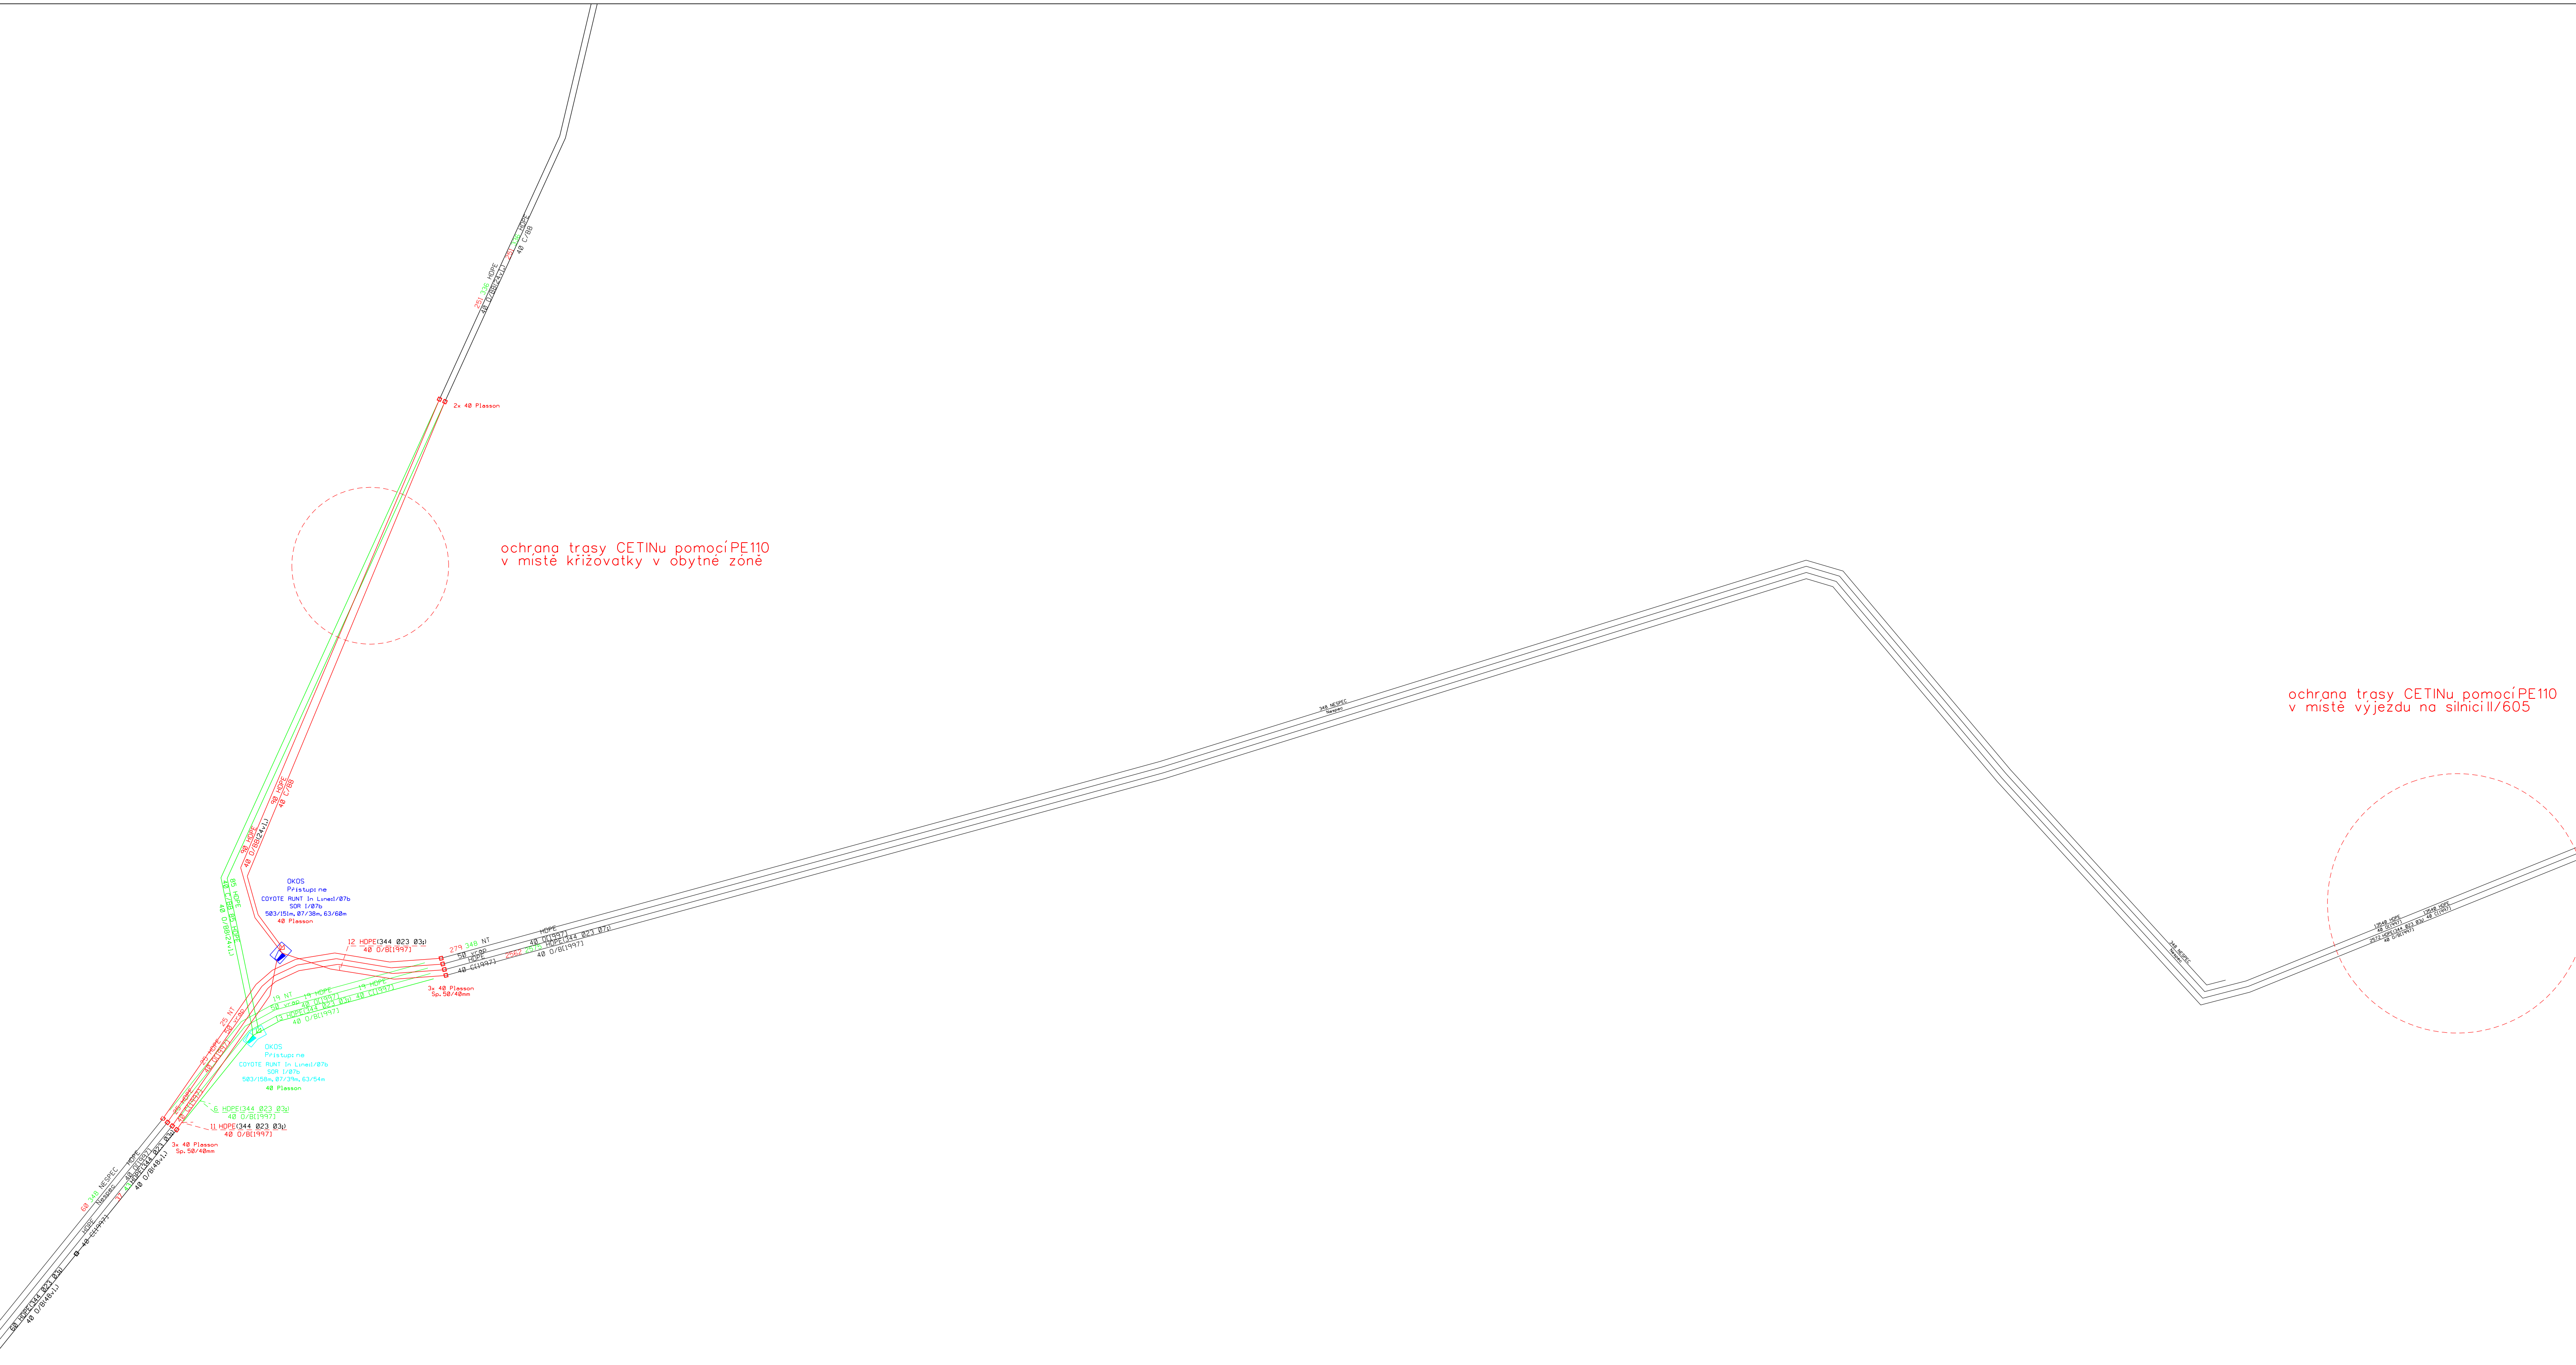


ochrana trasy CETINu pomocí PE110
v místě křižovatky v obytné zóně

ochrana trasy CETINu pomocí PE110
v místě výjezdu na silnici II/605


LEGENDA :

- nová trasa CETIN
- stávající trasa CETIN
- zrušená trasa CETIN
- montáž spojky CETIN
- demontovaná spojka CETIN

	Stavebník / Investor:	Obec SULISLAV	SO:	501
	Adresa:	Sulislav 42, 349 01 Stříbro	Stupeň :	PDPS
	K.ú.:	Sulislav	Formát :	A1
	Vypracoval:	Antonín Procházka	Měřítko :	1:500
Zodp. proj.:		Ing. Luděk Bláha	Datum:	04/2018
Název výkresu: Schematický výkres			Číslo výkresu:	
Název zakázky: Sulislav - Komunikace a infrastruktura obytné zóny SO 501 - Přeložka datových kabelů			D5.2	

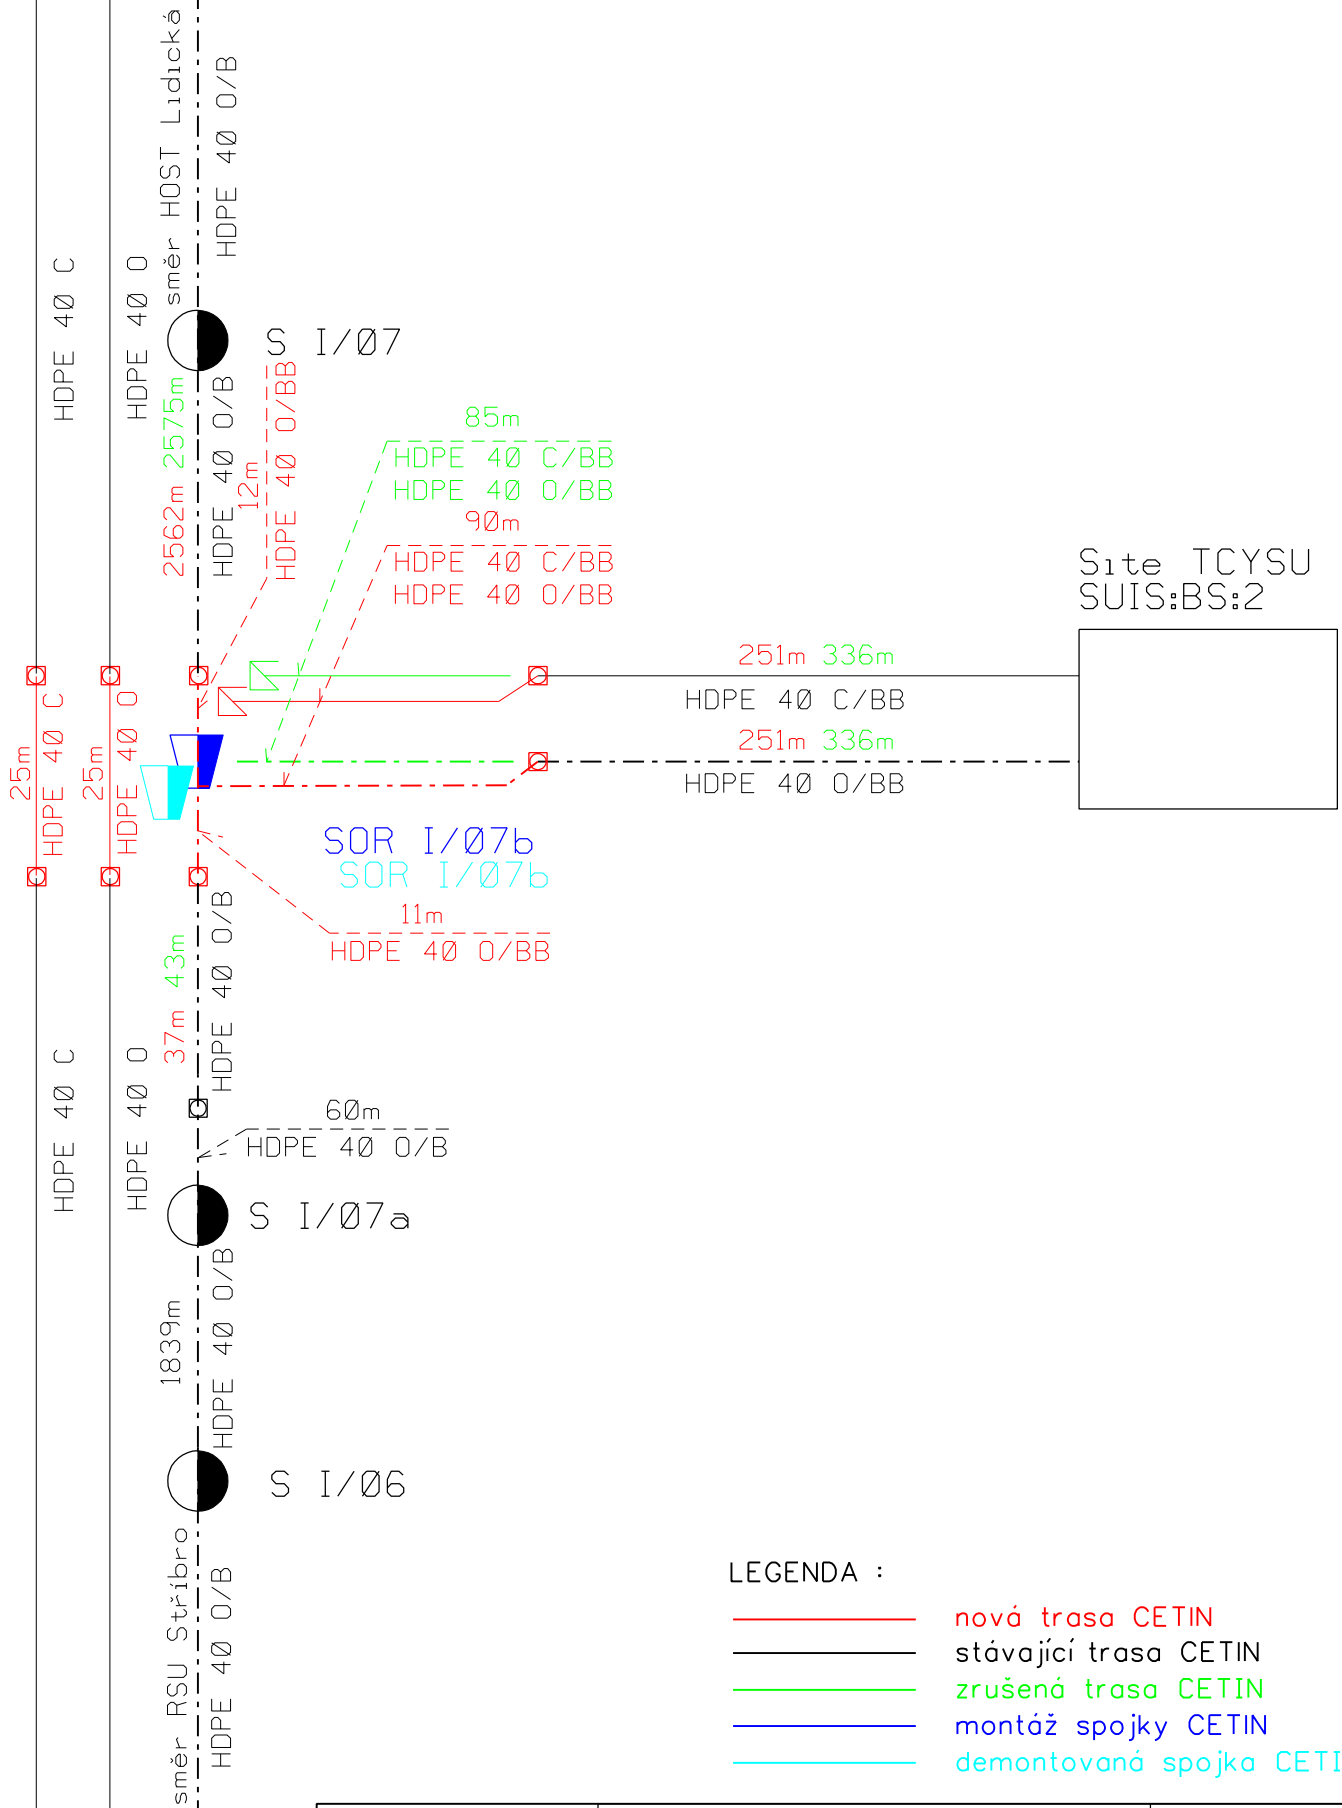

- LEGENDA :
- nová trasa CETIN
 - stávající trasa CETIN
 - zrušená trasa CETIN
 - montáž spojky CETIN
 - demontovaná spojka CETIN

	Stavebník / Investor: Obec SULISLAV	SO: 501
	Adresa: Sulislav 42, 349 01 Stříbro	Stupeň: PDPS
	K.ú.: Sulislav	Formát: A1
	Vypracoval: Antonín Procházka	Měřítko: 1:500
Zodp. proj.: Ing. Luděk Bláha <i>Bláha</i>	Datum: 04/2018	
Název výkresu: Schema dílčích délek HDPE trubek		Číslo výkresu: D5.4
Název zakázky: Sulislav - Komunikace a infrastruktura obytné zóny SO 501 - Přeložka datových kabelů		

Název stavby: SO 501 Sulislav
 Číslo SPP prvku:
 Zhotovitel PD: Watecom s.r.o.
 KPO:
 HOST:
 VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.150	KMP:	0.000	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.000	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.270	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	93 198,06 Kč
MONTÁŽ	112 547,97 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	7 735,58 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	10 045,25 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	2 086,80 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	5 640,18 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	36 848,51 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: **268 102 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST	252 639,79 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	15 462,56 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	124.00 m	2 305,16 Kč
954977 S		Povrchy nad rámeč litý beton	30.00 m2	21 114,90 Kč
952355 S		Rýha v trávě 50/110	150.00 m	68 790,00 Kč
955052 S		Vytyčení trasy ve volném terénu	200.00 m	988,00 Kč
MONTÁŽ				
955123 S		Demontáž koncovky mech.rozeb.s n.bez ven	1.00 ks	32,00 Kč

955038 S	Demontáž ochranného boxu pro spojku	1.00 ks	630,47 Kč
955079 S	Demontáž spojky bez demontáže vláken	1.00 ks	919,46 Kč
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	270.00 m	990,90 Kč
958312 S	Měření oboustranné OTDR (1625 nm) - stavba	52.00 ks	14 225,12 Kč
958314 S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	52.00 ks	4 064,32 Kč
955255 S	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	1.00 ks	36,05 Kč
955003 S	Montáž ochranného boxu pro spojku	1.00 ks	716,47 Kč
955286 S	Montáž spojky bez montáže vláken	1.00 ks	1 039,22 Kč
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	11.00 ks	528,77 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	270.00 m	3 242,70 Kč
958592 S	Provádění PEW v maintenance window	1.00 ks	31 618,06 Kč
958557 S	Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks	16 674,10 Kč
958331 S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní s	52.00 ks	20 322,12 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV	3 720,00 Kč
958336 S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	540.00 m	9 493,20 Kč
958558 S	Zkouška trhací	1.00 ks	1 563,20 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 731,81 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA			
956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km	120.00 m	2 170,80 Kč
956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	5 564,78 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE			
956283 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km	120.00 m	1 837,20 Kč
956282 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	5 564,78 Kč
955199 S	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 643,27 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	2 086,80 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 504,15 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	3 136,03 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	150.00 ks	5 703,00 Kč
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	150.00 m	576,00 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	150.00 m	663,00 Kč
302814 S		Koncovka trubky 40 mm s ventilkem Plass.	1.00 ks	190,09 Kč
312186 S		Konektor UR2-D - suchý	2.00 ks	7,84 Kč
302532 S		Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	2.00 ks	461,64 Kč
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	7.00 ks	1 425,62 Kč
323050 S		Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm	80.00 ks	435,20 Kč
303251 S		Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon	3.00 ks	297,54 Kč
303527 S		Spojka plastová 50/40 mm	2.00 ks	43,46 Kč
304901 S		Spojka trubky HDPE 40mm Comfit-SPCOM	3.00 ks	278,22 Kč
303003 S		Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	8.00 ks	1 173,12 Kč
319209 S		Trubka dělená SYSPRO 160/110	12.00 m	5 539,56 Kč
300027 S		Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	90.00 m	2 310,30 Kč
300023 S		Trubka HDPE 40/33 černá	30.00 m	770,10 Kč
300036 S		Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	90.00 m	2 310,30 Kč
300032 S		Trubka HDPE 40/33 oranžová -bílý pruh	30.00 m	770,10 Kč
300030 S		Trubka HDPE 40/33 oranžová	30.00 m	770,10 Kč
302672 S		Trubka PE 110/6,3/6000mm	16.00 ks	12 512,96 Kč
302361 S		Trubka vrapovaná 50/40 s lankem	30.00 m	525,60 Kč
303465 S		Víčko plastové trubky 110/100 mm	4.00 ks	84,76 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
403175 S		Pěna montážní Soudal 300ml	1.00 ks	0,00 Kč
309816 S		Trubka PVC ohebná FXP 40mm vrapovaná	2.00 m	0,00 Kč

DZ 48-19

MĚSTSKÝ ÚŘAD STŘÍBRO

Odbor výstavby a územního plánování

Masarykovo náměstí 1, 349 01 STŘÍBRO

Tel. +420 374 801 111, Fax +420 374 801 331, E-mail: podatelna@mustribro.cz

OBECNÍ ÚŘAD SULISLAV		č. dop.:
Došlo: 17.4.19	Č. j.: Su/70/19	zprac.: Str.
Poč. listů: 9	Poč. příloh: 8	u. znak 330 1/5

Č. j.: 557/OVÚP/19-3/106

Č. ev.: 8608/19-STŘIBRO

Oprávněná úřední osoba:

Bc. Vladislav Hanzlíček, Pavel Žíla

Vyřizuje: Pavel Žíla

Tel.: 374 801 142

E-mail: zila@mustribro.cz

Stříbro 17.04.2019

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
ProjektEL s. r. o., Masarykova 436, 339 01 Klatovy

- žadatel
- zástupce žadatele

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Dne 11.03.2019 podala spol. ProjektEL s. r. o., Masarykova 436, 339 01 Klatovy, IČ 28044711, jako zplnomocněný zástupce spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, u odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Stříbro, jako obecného stavebního úřadu příslušného podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Sulislav, TC, 6 x RD - vVN, DTS, KNN.

Účastníci územního řízení jsou vymezeni ve smyslu ustanovení § 85 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jmenovitě jsou uvedeni níže. Jedná se o žadatele, obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, vlastníky pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ty, kdo mají jiné věcné právo k těmto pozemkům nebo stavbám, osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

Účastníkem územního řízení, ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), ve znění pozdějších předpisů, je žadatel a vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ti, kteří má jiné věcné právo k těmto pozemkům nebo stavbám.

Městský úřad Stříbro, odbor výstavby a územního plánování, jako obecný stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudil návrh v souladu s ustanovením § 90 stavebního zákona a na základě posouzení vydává podle ustanovení § 92 odst.1 stavebního zákona

územní rozhodnutí o umístění stavby

Sulislav, TC, 6 x RD - vVN, DTS, KNN.

Jedná se o stavbu nového zemního kabelového vedení vysokého napětí ze stávajícího opěrného bodu vzdušného elektrického vedení na hranici p. p. č. 1203 a 1205, k. ú. Sulislav do nové trafostanice v blízkosti hranic p. p. č. 1238/1 a 1238/6, k. ú. Sulislav a stavbu nových zemních kabelů nízkého napětí pro novou obytnou zónu v severovýchodní části obce Sulislav. V rámci stavby bude zdemontováno stávající vzdušné vedení nízkého napětí ze stávající trafostanice Sulislav - obec (na p. p. č. 1205, k. ú. Sulislav), vedoucí přes kostel, rybníky a ukončené na objektu bývalého kravína. Dále bude zdemontováno stávající vzdušné vedení k domům č. p. 68 a 69 Sulislav.

Umístěním nové stavby budou dotčeny části p. p. č. 675/3, 978/4, 978/6, 1147, 1148, 1172, 1205, 1209/1, 1210, 1211/1, 1214, 1226, 1227, 1234, 1238/1, 1238/3, 1238/4, 1238/5, 1238/6, 1238/7, 1238/8, 1238/9 a st. p. č. 64, 65, k. ú. Sulislav.

Vlastníky dotčených pozemků jsou

p. p. č. 675/3, 978/4, 1205, 1209/1, 1210, 1214, 1227, 1234, 1238/1, 1238/3, 1238/6, 1238/7, 1238/8, 1238/9, k. ú. Sulislav - Obec Sulislav, Sulislav 42, 349 01,
p. p. č. 978/6, 1172, k. ú. Sulislav - ČR, Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové,
p. p. č. 1226, k. ú. Sulislav - Finna Vladimír, Sulislav 24, 349 01,
p. p. č. 1147, k. ú. Sulislav - Ryneš Vladimír, Větrná 1286, 349 01 Stříbro,
p. p. č. 1148, k. ú. Sulislav - Zemědělské družstvo Mořina, Mořina 29, 267 17 Mořina,
p. p. č. 1211/1, k. ú. Sulislav - COTONADA s. r. o., Sulislav 7, 349 01,
p. p. č. 1238/4, k. ú. Sulislav - Strohschneider Milan, Sulislav 81, 349 01,
p. p. č. 1238/5, k. ú. Sulislav - Ing. Spal Petr Ph.D., Křížkova 270/15, 301 00 Plzeň a Ing. Spalová Eva, Křížkova 270/15, 301 00 Plzeň,
st. p. č. 64, k. ú. Sulislav - Egerová Amata, Sulislav 68, 349 01,
st. p. č. 65, k. ú. Sulislav - Mičková Miluše, Sulislav 69, 349 01.

Druhy dotčených pozemků jsou

p. p. č. 675/3, 978/4, 978/6, 1148, 1172, 1205, 1209/1, 1210, 1211/1, 1214, 1226, 1227, 1234, k. ú. Sulislav - ostatní plocha,
p. p. č. 1147, k. ú. Sulislav - zahrada,
p. p. č. 1238/1, 1238/3, 1238/4, 1238/5, 1238/6, 1238/7, 1238/8, 1238/9, k. ú. Sulislav - trvalý travní porost,
st. p. č. 64, 65, k. ú. Sulislav - zastavěná plocha a nádvoří.

Jedná se o stavbu, která podle ustanovení § 103, odst. 1, písm. e), bod č. 5 stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. Z tohoto důvodu územní rozhodnutí obsahuje podmínky jak pro umístění, tak pro realizaci stavby.

Pro umístění a následnou realizaci stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna a realizována na částí p. p. č. 675/3, 978/4, 978/6, 1147, 1148, 1172, 1205, 1209/1, 1210, 1211/1, 1214, 1226, 1227, 1234, 1238/1, 1238/3, 1238/4, 1238/5, 1238/6, 1238/7, 1238/8, 1238/9 a st. p. č. 64, 65, k. ú. Sulislav a to dle dokumentace stavby předložené k územnímu řízení (zpracovatel: ProjektEL s. r. o., Masarykova 436, 339 01 Klatovy, IČ 28044711, Stanislav Henek, ČKAIT 0201523, zak. č. IV-12-0013123, datum 02/2019).
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.

3. Při stavbě budou dodržována příslušná ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění novel.
4. Stavba bude dokončena nejpozději v termínu do 31.12.2021.
5. Stavbu bude provádět, v souladu s veškerými předpisy, které se týkají provádění staveb, jakož i s předpisy které se týkají ochrany zdraví a životního prostředí, stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím a aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. Stavebník před zahájením stavby oznámí stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
6. Veškeré škody vzniklé stavbou na jakémkoliv majetku budou bezprostředně odstraněny na náklad žadatele. Dotčené pozemky a stavby budou po skončení prací uvedeny do původního stavu.
7. Stavba nesmí být zahájena dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Stavebnímu úřadu bude písemně oznámeno zahájení prací na stavbě.
8. Stavební činností nesmí být znečišťovány nebo poškozovány veřejné a účelové komunikace ani pozemky veřejného prostranství.
9. Před zahájením prací na stavbě budou vytyčena všechna existující vedení a budou přijata opatření, aby nedošlo k jejich poškození a byla dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení. Případné škody budou odstraněny na náklad žadatele.
10. Odpadní materiály ze stavby budou zlikvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
11. Před zahájením prací v dotčených místních komunikacích musí být jejich zvláštní užívání - pro provádění stavebních prací - povoleno příslušným silničním správním úřadem, tj. Obecním úřadem Sulislav, silničním správním úřadem.
12. Před zahájením prací na stavbě si její zhotovitel vyžádá souhlas spol. ČEZ Distribuce, a. s., s prováděním prací v ochranném pásmu stávajícího elektrického vedení v dotčené lokalitě; případné podmínky tohoto souhlasu musí být zhotovitelem stavby dodrženy.
13. Žadatel a zhotovitel stavby zajistí, aby stavební práce byly prováděny takovým způsobem, aby nebylo ohroženo zdraví a životy osob, zejména uživatelů dotčených pozemků, komunikací a staveb. Staveniště musí být řádně označeno a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob.
14. Před vstupem zhotovitele stavby na cizí pozemky či cizí stavby při provádění stavby (včetně odstranění původního vzdušného vedení) bude s vlastníky dotčeného pozemku či stavby předem toto projednáno a bude s nimi sepsána dohoda o podmínkách vstupu na dotčený pozemek (či stavbu), popř. o podmínkách uvedení pozemku (či stavby) do původního stavu, náhradách vzniklých škod, atd. Po skončení stavby budou dotčené pozemky a stavby zhotovitelem protokolárně předány zpět jejich vlastníkům. Protokoly o předání a převzetí dotčených pozemků a staveb před zahájením a po skončení stavby budou stavebníkem předloženy stavebnímu úřadu při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Případné omezení vjezdů na sousední pozemky v průběhu provádění stavby bude s vlastníky pozemků předem prokazatelně projednáno.

15. Při umístění a realizaci stavby budou dodrženy případné podmínky z vydaných stanovisek ke stavbě od dotčených orgánů a účastníků územního řízení. Vydaná stanoviska jsou nedílnou součástí projektové dokumentace stavby. Jedná se o stanoviska, souhlasy a vyjádření:

Městský úřad Stříbro – odbor životního prostředí ze dne 27.03.2019, č. j. 592/ŽP/19 (souhlas ke křížení stávajícího zatrubněného vodního toku),
Městský úřad Stříbro ze dne 28.02.2019, č. j. 425/OVÚP/19-2/Ha (koordinované závazné stanovisko),
Václav Říha, Projekty, inženýring, Tuněchody, ze dne 14.02.2019, zn. 5/2019,
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Plzeň, ze dne 21.02.2019, zn. 11257/2019/342/Ron SP-2019/3061,
Lesy České republiky s. p., ST - oblast povodí Berounky, Plzeň, ze dne 07.03.2019, č. j. LCR955/000658/2019,
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., ze dne 14.02.2019, č. j. 542721/19,
GridServices, s. r. o., Brno, ze dne 13.02.2019, zn. 5001872101,
ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 13.02.2019, zn. 0101059336,
ČEZ ICT Services, a. s., ze dne 13.02.2019, zn. 070008504,
Telco Pro Services, a. s., ze dne 13.02.2019, zn. 0200868289,
Vodafone Czech Republic a. s., ze dne 18.02.2019, zn. 190215-1451110268,
T - Mobile Czech Republic a. s., ze dne 14.02.2019, zn. E06595/19.

16. Vzhledem k faktu, že se stavba nachází na území s předpokládaným výskytem archeologických nálezů a mohlo by dojít k jejich narušení, je nutné dodržet podmínky zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Z nich vyplývá povinnost ohlásit již od doby přípravy stavby tento záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umožnit záchranný archeologický výzkum pověřené organizaci. Úhrada nákladů tohoto výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Při provádění zemních prací tak budou splněny podmínky zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, ohledně archeologie a s prováděcí organizací (pověřeným archeologickým pracovištěm) bude v předstihu uzavřena smlouva o provedení archeologického výzkumu. V případě archeologických nálezů je dle § 23 zákona č. 20/1987 Sb. nálezce povinen učinit oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu.
17. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby musí být předloženy doklady o prováděných revizích a zkouškách s vyhovujícími výsledky, protokoly o předání a převzetí dotčených pozemků a staveb a geodetické zaměření dokončené stavby.

Toto rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyli-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru; bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává; vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.

Odůvodnění

Dne 11.03.2019 podala spol. ProjektEL s. r. o., Masarykova 436, 339 01 Klatovy, IČ 28044711, jako zplnomocněný zástupce spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, u odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Stříbro, jako obecného stavebního úřadu příslušného podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Sulislav, TC, 6 x RD - WVN, DTS, KNN.

Jedná se o stavbu nového zemního kabelového vedení vysokého napětí ze stávajícího opěrného bodu vzdušného elektrického vedení na hranici p. p. č. 1203 a 1205, k. ú. Sulislav do nové trafostanice v blízkosti hranic p. p. č. 1238/1 a 1238/6, k. ú. Sulislav a stavbu nových zemních kabelů nízkého napětí pro novou obytnou zónu v severovýchodní části obce Sulislav. V rámci stavby bude zdemontováno stávající vzdušné vedení nízkého napětí ze stávající trafostanice Sulislav - obec (na p. p. č. 1205, k. ú. Sulislav), vedoucí přes kostel, rybníky a ukončené na objektu bývalého kravína. Dále bude zdemontováno stávající vzdušné vedení k domům č. p. 68 a 69 Sulislav.

Umístěním nové stavby budou dotčeny části p. p. č. 675/3, 978/4, 978/6, 1147, 1148, 1172, 1205, 1209/1, 1210, 1211/1, 1214, 1226, 1227, 1234, 1238/1, 1238/3, 1238/4, 1238/5, 1238/6, 1238/7, 1238/8, 1238/9 a st. p. č. 64, 65, k. ú. Sulislav.

Vlastníky dotčených pozemků jsou

p. p. č. 675/3, 978/4, 1205, 1209/1, 1210, 1214, 1227, 1234, 1238/1, 1238/3, 1238/6, 1238/7, 1238/8, 1238/9, k. ú. Sulislav - Obec Sulislav, Sulislav 42, 349 01,
p. p. č. 978/6, 1172, k. ú. Sulislav - ČR, Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové,
p. p. č. 1226, k. ú. Sulislav - Finna Vladimír, Sulislav 24, 349 01,
p. p. č. 1147, k. ú. Sulislav - Ryneš Vladimír, Větrná 1286, 349 01 Stříbro,
p. p. č. 1148, k. ú. Sulislav - Zemědělské družstvo Mořina, Mořina 29, 267 17 Mořina,
p. p. č. 1211/1, k. ú. Sulislav - COTONADA s. r. o., Sulislav 7, 349 01,
p. p. č. 1238/4, k. ú. Sulislav - Strohschneider Milan, Sulislav 81, 349 01,
p. p. č. 1238/5, k. ú. Sulislav - Ing. Spal Petr Ph.D., Křížkova 270/15, 301 00 Plzeň a Ing. Spalová Eva, Křížkova 270/15, 301 00 Plzeň,
st. p. č. 64, k. ú. Sulislav - Egerová Amata, Sulislav 68, 349 01,
st. p. č. 65, k. ú. Sulislav - Mičková Miluše, Sulislav 69, 349 01.

Druhy dotčených pozemků jsou

p. p. č. 675/3, 978/4, 978/6, 1148, 1172, 1205, 1209/1, 1210, 1211/1, 1214, 1226, 1227, 1234, k. ú. Sulislav - ostatní plocha,
p. p. č. 1147, k. ú. Sulislav - zahrada,
p. p. č. 1238/1, 1238/3, 1238/4, 1238/5, 1238/6, 1238/7, 1238/8, 1238/9, k. ú. Sulislav - trvalý travní porost,
st. p. č. 64, 65, k. ú. Sulislav - zastavěná plocha a nádvoří.

Výše uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby.

Účastníci územního řízení jsou vymezeni ve smyslu ustanovení § 85 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jmenovitě jsou uvedeni níže. Jedná se o žadatele, obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, vlastníky pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ty, kdo mají jiné věcné právo k těmto pozemkům nebo stavbám, osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

Účastníkem územního řízení, ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), ve znění pozdějších předpisů, je žadatel a vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ti, kteří má jiné věcné právo k těmto pozemkům nebo stavbám.

Městský úřad Stříbro, odbor výstavby a územního plánování, jako příslušný obecný stavební úřad, opatřením ze dne 20.03.2019 oznámil všem známým účastníkům územního řízení a dotčeným orgánům, v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu a v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona, zahájení územního řízení a jelikož byly stavebnímu úřadu dobře známy poměry v místě stavby a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrženého záměru, upustil stavební úřad od ústního jednání a ohledání na místě. Pro uplatnění případných námitek a stanovisek byla stanovena lhůta 20 dnů. Ve stanovené lhůtě nikdo z účastníků řízení ani dotčených orgánů nenahlížel do spisu a k navrhovanému umístění stavby nebylo uplatněno žádných námitek či připomínek.

Jedná se o stavbu, která podle ustanovení § 103, odst. 1, písm. e), bod č. 5 stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. Z tohoto důvodu územní rozhodnutí obsahuje podmínky jak pro umístění, tak pro realizaci stavby.

K podané žádosti byla doložena vyjádření, stanoviska, závazná stanoviska:

Městský úřad Stříbro – odbor životního prostředí ze dne 27.03.2019, č. j. 592/ŽP/19 (souhlas ke křížení stávajícího zatrubněného vodního toku),

Obecního úřadu Sulislav, silničního správního úřadu, ze dne 11.03.2019,

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Tachov, ze dne 19.03.2019, č. j. HSPM-823-2/2019 TA,

Městský úřad Stříbro ze dne 28.02.2019, č. j. 425/OVÚP/19-2/Ha (koordinované závazné stanovisko),

Václav Říha, Projekty, inženýring, Tuněchody, ze dne 14.02.2019, zn. 5/2019,

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Plzeň, ze dne 21.02.2019, zn. 11257/2019/342/Ron SP-2019/3061,

Lesy České republiky s. p., ST - oblast povodí Berounky, Plzeň, ze dne 07.03.2019, č. j. LCR955/000658/2019,

Česká telekomunikační infrastruktura a. s., ze dne 14.02.2019, č. j. 542721/19,

GridServices, s. r. o., Brno, ze dne 13.02.2019, zn. 5001872101,

ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 13.02.2019, zn. 0101059336,

ČEZ ICT Services, a. s., ze dne 13.02.2019, zn. 070008504,

Telco Pro Services, a. s., ze dne 13.02.2019, zn. 0200868289,

Vodafone Czech Republic a. s., ze dne 18.02.2019, zn. 190215-1451110268,

T - Mobile Czech Republic a. s., ze dne 14.02.2019, zn. E06595/19.

Vydaná stanoviska jsou nedílnou součástí projektové dokumentace stavby. Povinnost dodržet případné podmínky z citovaných stanovisek a vyjádření byla stavebním úřadem zapracována do podmínek územního rozhodnutí (viz. podmínka č. 15 tohoto rozhodnutí).

K umístění části navržené stavby do tělesa dotčené místní komunikace bylo vydán souhlas Obecního úřadu Sulislav, silničního správního úřadu, ze dne 11.03.2019.

Umístění stavby bylo z hlediska územního plánování posouzeno příslušným orgánem státní správy na úseku územního plánování, tj. Městským úřadem Stříbro - OVÚP, Úřadem územního plánování, který k umístění stavby vydal souhlasné závazné stanovisko (v rámci koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Stříbro ze dne 28.02.2019, č. j. 425/OVÚP/19-2/Ha).

Po posouzení podané žádosti podle § 90 stavebního zákona bylo zjištěno, že návrh je v souladu s územně plánovací dokumentací, cíli a úkoly územního plánování, požadavky na využívání území, požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Stavební úřad neshledal v průběhu řízení nedostatky, které by bránily vydání navrhovaného územního rozhodnutí, proto rozhodl, jak výše uvedeno.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze dle ust. § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje - odboru regionálního rozvoje, písemným podáním u zdejšího odboru výstavby. V odvolání se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy, nesprávnost rozhodnutí nebo řízení jež mu předcházelo. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné.

Bc. Vladislav Hanzlíček v. r.
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování

otisk úředního razítka

Za správnost vyhotovení:
Pavel Žíla

Účastníci územního řízení:

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Finna Vladimír, Sulislav 24, 349 01
Ryneš Vladimír, Větrná 1286, 349 01 Stříbro
Strohschneider Milan, Sulislav 81, 349 01
Ing. Spal Petr Ph.D., Křížkova 270/15, 301 00 Plzeň
Ing. Spalová Eva, Křížkova 270/15, 301 00 Plzeň
Egerová Amata, Sulislav 68, 349 01
Eger Josef, Sulislav 68, 349 01
Mičková Miluše, Sulislav 69, 349 01
Pelzlová Kateřina, Sulislav 43, 349 01
Flajšman Václav, Sulislav 8, 349 01
Kracík Svatoslav, Sulislav 79, 349 01
ČR, Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
ČR, Lesy České republiky, s. p., Správa toků, oblast povodí Berounky,
Slovanská alej 2323/36, 326 00 Plzeň
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
Zemědělské družstvo Mořina, Mořina 29, 267 17 Mořina
COTONADA s. r. o., Sulislav 7, 349 01
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha

Vodafone Czech Republic a. s., Náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha
Václav Říha, Projekty, inženýring, Tuněchody 9, 349 01
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
Oberbank AG, id.č.FN 79063w, Untere Donaulände 28, A-4020 Linz, Rakousko, doručovací
adresa: Oberbank AG pobočka Česká republika, Nám. Přemysla Otakara II. 6/3, 370 01
České Budějovice
Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha
Obec Sulislav, Sulislav 42, 349 01

Dotčené orgány:

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, ú. p. Tachov
Obecní úřad Sulislav - Silniční správní úřad
Městský úřad Stříbro - odbor životního prostředí
Městský úřad Stříbro - OVÚP, Památková péče
Městský úřad Stříbro - OVÚP, ÚÚP

Doručí se:

ProjektEL s. r. o., Masarykova 436, 339 01 Klatovy
Finna Vladimír, Sulislav 24, 349 01
Ryneš Vladimír, Větrná 1286, 349 01 Stříbro
Strohschneider Milan, Sulislav 81, 349 01
Ing. Spal Petr Ph.D., Křížkova 270/15, 301 00 Plzeň
Ing. Spalová Eva, Křížkova 270/15, 301 00 Plzeň
Egerová Amata, Sulislav 68, 349 01
Eger Josef, Sulislav 68, 349 01
Mičková Miluše, Sulislav 69, 349 01
Pelzlová Kateřina, Sulislav 43, 349 01
Flajšman Václav, Sulislav 8, 349 01
Kracík Svatoslav, Sulislav 79, 349 01
ČR, Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
ČR, Lesy České republiky, s. p., Správa toků, oblast povodí Berounky,
Slovanská alej 2323/36, 326 00 Plzeň
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
Zemědělské družstvo Mořina, Mořina 29, 267 17 Mořina
COTONADA s. r. o., Sulislav 7, 349 01
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Vodafone Czech Republic a. s., Náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha
Václav Říha, Projekty, inženýring, Tuněchody 9, 349 01
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
Oberbank AG, id.č.FN 79063w, Untere Donaulände 28, A-4020 Linz, Rakousko, doručovací
adresa: Oberbank AG pobočka Česká republika, Nám. Přemysla Otakara II. 6/3, 370 01
České Budějovice
Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha
Obec Sulislav, Sulislav 42, 349 01
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, ú. p. Tachov
Obecní úřad Sulislav - Silniční správní úřad
Městský úřad Stříbro - odbor životního prostředí
Městský úřad Stříbro - OVÚP, Památková péče
Městský úřad Stříbro - OVÚP, ÚÚP

vlastní

Příloha:

ověřená dokumentace stavby bude doručena po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

MĚSTSKÝ ÚŘAD STŘÍBRO

Odbor výstavby a územního plánování

Masarykovo náměstí 1, 349 01 STŘÍBRO

Tel. +420 374 801 111, Fax +420 374 801 331, E-mail: podatelna@mustribro.cz

OBECNÍ ÚŘAD SULISLAV		č. dep.:
Došlo: 24.5.19		zprac.: Str.
Č. j.: 54/98/19		u. znak
Poč. listů: 1	Poč. příloh: 0	330 V/5

Č. j.: 557/OVÚP/19-4

Č. ev.: 11132/19-STŘIBRO

Oprávněná úřední osoba:

Bc. Vladislav Hanzlíček, Pavel Žíla

Vyřizuje: Pavel Žíla

Tel.: 374 801 142

E-mail: zila@mustribro.cz

Stříbro 23.05.2019

ProjektEL s. r. o., Masarykova 436, 339 01 Klatovy

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí

Oznamujeme Vám, že rozhodnutí odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu ve Stříbře, vydané dne 17.04.2019 pod č. j.: 557/OVÚP/19-3/106 – územní rozhodnutí o umístění stavby **Sulislav, TC, 6 x RD - vVN, DTS, kNN**, nabylo právní moci dne **22.05.2019** a je proto vykonatelné.

V. Ž. 

Bc. Vladislav Hanzlíček
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování



Za správnost vyhotovení:
Pavel Žíla

Obdrží:

ProjektEL s. r. o., Masarykova 436, 339 01 Klatovy
Obec Sulislav, Sulislav 42, 349 01

Vlastní

Příloha:

1 x ověřená PD
