



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o real. překládce sítě elektr. komun. č. VPI/MJ/2017/00012, akce: "II/602 V. Meziříčí - most ev.č. 602-028"			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství			
Schváleno:	ZK	Datum:	7. 2. 2017	Č.usnesení: 0044/01/2017/ZK
Dokument uložen u:	Ing. Blaha/ODSH			
Počet vyhotovení:	2			
Adresát:	Česká telekomunikační infrastruktura a.s.			
Smluvní částka: 1)	849789.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	neprodleně			

		Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:		Ing. Blaha/ ODSH	14.2.2017	
Projednáno s:		Ing. Handa/ ODSH	14.2.2017	
Právní kontrola:		JUDr. Mládek/ ODSH	14.2.2017	
Předkládá:		Ing. Strnadová/ ODSH	14.2.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)		Ing. Strnadová /ODSH	14.2.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	Ing. Strnadová/ ODSH	14.2.2017	
	Správce rozpočtu:	Ing. Sošková/ OE	14.2.2017	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 04084063), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: blaha.d, datum ověření: 14.02.2017 09:37:24):

Smlouva o realizaci překládce sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2017/00012, akce: "II/602 Velké Meziříčí - most ev.č. 602-028"

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 849789, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1000, ORG: 0001890000000 POL: 6121 UZ: 1070000

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžitě plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžitě plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP0170JNG

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2017/00012

uzavřená dle ustanovení § 1724 a § 1746 odst. 2 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění

Vlastník sítě elektronických komunikací:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623
Zastoupená Ing. Zdeňkem Šulcem, MBA, manažerem, Výstavba pevné přístupové sítě dle pověření

Bankovní spojení: PPF banka

Číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „CETIN“)

a

Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací:

Kraj Vysočina

Se sídlem:

v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ :

708 90 749

DIČ :

CZ 708 907 49

Zastoupen:

hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounekem

zástupce pro věci smluvní:

MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje, Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

k podpisu smlouvy pověřen:

Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci technické:

Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová

Bankovní spojení :

Sberbank CZ, a.s.

Číslo účtu :

4 200 134 175/6800

(dále jen „Stavebník“)

uzavírají tuto smlouvu:

Definice pojmů

Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) se rozumí stavba spočívající ve změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení veřejné komunikační sítě.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy a současně prohlašuje, že SEK užívá ke své podnikatelské činnosti

Stavebník ve smyslu Vyjádření o existenci SEK a Všeobecných podmínek ochrany SEK vydaného dne 13.5.2016 pod č. 610335/16 vyvolává ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. č. 127/2005 Sb. překládku dotčeného úseku SEK.
Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením

„VPI Vel.Meziříčí ZR most ev.č. 602_028“.

Čl. 2 Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je požadavek Stavebníka na překládku SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, závazek společnosti CETIN zajistit si překládku SEK a s ní související záležitosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek Stavebníka, jež překládku SEK vyvolal, uhradit všechny nezbytné náklady, které společnosti CETIN v souvislosti se zajištěním překládky SEK vzniknou.

Čl. 3 Překládka SEK, podmínky překládky SEK

3.1 Překládka SEK dle této smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech dle Cenového a technického návrhu překládky SEK VPI Vel.Meziříčí ZR most ev.č. 602_028, který je Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Překládka“).

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

- zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu (Překládky)
- zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených překládkou SEK nebo vyvlastnění takového práva.

(to vše dále jen „Předpoklady pro realizaci překládky SEK“).

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci překládky SEK nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

Čl. 4 Plnění spojená s překládkou SEK

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje

- před realizací Překládky:

- zajistit vyhotovení projektové dokumentace Překládky (dále jen „Projekt“) a její odsouhlasení stavebníkem
- uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí. V případě, že tuto povinnost nesplní je povinna oznámit stavebníkovi ve lhůtě do 30 dnů od zjištění této skutečnosti, že tato povinnost není splněna
- po realizaci Překládky:
 - zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky.
 - zajistit nezbytné geometrické plány s vyznačenými služebnostmi a vklad služebností do katastru nemovitostí

4.2 V souvislosti s provedením překládky se Stavebník zavazuje

- před realizací Překládky:
 - zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky),
 - písemně oznámit společnosti CETIN, nejpozději 6 týdnů před zahájením realizace Překládky, stavební připravenost a vyzvat CETIN k realizaci Překládky s tím, že tato výzva může být učiněna nejdříve 4 měsíce po uzavření této smlouvy.

Strany shodně konstatují, že společnost CETIN bude na základě Územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby včetně Překládky vydaného na návrh Stavebníka oprávněna provést Překládku za podmínek stanovených v tomto územním rozhodnutí, ve stanoviskách dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak budou v tomto územním rozhodnutí stanoveny, a to na základě této smlouvy se Stavebníkem. Toto územní rozhodnutí je po nabytí právní moci Stavebník povinen společnosti CETIN neprodleně předat.

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky do 3 měsíců od doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce a to za předpokladu, že ke dni doručení písemné výzvy stavebníka dle předchozího odstavce jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci překládky SEK uvedené v Čl. 3 bodu 3.2 této smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v Čl. 6 bodu 6.1 písm. a) a v Čl. 4. bodu 4.2 této smlouvy vyjma ustanovení o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 3 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 Sb. k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN - vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou, stejně tak v případě nákladů společnosti CETIN za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do Katastru nemovitostí event. případně nákladů vzniklých společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smlouvy o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.

4.6 Sjednaná lhůta realizace Překládky dle Čl. 4 bodu 4.3 této smlouvy se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN. Prodloužení termínu realizace bude řešeno formou dodatku ke smlouvě.

4.7 Závazky (povinnosti) společnosti CETIN z této smlouvy týkající se realizace Překládky a souvisejících záležitostí, jež Překládce předcházejí, jsou rozděleny do dvou etap. První etapa je co do rozsahu stanovena položkami uvedenými v Příloze č. 3 této smlouvy (dále jen „První etapa“) a bude považována za ukončenou dnem ukončení První etapy tj. dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v Čl. 8 této smlouvy oznámení o ukončení První etapy. Druhá etapa bude stanovena co do rozsahu Projektem (dále jen „Druhá etapa“) a považována za dokončenou dnem ukončení realizace Překládky tj. dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v Čl. 8 této smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky

4.8 CETIN se zavazuje koordinovat realizaci přeložky s ohledem na další podmínky vyplývající z dokumentace stavby II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602-028, která překládku vyvolala.

Čl. 5

Náklady spojené s překládkou SEK

5.1 Stavebník je na základě zákona č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK (včetně nákladů vymezených v čl. 4.4. této smlouvy), které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k překládce nedošlo.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu ke dni uzavření této smlouvy činí **849.789,- Kč**. Překládka na základě zákona č. 127/2005 Sb. je mimo předmět daně z přidané hodnoty.

Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační),

5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu“). Společnost CETIN písemně oznámí do **3** měsíců od uzavření této smlouvy Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit za předpokladu, že nebudou zahrnuty v nákladech Překládky stanovených po vyhotovení Projektu ve smyslu čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy. Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN na základě dodatku k této smlouvě uhradit, přičemž smluvní strany se zavazují takový dodatek uzavřít před provedením prací nebo vznikem nákladů souvisejících s překládkou SEK a to do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jeho uzavření Stavebníkovi. Pokud k uzavření takového dodatku v uvedené lhůtě

nedojde, uhradí Stavebník tyto náklady společnosti CETIN na základě jejich uplatnění. Může se jednat například o:

- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníků Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v Čl. 4 bodu 4.4. této smlouvy),
- náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 bodu 4.4 této smlouvy,
- náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z Katastru nemovitostí,
- náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- náklady na identifikaci parcel,
- náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou zhotoviteli v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací předmětného díla podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- náklady na peněžitě plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

Čl. 6

Platební podmínky

6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle Čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy je Stavebník povinen uhradit takto:

- a) Fakturu č. 1 ve výši **35.172,- Kč** do 30 dnů ode dne jejího vystavení,
- b) Fakturu č. 2 ve výši doplatku nákladů za Překládku do 30 dnů od jejího vystavení.

6.2 Faktura dle bodu 6.1 písm. a) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od ukončení První etapy, faktura dle bodu 6.1 písm. b) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu Čl. 4 bodu 4.7 této smlouvy a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti.

6.3 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy.

6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v Čl. 5 bod 5.4 této smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných faktur vystavených společností CETIN a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne vystavení každé jednotlivé faktury

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak. Dnem úhrady faktury (zaplacením fakturovaných nákladů) se rozumí den připsání účtované (fakturované) částky na účet společnosti CETIN.

Čl. 7 Sankce

7.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Stavebníka s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebníka zaplatit společnosti CETIN úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.

7.2 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení společnosti CETIN ve lhůtách překládek dohodnutých v souladu s čl. 4.3. této smlouvy povinnost společnosti CETIN zaplatit stavebníkovi smluvní pokutu ve výši 0,3 % ze sjednané částky za každý den prodlení

7.3. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.

7.4. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 a 7.2 tohoto článku, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

7.5. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 až 7.3. tohoto článku, trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

Čl. 8 Kontaktní osoby

a) Za CETIN :

ve věcech smluvních Ludmila Uhrová funkce :specialista pro výstavbu sítě

e-mail ludmila.uhrova@cetin.cz

tel. 607 931 841

ve věcech technických Petr Bílek

funkce: specialista pro výstavbu sítě – přístupová síť

e-mail petr.bilek@cetin.cz

tel. 606 758 332

b) Za stavebníka :

ve věcech smluvních: MUDr. Jiří Běhounek funkce: hejtman kraje,

Ing. Jan Hyliš

funkce: člen rady kraje pro oblast dopravy a
silničního hospodářství

ve věcech technických: Ing. Daniel Blaha funkce: úředník ODSH

e-mail: blaha.d@kr-vysocina.cz tel. 724 650 184

Čl. 9

Odstoupení od smlouvy

9.1 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou některé platby dle této smlouvy a toto prodlení trvá déle než 60 dní, poruší Stavebník smlouvu podstatným způsobem a společnost CETIN je oprávněna od této smlouvy odstoupit nejpozději do 80. dne prodlení.

9.2 Pokud výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10% než výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu je Stavebník oprávněn odstoupit od této smlouvy do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle Čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy.

9.3 V případě, že dojde k odstoupení dle bodu 9.1 nebo 9.2 tohoto článku je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této smlouvy.

Čl. 10

Rozvazovací podmínka

10.1. Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění, nedohodnou-li smluvní strany jinak.

10.2. Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. Zánikem smlouvy touto rozvazovací podmínkou není dotčeno právo společnosti CETIN na zaplacení smluvní pokuty dle Čl. 7 bodů 7.1.až 7.5. této smlouvy, a tomu odpovídající povinnost Stavebníka tuto pokutu zaplatit. Právo na náhradu škody zůstává zachováno.

Čl. 11

Závěrečná ustanovení

11.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

11.2. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

11.3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

11.4. Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští.

11.5. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

11.6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude zasílána doporučeně na adresy uvedené v hlavičce této smlouvy nebo na adresy elektronické pošty uvedené v Čl. 8 této smlouvy, ustanovení § 573 občanského zákoníku se neuplatní.

11.7. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11.8. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku na tuto smlouvu.

11.9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

11.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

11.11. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

11.12. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy.

11.13. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru stavebníka vlastník PZ výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické dokumentace, které jim byly svěřeny druhou stranou nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než je plnění podmínek této smlouvy.

11.14. CETIN prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustila v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním stavebník uzavřel smlouvu, a že se nedopustila žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.


11.15 Společnost CETIN výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Stavebník.

11.16. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Přílohy :

1. Cenový a technický návrh Překládky
2. Specifikace nákladů
3. Specifikace První etapy Překládky
3. Pověření Ing. Zdeňka Šulce

V Brně dne 17-02-2017




Česká telekomunikační infrastruktura a.s.:
Ing. Zdeněk Šulc, MBA
manažer, Výstavba pevné přístupové sítě

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Cibenská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

231

V Jihlavě dne 20.2.2017



Stavebník: Kraj Vysočina
Ing. Jan Hylíš
člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

TECHNICKÁ ZPRÁVA CaTN

VPI Vel.Meziříčí ZR most ev.č. 602_028

CaTN řeší situaci vyvolanou plánovanou rekonstrukcí mostu ev.č. 602-028 ve Velkém Meziříčí.

Ve stávajícím mostě jsou vedeny trasy telekomunikačního vedení spol. CETIN. Jedná se o metalické kabely a optotrubky, které nejsou obsazeny optickými kabely.

Bude nutné zřízení provizorní přeložky úložných sítí vedených přes most. Provizorně budou přeloženy pouze metalické kabely. Optotrubky se na koncích mostu uzavřou koncovkami. Přes řeku Oslavu bude trasa uložena na provizorní lávce po celou dobu stavby mostu. Po jeho dokončení se provede přeložení kabelů do definitivní trasy. Všechny prvky sítě budou instalovány do římsy mostu do připravených chrániček.


Překládané kabely a trubky:

DCKQYPY 12DM 0,9	PPFLE 15XN0,8
TCEKE 35XN 0,4	PPFLE 50XN0,4
TCKOPV 300P 0,6	PPFLE 200XN0,6
TCKOPV 50P 0,6	PPFLE 25XN0,6
TCKOPV 400P 0,6	PPFLE 200XN0,6
DCKOPV 37DM 1,3 + 36DM 0,9 (mimo provoz)	zrušen bez náhrady
TCEPKPFLE 100XN 0,4	PPFLE 100XN0,4
TCEPKPFLE 150XN 0,6	PPFLE 200XN0,6
TCEPKPFLE 200XN 0,6	PPFLE 200XN0,6
HDPE 40 B	HDPE 40 O/BB
HDPE 40 Z	HDPE 40 C/BB
HDPE 40 C	HDPE 40 C
HDPE 40 O	HDPE 40 O
HDPE 40 O/B	HDPE 40 O/B

Na akci bude zpracován realizační stupeň PD

VBř – ANO

ÚR – dodá stavebník

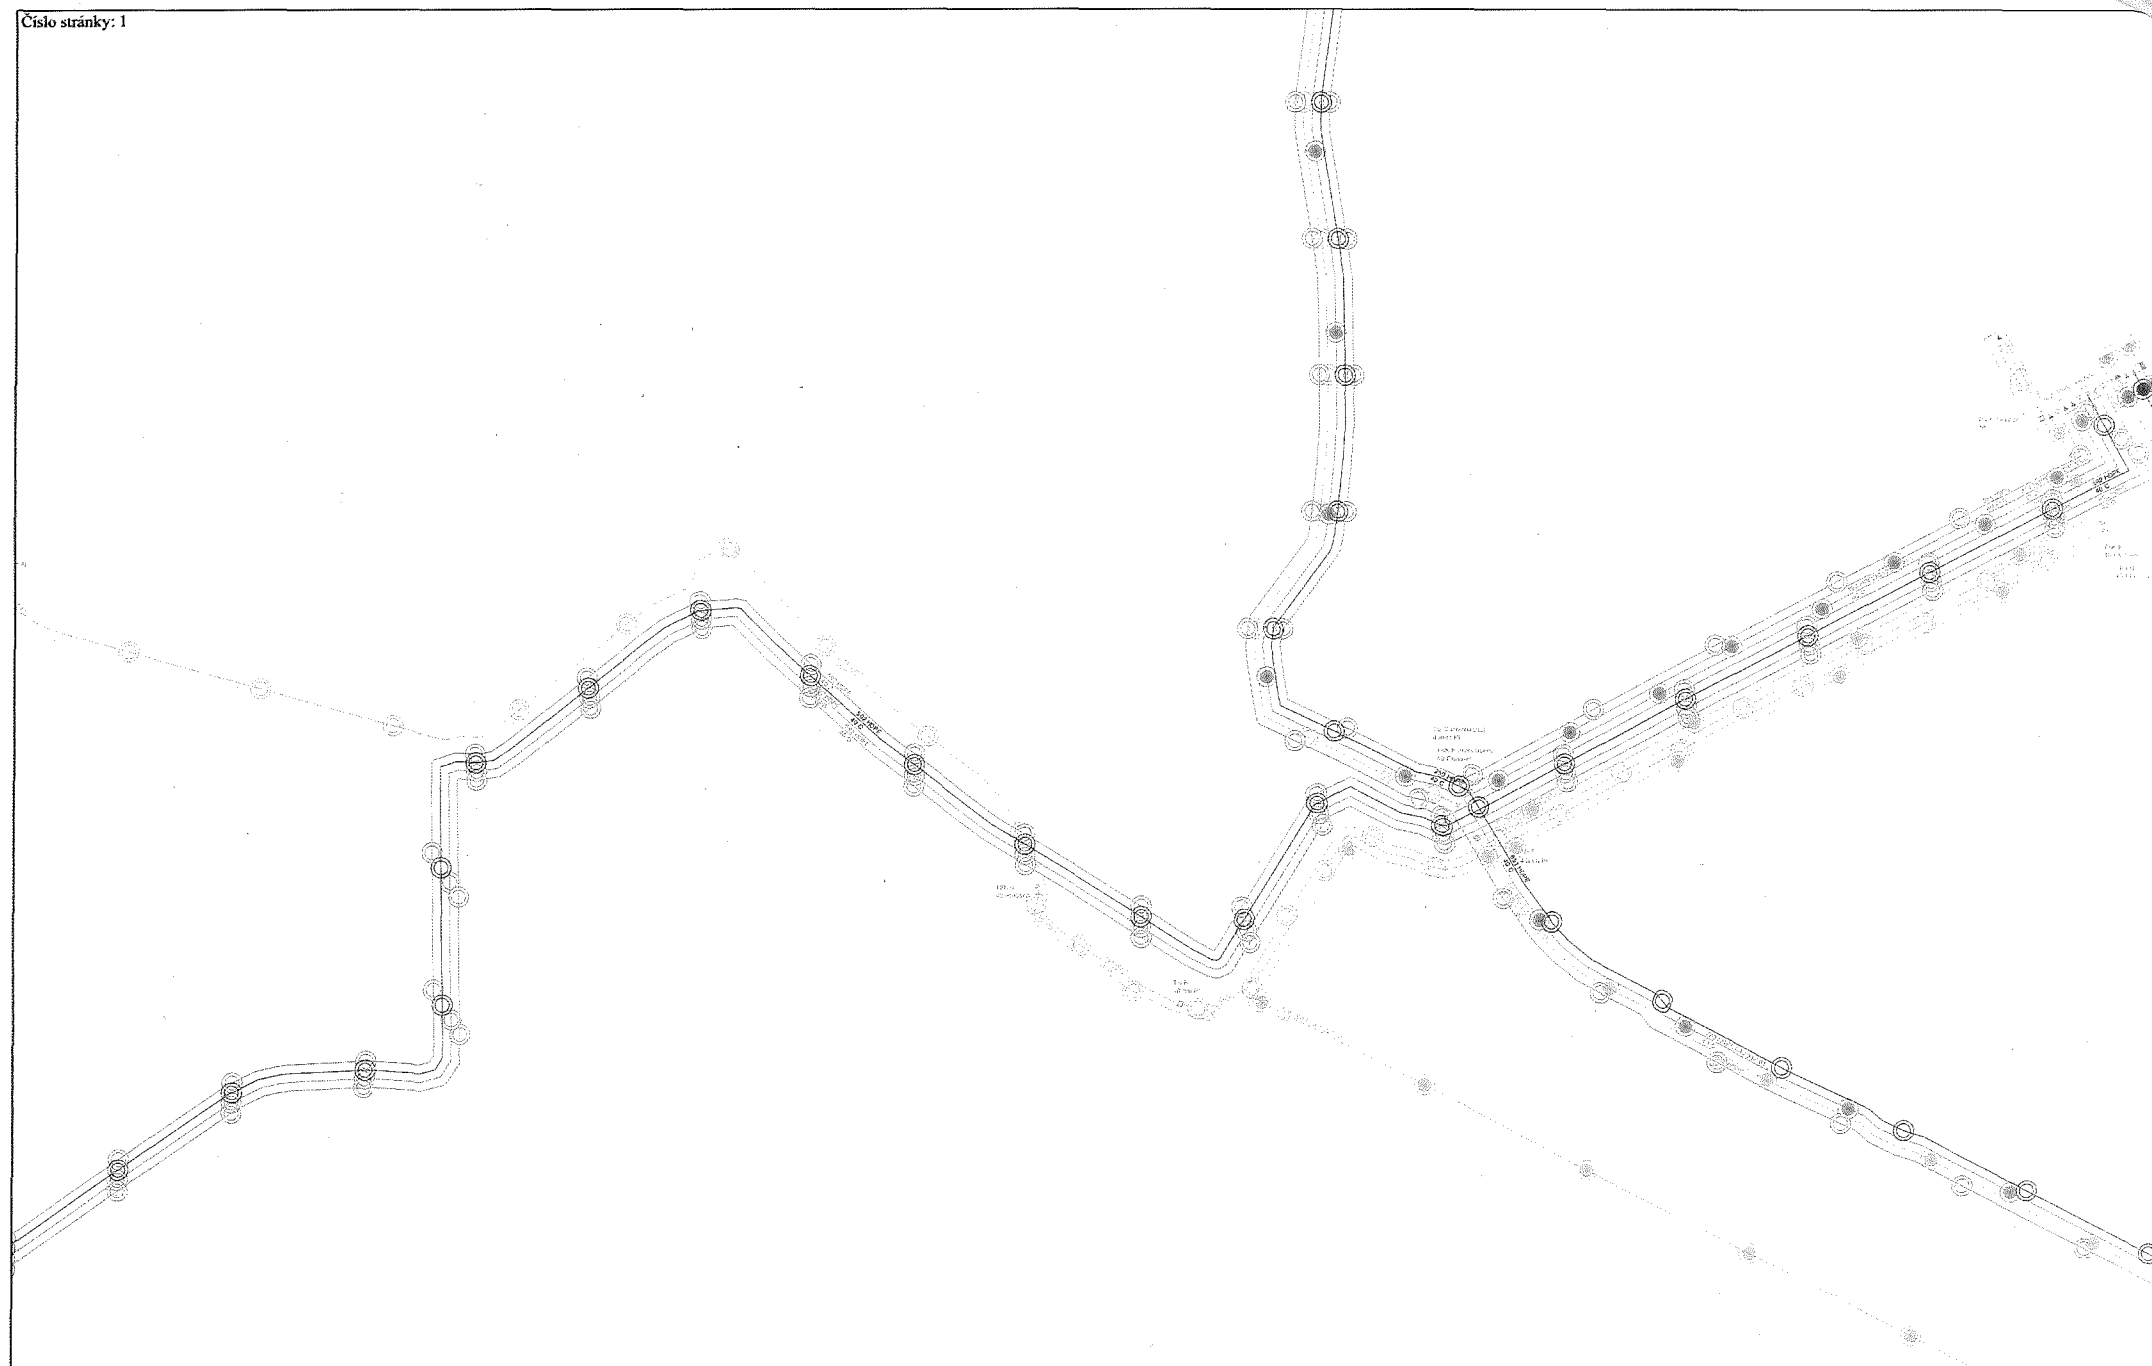

47H. Vel Meziříčí
VELM2163
XVELM2169/1.1/46-50

47H. Vel Meziříčí
VELM2165
XVELM2169/1.1/41-45

VELM1099
XVELM1052.1/119-120

XVELM99/10.2/11-20

VELM1198 Vel Meziříčí
VELM1119
XVELM1052.1/115-118

199 Vel Meziříčí
VELM1120
XVELM1052.1/121-130

187 Vel Meziříčí
VELM1118
XVELM1052.1/111-114

161 Vel Meziříčí
VELM1005
XVELM1052.1/114-95

VIA ROP 9662203
VELM3542
XVELM1059/1.1/17-37


1422A Vel Meziříčí
VELM3171
XVELM799/1.1/21-28

1422B Vel Meziříčí
VELM3172

68 Vel Meziříčí
VELM2838
XVELM909.1/1-10

69C Vel Meziříčí
VELM2838
XVELM2840/1.3/1-2

69B Vel Meziříčí
VELM2838
XVELM2840/1.3/1-2

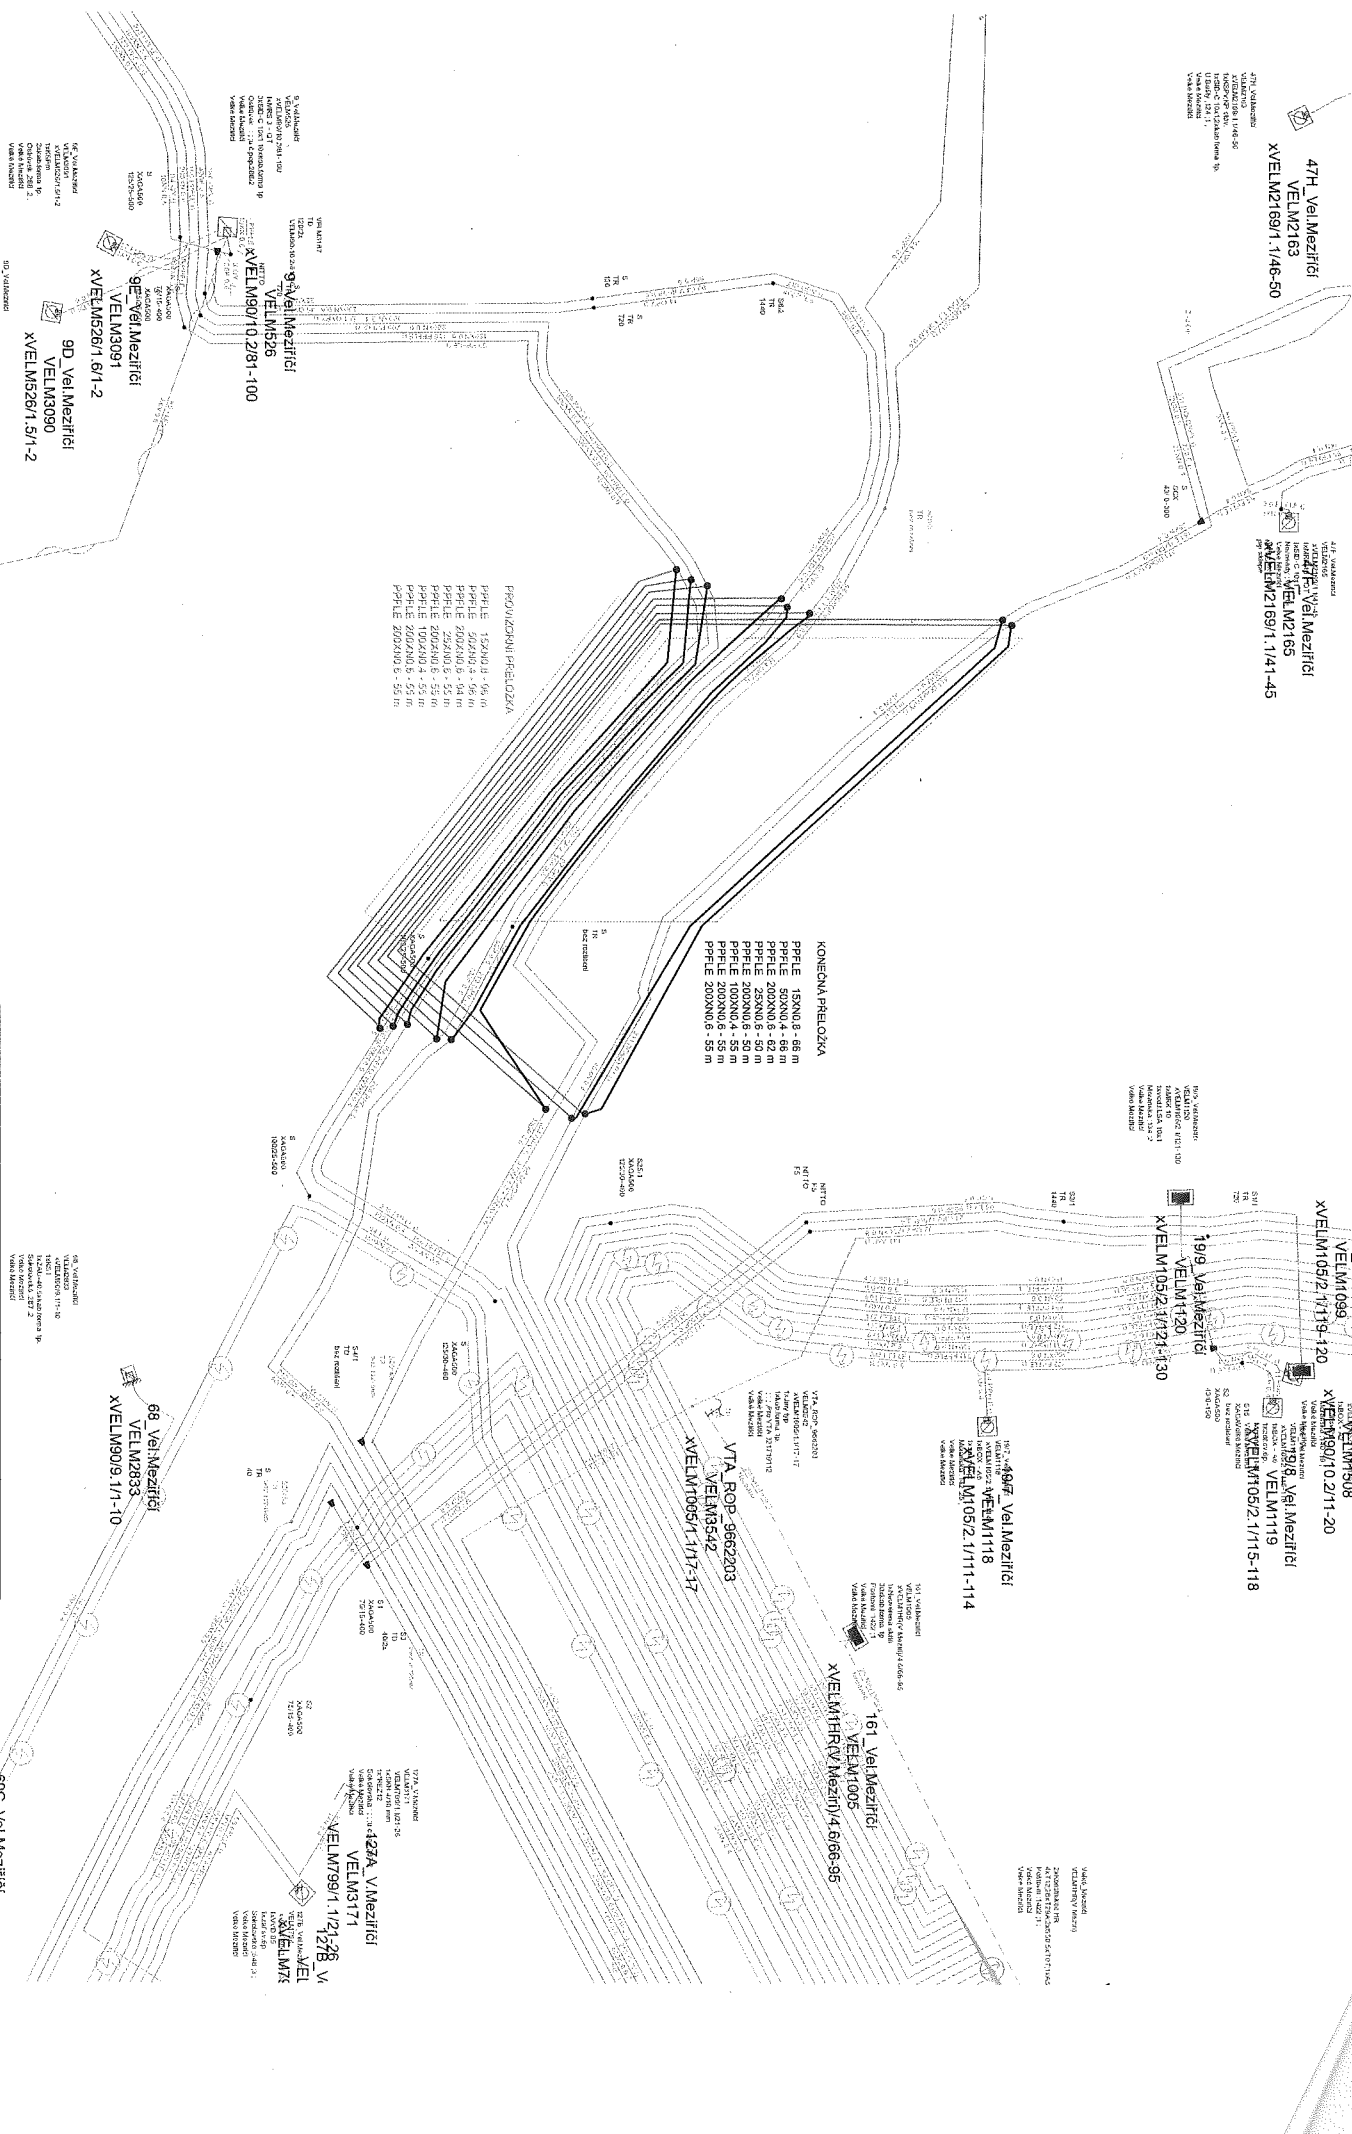


PROJEKČNÍ PŘELOŽKA
PPLE 150X0.8-55m
PPLE 50X0.4-55m
PPLE 200X0.6-55m
PPLE 250X0.6-55m
PPLE 100X0.4-55m
PPLE 200X0.6-55m
PPLE 200X0.6-55m

KONEČNÁ PŘELOŽKA
PPLE 150X0.8-55m
PPLE 50X0.4-55m
PPLE 200X0.6-55m
PPLE 250X0.6-55m
PPLE 100X0.4-55m
PPLE 200X0.6-55m
PPLE 200X0.6-55m

LEGENDA:
- silniční vozni
- provizorní vedení
- nové budované vedení
- rušené vedení

NÁZEV:			ZPRACOVÁNÍ: Ing. Petr Šaboun tel. 602 429 763
VPH Vel.Meziříčí ZR most ev.č. 602_028			
...	OBSAH:		OKRES:
	Stavba	MĚŘÍTKO:	
	RFK: ...		
			6.9.2016

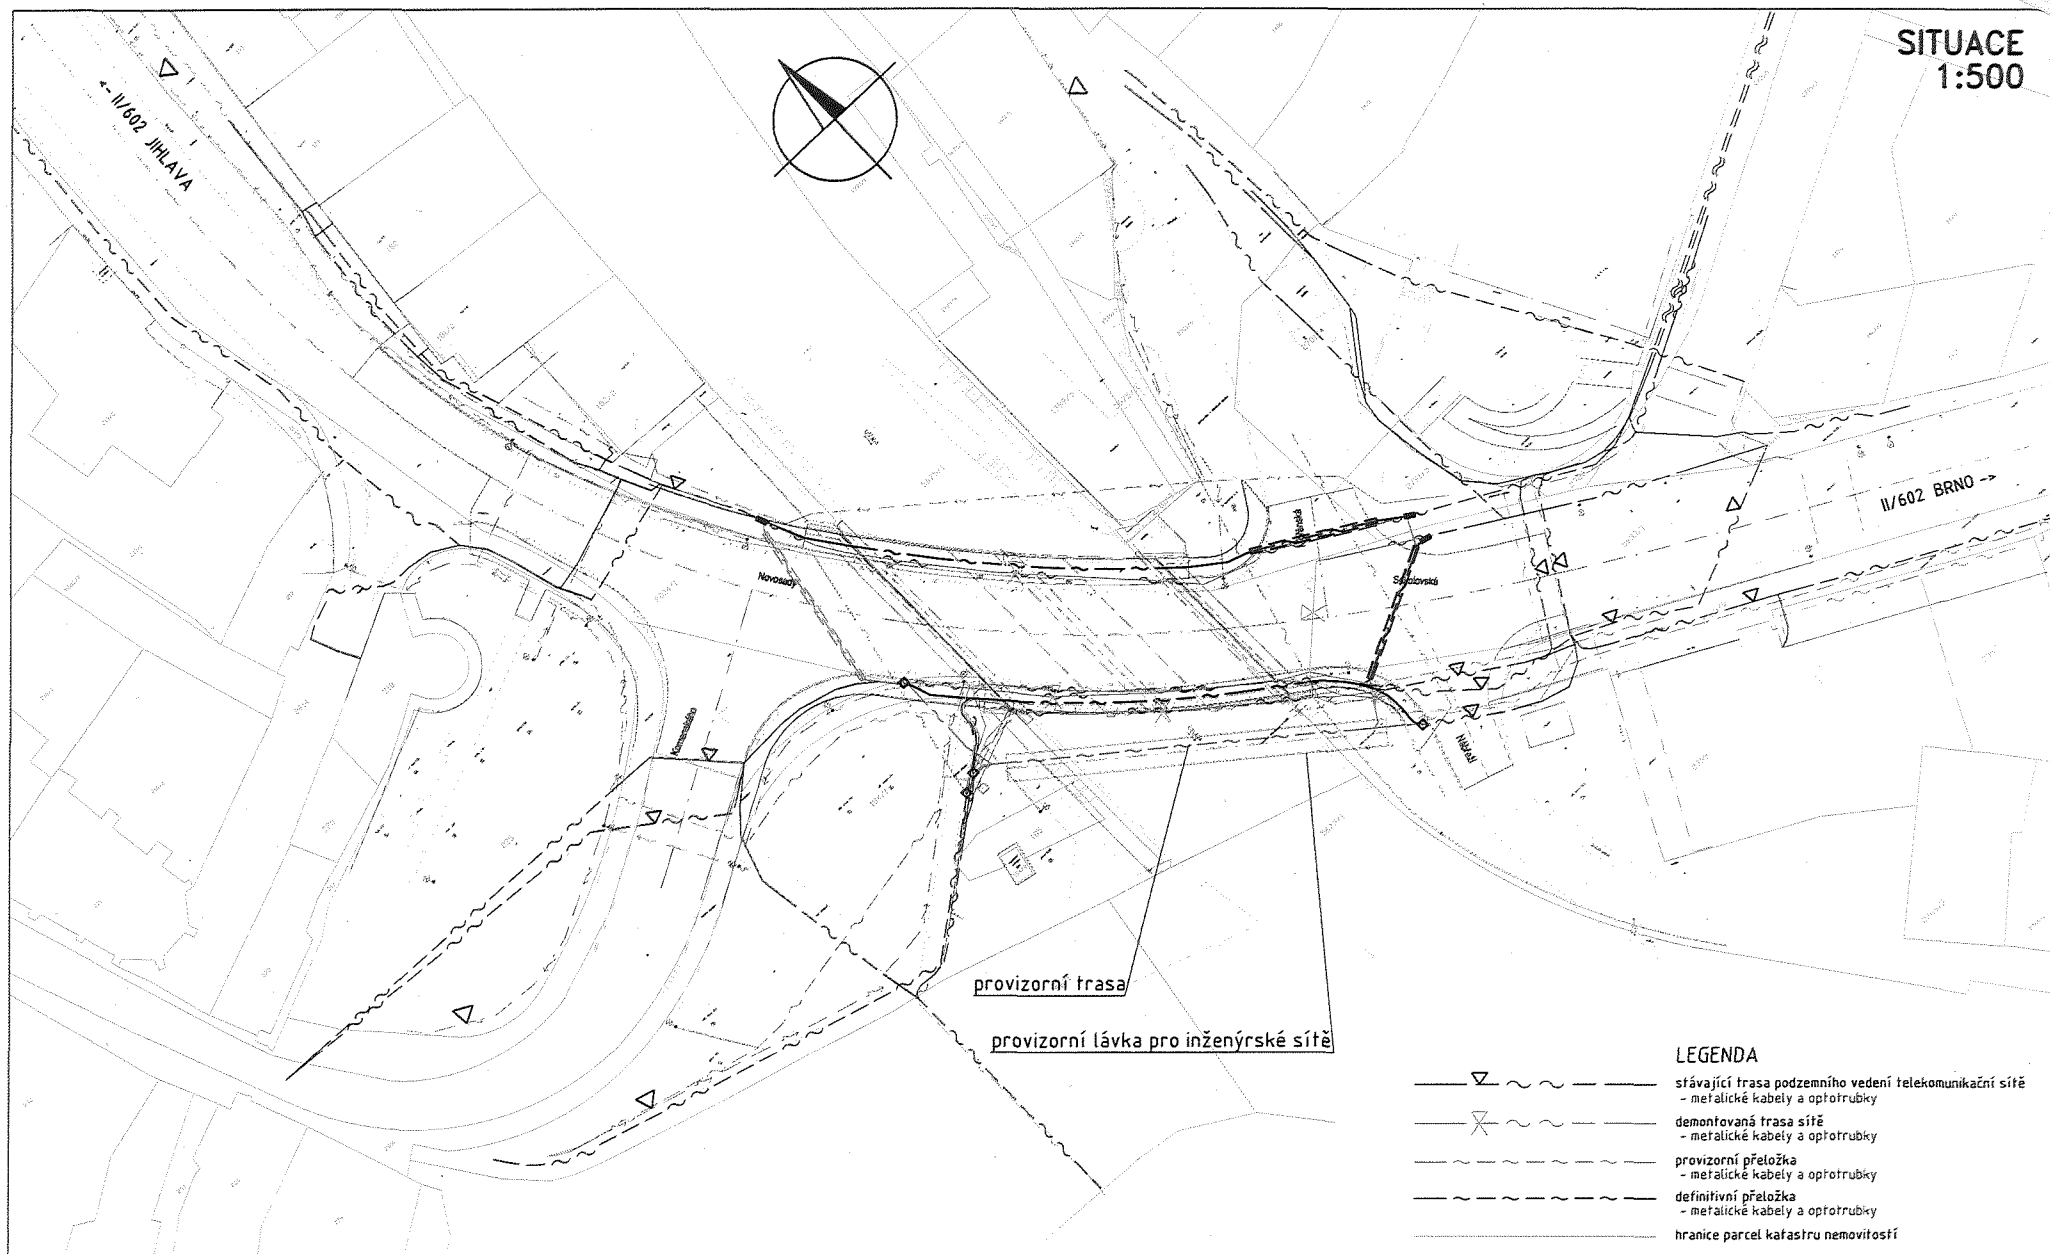

POZNÁMKA

Před zahájením výkopových prací je nutné si vyžádat přesné
vytyčení stávajících podzemních vedení jejich uživateli a provozovateli
a zajistit si jejich dozor při provádění výkopových prací

Č. přílohy
2

Akce: II/602 VELKÉ MEZÍŘÍČI, MOST EV.Č. 602-028
Objekt: SO 451 - Přeložka kabelové trasy CETIN
Příloha: SITUACE

PONTEX s.r.o.

VPI Vel.Meziříčí ZR most ev.č. 602_028 - specifikace nákladů_příloha č.2

PPD - Propočet projektové dokumenta Ceník: VP - Východ - TEM - STAND. - 2016.11

Ceník: VP - Východ - TEM - STAND. - 2016.11

Název stavby: **VPI Vel.Meziříčí ZR most ev.č. 602_028 v.2**

Číslo SPP prvku:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	29 617,20 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	108 695,51 Kč
MONTÁŽ	219 775,51 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	6 504,77 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	5 554,35 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	40 849,53 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	438 792,13 Kč

Celkové náklady: 849 789,00 Kč

Seznam položek			
Číslo SAP	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA			
958084	Návrh cenový a technický	1.00 ks	9 442,40 Kč
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě	1.00 ks	20 174,80 Kč
ZEMNÍ PRÁCE			
954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	150.00 m	2 223,00 Kč
955551	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	50.00 m	2 172,50 Kč
955552	Rozšíření prohloubení výk.hl.10cm,š.10cm	50.00 m	642,00 Kč
955577	Rýha v chodníku 35/50-70	50.00 m	21 576,00 Kč
955578	Rýha v chodníku rozšíření o10cm	50.00 m	6 171,50 Kč
954962	Rýha ve vozovce l.asf.50/130rozš.o 10 cm	50.00 m	12 652,51 Kč
954952	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130	50.00 m	63 258,00 Kč
MONTÁŽ			
952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	8.00 ks	1 026,96 Kč
952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	864.00 ks	25 600,32 Kč
954999	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	3488.00 ks	68 888,00 Kč
955255	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	10.00 ks	340,70 Kč
955268	Montáž podzemní tratě síťové metalické montáž kabelů v provizotní lávce	1.00 ks	37 200,50 Kč
955269	Montáž podzemní tratě síťové optické montáž trubek do mostu	1.00 ks	12 400,00 Kč
955282	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	24.00 ks	33 178,08 Kč
955281	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	8.00 ks	7 504,56 Kč
955284	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	10.00 ks	455,50 Kč
952602	Montáž trubky úložné	325.00 m	3 692,00 Kč
954990	Montáž úložných kabelů do 15 XN	162.00 m	2 719,98 Kč
954992	Montáž úložných kabelů do 300 XN	591.00 m	17 511,33 Kč
954991	Montáž úložných kabelů do 50 XN	267.00 m	5 537,58 Kč
958469	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	3 720,00 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

955198	MA Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 308,15 Kč
956284	S Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	4 196,62 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	3.00 ks	5 554,35 Kč
--------	--------------------------	---------	-------------

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene náhrada za VBŘ odhadovaná	3.00 ks	30 000,00 Kč
--------	---	---------	--------------

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.

955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	3.00 ks	5 998,71 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	3.00 ks	4 850,82 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE			
303918	Deska krycí plast. 300x1000 mm	50.00 ks	1 832,00 Kč
303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	50.00 m	185,50 Kč
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	100.00 m	426,00 Kč
300128	Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,8	162.00 m	14 798,70 Kč
300123	Kabel plastový TCEPKPFLE 200x4x0,6	481.00 m	302 770,26 Kč
300120	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,6	105.00 m	8 927,10 Kč
300109	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4	162.00 m	12 658,68 Kč
300139	Kabel plastový TCEPKPFLEZE 100x4x0,4	110.00 m	26 852,10 Kč
302788	Koncovka trubky 40 mm Plasson	10.00 ks	1 295,30 Kč
312425	Modul konektor. 9700-10P	698.00 ks	20 500,26 Kč
320298	Spojka smršťovací XAGA 550 75/15-500	16.00 ks	13 550,88 Kč
320299	Spojka smršťovací XAGA 550 92/25-500	16.00 ks	18 416,80 Kč
303003	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	10.00 ks	2 080,30 Kč
300027	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	65.00 m	1 717,95 Kč
300023	Trubka HDPE 40/33 černá	65.00 m	1 717,95 Kč
300036	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	65.00 m	1 717,95 Kč
300032	Trubka HDPE 40/33 oranžová -bílý pruh	65.00 m	1 717,95 Kč
300030	Trubka HDPE 40/33 oranžová	65.00 m	1 717,95 Kč
302423	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	150.00 m	5 908,50 Kč

VPI Vel.Meziříčí ZR most ev.č. 602_028 - specifikace nákladů_1.etapa-dílčí fakturace PD

PPD - Propočet projektové dokumenta Ceník: VP - Východ - TEM - STAND. - 2016.11

Ceník: VP - Východ - TEM - STAND. - 2016.11

Název stavby: **VPI Vel.Meziříčí ZR most ev.č. 602_028 v.2**

Číslo SPP prvku:


Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA 29 617,20 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 5 554,35 Kč

Celkové náklady: 35 171,55 Kč**Seznam položek**

Číslo SAP	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA			
958084	Návrh cenový a technický	1.00 ks	9 442,40 Kč
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě	1.00 ks	20 174,80 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBR	3.00 ks	5 554,35 Kč



ČESKÁ
TELEKOMUNIKAČNÍ
INFRASTRUKTURA

Evidenční číslo: PŘ/700/2016

POVĚŘENÍ

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 (dále jen „Společnost“), tímto pověřuje

svého zaměstnance pana

Zdeňka Šulce

os. č. 68172, bytem Hlavní 4, Štěchovice, Praha západ, PSČ 252 07, r.č. 680223/1502

k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 ods.4 zákona č.127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě a smlouvy nájemní a podnájemní,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- projednával a uzavíral smlouvy kupní, jejichž předmětem je koupě či prodej veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o realizaci, jejichž předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č.127/2005 (dále jen „Překládka“) Společnosti pro stavebníka bez limitu,
- projednával jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění všech zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou,

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623

www.cetin.cz

s vystavením souhlasí: Petr Gazda, ředitel, Přístupová síť

- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti.

Pověřený je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku **1.000.000,- Kč** (slovy: jeden milion korun českých).

Dále je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku **5.000.000,- Kč** (slovy: pět milionů korun českých).

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka.


Dále je oprávněn v této souvislosti činit úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 31.7.2017. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne 1.8.2016

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Představenstvo


Ing. Martin Vlček
předseda představenstva


Ing. Petr Slováček
místopředseda představenstva

Ověření – legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy: OI/2112,2118/2016

Ověřuji, že:

Ing. Martin Vlček, nar. 2.10.1977-----

bydlištěm Korunní 962/85, Praha 3-----


Ing. Petr Slováček, nar. 15.5.1959-----

bydlištěm K Potokům 205, Řitka-----

před notářem uznali podpisy na listině se nacházející-----
za vlastní.-----

Totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy.-----

V Praze dne 13.9.2016-----



Marcela Šrámková
Marcela Šrámková
notářská tajemnice
pověřená Mgr. Radimem Neubauerem
notářem v Praze, se sídlem
Praha 1, Kapruva 6
