

Smlouva o dílo č. 21/2/2021





na realizaci akce

„Modernizace výsledkového panelu na zimním stadionu v Mostě“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

I.

Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** Statutární město Most
Zastoupený: Mgr. Janem Paparegou, primátorem města
Sídlo: Most, Radniční 1, PSČ 434 69
IČO: 00266094
DIČ: CZ00266094
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Most
Č. ú. výdajového: 27-1041368359/0800
Č. ú. příjmového: 19-1041368359/0800
E-mail: posta@mesto-most.cz
ID datové schránky: pffbvy
(dále jen objednatel)
- 1.2 **Zhotovitel:** Technické služby města Mostu a.s.
Zastoupený: Ing. Václavem Zahradníčkem, předsedou představenstva
Tomášem Kubalem, místopředsedou představenstva
Sídlo: Dělnická 164, 434 01 Most – Velebudice
IČO: 64052265
DIČ: CZ64052265
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Č.ú.: 915209603/0300
E-mail: info@tsmost.cz
ID datové schránky: vywt2un
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
Oddíl B, vložka 771
(dále jen zhotovitel)
- 1.3 **Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:**
za objednatele:  - vedoucí odboru investic
- referent odboru investic
za zhotovitele:  - manažer divize účelových zařízení a
správy majetku
- 1.4 **Zástupce pověřený jednáním v místě plnění:**
za objednatele:  - vedoucí odboru investic
- referent odboru investic
za zhotovitele:  - manažer divize účelových zařízení a
správy majetku

8/

- 1.5 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod 5.8, 5.9, 12.3 a 12.4:
za objednatele: Mgr. Jan Paparega, primátor do max. ceny 2 mil. Kč bez DPH, pro každý jednotlivý změnový list
[redacted] vedoucí odboru investic do max. ceny 100 tis. Kč bez DPH, pro každý jednotlivý změnový list
- za zhotovitele: Ing. Václav Zahradníček – předseda představenstva
Tomáš Kubal – místopředseda představenstva
Ing. Václav Zahradníček – ředitel společnosti do max. ceny 100 tisíc Kč bez DPH

II.

Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Výchozí údaje
- 2.1.1 Název akce: „Modernizace výsledkového panelu na zimním stadionu v Mostě“
- 2.1.2 Místo akce: Most, Rudolická 1700/2, zimní stadion
- 2.1.3 Investor: statutární město Most
- 2.1.4 Vlastník: statutární město Most
- 2.2 Smlouva se uzavírá na základě výjimky dle čl. 9, bod 1 Pravidel pro zadávání a průběh veřejných zakázek malého rozsahu statutárního města Mostu.

III.

Předmět plnění

- 3.1 Zhotovitel je povinen provést podle nabídky ze dne 4. 2. 2021 zpracované společností Technické služby města Mostu a.s., dílo, kterým je realizace akce „Modernizace výsledkového panelu na zimním stadionu v Mostě“. Nabídka je nedílnou součástí této smlouvy.
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, včas a řádně a s odbornou péčí. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 3 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, že poddodavatel nebude provádět část díla, k jejímuž provedení se zavázal, s pomocí jakéhokoliv dalšího poddodavatele. Změna poddodavatele, je možná jen se souhlasem objednatele. Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy). Při provádění díla poddodavatelem má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 3.3 Zhotovitel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veškeré práce, dodávky a služby a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení díla, zejména:
- předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité materiály, revizí, osvědčení, atestů
 - vedení stavebního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních

- prohlídek investora
- provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy
- dodržování zkušebních a kontrolních plánů, HMG
- zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, jeho vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu
- zajišťování potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, povolení záboru veřejného prostranství apod.
- fotodokumentaci akce
- provádění úhrady veškerých poplatků, skládkovného, dopravy odpadu na skládku a úhrady potřebných médií
- zajišťování dopravních opatření nutných k provedení díla včetně zajištění stanovení dopravně inženýrských opatření
- zajištění a předání dokladové části specifikované v článku 11.2.

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce

- 3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy.

IV. Doba plnění

4.1 Doba plnění:

Zajištění dodávek:	ihned po nabytí účinnosti smluvního vztahu
Termín předání místa plnění:	dodavatel oznámí minimálně 2 týdny před zahájením prací v místě plnění termín převzetí místa plnění a zahájení prací
Zahájení prací:	ihned po předání místa plnění
Dokončení díla:	do 31. 7. 2021
Místo plnění:	Most, Rudolická 1700/2, zimní stadion

- 4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním předáním objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného provozování.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli do pěti pracovních dnů od jeho zhotovení, kterým se rozumí dokončení díla dle odst. 4.1 a objednatel se zavazuje do pěti pracovních dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo je zhotoveno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které nebudou bránit řádnému provozování, pokud se zhotovitel písemně zaváže tyto drobné vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel drobné vady a nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato nebylo.
- 4.4 Zhotovitel zpracuje závazný časový harmonogram prací a kontrolně zkušební plán, který předá objednateli při předání místa plnění. Postup, provádění, termíny a četnost zkoušek bude v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací.

- 4.5 Při prodlení zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden nad rámec sjednaného termínu je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.6 V případě rozšíření rozsahu díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu díla o více než 10 % na základě požadavku objednatele z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, je zhotovitel oprávněn podat objednateli odůvodněný požadavek na prodloužení nebo zkrácení doby plnění.
- 4.7 Písemnou žádost o prodloužení doby plnění je zhotovitel povinen předat objednateli min. 10 pracovních dnů před termínem dokončení díla.
- 4.8 Prodlení zhotovitele s plněním díla z klimatických důvodů se považuje za odsouhlasené zápisem do stavebního deníku stvrzeného podpisy obou smluvních stran.
- 4.9 Změny doby plnění mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy). Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy).

V. Cena

- 5.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí **1.363.830,- Kč bez DPH**.

Slovy: jeden milion tři sta šedesát tři tisíc osm set třicet korun českých

Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III., odst. 3.3 této smlouvy.

- 5.2 Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet díla po jeho jednotlivých částech (dále jen položkový rozpočet). Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly. Soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly budou objednateli předány po jednotlivých objektech. Při stanovení ceny částí díla bude postupováno takto:
- tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její část vypočtena jako násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně provedené práce v příslušných položkách.
- Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako podklad pro zpracování faktur a eventuální vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy. Tímto není dotčeno ujednání obsažené v odst. 5.1 této smlouvy.

- 5.3 Zhotovitel prohlašuje, že si zadávací dokumentaci řádně prostudoval a s jejím zněním je plně obeznámen. V případě zjištění chyb a nedostatků v zadávací dokumentaci je Zhotovitel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele, který je povinen tento nesoulad napravit v dohodnuté lhůtě, není-li stanoveno tak ve lhůtě přiměřené k povaze nedostatku zadávací dokumentace, a neučiní-li tak, nevzniká mu nárok na změnu ceny díla či posun termínu realizace.

87

Zhotovitel zaručuje, po řádném seznámení s podklady nutnými pro realizaci díla, úplnost rozpočtu.

- 5.4 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy budou posuzovány jako dodatečné práce. Práce a dodávky sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce (jedná se o případ, kdy objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezávinily ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem – neodpovídající geologické údaje apod.).
- 5.5 Provedení veškerých dodatečných prací musí být vždy předem písemně schváleno objednatelem.
- 5.6 Zhotovitel je povinen provést dodatečné práce požadované objednatelem, objednatel dodatečné práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy.
- 5.7 Případné dodatečné práce budou oceněny dále uvedeným způsobem:
- 5.7.1 Dodatečné práce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny podle těchto položek.
- 5.7.2 Dodatečné práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny takto:
- Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných „Katalogů popisů a směrných cen prací“, resp. „Katalogů popisů a směrných cen montáží technologických zařízení ÚRS Praha“ (dále jen Směrné ceny), a.s. platných v době provádění víceprací. Pokud nabídková cena zhotovitele byla v době předložení nabídky nižší než cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s., sníží se cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s. o tolik procent, o kolik procent se liší porovnávané ceny převedené na procenta. 100% představuje pro účely výpočtu cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s. Při změně Směrných cen ÚRS Praha, a.s. se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.
 - Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.
 - Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přírůžek pořizovacích nákladů ÚRS Praha, a.s.
 - Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS Praha, a.s.
 - Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.
 - V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a.s., ocení se tyto práce HZS.
- HZS se stanoví (bez DPH) :
- | | |
|----------------------|---------------|
| - stavební práce | 300,- Kč/hod. |
| - pro montážní práce | 300,- Kč/hod. |

87

- pro revize a zkoušky 250,- Kč/hod.

K cenám veškerých dodatečných prací již nebudou rozpočtovány žádné náklady na umístění díla.

- 5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění dodatečné stavební práce před realizací. Do 15 kalendářních dnů po provedení předem schválených dodatečných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) obsahující ocenění skutečně provedených dodatečných prací formou v souladu s bodem 5.7 této smlouvy.
- 5.9 Zhotovitel je povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) i ohledně prací a dodávek, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším rozsahu. Méněpráce budou oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy.

VI.

Platební podmínky

- 6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání v místě plnění soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu .kz nebo .xls (dle podkladů objednatele). Zástupce objednatele pověřený k jednání v místě plnění je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit s odůvodněním svého postupu.
- 6.2 Podkladem pro placení jsou dílčí faktury a konečná faktura. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací dle ucelených částí a zabudovaných dodávek. Nedílnou součástí faktury bude rovněž vzájemně odsouhlasený položkový soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek. Bez oboustranně odsouhlaseného soupisu nebude faktura proplacena. Konečná (vyúčtovací) faktura bude vystavena na základě protokolárního předání a převzetí díla objednatelem.
- 6.3 Faktury je možné zasílat i v elektronické formě na adresu: faktury@mesto-most.cz
- 6.4 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.
- 6.5 Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Dále musí faktura obsahovat číslo smluvního vztahu s objednatelem a oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla, nebo oběma stranami podepsaný soupis prací. Bez kterékoliv z těchto náležitostí nebude faktura proplacena.
- 6.6 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je

87

povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle článku XI.

- 6.7 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 6.8 U předmětného plnění se použije režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH je povinen priznat a odvést místně příslušnému finančnímu úřadu objednatel plnění.

VII. Záruční doba

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí podle podmínek této smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli.
- 7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí díla budou sepsány v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané a nepřevzaté a zhotovitel je s provedením díla v prodlení.
- 7.4 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
- 7.5 Práva objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“ nebo „nároky z vad díla“) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na předané dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba se **sjednává na 60 měsíců na montážní práce a 24 měsíců na dodávky.**
- 7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednatelem. V případě odstranění reklamované vady díla nebo jeho části počíná plynout záruční doba ode dne převzetí díla nebo jeho části po odstranění vady.
- 7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatní již v oznámení vad díla (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen tento nárok uspokojit. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vad a neurčí k tomu lhůtu, je zhotovitel povinen vytčené vady odstranit nejpozději do patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud objednatel neuplatní již v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen nejpozději do pěti dnů po doručení reklamace zahájit reklamační řízení, v něm zjistit, jaký nárok z odpovědnosti za vady bude objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve sjednané lhůtě, případně, pokud k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě určené objednatelem.

- 7.8 V případě, že zhotovitel ne zahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude na porušení povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Stejně právo má objednatel i v případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad.
- 7.9 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
- 7.10 Reklamací vad díla, pokud tak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést bezodkladně po zjištění vad i případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu objednatel zmocní.
- 7.11 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol

VIII.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1 Po oznámení zhotovitele předá objednatel zhotoviteli místo plnění určené k provedení díla. O předání místa plnění pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání místa plnění je zhotovitel povinen vést stavební deník. V téže lhůtě je zhotovitel povinen předat objednateli informaci o pracovní době svých zaměstnanců a případné změny oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat v místě plnění občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na místo plnění. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Za takto provedené práce zhotovitel odpovídá stejně, jako by byly provedeny jeho poddodavatelem.
- 8.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vyčtených závad.
- 8.6 Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pozvánku k prověření těchto prací je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen se prováděných zkoušek a проверки

zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v provádění díla.

- 8.7 Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, stávají majetkem zhotovitele.
- 8.8 Likvidaci a úklid místa plnění ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení díla a protokolárně je předá zástupci objednatele.
- 8.9 Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí akce a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
- 8.10 Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.
- 8.11 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek v místě plnění. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku.

IX.

Smluvní pokuty

- 9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupení od smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.
- 9.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.
- 9.3 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě své vůle, ustoupit. Neuplatnění nároku na smluvní pokutu není vzdáním se práva na ni.
- 9.4 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla činí 0,1 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.5 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 0,1 % z ceny díla za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním.
- 9.6 Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční době činí 0,1 % z ceny díla za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.
- 9.7 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením místa plnění činí 0,1 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.

- 9.8 Jestliže zhotovitel v průběhu akce nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč z ceny díla za každý případ.
- 9.9 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 5 000,- Kč z ceny díla za každý případ.
- 9.10 Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo řádně provedeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla.
- 9.11 Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z kontrolně zkušebního plánu činí 0,1 % z ceny díla za každý případ.
- 9.12 Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí 100% příslušné ceny prací. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nedojde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy
- 9.13 Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) činí 100 % ceny příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nedojde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy.
- 9.14 Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na pracovišti zhotovitelem činí částku stanovenou v příloze č. 2 této smlouvy.
- 9.15 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele mít v místě plnění ve své pracovní době trvale dostupný stavební deník činí 0,05 % z ceny díla za každý zjištěný případ a zhotovitel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním protiprávního stavu činí 0,05 % z ceny díla za každý započatý pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.
- 9.16 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 1.000,- Kč za každý případ.
- 9.17 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.

X. Další ujednání

- 10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.
- 10.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor veřejného

prostranství jsou součástí ceny díla.

- 10.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:
- zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 - vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 - zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 - zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
 - vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
 - zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
 - nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
 - zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 - požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány
- 10.4 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 10.5 Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem a za škodu v této souvislosti vzniklou. Stejně tak odpovídá, pokud jich použil, přestože k tomu neměl písemný pokyn objednatele daný na základě upozornění dle č. 10.4 této smlouvy.
- 10.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních prací zabezpečit zejména rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění prací, povolení zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras k místu plnění.
- 10.7 Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti důležité pro kontrolu plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí místa plnění, údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od zadávací dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro orgány státní správy.
- 10.8 Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby zhotovitele musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy v místě plnění.
- 10.9 Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné akce,

život a/nebo zdraví pracujících v místě plnění nebo hrozí-li jiné vážné škody.

- 10.10 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.
- 10.11 Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek.
- 10.12 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení a protokolárního předání objednateli nese zhotovitel.
- 10.13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností u Kooperativa pojišťovna, a.s. smlouvy 7721127380 na hodnotu škody ve výši 10.000.000, - Kč. Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat po celou dobu trvání smluvního vztahu.
- 10.14 Zhotovitel, vč. jeho poddodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti.

XI.

Předání a převzetí

- 11.1 Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení, o protokolárním předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.
- 11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:
- seznam dokladů
 - atesty o použitých materiálech 2x
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních 2x
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 2x
 - fotodokumentace akce od zahájení po protokolární předání (část tištěná forma + komplet CD)
 - stavební deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek investora – 1x originál a 1x kopie
 - zkušební, záruční listy a dodací listy 2x
 - doklad o uložení odpadu 2x
 - prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 2x

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

XII.

Závěrečná ujednání

- 12.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.



106/1999 Sb.“) a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu.

- 12.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 12.3 Změny doby plnění dle čl. IV. mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy).
- 12.4 Změny poddodavatele mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy).
- 12.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 12.6 Nedílnou součástí smlouvy se stává:
- Příloha č. 1 - vzor „Změnového listu“
- Příloha č. 2 - Smluvní pokuty a nedodržení pravidel BOZP
- Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 - Nabídka
- 12.7 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 12.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 12.9 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
- 12.10 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel.
- 12.11 Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
- 12.12 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a

87

srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

- 12.13 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.
- 12.14 V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného. Smluvní strany sjednávají, že veškeré spory z této smlouvy budou řešit primárně dohodou.
- 12.15 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

V Mostě dne 10-03-2021

V *mostě* dne 4.3.2021

Za objednatele :

Za zhotovitele :



místopředseda představenstva

8/

Změnový list č. ze dne

Název díla:	Modernizace výsledkového panelu na zimním Stadionu v Mostě
Číslo smluvního vztahu:	
Název části díla (PS, SO):	
Objednatel:	Zhotovitel:
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
<u>Nové řešení:</u>	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Výpočet

SAZEBNÍK POKUT

Akce: Modernizace výsledkového panelu na zimním stadionu v Mostě

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Město Most si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora akce. Město Most není povinno tyto pokuty zdůvodňovat.

Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na úseku bezpečnosti práce, část II řeší oblast požární ochrany, část III jsou pokuty za porušení v oblasti životního prostředí a část IV řeší pokuty ostatní.

I. BEZPEČNOST PRÁCE

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklady vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či poddávatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro provádění práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka poddávatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší jak tři pracovní dny. 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního úrazu
10	Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhl. č. 499/2006 Sb.	2000,- Kč za případ

II. POŽÁRNÍ OCHRANA

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení	5000,- Kč za případ

	zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem	5000,- Kč za případ

87

	mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak poddodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty

87

PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Akce: Modernizace výsledkového panelu na zimním stadionu v Mostě

Prohlašuji, že na akci „Modernizace výsledkového panelu na zimním stadionu v Mostě“ máme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky.

Pořadové číslo poddodavatele	Poddodavatel (obchodní firma nebo název/obchodní firma nebo jméno a příjmení)	IČ (identifikační číslo)	Věcný podíl poddodavatele na plnění veřejné zakázky
1.	Dle výběrového řízení		
2.			
3.			
4.			
5.			
Až x.			

V Mostě dne 4. 3. 2021



88



MODERNIZACE VÝSLEDKOVÉHO PANELU NA ZIMNÍM STADIONU V MOSTĚ

ZADAVATEL:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Radniční 1/2, 434 69 MOST



A-BENET Aréna – zimní stadión

RUDOLICKÁ 1700/2, MOST



DODAVATEL:

**TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.**

DĚLNICKÁ 164, MOST



Tel: 476 453 211

IČO: 64052265

ZPRACOVAL:

[REDACTED]

MANAŽER DÚZSM

[REDACTED]

V MOSTĚ | 04/02/2021



ZADÁNÍ:

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTU:

- ZIMNÍ STADION UVEDEN DO PROVOZU V 1998
- DIVÁCKÁ KAPACITA: 1 640 MÍST K SEZENÍ A 100 K STÁNÍ
- LEDOVÁ PLOCHA JE O ROZMĚRECH 59 x 28 M A ODPOVÍDÁ PARAMETRŮM ČSLH
- ZÁZEMÍ TVOŘÍ 14 ŠATEN SE SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍM
- U ZIMNÍHO STADIONU JE PARKOVIŠTĚ S KAPACITOU CCA 250 MÍST



MOST

ZJEDNODUŠENÝ POPIS ZADÁNÍ:

- 2 ZOBRAZOVACÍ LED PANELY – SOUČASNÝ STAV 2x PANEL 3x1M
- OBA PANELY BUDOU BĚHEM HRY ZOBRAZOVAT HERNÍ ÚDAJE
- MOŽNOST ZOBRAZENÍ KOMERČNÍ PŘESTÁVKY (REKLAMY / LOGA VE FORMÁTU MP4, JPG...)
- 1x OBOUSTRANNÉ HODINY DO CHODBY U ŠATEN S ČASEM, KTERÝ BUDE ODPOČÍTÁVAT HRÁČŮM ČAS PRO NÁSTUP NA HRACÍ PLOCHU
- 2x BRANKOVÁ SVĚTLA
- AKUSTICKÁ SIGNALIZACE NA HALU
- VÝSTUPNÍ SIGNÁL AUDIA DO ZVUKOVÉHO SYSTÉMU HALY (ZVUK Z VIDEOREKLAM)
- OVLÁDACÍ KONZOLE NEBO SW PRO OBSLUHU LED PANELŮ A HERNÍCH ÚDAJŮ + ODBAVENÍ PŘEDVYTVOŘENÝCH PLAYLISTŮ
- RYCHLÉ TLAČÍTKO PRO START /STOP ČASU
- MONTÁŽ, OŽIVENÍ ZAUČENÍ
- VÝCHOZÍ REVIZE ZAŘÍZENÍ
- ZAJIŠTĚNÍ NÁSLEDNÉHO SERVISU A PRAVIDELNÝCH KONTROL



NÁVRH ŘEŠENÍ:

OSAZENÍ HRACÍ PLOCHY DVĚMA VÝSLEDKOVÝMI TABULEMI S RGB LED PANELY O ROZMĚRECH 4x3 METRY S NATIVNÍM ROZLIŠENÍM 832 x 624 PIXELŮ. TYTO OBRAZOVKY JSOU URČENY PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ A SPLŇUJÍ KRYTÍ IP43 SE ZARUČENÍM INTERIÉROVÉ SVÍTIVOSTI S OHLEDEM NA CENU A FUNKČNOST CELÉ SESTAVY.

NÁVŠTĚVNÍKOVI TAK ZAJISTÍ DOSTATEČNÝ PŘEHLED O PRŮBĚHU HRY NA ZOBRAZOVACÍ PLOŠE 2x 12 m². LED PANELY JSOU NAVRŽENY TECHNOLOGIÍ GENELITE JAPAN, KTERÁ JE VHODNÁ PRO VNITŘNÍ SPORTOVIŠTĚ A DÍKY VESTAVĚNÝM PROCESORŮM LZE SYSTÉM ROZŠÍŘOVAT O DALŠÍ PRVKY. TĚMI MOHOU BÝT V BUDOUCNU:

- SAMOSTATNÁ REŽIE A VIDEOPROCESOR PRO NAPOJENÍ ŽIVÝCH KAMER
- DOPLŇKOVÉ DISPLEJE
- VYTVOŘENÍ DALŠÍHO LOKÁLNÍHO PRACOVIŠTĚ
- VSTUP ZE SLOWMOTION SYSTÉMŮ...

SVĚTOVÍ VÝROBCI POUŽITÝCH KOMPONENT:



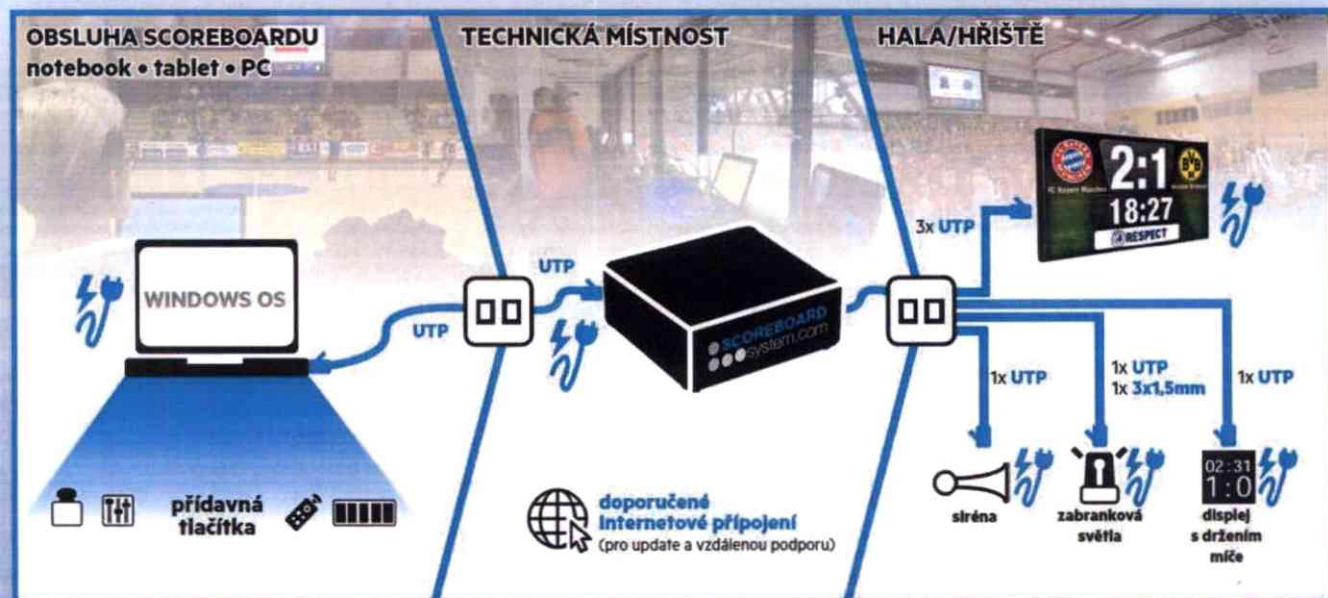
SOUČÁSTÍ ŘEŠENÍ ODBAVENÍ PROVOZU JE MÓD PRO ABSOLUTNÍ KONFIGURACI VLASTNÍCH PRAVIDEL SPORTU, COŽ JE PRAKTICKÉ ZEJMÉNA PRO ŽÁKOVSKÉ TURNAJE A KRÁTKÁ UTKÁNÍ V RÁMCI VÝUKY.

VÝSLEDKOVÉ TABULE SE SOFTWARE ŘÍZENÍM SPORTVISON UMOŽŇUJÍ ZOBRAZENÍ NEJEN VÝSLEDKŮ, ALE TAKÉ HRÁČSKÝCH KARET ALE TAKÉ DALŠÍCH PROVOZNÍCH INFORMACÍ, REKLAMNÍCH SPOTŮ APOD.

VZHLEDEM K INDIVIDUÁLNOSTI ZAKÁZKY NAVRHUJEME V PŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ S UPŘESNĚNÍM DETAILŮ (PŘEDEVŠÍM UCHYCENÍ LED PANELŮ A STATICKÝ POSUDEK) HMOTNOST JEDNOHO PANELU JE CCA. 380 KG I



BLOKOVÉ ZNÁZORNĚNÍ NAVRŽENÉHO SYSTÉMU:



PRO KOMUNIKACI S JEDNOTLIVÝMI PRVKY SLOUŽÍ DATOVÉ ROZVODY UTP CAT5. K JEDNOTLIVÝM ZOBRAZOVACÍM PANELŮM JSOU ZAPOTŘEBÍ MINIMÁLNĚ 2 UTP KABELY (PRO ZPĚTNOU SMYČKU - V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ NĚKTERÉHO Z PANELŮ) A ZÁROVEŇ ZAJIŠTĚNÍ LOKÁLNÍHO NAPÁJENÍ 230V K JEDNOTLIVÝM VÝSTUPNÍM I VSTUPNÍM ZAŘÍZENÍM.

VIDEOSERVER BY MĚL BÝT PŘIPOJEN DO SÍTĚ INTERNET Z DŮVODU VZDÁLENÉ PODPORY ČI AKTUALIZACE FIRMWARE.

JAKO OBSLUŽNÉ ZAŘÍZENÍ SE VYUŽÍVÁ KLIENTSKÝ PC (NOTEBOOK/TABLET) S OPERAČNÍM SYSTÉMEM WINDOWS. VZDÁLENOST MEZI JEDNOTLIVÝMI PRVKY A ŘÍDÍCÍM SERVEREM NESMÍ PŘEKROČIT 95 METRŮ – V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BY MUSELY BÝT NAHRAZENY METALICKÉ ROZVODY OPTICKÝMI.



CENOVÝ ROZPOČET OBSAHUJE:

- 2x LED ZOBRAZOVACÍ PANEL O ROZMĚRU 4x3 METRY
- VIDEOSERVER S LICENCÍ SPORTVISION
- 2 ZÁBRANKOVÁ SVĚTLA SBĚRNICOVÁ
- VÝSLEDKOVÝ MODUL PRO HOKEJOVÉ SPORTY
- 1 HLAVNÍ SIRÉNA
- MODBUS RS485 PRO VÝSTUPNÍ PRVKY
- OBOUSTRANNÁ ČASOMÍRA DO CHODBY U ŠATEN
- SLABOPROUDÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY VČETNĚ DOPLNĚNÍ UTP TRAS
- NOSNÁ KONSTRUKCE PRO OBRAZOVKY UMÍSTĚNÉ NA ČI POD ZÁBRADLÍ / **NUTNÉ UPŘESNĚNÍ PRO VÝROBU A PŘESNÉ ZKALKULOVÁNÍ KONSTRUKCE**
- NÁKLADY NA DOPRAVU, ZAHOŘENÍ, OŽIVENÍ, MONTÁŽ A REVIZE + ZAŠKOLENÍ
- ZAJIŠTĚNÍ VÝŠKOVÉ TECHNIKY

CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU:

1.363.830,- Kč

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ + CENY:

- USB SCOREBOARD MIDI KONTROLÉR (EXTERNÍ TLAČÍTKO PRO START / STOP)
 - CENA 9.800,- Kč
- RACKOVÁ SKŘÍŇ PRO UMÍSTĚNÍ A UZAMČENÍ VIDEOSERVERU (VČETNĚ NAPÁJECÍ LIŠTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ)
 - CENA 7.250,- Kč

NABÍDKA NEOBSAHUJE:

- ZÁLOŽNÍ ZDROJE ZAJIŠŤUJÍCÍ PROVOZ PŘI VÝPADKU NAPÁJENÍ
- KLIENTSKÝ OBSLUŽNÝ POČÍTAČ (NOTEBOOK) S OPERAČNÍM SYSTÉMEM WINDOWS
- AUDIO OZVUČENÍ STADIONU (VÝSTUP Z VIDEOSERVERU JE NUTNÉ ZAPOJIT DO MIX PULTU)
- INTERNETOVOU KONEKTIVITU
- EXTENDER VIDEOPROCESORU PRO PŘIPOJENÍ ŽIVÝCH KAMER, STREAMU UTKÁNÍ APOD.
- STATICKÝ POSUDEK PRO UMÍSTĚNÍ PANELŮ



VEDENÉ CENY JSOU BEZ AKTUÁLNÍ SAZBY DPH

* NUTNÉ JE UPŘESNIT UCHYCENÍ LED PANELŮ !

WWW.TSMOST.CZ | TsmM a.s. | MOST, Dělnická 164 | IČ 64052265 | DIČ CZ64052265

TECHNICKÉ PARAMETRY LED PANELU:


Technický list výsledkové tabule

Parametry obrazové plochy

No.	Položka	Parametr
1	Rozměr	4 x 3 m
2	Rozlišení obrazovky	832 x 624 pixelů

Technické parametry obrazovky

3	Jas	1000cd/m ²
4	Zobrazovací úhel	160° horizontálně, 160° vertikálně
5	Pozorovací vzdálenost od	5 m
6	Obnovovací frekvence snímků	>1920Hz
7	Životnost diod	>100000 hodin
8	Provozní napětí	AC 230V 50-60 Hz
9	Spotřeba elektrické energie	Průměrný : 267W/m ² / Maximální: 800W/m ²
10	Teplota pracovního prostředí systému	-25°C ~ +65°C
11	Hmotnost obrazovky (bez rámu)	356 kg

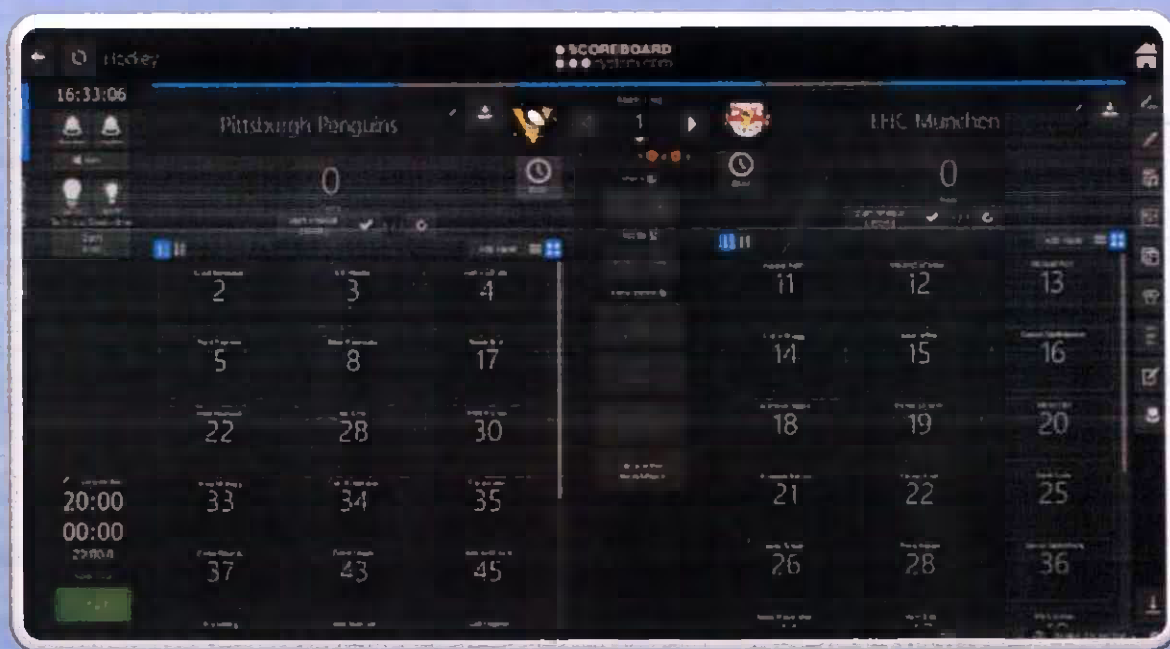

UKÁZKA ZOBRAZENÍ:

● **SCOREBOARD**
●●● system.com

Pittsburgh Penguins ¹ EHC München

0 20:00 0

0 50:00 0

 **GOAL!**

17 

Bryan Rust ●●● **SCOREBOARD**
system.com

Pittsburgh Penguins ¹ EHC München

2 20:00 0

3 50:00 0





CENOVÁ KALKULACE:

Modernizace výsledkového panelu na zimním stadionu v Mostě

popis	počet	jed.	jednotková cena	cena celkem bez DPH
Interiérový LED panel 4 x 3 metry s videoserverem	2	ks	495 120,00 Kč	990 240,00 Kč
Videoserver	1	ks	34 350,00 Kč	34 350,00 Kč
Softwarový balíček pro hokejové zápasy	1	ks	45 040,00 Kč	45 040,00 Kč
Nosná konstrukce pro obrazovky do 12m2 - rám nosný, uchycení zavěšené	2	ks	49 500,00 Kč	99 000,00 Kč
Hlavní sířena na hrací plochu vč ovládacího modulu	1	ks	7 750,00 Kč	7 750,00 Kč
RS 485 Modbus - komunikační rozhraní	1	ks	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
Zábranková signalizační světla	2	ks	9 500,00 Kč	19 000,00 Kč
Časová tabule do šaten oboustranná - stropní závěs	1	ks	29 350,00 Kč	29 350,00 Kč
Kabeláž FTP Cat 5e venkovní provedení LSOH	500	m	20,00 Kč	10 000,00 Kč
Kabeláž CYKY po napájení 230V	100	m	25,00 Kč	2 500,00 Kč
Úložný materiál (trubky, lišty)	200	m	20,00 Kč	4 000,00 Kč
Zajištění lokálních přívodů 230V včetně jištění	5	kpl	3 500,00 Kč	17 500,00 Kč
Práce montážní a přesuny hmot	1	kpl	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Instalace LED panelů, nastavení SW, zaučení obsluhy	2	kpl	32 500,00 Kč	65 000,00 Kč
Výchozí revize zařízení	5	ks	1 500,00 Kč	7 500,00 Kč
Cestovné / přesuny	1	kpl	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Drobný a pomocný materiál	1	kpl	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
Zapůjčení halové plošiny pro montáž panelů	16	h	350,00 Kč	5 600,00 Kč

Celkem bez DPH	1 363 830 Kč
DPH 21%	286 404 Kč
Celkem s DPH	1 650 234 Kč

KRYCÍ LIST SMLOUVY Č. 21/2/2021

	Datum	Jméno, příjmení / příp. organizace	Funkce, O
Zpracoval/a/i/y:	26.2.2021		Referent OI
Vedoucí odboru:	26. 02. 2021		Vedoucí OI
Správce rozpočtu:	26. 02. 2021		Ekonomka OI
☐ dotace EU apod. ☐ podmíněná pohledávka ☐ podmíněný závazek _____ Kč (vč. DPH) ☐ podpora de minimis ☐ veřejná podpora – bloková výjimka ☒ výjimka – vertikální spolupráce			
Za OF posoudil/a:	2.3.2021		Referent OF
AK – právně posoudil/a:	2.3.2021	KINDL & PARTNERI advokátní kancelář s.r.o.	Advokátní kancelář
	Uveřejnění v registru smluv: ☐ NE ☒ ANO		
	Anonymizovat smlouvu: ☐ NE ☒ ANO		
Za VM:	10 -03- 2021	Ing. Marek Hrvol	Náměstek předsedy
Schváleno v:	☐ PPM / ☐ RmM / ☐ ZmM – dne _____		
Datum uveřejnění smlouvy:		Poznámka:	Smlouva se uzavírá na základě čl. 9, bod 1 Pravidel pro zadávání a provedení veřejných zakázek malého rozsahu statutárního města Mostu
ID smlouvy z registru smluv:			
