

Číslo smlouvy objednatele: 1241/2014/OI/LPO
Veřejná zakázka č.: 69/2013

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora
Ing. Jiřím Hrabínou

STASPO, spol. s r.o.
se sídlem: Těšínská 254, 716 00 Ostrava -
Radvanice
jednatel: Svatoplukem Madrym, jednatelem
zapsána v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl C,
vložka 1807

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (pláteece DPH)
Peněžní ústav:

IČ: 41035704
DIČ: CZ41035704
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Číslo účtu:

dále jen **objednatel**

Autorizovaná osoba v oblasti VH staveb:

Č. autorizace:
Stavbyvedoucí:

vedoucí účastník sdružení

a

HYDROSPOR spol. s r.o.
se sídlem: Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava -
Přivoz
jednatel: Ing. Ladislavem Horákem, jednatelem
zapsána v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl C,
vložka 10081

IČ: 47666374
DIČ: CZ47666374
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

účastník sdružení

dále jen **zhotovitel**

Společnosti STASPO, spol. s r.o. a HYDROSPOR spol. s r.o. jsou účastníky sdružení s názvem „STASPO – HYDROSPOR – Kanalizace Petřkovice II. a III. etapa“ k veřejné zakázce „Kanalizace Petřkovice II. a III. etapa“ na základě smlouvy o sdružení ze dne 19. 11. 2013.

Obsah smlouvy

čl. I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly podle § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, že se jejich závazkový vztah založený touto smlouvou bude řídit obchodním zákoníkem. Smlouva o dílo je uzavřena podle § 536 a násl. Tohoto zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy ve výši 100 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
(V případě, že na realizaci předmětu této smlouvy se bude podílet více zhotovitelů společně na základě smlouvy o sdružení, bude každý účastník sdružení pojištěn za škodu způsobenou třetí osobě při plnění předmětu této smlouvy ve výši min. 100 mil. Kč. Tato povinnost bude splněna tím, že každý ze zhotovitelů předloží kdykoli na požádání zástupci objednatele k nahlédnutí pojistnou smlouvu dle předchozí věty v plné výši a v originále samostatně, anebo tak, že kterýkoliv ze zhotovitelů doloží pojistnou smlouvu, ze které bude vyplývat, že pojištění je sjednáno i ve prospěch ostatních účastníků sdružení).
5. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
7. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění odvedení splaškových odpadních vod z lokality Petřkovice.
8. Zhotovitel stavby „Petřkovice, kanalizační stoka T – část B (II. a III. etapa)“, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená nesmí provádět technický dozor u této stavby.

čl. II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k realizaci stavby „**Petřkovice, kanalizační stoka T – část B (II. a III. etapa)**“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“) dle dokumentace pro provádění stavby (dále též jen „projektová dokumentace“), kterou zpracovala společnost Sweco Hydroprojekt a.s. pod číslem zakázky 30917-9-06 v dubnu 2013. Při realizaci stavby budou dodrženy veškeré podmínky a požadavky uvedené ve vyjádřeních a rozhodnutích dotčených orgánů, institucí a správce inženýrských sítí vydaných v průběhu projednávání a povolování stavby, zejména podmínky uvedené v Rozhodnutí č. 88/05 o povolení stavby vodního díla, které vydal odbor ochrany vod a půdy Magistrátu města Ostravy dne 17. ledna 2005, Rozhodnutí č. 1593/06 o povolení změny vodního díla před dokončením, které vydal odbor ochrany vod a půdy Magistrátu města Ostravy dne 27. listopadu 2006, Rozhodnutí č. 119/07 o povolení změny vodního díla před dokončením, které vydal odbor ochrany vod a půdy Magistrátu města Ostravy dne 24. ledna 2007, Rozhodnutí č. 1123/04 ze dne 1. října 2003 a č. 1313/04 ze dne 23. listopadu 2004 o povolení k nakládání s vodami, které vydal odbor ochrany vod a půdy Magistrátu města Ostravy, a dále podmínky uvedené v Rozhodnutí č. 580/13/VII, které vydal odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy dne 25. června 2013. Stavba bude realizována dle „Požadavků na provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek“, které zpracovaly Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. (dále též jen „OVAK a.s.“ nebo „provozovatel“) v červenci 2012.
2. Součástí předmětu smlouvy je:
 - a) zpracování dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle čl. XIII. odst. 4 písm. a) této smlouvy;
 - b) aktualizace vyjádření správce inženýrských sítí;
 - c) projednání projektové dokumentace se správci dotčených inženýrských sítí a zařízení, vyžádání souhlasů s činností v jejich ochranném pásmu a zajištění vytyčení podzemních inženýrských sítí a

- vedení podle podmínek vyjádření jejich správce a vlastníku, a to vše před zahájením prací na staveništi, včetně jejich písemného zpětného předání jednotlivým správcům a vlastníkům, vytyčení inženýrských sítí vyznačí zhotovitel v terénu a doloží objednateli protokoly o vytyčení;
- d)** zajištění ochrany veškerého zařízení správce inženýrských sítí v rozsahu daném příslušnými zákony a v souladu s ostatními platnými předpisy, učinění veškerých opatření, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správce inženýrských sítí – zahájení stavby bude předem zhotovitelem oznámeno správcům inženýrských sítí a zástupci těchto správce budou přizváni ke kontrole plnění jimi stanovených podmínek;
- e)** zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně geodetického zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrických plánů v počtu potřebném pro vložení stavby do katastru nemovitostí, zajištění následujících činností oprávněným geodetem:
- vytyčení stavby dle souřadnic z projektové dokumentace;
 - průběžné výškopisné a polohopisné zaměření trasy, a to již před zásypem prováděného díla (tato skutečnost včetně uvedení hloubky uložení a hloubky míst křížení s ostatními inženýrskými sítěmi bude vždy geodetem stvrzena zápisem do stavebního deníku), rovněž každá šachta bude před zásypem protokolárně (např. zápisem do stavebního deníku) předána objednateli za účasti oprávněného geodeta;
 - geodetické zaměření náhradní výsadby;
 - veškeré polohopisné a výškopisné souřadnice uvedené v geodetickém zaměření budou v systému S-JTSK a Balt po vyrovnání;
- f)** ohlášení termínu zahájení stavby a fází výstavby příslušnému stavebnímu úřadu, umožnění provedení kontrolní prohlídky stavby včetně účasti na ní a vyhotovení příslušných protokolů;
- g)** zpracování plánu zkoušek a jeho projednání a schválení zástupcem provozovatele;
- h)** zpracování aktuálního provozního řádu pro snižování hladiny podzemních vod přítékajících do výkopu po dobu výstavby s ohledem na technické vybavení zhotovitele a jeho projednání s odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, výkopové práce budou zahájeny na základě předložení aktualizovaného provozního řádu zástupci objednatele;
- i)** vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením a provozem;
- j)** projednání napojení na odběr elektrické energie, vody z veřejného vodovodu a kanalizace pro potřeby stavby s příslušnými správci těchto sítí;
- k)** označení stavby tabulí s uvedením názvu stavby, zhotovitele a investora včetně zodpovědných osob a termínu realizace a umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě před zahájením stavby;
- l)** zajištění odborného vedení stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- m)** prověření polohy a hloubky všech napojovacích míst stávajících kanalizačních stok před zahájením zemních prací;
- n)** zajištění souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací a vydání příkazu na dočasné dopravní značení dle platných předpisů, zabezpečení plnění veškerých podmínek uvedených v povolení zvláštního užívání, využití veškerých komunikací jen v souladu s platnými předpisy a povoleními;
- o)** aktualizace, osazení a údržba dočasného dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání její případné změny u příslušného orgánu státní správy, uvedení dopravního značení do původního stavu po skončení prací;
- p)** zajištění trasy mimo obvod staveniště pro dopravu materiálu na stavbu a odvoz ze stavby včetně její údržby po dobu výstavby a uložení materiálu a výkopků pro stavbu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích;
- q)** vykácení dřevin a následně naložení s vytěženou dřevní hmotou v souladu s příslušnými rozhodnutími správních orgánů ochrany přírody a krajiny, které se vztahují k předmětu díla, projednání způsobu naložení s vytěženou dřevní hmotou s jejím vlastníkem či správcem a předání dokladů o provedení těchto prací objednateli, jejichž součástí bude přesná specifikace druhu, průměru a počtu kusů (event. množství) a popis způsobu odstranění dřevní hmoty včetně písemného

odsouhlasení vlastníkem či správcem, v případě neprovedení kácení zeleně zhotovitel doloží objednateli čestné prohlášení, že v rámci realizace díla k tomuto úkonu nedošlo:

- r) zajištění bezpečnostních přechodů a přejezdu přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu ke stavbě a dotčeným objektům;
 - s) provedení všech předepsaných zkoušek jako zkoušky vodotěsnosti, kamerové prohlídky včetně vyhodnocení, zkoušky míry zhutnění podsypu, obsypu a zásypu potrubí, případně jiné zkoušky stanovené v projektové dokumentaci prokazující kvalitu díla. Při provádění požadovaných zkoušek a před záhozem potrubí přizve zhotovitel k účasti zástupce provozovatele, stavebního dozoru a objednatele min. 3 dny předem;
 - t) průběžné odstraňování nečistot vzniklých při provádění prací z příjezdních komunikací ke staveništi po celou dobu realizace stavby;
 - u) likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad;
 - v) doložení oprávnění k odstranění odpadů v případě, že zhotovitel toto oprávnění má. V případě, že odstraňování bude zajišťováno prostřednictvím odborné firmy, doloží fotokopii smlouvy o odstranění odpadů uzavřenou mezi ním a touto firmou a fotokopii oprávnění tohoto smluvního partnera k odstraňování odpadů vzniklých při realizaci stavby. Tyto doklady musí být platné po celou dobu realizace díla.
3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení víceprací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých při zpracování položkového rozpočtu a není-li to možné, tak podle cen RTS platných v době realizace těchto víceprací. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.
4. V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek k této smlouvě o dílo (dále též jen „smlouva“).
5. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s realizační dokumentací stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
7. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
8. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami, ustanoveními této smlouvy a projektovou dokumentací uvedenou v odst. 1. tohoto článku smlouvy.

čl. III.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

čl. IV.

Místo plnění

Místem plnění je místo stavby, tj. dotčená oblast v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava dle projektové dokumentace uvedené v článku II. odst. 1 této smlouvy.

čl. V.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště.
2. Kompletní dílo bude objednateli předáno **do 130 týdnů** od protokolárního předání a převzetí staveniště, z toho doba realizace kanalizační stoky T13g bude činit maximálně **15 týdnů**.
3. V případě požadavku objednatele umožní zhotovitel předčasné užívání dohotovených částí stavby.
4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Časový harmonogram realizace díla.
5. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím dotčené.
6. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku a o tuto přestávku bude prodloužena doba nutná k provedení díla.
7. Bude-li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 6 tohoto článku smlouvy trvat déle než šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny dílčími fakturami dle článku VII. odst. 4 této smlouvy.
8. Trvá-li přerušení prací déle než 24 měsíců závazek zaniká, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí pokud bude dohodnut termín jejich odstranění. Konečná faktura však bude vystavena až po jejich odstranění v souladu s čl. VII. odst. 5 této smlouvy.
10. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.

čl. VI.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	49 674 439,- Kč
DPH	10 431 632,- Kč
Cena celkem včetně DPH	60 106 071,- Kč

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálu, konstrukčních systémů a parametru specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací, předpokládané inflační vlivy apod.
4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky (mimo poplatky za zvláštní užívání zeleně, chodníků a vozovky ve správě příslušného městského obvodu, které má statutární město Ostrava jako investor zdarma), a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
5. Ke změně cen bez DPH dle odst. 1 tohoto článku smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy.
6. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté projektové dokumentace.
7. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací předmětu této smlouvy, např. na vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, na vypracování dokumentace skutečného provedení, apod.

8. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
9. Součástí této smlouvy je příloha č. 2 - Kalkulace nákladů.
10. Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
11. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH účtována platná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
12. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude sloužit výlučně pro výkon veřejné správy - přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti. Zhotovitel podle charakteru prací stanoví, zda ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 bude pro výše uvedené plnění aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a v souladu s tím vystaví daňový doklad se všemi náležitostmi.

čl. VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury;
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky (69/2013);
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
 - d) obchodní firma, místo podnikání, IČ a DIČ zhotovitele;
 - e) název, sídlo IČ a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor investiční);
 - f) informace o zatřídění prací z hlediska CZ CPA;
 - g) lhůtu splatnosti faktury;
 - h) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu;
 - i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno;
 - j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
4. V souladu s ust. § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílejší plnění. Dílejší plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v souladu s harmonogramem realizace díla a v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Součástí faktury bude také zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený inženýrskou organizací, vykonávající na základě plné moci za objednatele inženýrskou činnost na stavbě. Zhotovitel minimálně 5 pracovních dní před vystavením faktury zašle elektronicky objednateli ke kontrole soupis provedených prací. Každá položka soupisu provedených prací musí být přesně a konkrétně specifikována a kvantifikována. Faktury za samostatná zdanitelná dílejší plnění budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací odsouhlasených dle harmonogramu realizace díla do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou. Lhůta splatnosti těchto faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli.
5. Konečná faktura obsahující doplatek do 90 % ze smluvní ceny a rovněž 10 % pozastávku z celkové smluvní ceny bude vystavena do 15 kalendářních dnů ode dne předání stavby. Lhůta splatnosti konečné faktury (doplatku), mimo 10 % pozastávku, je 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli, neskončí však dříve než 30 dnů po termínu plnění uvedeném v čl. V, odst. 2, této smlouvy. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.). Pozastávka ve výši 10 % z celkové smluvní ceny bude splatná do 30 dnů po

odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o předání a převzetí dokončeného díla.

6. Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn č. D-6, MF ČR k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
8. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na tok financí statutárního města Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahu.
9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací.
10. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činnosti. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcem objednatele provedení kontroly umožnit.
11. Doručení faktur provede zhotovitel osobně proti podpisu zástupce objednatele nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence.
12. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy.
13. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

čl. VIII.

Plná moc

1. Objednatel uděluje k úkonům v rozsahu dle čl. II. této smlouvy zhotoviteli plnou moc, která je uvedena v příloze č. 3 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2. Zhotovitel plnou moc v celém rozsahu přijímá.

čl. IX.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové dokumentaci pro provádění stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci pro provádění stavby musí být předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrské činnosti a objednatelem.

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

čl. X.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele.
3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
4. Zhotovitel projedná zařízení a provoz staveniště s vlastníkem pozemku, který je ke zřízení zařízení staveniště určen.
5. Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na jeho ostrahu jsou již zahrnuty v ceně.
7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy o likvidaci odpadů.
9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zavazuje se dodržovat v prostorách staveniště bezpečnostní, hygienické a požární předpisy.
10. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od předání díla objednateli. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

čl. XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
3. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení projektové dokumentace bez zbytečných odkladů prověřit, zda projektová dokumentace a další závazné podklady a pokyny objednatele týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce, zda výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry. Zhotovitel však není povinen podrobně přezkoumávat správnost výpočtů nebo takové výpočty provádět.
4. V případě zjištěných vad je zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit objednatele. Ten se vyjádří, zda budou vady odstraněny či zda na provedení díla trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na postupu do doby odstranění vady.
5. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
6. Zhotovitel zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se stavby.
7. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací harmonogram postupu prací uzpůsobený jednotlivým fázím výstavby pro plán provádění kontrolních prohlídek stavby.
8. V případě určení koordinátora bezpečnosti na staveništi objednatel dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

- vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, je povinností zhotovitele stavby poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu přípravy a realizace stavby. Nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi je zhotovitel povinen doložit objednateli, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
9. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x měsíčně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých subdodavatelů.
 10. Při provádění prací musí zhotovitel dodržovat požadavky vlastníků pozemků, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci.
 11. Zhotovitel je povinen řídit se podmínkami a požadavky uvedenými ve vyjádřeních a rozhodnutích orgánů státní správy a správců inženýrských sítí vydaných v průběhu projednávání stavby a je povinen dodržovat hranice dočasných záborů, které jsou dané stavebním povolením.
 12. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí.
 13. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, a to na vlastní náklady.
 14. V průběhu realizace předmětu smlouvy zajistí zhotovitel ochranu dřevin před poškozením. Ve vzdálenosti 2,5 m od pat kmene stromů nesmí být pojížděno těžkými mechanismy a měněna výšková úroveň terénu, prováděny výkopové práce, skladována výkopová zemina a stavební materiál.
 15. Zhotovitel zajistí řádné zabezpečení výkopů v souladu s platnými předpisy, zejména nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
 16. Zhutnění podsypu, obsypu a záspy potrubí bude provedeno v souladu s technickou normou ČSN 72 1016 Kontrola zhutnění zemin a sypanin.
 17. Při nakládání se závadnými látkami bude zhotovitel postupovat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s prováděcími vyhláškami těchto zákonů, přičemž nejpozději při předání staveniště zhotovitel předloží objednateli doklady, ze kterých bude zřejmé, že odstranění odpadů vzniklých při realizaci díla bude prováděno v souladu s právními předpisy.
 18. Zhotovitel zamezí úniku nebezpečných látek a tím i znečištění povrchových vod. Zhotovitel dále ručí za dobrý technický stav všech svých vozidel a mechanismů a je odpovědný za případný únik pohonných hmot, oleje a jiných závadných látek, který způsobí svou zaviněnou činností na staveništi stavby, a jeho následnou likvidaci.
 19. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí na staveništi havárii, je povinen informovat oprávněného zástupce objednatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména z důvodu porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 20. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
 21. Ověřování provedených prací bude prováděno zástupci obou smluvních stran do sedmi pracovních dnů po uplynutí měsíce. Objednatel potvrdí svým podpisem objem prací a dodávek na jednotlivých objektech provedených v uplynulém měsíci, a to dohodnutou formou a ve lhůtě 3 pracovních dnů od převzetí soupisu prací od zhotovitele.

22. Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve zástupce objednatele nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předešlém písemném upozornění objednatele.
23. Před záhozem provede zhotovitel zaměření všech podzemních inženýrských sítí a vedení odkrytých při výstavbě a zakreslí případné změny do dokumentace skutečného provedení. Dále zajistí odkrytá podzemní vedení tak, aby nedošlo k jejich poškození.
24. Zhotovitel písemně vyzve kromě zástupce objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením stavby předá objednateli.
25. Zhotovitel písemně vyzve kromě zástupce objednatele i správce komunikace ke kontrole kvality provedení vozovky a k jejímu převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem do stavebního deníku.
26. Zhotovitel bude předkládat zástupci objednatele ke kontrole výsledky dílčích geodetických měření prováděného díla potvrzené oprávněným geodetem včetně razítka.
27. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
28. Při zjištění nezakreslených podzemních sítí v projektu, které brání realizaci prací, je zhotovitel oprávněn přerušit na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu práce, které jsou těmito překážkami dotčeny. Tuto skutečnost písemně oznámí objednateli včetně návrhu řešení.
29. Zhotovitel zabezpečí povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a zeleně, projednání provizorního dopravního značení včetně organizace dopravy po dobu realizace díla.
30. Při realizaci stavby budou dodrženy platné obecně závazné právní předpisy, zejména vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
31. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace stavby zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí stavby.
32. Po dokončení díla bude provedeno zaslepení a zafoukání starých kanalizačních stok včetně demontáže povrchových znaků, které budou v trase kanalizace. Toto bude dohodnuto zhotovitelem s provozem kanalizační sítě provozovatele a výsledek projednání bude zapsán do stavebního deníku.
33. Po ukončení prací budou veškeré dotčené parcely (pozemky, komunikace apod.) uvedeny do původního stavu a písemně předány jejím vlastníkům či správčům. Protokoly o předání pozemků zpět jejich vlastníkům či správčům budou předány zástupci objednatele.

čl. XII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se bude skládat z úvodního listu, denních záznamů a příloh. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný na stavbě.
2. Stavební deník musí obsahovat:
 - a) úvodní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta, a případné změny těchto údajů;
 - b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací;
 - c) seznam dokladu a úředních opatření týkajících se stavby;
 - d) přehled smluv a dodatků, případně změn;
 - e) seznam dokumentace stavby včetně změn a doplnění.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy nebudou vynechávána volná místa.

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu;
 - b) druh použitých materiálů a technologií;
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti dokumentaci pro provádění stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce;
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků;
 - e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, oprávnění zástupci objednatele, zhotovitele a provozovatele a dále orgány státního odborného dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.
6. Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamu v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen oprávněný zástupce objednatele zapsat své připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele k zapsání připomínek.
7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.
8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
9. Zhotovitel bude odevzdávat oprávněnému zástupci objednatele prvý prupis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
10. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení více a méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno oprávněným zástupcem zhotovitele, objednatele, technickým a autorským dozorem. Režim tohoto deníku se řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
11. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

čl. XIII.

Předání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele k zahájení předávacího řízení písemnou výzvou (doporučený dopis, e-mail, fax, zápis do stavebního deníku) nejméně 5 dnů před termíny provedení díla uvedenými v čl. V. této smlouvy.
2. Přijímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 15 pracovních dnů od zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak.
3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který sepíše zhotovitel do formuláře, který mu předá objednatel v průběhu provádění díla a bude obsahovat:
 - a) označení díla;
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla;
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, věč. čísel a dat uzavření jejich dodatku;
 - d) datum vydání a číslo stavebního povolení;
 - e) termín vyklizení staveniště;
 - f) datum ukončení záruky na dílo;
 - g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části;
 - h) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle nebo jeho části;
 - i) seznam převzaté dokumentace;
 - j) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění;
 - k) prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přijímá;
 - l) datum a místo sepsání zápisu;
 - m) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

4. K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli 1 týden předem doručit následující doklady ve 4 vyhotoveních:
- a) dokumentaci skutečného provedení stavby se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací, autorizovanou zhotovitelem a autorským dozorem, včetně 2 vyhotovení aktuálních katastrálních situací se zákresem skutečného provedení a geodetického zaměření skutečného provedení díla ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě, které bude zpracováno odpovědným geodetem dle přílohy č. 3 „Požadavky na geodetické zaměření staveb a jejich předávání společností OVAK a.s.“ uvedené v „Požadavcích na provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek“, které zpracoval OVAK a.s. v červenci 2012;
 - b) doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů;
 - c) závěrečné zprávy ke všem provedeným zkouškám prokazujícím kvalitu díla. Z těchto závěrečných zpráv bude zřejmé, že daná zkouška vyhověla. Tyto zprávy budou zástupci objednatele předány formou samostatných protokolů podepsaných oprávněnou osobou nebo zhotovitelem. Průběh individuálního vyzkoušení bude zapsán do stavebního deníku a potvrzen zástupcem provozovatele. O průběhu komplexního vyzkoušení bude zhotovitelem vypracována samostatná zpráva, která bude rovněž potvrzena zástupcem provozovatele;
 - d) certifikáty, atesty a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod.;
 - e) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla;
 - f) kopie zápisů o provedené kontrole stavu podzemních inženýrských sítí před záhozem, potvrzené jejich vlastníky a správci, pokud tyto zápisy nejsou ve stavebním deníku;
 - g) stavební deník;
 - h) originály dokladů o zpětném převzetí dotčených pozemků jejich vlastníky;
 - i) originály dokladů o zpětném předání provedené kanalizační přípojky vlastníkům připojované nemovitosti - písemný souhlas vlastníka připojované nemovitosti s provedením způsobu realizace této přípojky na formuláři dodaném objednatelem při předání staveniště - „Protokol o převzetí realizované kanalizační přípojky“;
 - j) doklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou;
 - k) ověřené geometrické plány pro všechny pozemky dotčené stavbou opatřené souhlasem příslušného katastrálního úřadu pro zřízení věcných břemen a pro vyznačení vodo hospodářských staveb u pozemků města a pozemků, u kterých nebudou věcná břemena zřízena;
 - l) doklady o provedení kácení zeleně včetně provedení náhradní výsadby dřevin.
- Zahájení přijímacího řízení je podmíněno úspěšným provedením příslušných zkoušek.
5. Součástí zápisu o předání a převzetí dokončeného díla bude i prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla. Objednatel se zavazuje převzít dílo na základě zápisu o předání a převzetí dokončeného díla i s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě, nebo ve spojení s jinými nebrání provozu díla jako celku s tím, že v předmětném zápise o předání a převzetí dokončeného díla budou zhotoviteli stanoveny závazné termíny k jejich odstranění.
6. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v zápise o předání a převzetí dokončeného díla cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání zápisu o předání a převzetí dokončeného díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Za vady, které se projeví po předání a převzetí díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.
7. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevzme, uvede v zápise o předání a převzetí dokončeného díla důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přijímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přijímky sepiší smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu o předání a převzetí dokončeného díla, v němž objednatel prohlásí, zda dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přijímá.
8. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přijímacím řízení na převzetí díla ve lhůtě 5-ti pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu.
9. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná.

10. K přejímání a předávání díla je za objednatele oprávněn vedoucí investičního odboru Magistrátu města Ostravy, případně jím pověřený pracovník. Zástupci smluvních stran, kteří jsou oprávněni k předání a převzetí díla, budou uvedeni ve stavebním deníku.

čl. XIV.

Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:
 - záruční lhůta na dílo 60 měsíců,
 - záruční lhůta na povrchy 36 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla nebo jeho částí bez vad a nedodělků objednatelem. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
5. Vady zjištěné na provedeném díle při závěrečné kontrolní prohlídce a v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše, uvede, jak se projevuje, a sdělí, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
7. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.
8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemným předávacím protokolem. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

XV.

Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho částí nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese odpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektu.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným v článku I. odst. 4 této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

čl. XVI.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků.

2. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku oprávněným zástupcem objednatele ve stanoveném termínu neodstraní.
4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle článku X. odst. 10 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
6. V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebním úřadem nebo vad, které se projeví v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
9. Pro případ nedodržení „Dodavatelského schématu“, které je součástí přílohy číslo 4. této smlouvy, v objektech/oddílech, u kterých je uvedeno „ne“, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý zjištěný případ.
10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
11. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XVII.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 2395/ZM1014/31 ze dne 2. 4. 2014. Veřejná zakázka byla zadána v otevřeném nadlimitním řízení.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření.
3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny ceny dle čl. VI. odst. 11 této smlouvy a změny subdodavatele dle odst. 9 tohoto článku smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany mohou ukončit tento smluvní vztah písemnou dohodou.
5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí se 14-ti denní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
7. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám.
8. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
9. Seznam subdodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam subdodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy v rozsahu větším než 5 % z ceny díla, je uveden v příloze č. 4 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele pouze po předešlém schválení zástupce objednatele – vedoucího odboru investičního Magistrátu města Ostravy nebo jím pověřené osoby. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový

subdodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní subdodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně subdodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. Součástí přílohy č. 4 této smlouvy je také „Dodavatelské schéma“ zpracované dle zadávací dokumentace k této veřejné zakázce.

10. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
11. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.
12. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
14. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
15. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
16. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady, apod. písemnou formou.
17. Odpovědnou osobou ve věcech technických pro účely této smlouvy je ze strany objednatele ustanoven zaměstnanec statutárního města Ostravy zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy - _____, popř. zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního Magistrátu města Ostravy.
18. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopísech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
19. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:
Příloha č.1 - Časový harmonogram realizace díla,
Příloha č.2 - Kalkulace nákladů,
Příloha č.3 - Plná moc,
Příloha č.4 - Seznam subdodavatelů.

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava

zmocněnec Ing. Jiří Hrabina
náměstek primátora

Za zhotovitele

STASPO, spol. s r.o.

Datum: _____

Místo: Ostrava

Svatopluk Madry
jednatel společnosti

HYDROSPOR spol. s r.o.


Datum: _____

Místo: Ostrava

Ing. Ladislav Horák
jednatel společnosti

Časový harmonogram realizace díla

Kanalizace Petřkovice II. a III. etapa

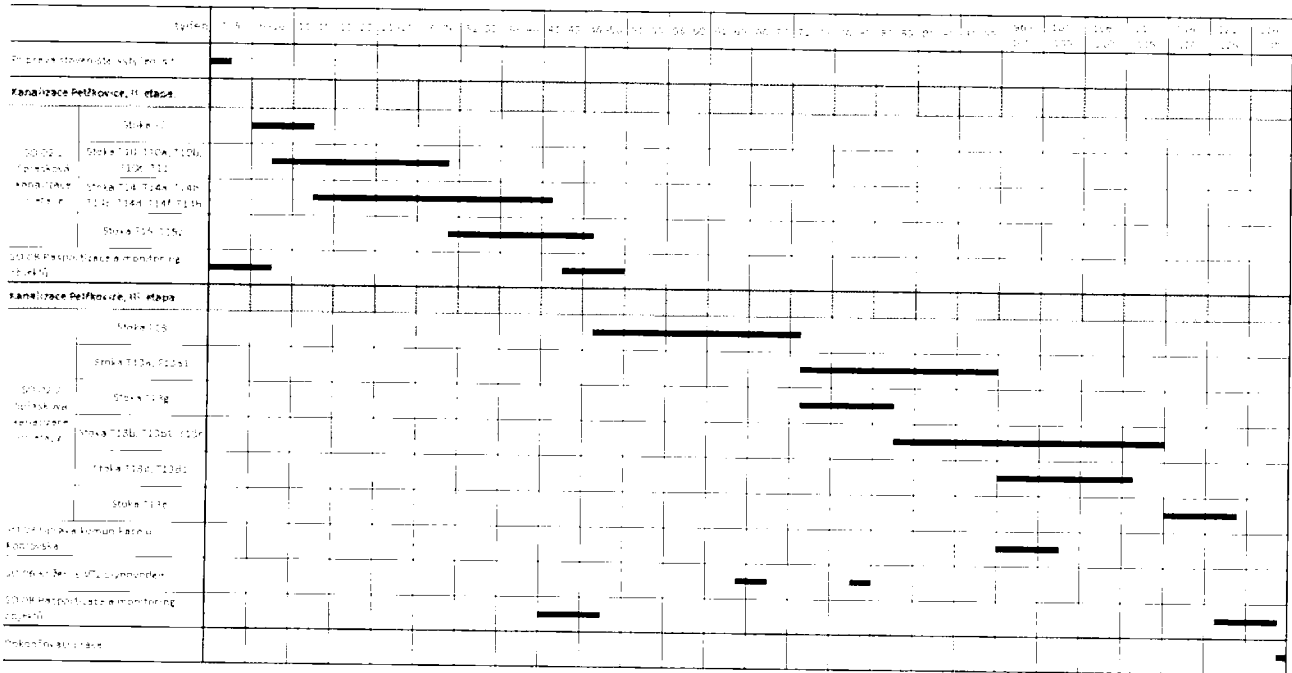

Kalkulace nákladů

P.č.	Typ	Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena celkem	Sazby DPH		Cena celkem s DPH
						21%	15%	
1	0	P2013021	Kanalizace Petřkovice II etapa					
2	0	P2013021a	SO 02 2 Spáňková kanalizace I. etapa					
3	0	P2013024-001	T7 Kanalizace DN 300 hrdlova		679 124,29	141 719,99	820 844,28	
4	0	P2013024-002	T7 Kanalizace DN 300 protlak		354 650,10	74 273,53	428 923,63	
5	0	P2013024-003	T7 Kanalizační odbočky		249 794,01	52 149,94	301 943,95	
6	0	P2013024-004	T10 Kanalizace DN 300 hrdlova		1 439 449,21	299 984,34	1 739 433,55	
7	0	P2013024-006	T10 Kanalizace DN 300 protlak		2 443 620,50	501 960,56	2 945 581,06	
8	0	P2013024-006a	T10a Odbočky DN 150		229 370,45	47 766,79	277 137,24	
9	0	P2013024-006b	T10b Odbočky DN 200		19 000,47	3 920,11	22 920,58	
10	0	P2013024-006c	T10c Kanalizace		186 676,39	38 853,92	225 530,31	
11	0	P2013024-009	T10a Kanalizační odbočky		39 419,64	8 184,42	47 604,06	
12	0	P2013024-010	T10b Kanalizace		89 020,74	18 614,35	107 635,09	
13	0	P2013024-011	T10c Kanalizační odbočky		11 216,07	2 306,99	13 523,06	
14	0	P2013024-012	T10c Kanalizace DN 300 protlak		661 290,21	137 673,33	798 963,54	
15	0	P2013024-013	T10c Kanalizační odbočky DN 150		48 041,41	10 000,09	58 041,50	
16	0	P2013024-014	T11 Kanalizace DN 300		541 000,00	113 610,00	654 610,00	
17	0	P2013024-015	T11 Kanalizační odbočky DN 150		69 622,00	14 512,84	84 134,84	
18	0	P2013024-016	T11 Kanalizace DN 300 hrdlova		1 268 418,71	264 987,94	1 533 406,65	
19	0	P2013024-017	T14 Kanalizace DN 300 protlak		1 796 203,02	373 333,99	2 169 537,01	
20	0	P2013024-018	T14 Kanalizační odbočky DN 150		479 208,81	100 249,43	579 458,24	
21	0	P2013024-019	T14 Kanalizační odbočky DN 200		209 449	43 227,91	252 676,91	
22	0	P2013024-020	T14a Kanalizace DN 300 protlak		2 139 417,95	441 982,79	2 581 400,74	
23	0	P2013024-021	T14b Kanalizační odbočky DN 150		1 0 110,11	21 000,19	121 010,30	
24	0	P2013024-022	T14b Kanalizace DN 300 hrdlova		760 662,19	156 013,10	916 675,29	
25	0	P2013024-023	T14c Kanalizační odbočky DN 150		491 700,02	101 993,82	593 693,84	
26	0	P2013024-024	T14c Kanalizace DN 300 hrdlova		499 000,00	104 294,29	603 294,29	
27	0	P2013024-025	T14c Kanalizační odbočky DN 150		190 000,00	39 600,00	229 600,00	
28	0	P2013024-026	T14c Kanalizace DN 300 hrdlova		244 382,67	50 709,15	295 091,82	
29	0	P2013024-027	T14d Kanalizační odbočky DN 150		129 021,69	27 263,57	156 285,26	
30	0	P2013024-028	T14f Kanalizace DN 300 hrdlova		242 312,64	50 497,12	292 809,76	
31	0	P2013024-029	T14f Kanalizační odbočky DN 150		23 297,10	4 844,44	28 141,54	
32	0	P2013024-030	T14h Kanalizace DN 200		201 298,02	42 563,20	243 861,22	
33	0	P2013024-031	T14h Kanalizační odbočky DN 150		10 027,70	2 116,11	12 143,81	
34	0	P2013024-032	T16 Kanalizace DN 300 hrdlova		2 193 163,17	461 563,36	2 654 726,53	
35	0	P2013024-033	T16 Kanalizační odbočky DN 150		500 109,59	105 023,39	605 132,98	
36	0	P2013024-034	T16 Kanalizační odbočky DN 200		20 339,11	4 211,70	24 550,81	
37	0	P2013024-035	T16c Kanalizace hrdlova DN 300		151 130,29	31 733,47	182 863,76	
38	0	P2013024-036	T16c Kanalizační odbočky DN 150		174 572,04	36 260,40	210 832,44	
39	0	P2013024b	SO 01 Inace spáňové s výkytem tekutých pevných znečištění					
40	0	P2013024c	SO 08 Paspařovací a mýcí stroj objektu		21 140,00	44 292,79	65 432,79	
41	0	P2013027d	Melejška a ostatní náklady		814 026,00	169 146,00	983 172,00	
			CELKEM		29 513 203,73	6 002 092,35	35 515 296,08	

P.č.	Typ	Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena celkem	DPH nízká	DPH vysoká	Cena celkem s DPH
1	S	P2013025	Kanalizace Petřkovice III. etapa					
2	O	P2013025A	SD 02 2 Společná kanalizační etapa					
3	O	P2013025-001	T17 Kanalizace DN 300 Petřkovice		499 607,00		149 882,10	649 489,10
4	O	P2013025-002	T17 Kanalizace DN 300 Petřkovice		2 209 211,17		662 963,12	2 872 174,29
5	O	P2013025-003	T13 Kanalizační odbočky DN 150		1 219 773,47		354 163,51	1 573 936,98
6	O	P2013025-004	T13a Kanalizace DN 300		1 219 773,47		354 163,51	1 573 936,98
7	O	P2013025-005	T13a Kanalizační odbočky DN 300 Petřkovice		1 219 773,47		354 163,51	1 573 936,98
8	O	P2013025-006	T13a Kanalizační odbočky DN 150		2 112 511,52		634 533,46	2 747 044,98
9	O	P2013025-007	T13a1 Kanalizace DN 200		13 191,24		3 957,37	17 148,61
10	O	P2013025-008	T13b Kanalizační odbočky DN 150		13 191,24		3 957,37	17 148,61
11	O	P2013025-009	T13b Kanalizace DN 300		2 112 511,52		634 533,46	2 747 044,98
12	O	P2013025-010	T13b Kanalizační odbočky DN 150		13 191,24		3 957,37	17 148,61
13	O	P2013025-011	T13b1 Kanalizační DN 150		13 191,24		3 957,37	17 148,61
14	O	P2013025-012	T13b1 Kanalizační odbočky DN 150		13 191,24		3 957,37	17 148,61
15	O	P2013025-013	T13c Kanalizace DN 300		2 112 511,52		634 533,46	2 747 044,98
16	O	P2013025-014	T13c Kanalizační odbočky DN 150		13 191,24		3 957,37	17 148,61
17	O	P2013025-015	T13c Kanalizační odbočky DN 300		2 112 511,52		634 533,46	2 747 044,98
18	O	P2013025-016	T13d Kanalizace DN 300 Petřkovice		1 219 773,47		354 163,51	1 573 936,98
19	O	P2013025-017	T13d Kanalizace DN 300 ze skříně		1 219 773,47		354 163,51	1 573 936,98
20	O	P2013025-018	T13d Kanalizační odbočky DN 150 z PVC		1 219 773,47		354 163,51	1 573 936,98
21	O	P2013025-019	T13d1 Kanalizace DN 200		13 191,24		3 957,37	17 148,61
22	O	P2013025-020	T13d1 Kanalizační odbočky DN 200		13 191,24		3 957,37	17 148,61
23	O	P2013025-021	T13e Kanalizace		2 082 841,12		624 852,34	2 707 693,46
24	O	P2013025-022	T13e Kanalizační odbočky		2 082 841,12		624 852,34	2 707 693,46
25	O	P2013025-023	T13g Kanalizace DN 300 Petřkovice		2 082 841,12		624 852,34	2 707 693,46
26	O	P2013025-024	T13g Kanalizace DN 300 Petřkovice		2 082 841,12		624 852,34	2 707 693,46
27	O	P2013025-025	T13g Kanalizační odbočky DN 150		13 191,24		3 957,37	17 148,61
28	O	P2013025-026	T13g Kanalizační odbočky DN 200 DN 300		13 191,24		3 957,37	17 148,61
29	O	P2013025b	SD 03 Úprava ul. Kobovská					
30	O	P2013025-027	Úprava komunikace ul. Kobovská					
31	O	P2013025c	SD 06 Křižení s VTL plynovodem		173 833,62		52 150,08	225 983,70
32	O	P2013025-028	T11 Křižení s VTL plynovodem DN 300		173 833,62		52 150,08	225 983,70
33	O	P2013025-029	T12g Křižení s VTL plynovodem DN 300		173 833,62		52 150,08	225 983,70
34	O	P2013025d	SD 07 Práce spojené s výkolem tekutiny z písků	BRUŠEVNÁ				
35	O	P2013025e	SD 05 Pasportizace a monitoring objektů		418 000,00		125 400,00	543 400,00
36	O	P2013025f	Vedlejší a ostatní náklady		23 281 070,00		7 006 321,70	30 287 391,70
					CELKEM			

Cena díla

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Petřkovice, kanalizační stoka T - část B - II. etapa	20 393 369 Kč	4 282 607 Kč	24 675 976 Kč
Petřkovice, kanalizační stoka T - část B - III. etapa	29 281 070 Kč	6 149 025 Kč	35 430 095 Kč
Cena celkem	49 674 439 Kč	10 431 632 Kč	60 106 071 Kč

PLNÁ MOC

ke smlouvě č. 1241/2014/OI/LPO
na realizaci stavby „Petřkovice, kanalizační stoka T – část B (II. a III. etapa)“ v Ostravě -
Petřkovicích

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava
IČ: 00845451
zastoupeno Ing. Jiřím Hrabinou, náměstkem primátora

Zhotovitel: STASPO, spol. s r.o.
se sídlem: Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice
IČ: 41035704
jednatel: Svatoplukem Madrym, jednatelem
vedoucí účastník sdružení
a

HYDROSPOR spol. s r.o.

se sídlem: Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 47666374
jednatel: Ing. Ladislavem Horákem, jednatelem
účastník sdružení

vystupující jako sdružení s názvem „**STASPO – HYDROSPOR – Kanalizace Petřkovice
II. a III. etapa**“

1. Zhotovitel bude jménem a na účet objednatele zastupovat objednatele při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za objednatele písemnosti, spojené s dodavatelskou činností.
2. Zhotovitel jménem a na účet objednatele zabezpečí povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a zeleně, projednání provizorního dopravního značení včetně organizace dopravy po dobu realizace výše uvedené stavby.
3. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy do odstranění všech případných vad a nedodělků z přejímacího řízení výše uvedené stavby.

V Ostravě dne:

za objednatele
zmocněnec Ing. Jiří Hrabina
náměstek primátora

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

V Ostravě dne:

za zhotovitele
Svatopluk Madry
jednatel společnosti
STASPO, spol. s r.o.

za zhotovitele
Ing. Ladislav Horák
jednatel společnosti
HYDROSPOR spol. s r.o.

Seznam subdodavatelů

SEZNAM SUBDODAVATELŮ,

kterým má uchazeč v úmyslu zadat část veřejné zakázky,
dle ust. § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: „Kanalizace Petřkovice II. a III. etapa“		Část plnění veřejné zakázky, kterou uchazeč hodlá zadat jiné osobě	% podíl na plnění veřejné zakázky
1.	Název:	Odborné vedení stavby	0,5
	Sídlo/místo podnikání:	Opavská 768/99, 708 00 Ostrava - Poruba	
	Tel./fax:		
	E-mail:		
	IČ:	---	
	Kontaktní osoba:		
2.	Název:	Michlovský protlaky, a.s.	Realizace protlaků
	Sídlo/místo podnikání:	Salaš 99, 763 51 Zlín	29
	Tel./fax:	577 125 001/577125041	
	E-mail:	protlaky@michlovsky.cz	
	IČ:	277 04 262	
	Kontaktní osoba:		

Dodavatelské schéma: Kanalizace Petřkovice II. a III. etapa

kód	typ	objekt/oddíl	subdodávka
SO 02.2.		Splašková kanalizace – II. a II. etapa	
	HSV	Zemní práce	Ne
	HSV	Zakládání	Ne
	HSV	Vodorovné konstrukce	Ne
	HSV	Komunikace	Ne
	HSV	Trubní vedení – pro otevřený výkop	Ne
	HSV	Trubní vedení - řízená mikrotuneláž	Ano
		<i>Prohlídka televizní kamerou včetně záznamu</i>	Ano
	HSV	Ostatní konstrukce a práce-bourání	Ne
	HSV	Přesun hmot	Ne
	M	Montáže potrubí – otevřený výkop	Ne
SO 03		Úprava komunikace ul. Koblůvská – III. etapa	Ne
SO 06		Křížení s VTL plynovodem – III. etapa	Ne
SO 07		Práce spojené s výskytem tekutých pisků – II. a II. etapa	Ne
SO 08		Pasportizace a monitoring objektů – II. a II. etapa	Ne
