

SPOLEČNÍK 2:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

se sídlem: Mlýnská 68, 602 00 Brno
IČO: 25317628 DIČ: CZ25317628
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka oddíl B, vložka 2144,
zastoupena: Ing. Pavel Borek, člen představenstva

Korespondenční adresa:

Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10

Korespondenční adresa:

SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: společníka 1: 1ZHS210009

společníka 2: 26/2021

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Objednatel si přeje, aby Dílo „**Rekonstrukce mostu v km 200,916 trati Plzeň – Žatec**“ bylo provedeno Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a odstranění všech jeho vad, a proto se

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných dodatků) a jako její součást musí být čteny a vykládány:
 - 1.1 Dopis o přijetí nabídky datovaný 12. 3. 2021
 - 1.2 Dopis nabídky datovaný 17. 2. 2021
 - 1.3 Smluvní podmínky [Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (FIDIC 1999)-Obecné podmínky; Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky pro stavby Správy železnic, státní organizace č.j. 65/2020-520-DOP/1
 - 1.4 Technická specifikace
 - 1.5 Výkresy
 - 1.6 Formuláře:
 - 1.6.1 Soupis prací,
 - 1.6.2 Posuzovací protokol
2. Specifikace související dokumentace je uvedena v Technické specifikaci, a to zejména ve Zvláštních technických podmínkách.
3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré příslušné dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s ustanovením Smlouvy.
4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a odstranění jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
5. Objednatel používá informační systém pro řízení a monitoring staveb. Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu XML (viz datový předpis XDC, <https://xdc.szdc.cz/>):
 - 5.1 Faktura,
 - 5.2 souhrn fakturace,
 - 5.3 soupis zjišťovacích protokolů,

5.4 zjišťovací protokoly.

6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo.
7. NEOBSAZENO
8. V případě Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby, které je posledním Potvrzením průběžné platby nebo Potvrzením závěrečné platby před převzetí Díla, Sekce nebo jiné části Díla Objednatel ve smyslu Pod-článku 10.1 [*Převzetí díla a sekcí*] a Pod-článku 10.2 [*Převzetí části díla*] Smluvních podmínek je Správce stavby povinen vydat Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby nejpozději v den převzetí Díla, Sekce nebo části Díla Objednatel.
9. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92 odst. 1 zákona o DPH.
10. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
11. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený Zadávací dokumentací.
12. NEOBSAZENO.
13. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 20 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této Smlouvy.
14. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost nepůsobí zdánlivostí, neplatností ani nevymahatelností ostatních ustanovení Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení.
15. Objednatel si vyhrazuje:
 - 15.1 požadavek, že níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky:

SO 101 Rekonstrukce mostu

položky č.:

 - 56 42194AR
 - 57 42194BR
 - 58 42194BR
 - 59 42194BR
 - 60 42194CR
 - 61 425134R
 - 62 425138R
 - 63 425138R
 - 98 96618A

- 15.2 požadavek, že významné činnosti při plnění veřejné zakázky dle předchozího bodu 15.1 musí být plněny takovým subjektem na straně Zhotovitele, který před uzavřením Smlouvy prokázal odpovídající požadavky na technickou kvalifikaci, konkrétně poskytnutí a dokončení odpovídajících nejvýznamnějších stavebních prací, a to jeho vlastními prostředky; pokud by plnění měl poskytovat jiný subjekt na straně Zhotovitele, pak pouze pokud prokáže, že rovněž splňuje předmětnou kvalifikaci v potřebném rozsahu a Objednatel tuto skutečnost potvrdí písemným souhlasem; Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z nabídkové ceny uvedené v Dopise Nabídky za každý případ porušení vyhrazeného požadavku.
- 15.3 NEOBSAZENO.
- 15.4 změnu zhotovitele v souladu s § 100, odst. 2 ZZVZ v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinností Zhotovitele. Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Pokynů pro dodavatele je Objednatel oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Pokynů pro dodavatele. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.
- 15.5 právo valorizovat částky způsobilé k platbě Zhotoviteli, a to v souladu s Podčlánkem 13.8 Smluvních podmínek. Pro vyloučení pochybností se potvrzuje, že valorizace může nabývat hodnot kladných i záporných,
- 15.6 změna závazku v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ ve věci měření množství každé původní měřitelné položky s jednotkovou cenou ve výkazu výměr dle čl. 12 Smluvních podmínek.
16. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.
17. Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/poddodavatele/ člena koncernu, v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň s předložením Závěrečného vyúčtování (po vyřešení případných sporů):
- a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,
 - b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).
- Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100% hodnotě veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.
- Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky uvedeného v příloze č. 11 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu).
18. Podpisem této Smlouvy o dílo Zhotovitel současně jako zpracovatel uzavírá s Objednatelem jako správcem smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v příloze č. 5 této Smlouvy o dílo.
19. Smlouva o dílo se vyhotovuje elektronicky.

20. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
- | | |
|---------------|---|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů |
| Příloha č. 6 | Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek) |
| Příloha č. 7 | Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo <i>(Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné nabídky)</i> |
| Příloha č. 8 | NEOBSAZENO. |
| Příloha č. 9 | NEOBSAZENO |
| Příloha č. 10 | NEOBSAZENO |
| Příloha č. 11 | Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky |

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv.

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
Správa železnic, státní organizace

Datum: 2021.03.25
.....
Ing. Jan Freudl
místopředseda představenstva
SMP CZ, a.s.

ING. Pavel Kameník Digitálně podepsal ING. Pavel Kameník
Datum: 2021.03.25 11:46:44 +0100
.....
Ing. Pavel Kameník,
člen představenstva
SMP CZ, a.s.

Datum: 2021.03.25
.....
Ing. Pavel Borek,
člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Do přílohy smlouvy bude vložena tabulka Rekapitulace ceny dle PS a SO vyexportovaná z předložené nabídky oceněného Soupisu prací z IS ASPE. *(TISK -> 3.1 Soupis objektů stavby [Rekapitulace – Ve všech úrovních členění])*

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: 5423520052-zm03 - Rekonstrukce mostu km 200,916 trati Plzeň - Žatec

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena [Kč] : 155 191 035,78

OC+DPH [Kč] : 187 781 153,29

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
D.4 - Ostatní zařízení				
SO 98-98 - Všeobecný objekt				
E.1.1.1 - Železniční svršek				
SO 202 - Železniční svršek				
SO 202.1 - Železniční svršek a spodek				
E.1.1.2 - Železniční spodek				
SO 201 - Železniční spodek				
E.1.4 - Mosty, propustky, zdi				
SO 101 - Rekonstrukce mostu				
E.3.6 - Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				
SO 401 - Přeložka kabelů TÚDC				
SO 402 - Přeložka kabelů SSZT				

PŘÍLOHA Č. 2

Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele

(Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek)

Oprávněné osoby Zhotovitele, včetně ředitele stavby dle čl. 5, odst. (1) bod g. směrnice SŽDC SM 105 Změny během výstavby

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Ředitel stavby

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr)

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██ ██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██ ██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██ ██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na technologická zařízení staveb

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██ ██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na geotechniku

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██ ██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za kontrolu kvality

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██ ██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za odpadové hospodářství

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

PŘÍLOHA Č. 3


Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
Skanska a.s. Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8 IČO: 26271303	Realizace stavebních objektů SO 202, SO 202.1, SO 201, konkrétní specifikace SO je následující: realizace části železničního svršku a spodku, činnosti osoby specialisty (vedoucího prací) na technologická zařízení staveb, v činnosti spojené s živnostenským oprávněním Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu a s živnostenským oprávněním Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady a dále technická pomoc.	3,61 %
MONZAS, spol. s r.o. Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 44222734	Zabezpečovací a sdělovací zařízení SO 401 a SO 402	0,59 %


PŘÍLOHA Č. 4

Harmonogram postupu prací

[Do přílohy smlouvy bude vloženo grafické znázornění postupu prací (Harmonogram postupu prací) předložené v nabídce uchazeče podle odst. 9.1 Pokynů pro dodavatele.]

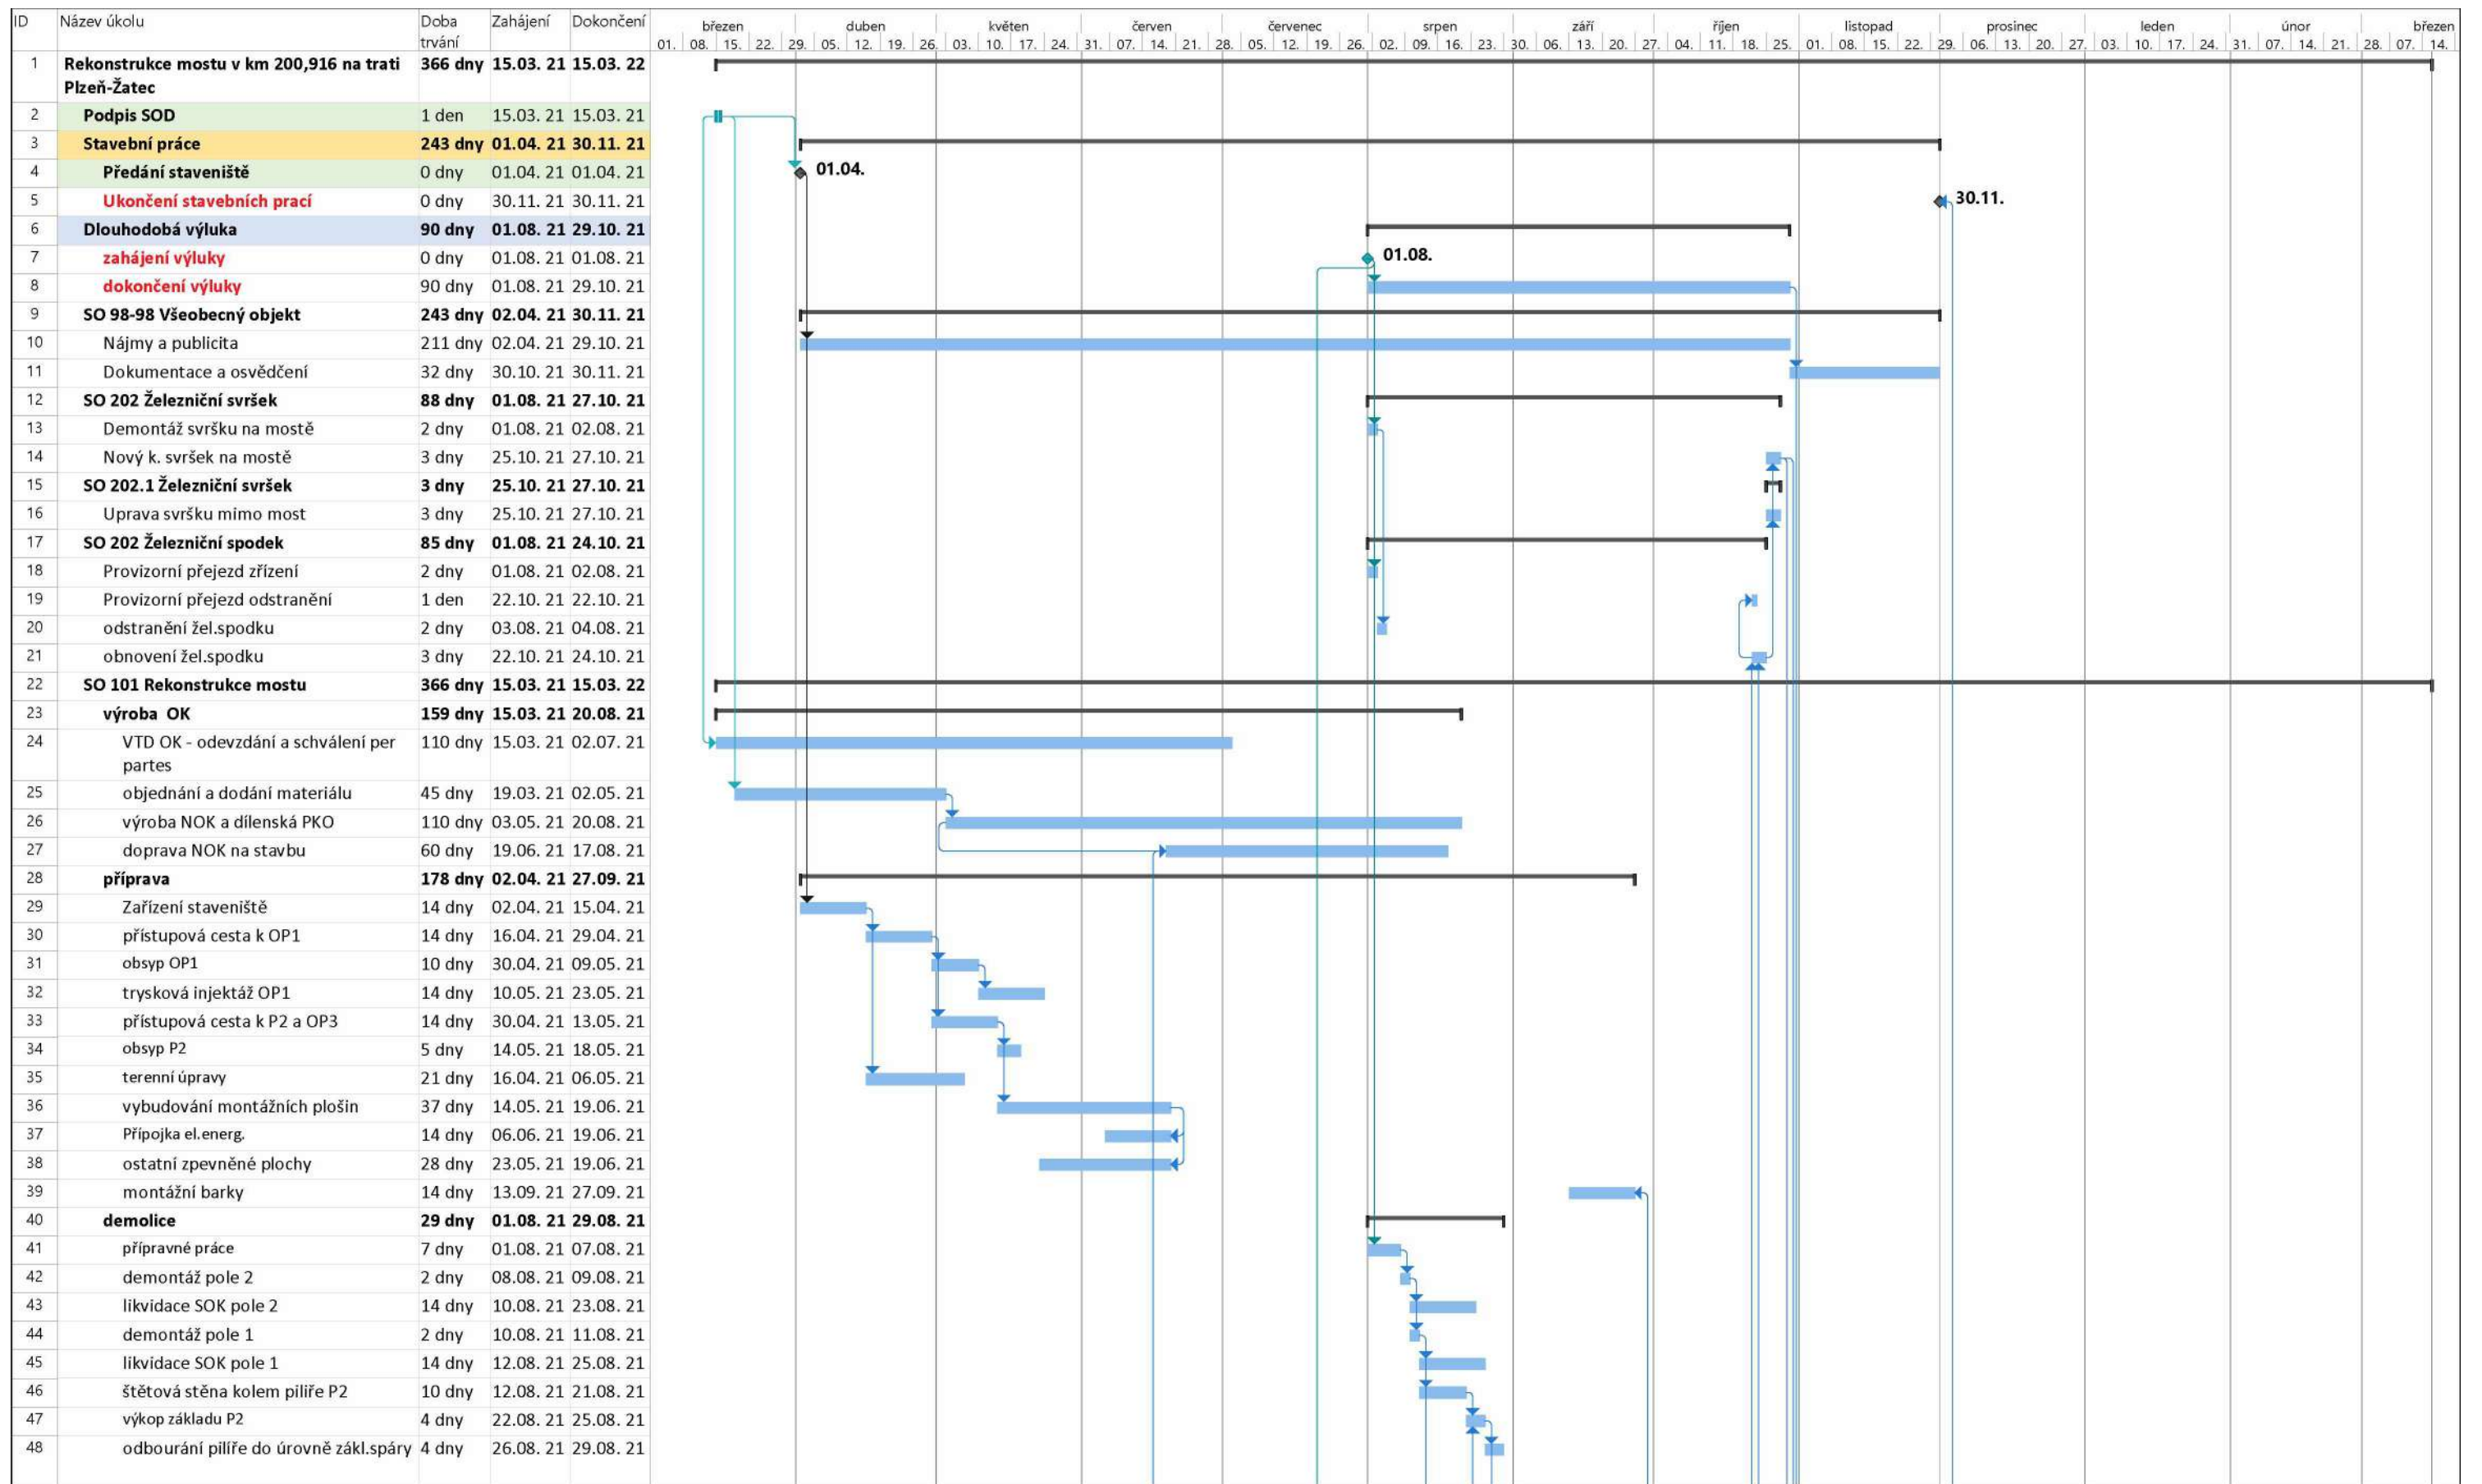

Most v km 200,916 na trati Plze Datum: 15.02. 21	Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Pouze zahájení		Konečný termín		Pouze s datem dokončení		Vnější milník		Konečný termín	
	Rozdělení		Neaktivní úkol		Pouze s dobou trvání		Pouze s datem dokončení		Průběh		Vnější úkoly		Průběh ručně zadaného úkolu		Průběh	
	Milník		Neaktivní milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější úkoly		Průběh		Vnější milník		Průběh		Průběh	
	Souhrnný		Neaktivní souhrn		Ruční souhrn		Vnější milník		Průběh		Vnější milník		Průběh		Průběh	

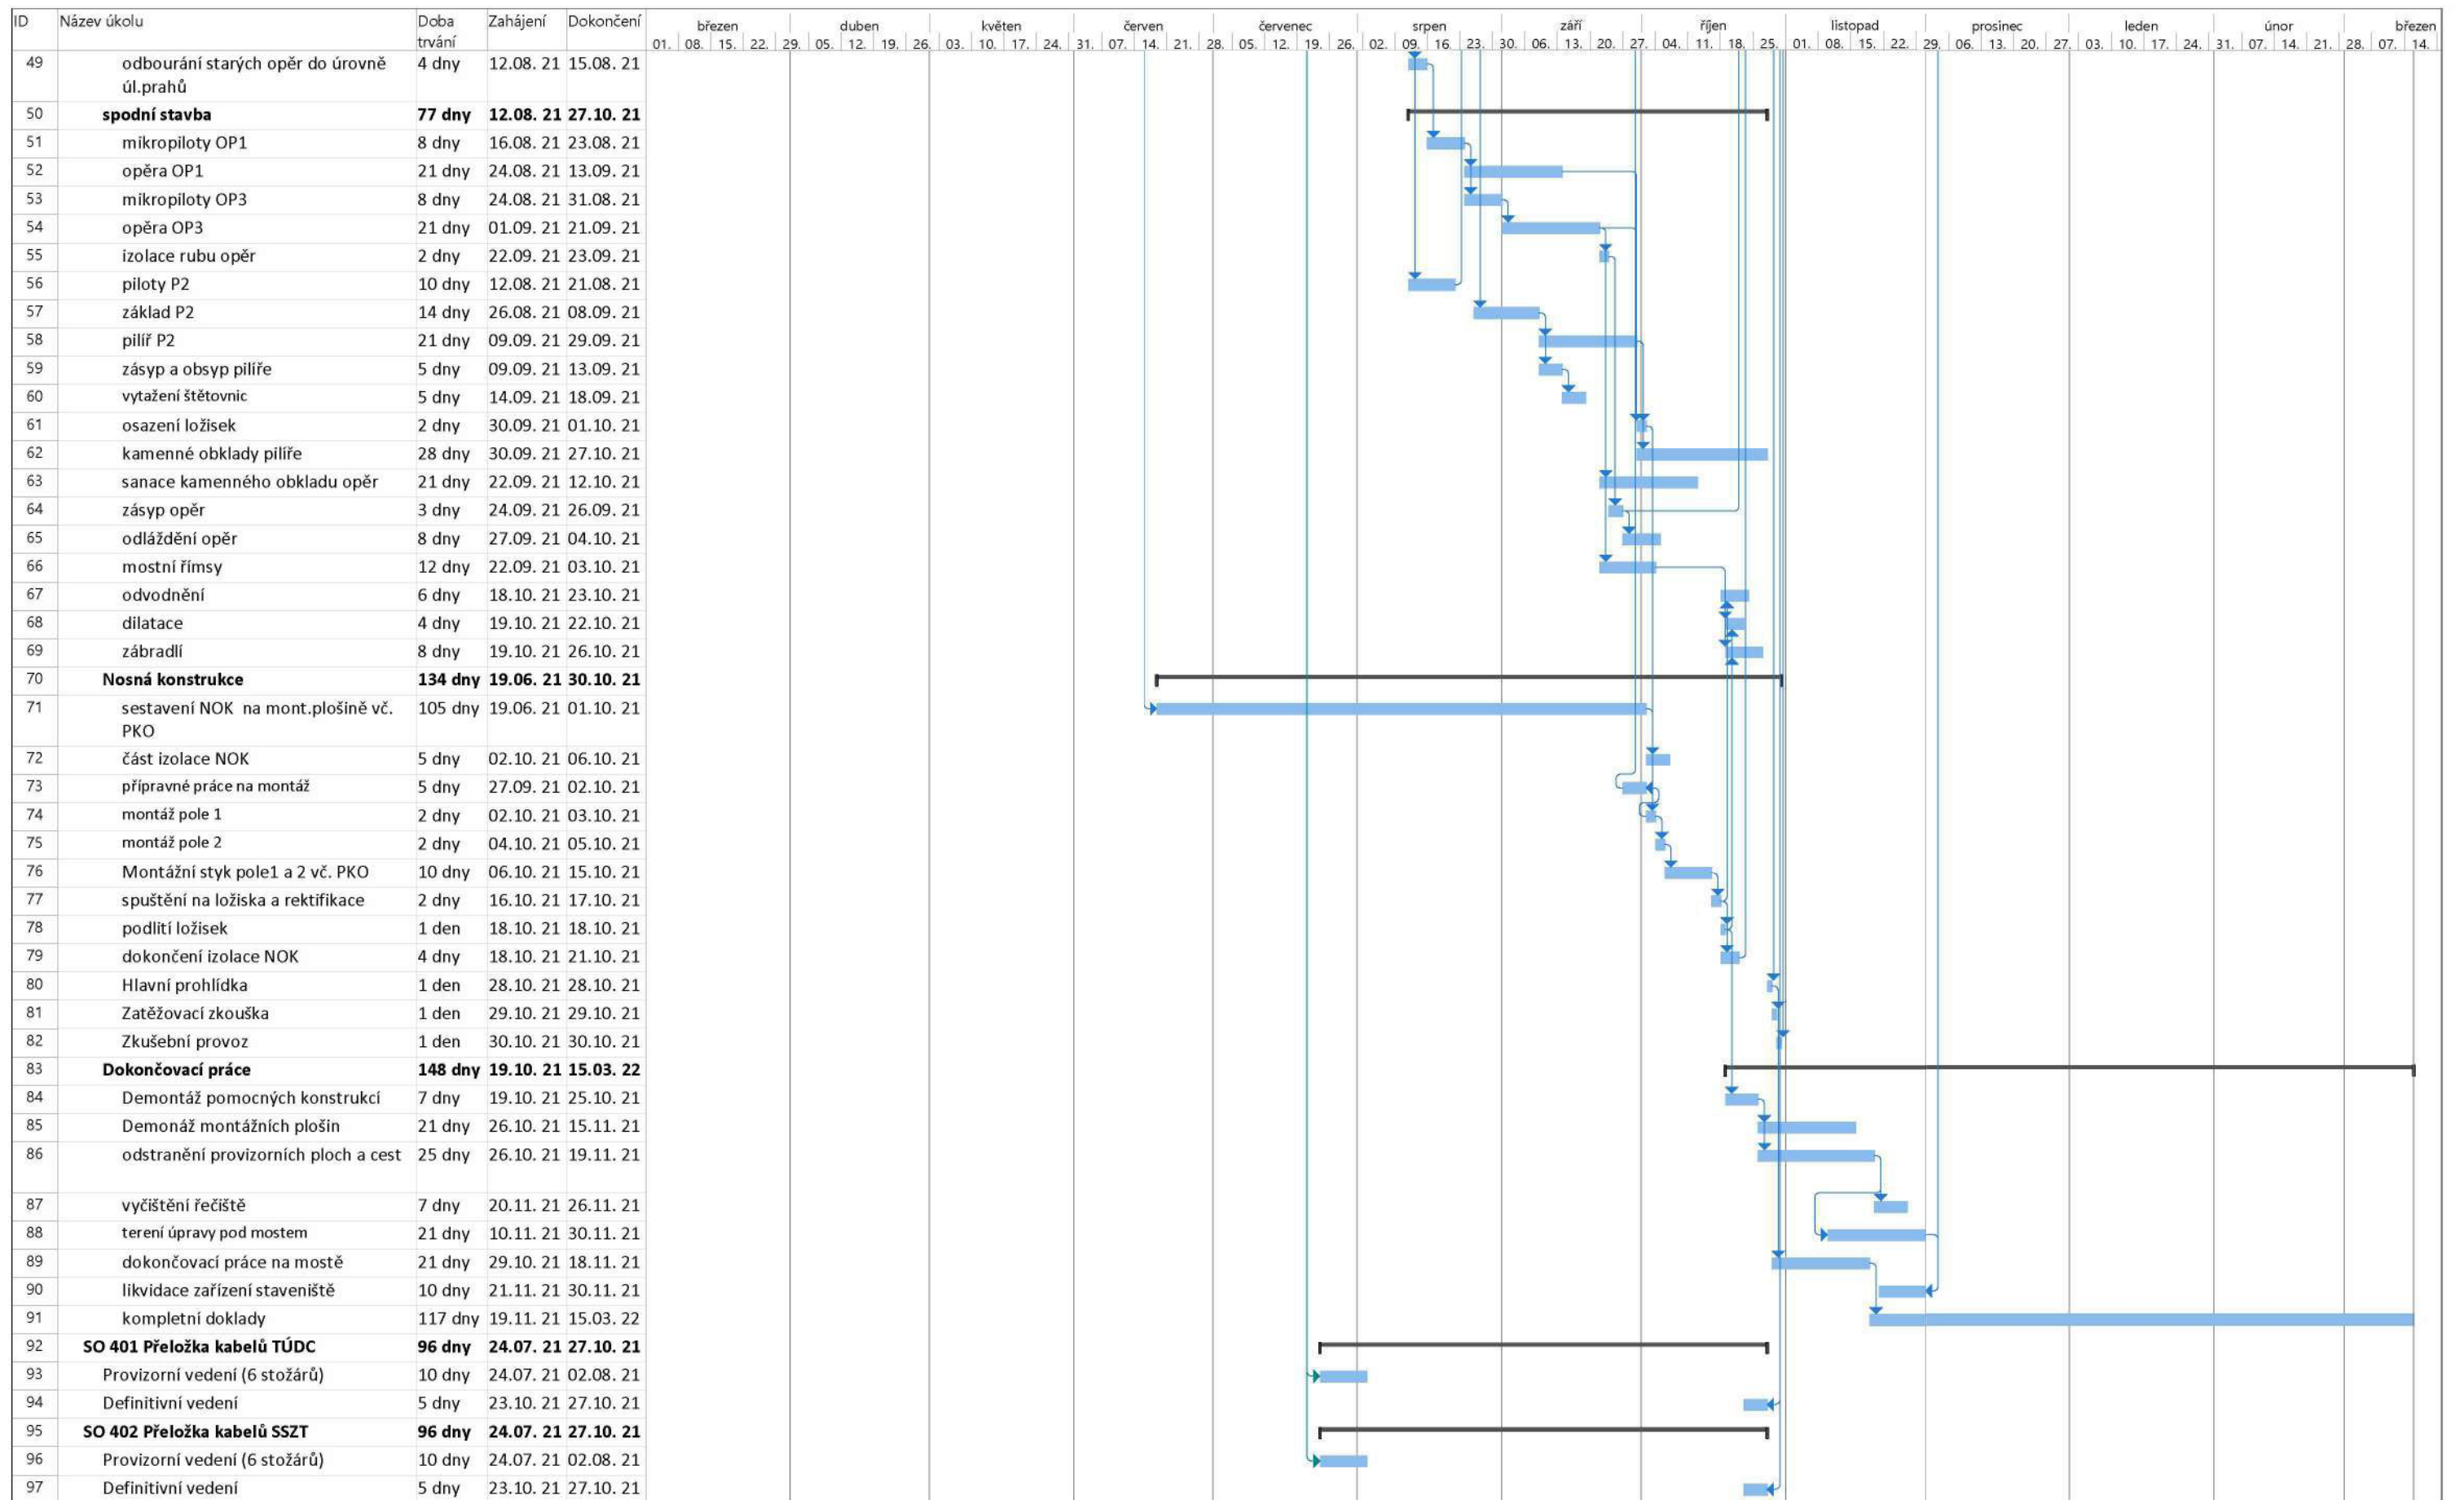

Most v km 200,916 na trati Plze Datum: 15.02. 21	Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Pouze zahájení		Pouze s datem dokončení		Vnější úkoly		Průběh ručně zadaného úkolu		Vnější mílník		Konečný termín	
	Rozdělení		Neaktivní úkol		Pouze s dobou trvání		Pouze s datem dokončení		Vnější úkoly		Průběh ručně zadaného úkolu		Vnější mílník		Konečný termín		Průběh	
	Mílník		Neaktivní mílník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější úkoly		Vnější mílník		Konečný termín		Průběh		Konečný termín		Průběh	
	Souhrnný		Neaktivní souhrn		Ruční souhrn		Vnější úkoly		Vnější mílník		Průběh ručně zadaného úkolu		Vnější mílník		Konečný termín		Průběh	

PŘÍLOHA Č. 5

Smlouva o zpracování osobních údajů

1. Předmět smlouvy o zpracování osobních údajů

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran za účelem zajištění uzavření smluv uvedených ve Všeobecných technických podmínkách, a to za splnění podmínek dále uvedených.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat předmětné osobní údaje výhradně za uvedeným účelem a na základě doložených pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi, jak vyplývají z této Smlouvy o zpracování osobních údajů a z této Smlouvy o dílo.

2. Rozsah zpracovávaných údajů

- 2.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v v čl.4 Všeobecných technických podmínek na zhotovení stavby.
- 2.2 Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném bodě 2.1, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

3. Povinnosti Zhotovitele

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Správci.
- 3.2 Zhotovitel bude neprodleně informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru některé pokyny Objednatele v rozporu s platnou právní úpravou.
- 3.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává v souladu se Smlouvou o zpracování osobních údajů, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
- 3.4 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.
- 3.5 Zhotovitel může do zpracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem.
- 3.6 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních

opatření pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.

- 3.7 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.
- 3.8 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě během běžné pracovní doby Zhotovitele provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy o zpracování osobních údajů, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.
- 3.9 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o zpracování osobních údajů je Zhotovitel povinen vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchování je v souladu s platnou právní úpravou nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.

4. Odpovědnost Zhotovitele a smluvní pokuta

- 4.1 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování Zhotovitel za „zpracovatele“ ve smyslu GDPR. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený Smlouvou o zpracování osobních údajů nebo doloženými pokyny Objednatele vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit.
- 4.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zaslané Objednatelem na základě tohoto ustanovení.
- 4.3 Zaplacením smluvní pokuty, jak je popsána v odstavci výše, není dotčeno právo Objednatele požadovat náhradu újmy způsobené porušením ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů.

PŘÍLOHA Č. 6

Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)

Příloha k nabídce

„Rekonstrukce mostu v km 200,916 trati Plzeň – Žatec“

Všechny následující údaje musejí být vyplněny před podáním Nabídky (s výjimkou položek, u nichž byly vloženy požadavky Objednatele).

Všechny odkazy na jednotlivé Články a Pod-články uvedené v této Příloze k nabídce znamenají odkazy na Články a Pod-články Smluvních podmínek.

1.1.2.2 Název a adresa Objednatele

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

1.1.2.3 Název a adresa Zhotovitele

„Společnost SMP – Firesta, Plzeň – Žatec“

Kontaktní adresa sídla společnosti: SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00,

jejímž jménem jedná v rozsahu zmocnění obsaženém ve společenské smlouvě Ing. Jan
Freudl, místopředseda představenstva SMP CZ, a.s. a Ing. Pavel Kameník, člen představenstva
SMP CZ, a.s.

A. SPRÁVCE/SPOLEČNÍK 1: SMP CZ, a.s.

se sídlem: Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00

IČO: 27195147, DIČ: CZ27195147

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka oddíl B, vložka 9654

B. SPOLEČNÍK 2: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 25317628, DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka oddíl B, vložka 2144

1.1.2.4 Jméno (název) a adresa Správce stavby

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

1.1.3.7 Záruční doba

Záruční doba je specifikována v pod-článku 11.1 a v Technické specifikaci.

1.1.4.15 Faktura

U zhotovování Díla, které je spolufinancováno z prostředků OPD 2 nebo CEF, budou Faktury vystaveny dle vzoru specifikovaného ve směrnici Objednatele SŽDC SM č. 41 Oběh účetních dokladů v platném znění, který Objednatel zašle Zhotoviteli v elektronické podobě. U zhotovování Díla, které je financováno z národních zdrojů, budou Faktury vystavené v souladu s Právními předpisy. Vystavené Faktury se mají za kompletní, obsahují-li kromě náležitostí stanovených Právními předpisy také následující přílohy:

- a) Soupis zjišťovacích protokolů,
- b) Zjišťovací protokoly,
- c) Správcem stavby odsouhlasený soupis provedených prací.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel může za účelem splnění povinností podle tohoto odstavce 1.1.4.15 předložit Objednateli společně s Fakturou také podkladové dokumenty předkládané společně s Vyúčtováním, obsahují-li informace požadované v písm. a) až c) tohoto odstavce 1.1.4.15.

1.1.5.6 Definice sekcí

Specifikace jednotlivých Sekcí:

Popis	Doba pro dokončení
Sekce 1 stavební zahrnující všechny SO kromě SO 98-98-Všeobecný objekt, pol. Č. 1 až 3	12 měsíců od Data zahájení prací
Sekce 2 Zahrnující SO 98-98 – Všeobecný objekt, pol. č. 1 až 3 Část pro dokumentace	6 měsíců od dokončení Sekce 1

1.3 Elektronické přenosové systémy

Elektronickým přenosovým systémem ve smyslu pod-článku 1.3 se rozumí zaslání elektronických dokumentů prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Objednatele s ID: ucchjm nebo zaslání elektronické pošty emailem na emailovou adresu člena Personálu objednatel, který je oprávněn v dané věci za Objednatele jednat. Emailová adresa příslušného člena Personálu objednatel bude Zhotoviteli sdělena Správcem stavby. Změnu nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele ve smyslu článku 14.7 lze v elektronické formě provést výlučně na základě žádosti doručené do datové schránky Objednatele specifikované v této Příloze k nabídce.

1.4 Rozhodné právo

Smlouva se řídí českým právem.

1.4 Rozhodující jazyk

Rozhodujícím jazykem je český jazyk.

1.4 Komunikační jazyk

Komunikačním jazykem je český jazyk.

1.7 Postoupení

Doplňuje se druhý a třetí odstavec, současný druhý odstavec se stává čtvrtým.

Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele až do doby skončení poslední záruční doby (včetně veškerých prodloužení) převést svoji podnikatelskou činnost ani její část. Převodem podnikatelské činnosti se rozumí přeměna Zhotovitele (s výjimkou fúze) nebo převod jeho obchodního závodu či jeho části.

Pokud dojde v důsledku převodu podnikatelské činnosti Zhotovitele ke změně v osobě Zhotovitele, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky převodu podnikatelské činnosti či její části, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí Správce stavby o přerušeni prací dle Pod-článku 8.8 [Přerušeni práce] z důvodů na straně Zhotovitele.

1.14 Společná účast dvou a více zhotovitelů

V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. Jako vedoucí Zhotovitel je určen SMP CZ, a.s., IČO: 27195147 (dále jen Vedoucí zhotovitel). Vedoucí zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele společně a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele. Vystavovat daňové doklady – faktury za činnosti vykonávané v případech zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli pouze Vedoucí zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Vedoucí zhotovitel musí své zmocnění prokázat doložením příslušného zmocnění, které tvoří Přílohu č. 7 Smlouvy o dílo. Zmocnění Vedoucího zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této Smlouvy. Změna Vedoucího zhotovitele musí být oznámena Správci stavby spolu se sdělením souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího zhotovitele vůči Objednateli nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Ke změně bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným v pod-článku 14.7 Smluvních podmínek.

1.15 Sociální odpovědnost

Tento pod-článek se nepoužije.

2.1 Právo přístupu na staveniště

Přístup na Staveniště bude Zhotoviteli umožněn od předání Staveniště do dne předání Dokumentů souvisejících s předáním Díla dle pod-článku 7.9.

2.3 Personál objednatele

Ve věcech smluvních a obchodních (vyjma podpisu Smlouvy o dílo a případně jejich změn a dodatků):

- Ve věcech smluvních: [REDACTED] Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, pracoviště: Sušická 25, 326 00 Plzeň

- Ve věcech obchodních: I [REDACTED]
[REDACTED], Správa železnic, státní organizace, Stavební správa
západ, pracoviště: Sušická 25, 326 00 Plzeň

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek: [REDACTED]
[REDACTED] Správa železnic, státní organizace,
Stavební správa, pracoviště: Sušická 25, 326 00 Plzeň

3.1 Povinnosti a pravomoc správce stavby

Správce stavby je oprávněn na žádost Zhotovitele upravit délku lhůt uvedených v Technické specifikaci nebo v dalších předpisech vydaných Objednatelem pro ty SO a PS, u kterých je mezi dnem Zahájení prací a zahájením realizace těchto SO a PS kratší časový úsek, než jsou tyto požadované lhůty.

3.1 Zajištění souhlasu objednatele

Zvláštní souhlasem se v případě ustanovení dle pod-odstavce (2) tohoto pod-článku rozumí uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo.

4.2 Zajištění splnění smlouvy

Bankovní záruku za provedení Díla je Zhotovitel povinen poskytnout ve výši alespoň 10 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky, tj. 15 519 103,58 Kč.

Bankovní záruku za odstranění vad Díla je Zhotovitel povinen poskytnout alespoň ve výši 5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopis nabídky, tj. 7 759 551,79 Kč.

4.2.1 Bankovní záruka za plnění díla

Doplňuje se nový pátý odstavec a pořadí dalších se tak o jedno místo posunuje.

V případě, že Zhotovitel převede v souladu s Pod-článkem 1.7 s předchozím písemným souhlasem Objednatele svoji podnikatelskou činnost či její část a v důsledku tohoto převodu dojde ke změně v osobě Zhotovitele, musí být Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky převodu podnikatelské činnosti či její části, předložena Bankovní záruka za provedení Díla vystavená pro nového Zhotovitele. Objednatel vrátí předchozí Bankovní záruku za provedení Díla Zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdrží Bankovní záruku za provedení Díla vystavenou pro nového Zhotovitele.

Do šestého odstavce (podle nového pořadí) se za pododstavec (d) doplňují další dva pododstavce:

(e) při převodu podnikatelské činnosti Zhotovitele nebo její části nebude Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky převodu podnikatelské činnosti či její části, předložena Bankovní záruka za provedení Díla vystavená pro nového Zhotovitele. V takovém případě může objednatel nárokovat plnou částku Bankovní záruky za provedení Díla,

(f) Zhotovitel v rozporu s Pod-článkem 1.7 převede svoji podnikatelskou činnost bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku Bankovní záruky za provedení Díla.

4.2.2 Bankovní záruka za odstranění vad Díla

Doplňuje se nový čtvrtý odstavec a pořadí dalších se tak o jedno místo posunuje.

V případě, že Zhotovitel převede v souladu s Pod-článkem 1.7 s předchozím písemným souhlasem Objednatele svoji podnikatelskou činnost či její část a v důsledku tohoto převodu dojde ke změně v osobě Zhotovitele, musí být Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky převodu podnikatelské činnosti či její části, předložena Bankovní záruka za odstranění vad Díla vystavená pro nového Zhotovitele. Objednatel vrátí předchozí Bankovní záruku za odstranění vad Díla Zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdrží Bankovní záruku za odstranění vad Díla vystavenou pro nového Zhotovitele.

Do pátého odstavce (podle nového pořadí) se za pododstavec (d) doplňují další dva pododstavce:

(e) při převodu podnikatelské činnosti Zhotovitele nebo její části nebude Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky převodu podnikatelské činnosti či její části, předložena Bankovní záruka za odstranění vad Díla vystavená pro nového Zhotovitele. V takovém případě může objednatel nárokovat plnou částku Bankovní záruky za odstranění vad Díla,

(f) Zhotovitel v rozporu s Pod-článkem 1.7 převede svoji podnikatelskou činnost bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku Bankovní záruky za odstranění vad Díla.

4.3 Zástupce zhotovitele

V rozsahu zplnomocnění obsaženém ve společenské smlouvě jedná za společnost „Společnost SMP – Firesta, Plzeň – Žatec“ vedoucí účastník společnosti – SMP CZ, a.s.

Oprávnění zástupci za společnost SMP CZ, a.s.:

Ing. Martin Doksanský - předseda představenstva

Ing. Jan Freudl - místopředseda představenstva

Ing. Pavel Kameník - člen představenstva

Ing. Lucie Zímová - člen představenstva

Způsob jednání dle výpisu z OR

Oprávnění zástupci za společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Ivo Fišer, předseda představenstva

Ing. Pavel Borek, člen představenstva

Ing. Andrea Piro, člen představenstva

Způsob jednání dle výpisu z OR

4.4.2 Speciální činnosti a zařízení

Tento pod-článek se nepoužije.

4.4.4

Doplňuje se bod (d):

Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které Zhotovitel uvedl v nabídce dodavatele za účelem splnění kvalifikačních předpokladů stanovených v zadávacích podmínkách, se přímo podílely na plnění Díla alespoň v rozsahu jejich písemného závazku k poskytnutí určeného plnění. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby Správce stavby byl schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

4.27 Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu

Pododstavec (j) se doplňuje o text: „...převedl svoji podnikatelskou činnost nebo její část ...“ a nově zní:

(j) Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převedl svoji podnikatelskou činnost nebo její část, postoupil nebo dal do zástavy byt i jen částečně pohledávky související s prováděním Díla třetí osobě v rozporu s Pod-článkem 1.7 [Postoupení];

4.27 Smluvní pokuta

Výše smluvní pokuty dle jednotlivých ustanovení Smluvních podmínek činí:

Pod-článek 4.27 (a)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky za každý takový případ.

Pod-článek 4.27 (b)

Za každý započatý den prodlení se splněním závazného milníku pro finanční plnění je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z minimální částky stanovené pro příslušný závazný finanční milník ve smyslu pod-článku 4.28.

Není-li v této Příloze k nabídce u příslušného závazného milníku stanovena minimální částka finančního plnění, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

Za každý započatý den prodlení se zahájením provádění Díla do 14 dnů ode dne oznámení o Datu zahájení prací dle pod-článku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

Pod-článek 4.27 (c)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (d)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající příslušné Sekci, s jejímž dokončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny Všeobecného objektu za každý započatý den prodlení s dokončením celého Díla dle Pod-článku 8.2, minimálně však 2 000 Kč za den.

Pod-článek 4.27 (e) a pod-článek 8.7

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající příslušné Sekci, která nemohla být uvedena do provozu, a to za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (f)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z části Smluvní ceny odpovídající dotčenému objektu/dotčeným objektům, kterých se nedokončená práce, vada nebo poškození týká, a to za každý jednotlivý případ a za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (g)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (h)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (i)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý případ a za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27(j)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu za každý případ porušení povinnosti ve výši 3% z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky.

Pod-článek 4.27 (k)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, maximálně však 20 000 Kč za každý zjištěný případ. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů ode dne zápisu Objednatele do Stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý další den, až do dne, kdy odstraní veškeré nedostatky ve vedení Stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě.

Pod-článek 4.27 (l)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, maximálně však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý další den, a to až do dne, kdy předmětnou Zprávu o postupu prací předá Správci stavby.

Pod-článek 4.27 (m)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, maximálně však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ.

Pod-článek 4.27 (n)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé zjištění porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (o)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (p)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlžení.

Pod-článek 4.27 (q)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlžení.

Pod-článek 4.27 (r)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý případ porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (s)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši a za podmínek stanovených ve smlouvě o zpracování osobních údajů, která je Přílohou č. 5 Smlouvy o dílo.

4.27 Maximální celková výše smluvních pokut

Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy je stanovena ve výši 30 % nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

4.28 Postupné závazné milníky

Pro provádění Díla nejsou stanoveny žádné postupné milníky.

8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do 18 měsíců od Data zahájení prací.

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo / Sekci 1 stavební v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 12 měsíců od Data zahájení prací.

8.3, 8.6 Harmonogram

Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby při jednání platí, že projednávání časového postupu prací na Díle se řídí vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek z ledna 2018, která je dostupná na <http://www.sfdi.cz>.

8.7 Náhrada škody za zpoždění

Zhotovitel nahradí Objednateli ve smyslu pod-článku 8.7 škodu vzniklou zpožděním ve výši převyšující uhrazenou částku smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpoždění podle pod-článku 4.27.

8.7 Maximální částka náhrady škody za zpoždění

Celková výše náhrady škody za zpoždění je stanovena ve výši nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

11.1 Délka záruční doby

Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v níže uvedené délce počínaje ode dne vydání Potvrzení o převzetí

- na železničním svršku (užitý materiál) a geometrického uspořádání koleje (užitý materiál) v trvání 2 let,
- na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodě, izolace proti vodě mostovek ocelových mostů, tunelů a celoplošné izolace proti vodě v tunelech v trvání 10 let,
- na ostatní části Díla včetně částí stavebních a montážních v trvání 5 let, pokud není ve Smlouvě nebo kterékoliv její příloze uvedeno jinak.

Záruku za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných zhotovitelů (výrobců) se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce, jejíž je tento komponent součástí. V případech, kdy by Záruční doba poskytnutá výrobcem komponentu překročila výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli záruku za jakost alespoň v této delší době.

V případě, že Objednatel v Záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné celky nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne následujícího po dni jejich výměny běžet nová Záruční doba v délce 24 měsíců.

13.1 Právo na variaci

Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby při jednání platí, že projednávání zejména změn Díla se řídí vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek z ledna 2018, která je dostupná na <http://www.sfdi.cz>.

V souladu s úpravou ve směrnici Objednatele SŽDC SM 105 Změny během výstavby v platném znění mohou být práce obsažené ve změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování až po podpisu změnového listu a uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo obsahující tuto změnu.

13.5 Podmíněné obnosy

Podmíněné obnosy poskytnuty nebudou.

13.8 Úpravy cen v důsledku změn nákladů

Tento pod-článek se použije.

14.2 Zálohová platba

Zálohová platba se neposkytuje.

14.5 Technologické materiály určené pro dílo

Pod-článek 14.5 se nepoužije.

14.6 Vydání potvrzení průběžné platby

Do šestého odstavce se za pododstavec písm.(f) doplňuje další pododstavec písm.(g):

(g) neprokáže znovu splnění kvalifikace pro převodu podnikatelské činnosti či její části podle Pod-článku 1.7 [Postoupení],

14.6 Částka, která může být z Průběžné platby zadržena v případě porušení Smlouvy

Objednatel může v případě porušení některé povinnosti dle pod-odstavce (c) až (f) zadržet částku ve výši 10 % z Průběžné platby.

14.6 Minimální částka Potvrzení průběžné platby

Minimální částka Potvrzení průběžné platby není stanovena.

14.15 Měny platby

Smluvní cena a jakákoli jiná platba provedená na základě Smlouvy musí být zaplácena v českých korunách.

15.2 Odstoupení objednatelem

Dosavadní text prvního odstavce v pododstavci písm.(d) se ruší a nahrazuje textem:

(d) zadá celé Dílo podzhotoviteli, postoupí Smlouvu nebo převede podnikatelskou činnost či její část bez požadované dohody či souhlasu Objednatele.

18.1 Obecné požadavky na pojištění

Zhotovitel předloží a poskytne Objednateli v dále uvedených lhůtách:

- důkaz, že pojištění popsaná v článku 18 jsou v platnosti, kdykoliv na vyžádání Objednatele, a to do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti Objednatele;
- kopii pojistek pro pojištění popsaných v článku 18 do 2 pracovních dnů od Data zahájení prací.

18.2 Pojištění díla a vybavení zhotovitele

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění „all risk“ dle pod-článku 18.2 s pojistným plněním sjednaným minimálně ve výši nabídkové ceny (bez DPH) uvedené v Dopisu nabídky.

20.1 Ověřování a kvantifikace claimů

Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby při jednání především podle pod-článku 3.5 platí, že ověřování a kvantifikace claimů Zhotovitele se řídí vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů z roku 2018, která je dostupná na <http://www.sfdi.cz>.

20.2 až 20.8 Rozhodování sporů

Rozhodování sporů je upraveno dle varianty B.

PŘÍLOHA Č. 7

Zmocnění Vedoucího zhotovitele

a

Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo

Obsaženo ve společenské smlouvě a plné moci a dále v Příloze č. 3 cenové nabídky (Údaje o společnosti dodavatelů podávajících nabídku společně)

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení §2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v účinném znění

Smluvní strany

SPRÁVCE/SPOLEČNÍK 1:	
Obchodní firma:	SMP CZ, a.s.
Sídlo:	Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
Zastoupená:	Ing. Janem Freudlem, místopředsdou představenstva Ing. Pavlem Kameníkem, členem představenstva
IČO:	271 95 147
DIČ:	CZ27195147
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9654

(dále jen „**společník 1**“ nebo „**správce**“ nebo „SMP“) na straně jedné

SPOLEČNÍK 2:	
Obchodní firma:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Sídlo:	Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
Zastoupená:	Ing. Pavel Borek, člen představenstva
IČO:	25317628
DIČ:	CZ25317628
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2144

(dále jen „**společník 2**“ nebo „Firesta“) na straně druhé

(společně dále jen „**společníci**“ nebo „**smluvní strany**“, jsou-li sdružení více než dva společníci, budou ti z nich, kteří nejsou správcem, označováni společně jako „**další společníci**“)

Smluvní strany se touto smlouvou sdružují jako společníci za společným účelem činnosti, jak je dále stanoveno v této smlouvě o sdružení se společníků ve společnosti (dále jen „**smlouva**“).

Článek I. Společnost

1. 1. Společnost, která sdružením společníků podle této smlouvy vzniká („**společnost**“), nebude mít právní osobnost; společnost není svéprávná. Společníci budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou, s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
1. 2. Společníci jsou si rovni a o záležitostech společnosti rozhodují jednomyslně.
1. 3. Společníci se rozhodli vyvíjet níže popsanou společnou činnost pod názvem:

„Společnost SMP – Firesta, Plzeň - Žatec“

1. 4. Společnost bude sídlit na adrese sídla správce.

Článek II. Společný účel a doba trvání společnosti

2. 1. Účelem společnosti je:
 - a) získání veřejné zakázky na stavební práce, s názvem zakázky „Rekonstrukce mostu v km 200,916trati Plzeň - Žatec“ uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek (<http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/usisvz>) pod evidenčním číslem zakázky Z2020-043580 (dále jen „**veřejná zakázka**“), v souladu se zadávacími podmínkami, jejímž zadavatelem je Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00 (dále jen „**zadavatel**“);
 - b) a dále za předpokladu, že společníci získají veřejnou zakázku, provedení veřejné zakázky.
2. 2. Společnost vzniká uzavřením této smlouvy a bude trvat po celou dobu existence práv a povinností, plynoucích z předložené společné nabídky, případně ze smlouvy o dílo uzavřené mezi společníky a zadavatelem, jejímž předmětem bude provedení veřejné zakázky (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. 3. Společnost zanikne v případě:
 - a) zrušení zadávacího řízení, a to dnem jeho zrušení;
 - b) doručení oznámení zadavatele o výběru dodavatele svěřenciho o tom, že společná nabídka společníků nebyla vyhodnocena jako nejvhodnější, a to dnem doručení tohoto oznámení správci;
 - c) že budou splněny veškeré vzájemné závazky mezi společníky a zadavatelem a společníky navzájem, vyplývající ze společné nabídky společníků, ze smlouvy o dílo a této smlouvy;
 - d) že bylo v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku společníka a společnost má pouze dva společníky, a to dnem nabytí právní moci rozhodnutí o úpadku společníka;
 - e) ostatních důvodů stanovených v občanském zákoníku a/nebo touto smlouvou.
2. 4. Ustanovení odst. 2. 3. písm. a) a b) této smlouvy se neaplikují za předpokladu, že se společníci rozhodli podat:
 - a) námitky dle ustanovení §241 a násl. zákona č. 134/2016 Sb. nebo;

- b) návrh na přezkoumání úkonů zadavatele v zadávacím řízení vedeném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže nebo;
 - c) žalobu proti rozhodnutí vydanému v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v zadávacím řízení vedeném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, včetně řízení o kasační stížnosti.
2. 5. V případě, že společníci uzavřou se zadavatelem smlouvu o dílo, upraví si společníci další práva a povinnosti ve stanovách společnosti, které budou tvořit dodatek této smlouvy, a to nejpozději do 60 dní od uzavření smlouvy o dílo.

Článek III. Správce

3. 1. Společníkem, který je pověřen správou společných záležitostí a společných věcí (dále jen „**správa společnosti**“) je SMP.
3. 2. Správce zastupuje společníka 2 vůči zadavateli a vůči třetím osobám, a to v ústním i písemném styku.
3. 3. Společník 2 tímto uděluje správci **plnou moc** k právním jednáním souvisejícím s výše uvedeným zadávacím řízením na veřejnou zakázku a se smlouvou o dílo, zejména:
- a) k právním jednáním souvisejícím se společnou žádostí o účast společníků ve výše uvedeném zadávacím řízení na veřejnou zakázku (je-li podávána);
 - b) k právním jednáním souvisejícím se společnou nabídkou společníků ve výše uvedeném zadávacím řízení na veřejnou zakázku včetně podpisu smlouvy o dílo do nabídky; samotnou smlouvu o dílo v případě úspěchu v zadávacím řízení budou podepisovat všichni společníci společně;
 - c) k právním jednáním souvisejícím se splněním požadavků zadávacích podmínek zadavatele, zejména k právnímu jednání souvisejícímu se zajištěním finančních záruk a pojištění, apod.;
 - d) k právním jednáním souvisejícím s plněním smlouvy o dílo, včetně přijímání plnění, pokynů a plateb ze strany zadavatele.
- 3.4 Správce plnou moc od společníků ve výše uvedeném rozsahu přijímá. Výkon výše uvedeného zástupčího oprávnění náleží do působnosti statutárního orgánu správce. Statutární orgán správce je však oprávněn určit k výkonu zastoupení i třetí osobu.

Článek IV. Práva a povinnosti společníků

4. 1. Každý společník se zavazuje v rámci společné činnosti postupovat s náležitou odbornou péčí, chránit dobré jméno společnosti, jakož i dobré jméno dalších společníků.
4. 2. O dosažení společného účelu se společníci přičiňují touto měrou:
- a) každý společník zajistí, aby splnil (ať již sám či prostřednictvím poddodavatele) všechny kvalifikační předpoklady, které podle zákona o zadávání veřejných zakázek a podle dohody společníků splnit má, a aby v termínu předcházejícím rozumně termínu pro podání společné žádosti o účast nebo společné nabídky doručil všechny doklady o splnění kvalifikačních předpokladů správci;
 - b) každý společník zajistí, že pro vypracování společné nabídky poskytne nezbytné informace a součinnost;
 - c) správce při splnění součinnosti společníků zajistí včasné podání společné žádosti o účast a/nebo společné nabídky zadavateli, a dále zajistí další komunikaci se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení, a po jeho skončení zajistí i případné uzavření smlouvy o dílo a další komunikaci se zadavatelem v průběhu plnění smlouvy o dílo.

4. 3. Společníci se dohodli, že veřejná zakázka bude mezi společníky rozdělena v následujícím poměru:

- | | |
|-----------------------|---------|
| a) podíl správce | 37,60 % |
| b) podíl společníka 2 | 62,40 % |

Podrobnější určení stavebních objektů, resp. prací prováděných jednotlivými společníky na svůj náklad a nebezpečí bude následně dohodnut. Společníci se budou podílet na majetku nabytém za trvání společnosti, na zisku a na ztrátě společnosti tak, že každý ze společníků si ponechá zisk, případně ponese ztrátu z jím prováděného stavebního objektu, resp. stavební práce. Ostatní majetek si společníci vypořádají ve výše uvedeném poměru po předání veřejné zakázky zadavateli, nedohodnou - li se jinak.

4. 4. Ve vnitřním vztahu společníků je každý ze společníků povinen nahradit případnou majetkovou i nemajetkovou újmu, které vznikla v souvislosti s prováděním jeho podílu veřejné zakázky druhému společníkovi. Pokud budou vůči jednomu ze společníků vzneseny nároky, které plynou z provádění příslušné části veřejné zakázky druhého společníka, je tento druhý společník povinen tyto uplatněné nároky neprodleně uspokojit. Jedná se zejména o nároky vyplývající z povinnosti nahradit újmu, nároky vyplývající z prodlení jednoho ze společníků, nároky vyplývající z práv zadavatele z vadného plnění apod.

4. 5. Společníci jsou povinni uzavírat všechny smlouvy, zejména poddodavatelské, ve vztahu k jím prováděné části veřejné zakázky pouze vlastním jménem.

4. 6. Správce koordinuje, a přejímá od společníků jimi provedené stavební práce formou měsíčních dílčích zdanitelných plnění a následně jménem všech společníků dodává formou měsíčních dílčích zdanitelných plnění provedenou část veřejné zakázky zadavateli.

4. 7. Neaplikuje se.

4. 8. Společníci dbají na dodržování ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ZDPH) která se dotýkají společné činnosti. Správce vede evidenci pro účely DPH z činnosti celé společnosti. Současně každý společník vede evidenci pro účely DPH za společnou činnost odděleně, a to ve vztahu ke svému podílu na plnění veřejné zakázky. Správce přiznává daň na výstupu za činnost celé společnosti. Druhý společník uplatňuje daň na výstupu ve vztahu ke správci, a to v rozsahu jejich podílů na plnění veřejné zakázky. Pro uplatňování nároku na odpočet daně postupují společníci v souladu se ZDPH.

4. 9. Finanční plnění v souvislosti s prováděním veřejné zakázky je zásadně oprávněn přijmout pouze správce, který bude zadavateli fakturovat daňovým dokladem veškeré práce společníků. Příslušný podíl na přijatém plnění od zadavatele bude poukázán ve prospěch jednotlivých bankovních účtů společníků nejpozději do 10 pracovních dnů od připsání částky na účet společnosti.

4. 10. K přijímání plateb a k provádění dalších finančních operací v rámci společné činnosti, správce zřídí u banky odděleně od svých ostatních účtů zvláštní účet („účet společnosti“). Správce bude mít postavení majitele účtu společnosti. Druhý společník bude mít právo seznamovat se s údaji o pohybech na účtu společnosti. Právo nakládat s peněžními prostředky na účtu společnosti budou mít určení zástupci jednotlivých společníků. Příkaz k převodu nebo jakákoliv jiná dispozice s peněžními prostředky na účtu společnosti musí být podepsána zástupci všech společníků. Správce se zavazuje, že po dobu trvání sdružení nezmění podpisová práva k účtu společnosti bez souhlasu všech společníků. Každý společník se zavazuje neodmítnout podepsání příkazu k převodu předloženého správcem s výjimkou případů, kdy písemně uplatní odůvodněné výhrady k jeho správnosti. Správce je povinen při zakládání účtu společnosti nebo při nejbližší dispozici s již existujícím účtem společnosti povinen bance písemně oznámit (v souladu s § 41f odst. 2 zákona 21/1992 Sb., tj. zákona o bankách v účinném znění), že na účtu společnosti jsou evidovány peněžní prostředky představující pohledávku více osob.

4. 11. Jistotu za splnění povinností dodavatele z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku ve formě bankovní záruky zajistí správce. Druhý společník uhradí převodem na účet správce svůj podíl nákladů za vystavení bankovní záruky, a to dle výše uvedeného poměru.

4. 12. Jistota za řádné a včasné provedení veřejné zakázky a jistota za odstranění záručních vad v záruční době budou zadavateli poskytnuty jako bankovní záruka sdílená. Společníci se zavazují poskytnout nezbytnou součinnost k včasnému získání sdílených bankovních záruk a uhradit náklady na její pořízení dle výše uvedeného poměru. Toto ujednání se použije přiměřeně i v případě jiných než zde výslovně zmíněných bankovních záruk, které je za společnost třeba poskytnout.
4. 13. Každý společník je povinen být pojištěn v rozsahu a způsobem, jak bude sjednáno ve smlouvě o dílo. Společníci předají relevantní pojistné smlouvy správci nejpozději v termínu stanoveném pro předložení pojistných smluv zadavateli.
4. 14. Informace týkající se provozu závodů společníků, jejich obchodní činnosti, odborných metod a jiných oblastí, které nejsou veřejně dostupné, a dále informace týkající se veřejné zakázky, které nejsou zveřejněny zadavatelem, se považují za důvěrné. Společníci se zavazují nepředávat ani jinak nezpřístupňovat důvěrné informace třetím osobám a proti jejich jakémukoli zpřístupnění třetím osobám je přiměřeně chránit.
4. 15. Společníci nejsou oprávněni pohledávky za ostatními společníky vzniklé na základě této smlouvy postoupit a/nebo je použít jako zástavu na zajištění svých závazků vůči třetí osobě.
4. 16. Společníci podpisem této smlouvy prohlašují, že v okamžiku uzavření této smlouvy nemají uzavřenou žádnou zástavní smlouvu ke svým pohledávkám nebo smlouvu o postoupení svých pohledávek, která by se mohla dotknout pohledávek vzniklých na základě této smlouvy.
4. 17. Každý společník je povinen předložit k prokázání splnění kvalifikace dle §73, alt. §53 a §84 zákona o zadávání veřejných zakázek pouze takové informace a podklady, které odpovídají skutečnosti. Každý společník je rovněž povinen mít k dispozici podklady prokazující správnost a pravdivost informací a podkladů, které předkládá k prokázání splnění kvalifikace dle § 73, alt. §53 a §84 zákona o zadávání veřejných zakázek.
4. 18. Společník 2 prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy seznámil s Kodexem jednání proti korupci VINCI, Chartou etiky a jednání VINCI, Compliance kodexem Skupiny SMP, které jsou veřejně přístupné na webových stránkách správce (www.smp.cz), přičemž povinnosti vyplývající z těchto dokumentů se zavazuje dodržovat.
4. 19. Smluvní strany se zavazují při zpracování a/nebo předávání osobních údajů v souvislosti s touto smlouvou dodržovat pravidla stanovená zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Článek V.

Závěrečná ustanovení

5. 1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v účinném znění.
5. 2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být učiněny pouze formou písemných dodatků.
5. 3. Obsah této smlouvy je považován za důvěrný údaj a smluvní strany jsou povinny dbát o to, aby nebyl zneužit, nebo aby nedošlo k jeho prozrazení bez zákonného důvodu.
5. 4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
5. 5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy oprávněných osob obou smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
5. 6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výsledkem vážné vůle smluvních stran prosté omylu. Smluvní strany si smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí a prohlašují, že žádné ustanovení jimi není vnímáno jako přičící se dobrým mravům, zákonu či

veřejnému pořádku a dále, že obsah smlouvy je pro ně zcela určitým a srozumitelným. Na důkaz stvrzují tuto smlouvu svými podpisy, resp. podpisy svých oprávněných zástupců.

Za správce
SMP CZ, a.s.
V Praze

Za společníka 2
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
V Brně

Datum: 2021.02.16

Datum: 2021.02.16

.....
Ing. Jan Freudl
místopředseda představenstva

.....
Ing. Vlastimil Schovajsa
Ředitel OZ Čechy,
Na základě plné moci

Datum: 2021.02.16

.....
Ing. Pavel Kameník
člen představenstva

PLNÁ MOC

Představenstvo akciové společnosti FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.,
se sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno, IČO: 253 17 628

uděluje plnou moc

panu Ing. Vlastimilu Schovajsovi,
řediteli odštěpného závodu Čechy výše uvedené společnosti.

Rozsah zmocnění:

- zmocněnec je oprávněn jménem společnosti FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. podávat a podepisovat nabídky ve všech druzích zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
- zmocněnec je oprávněn ve smyslu výše uvedeného činit jménem společnosti FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. všechny právní úkony s výjimkou zpětvzetí nabídek, kdy k tomu musí mít písemný souhlas společnosti
- zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc k zastupování společnosti FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. třetí osobě v těchto případech:
 - a) k účasti na otevírání obálek a k jednání v souvislosti s jednotlivými zadávacími řízeními
 - b) k vyřízení provizorního napojení inženýrských sítí a jednání se správcí sítí v rámci realizovaných staveb
 - c) k vyřízení dopravních opatření (dopravní uzávěry apod.)

V Brně dne

Ing. Pavel Borek
člen představenstva
(tento podpis slouží zároveň jako podpisový vzor)

Výše uvedenou plnou moc v plném rozsahu přijímám.

Ing. Vlastimil Schovajsa
Ředitel odštěpného závodu Čechy
(tento podpis slouží zároveň jako podpisový vzor)

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **110021_002568**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **ALENA PLESKAČOVÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Praha 102**

Česká pošta, s.p. dne **11.03.2020**



127345313-14843-200311110803

Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací

č.j. [●]

Název zakázky:	
Číslo smlouvy Správy železnic (CES):	
Objednatel:	
Datum zahájení prací:	
Datum dokončení prací (stavebních nebo technologických):	
Uvedení poslední části stavby do zkušebního provozu:	
Datum dokončení díla (vč. dokumentace):	
Konečná cena díla celkem v Kč:	

Zhotovitel díla (název dle SOD)	
Správce/vedoucí společník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení):	
Další společník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení):	
Další společník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení):	
Další společník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení):	
Další společník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení):	

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO)	Hodnota poddávky v % ze smluvní ceny díla a konkrétní částka v Kč
---	--	--

	případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS např. popis vykonaných činností nebo dodávek)	

Rozsah prací: (dle předmětu díla / předmětu plnění VZ)	
Charakter prací (oprava/údržba/modernizace/rekonstrukce/novostavba)	
Délka traťového úseku* (v km)	
Dílo probíhalo na trati* jednokolejné / vícekolejné	
Dílo probíhalo na trati* elektrifikované / neelektrifikované	
Dílo probíhalo na trati* širé (mezistaniční úsek)/ ve stanici	
Stavební práce zahrnovaly práce na železničním svršku (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a délku traťového úseku, v případě železniční stanice počet výhybek)	
Stavební práce zahrnovaly práce na železničním spodku (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a délku)	
Stavební práce zahrnovaly práce na železničním mostním objektu (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a délku mostního objektů/mostních objektů, případně jinou specifikaci)	
Stavební práce zahrnovaly práce na trakčním vedení (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a délku traťového úseku)	
Stavební práce zahrnovaly práce na zabezpečovacím zařízení (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a délku traťového úseku, v případě železniční stanice počet výhybek)	
Stavební práce zahrnovaly práce na silnoproudých zařízeních (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč)	
Stavební práce zahrnovaly práce na tunelové stavbě (ANO/NE, v případě ANO uvést délku tunelu)	
Stavební práce zahrnovaly práce na pozemní stavbě (ANO/NE, v případě ANO uvést typ objektu – budova osobního nádraží, technologická budova apod.)	
Stavební práce zahrnovaly práce na stavbě s památkovou ochranou (ANO/NE, v případě ANO uvést druh objektu a hodnotu Kč)	
SOD obsahovala vyhrazené plnění realizované vlastní kapacitou (ANO/NE, v případě ANO uvést níže uvedené podrobnosti):	
Popis vyhrazeného plnění dle SOD (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO):	
Zhotovitel vyhrazeného plnění:	

Hodnota vyhrazeného plnění v Kč:

	Obchodní firma	Hodnota prováděných prací v Kč (bez DPH)
Správce/vedoucí společník (v případě, kdy se jedná o společnost – dříve sdružení):		
Další společník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení):		
Další společník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení):		
Další společník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení):		
Další společník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení):		
Celkem v Kč	xxx	

Hodnocení objednatele:

Správa železnic osvědčuje, že stavební práce uvedené v tomto osvědčení byly řádně poskytnuty a dokončeny.

Kontaktní osoba:**Jméno a příjmení** vystavitele (viz poznámka 1)**Funkce:****Podpis** vystavitele**Datum** vystavení osvědčení

* Je-li vzhledem k charakteru stavby relevantní.

Poznámka 1: Osvědčení je za Správu železnic oprávněna potvrdit (podepsat) výhradně osoba, která za Správu železnic smlouvu, na základě které bylo plněno, podepisovala (uzavírala). V případě, kdy smlouva byla za Správu železnic uzavřena ředitelem odboru či náměstkem GŘ, je možné Osvědčení potvrdit (podepsat) ředitelem organizační jednotky, do jejíž gesce kontrola plnění díla spadá/náleží.

Poznámka 2: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací je vyhotovováno výhradně v jednom znění platném pro všechny zhotovitele/společníky/poddodavatele. Tzn. Osvědčení se nevyhotovuje pro každého ze zhotovitelů/společníků/poddodavatelů zvlášť.

Poznámka 3: Všechny částky v Kč se uvedou v hodnotě bez DPH.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1433209

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6d53825e-e49f-4d0d-a232-7c6c70204371

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.04.2021 16:12:04



3b375446-258b-453a-a06b-246fc5114a79
