

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00065  
Číslo smlouvy Stavebníka: 2021/001842/SRM/DS

SAP S/4 Hana: 8030002033  
Registr smluv: ANO



S009P00TSWF2

---

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY  
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
č. VPI/MJ/2021/00065**

---

mezi

**CETIN a.s.**

a

**město Blansko**

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00065  
Číslo smlouvy Stavebníka: 2021/001842/SRM/DS

SAP S/4 Hana: 8030002033  
Registr smluv: ANO

### **CETIN a.s.**

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623  
zastoupená na základě pověření Ing. Miroslavem Kotem, supervizorem pro výstavbu sítě

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu [REDACTED]

(dále jen „**CETIN**“)

a

### **město Blansko**

se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

IČO: 00279943

DIČ: CZ00279943

zastoupená Ing. Jiřím Crhou, starostem města

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Blansko, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označování jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací  
(dále jen „**Smlouva**“)

## **DEFINICE**

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

**CTN** je cenový a technický návrh a současně realizační dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

**Překládka** je stavba v k.ú. Blansko spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

**Příprava Překládky** jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

**Předpoklady pro realizaci Překládky** mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

**SEK** je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00065  
Číslo smlouvy Stavebníka: 2021/001842/SRM/DS

SAP S/4 Hana: 8030002033  
Registr smluv: ANO

elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

**Vyjádření o existenci SEK** je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 14.1.2021 vydané pod č. 512814/21, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Blansko okr.kříž. ul.Poříčí-Mlýnská**“.

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

## 3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickým) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
  - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
  - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00065  
Číslo smlouvy Stavebníka: 2021/001842/SRM/DS

SAP S/4 Hana: 8030002033  
Registr smluv: ANO

- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

#### 4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

##### 4.1 Společnost CETIN se zavazuje

- (a) před realizací Překládky:
- (i) zajistit zpracování CTN;
  - (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.
- (b) po realizaci Překládky:
- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
  - (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
  - (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebností dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

##### 4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však jeden (1) měsíc od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí vydaného Městským úřadem Blansko, odbor stavební úřad – rozhodnutí o umístění stavby nazvané rekonstrukce křižovatky Poříčí – Mlýnská v Blansku č.j. SÚ ÚR 91/2016-16883/2016/Ša ze dne 25.4.2016, pravomocné dne 15.10.2016, (dále jen „**Územní rozhodnutí**“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v Územním rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Územním rozhodnutí výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Územní rozhodnutí je Přílohou č. 2 Smlouvy.

##### 4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy.

##### 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00065  
Číslo smlouvy Stavebníka: 2021/001842/SRM/DS

SAP S/4 Hana: 8030002033  
Registr smluv: ANO

dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

## 5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **487.391,- Kč** (slovy: čtyři sta osmdesát sedm tisíc tři sta devadesát jedna korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN.
- 5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníků Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vážnoucím na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00065  
Číslo smlouvy Stavebníka: 2021/001842/SRM/DS

SAP S/4 Hana: 8030002033  
Registr smluv: ANO

- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku stanovené na základě CTN se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

## 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:
- (a) Faktura za CTN Překládky ve výši **8.102,- Kč** (slovy: osm tisíc jedno sto dva korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od uzavření této Smlouvy,
  - (b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.
- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00065  
Číslo smlouvy Stavebníka: 2021/001842/SRM/DS

SAP S/4 Hana: 8030002033  
Registr smluv: ANO

6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

## 7. SANKCE

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

## 8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: Ludmila Uhrová  
funkce: specialista pro výstavbu sítě - překládky SEK  
e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: Petr Bílek  
funkce: senior specialista pro výstavbu sítě  
e-mail: [REDACTED]

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Ing. Jiří Crha  
funkce: starosta města  
e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: Ing. Eva Laštůvková  
funkce: investiční referent  
e-mail: [REDACTED]

## 9. Odstoupení od smlouvy

9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.

9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.

9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.

9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž



Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00065  
Číslo smlouvy Stavebníka: 2021/001842/SRM/DS

SAP S/4 Hana: 8030002033  
Registr smluv: ANO

Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.

- 9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

## 10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

## 11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přijímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přijímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přijímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.



Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00065  
Číslo smlouvy Stavebníka: 2021/001842/SRM/DS

SAP S/4 Hana: 8030002033  
Registr smluv: ANO

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

## 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společností CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- (a) v listinné podobě;
- (b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;
- (c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy, věta první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem (b) a (c).

12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00065  
Číslo smlouvy Stavebníka: 2021/001842/SRM/DS

SAP S/4 Hana: 8030002033  
Registr smluv: ANO

Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

- 12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
  - § 1767 odst. 2;
  - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
  - § 1743.
- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).
- Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.
- Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis. Aniž by byla dána jakákoliv souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00065  
 Číslo smlouvy Stavebníka: 2021/001842/SRM/DS

SAP S/4 Hana: 8030002033  
 Registr smluv: ANO

situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.  
 Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13 Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Blansko, odbor stavební úřad – rozhodnutí o umístění stavby nazvané rekonstrukce křižovatky Poříčí – Mlýnská v Blansku č.j. SÚ ÚR 91/2016-16883/2016/Ša

#### Doložka

Tato smlouva se uzavírá na základě rozhodnutí starosty města Blansko ve věci mu svěřené Radou města Blansko na její 14. schůzi dne 28. 06. 2011 usnesením č. 109.

CETIN:

V Brně dne 18 -03- 2021





CETIN a.s.  
 Ing. Miroslav Kot  
 supervizor pro výstavbu sítě

Stavebník:

V Blansku dne 30 -03- 2021



město Blansko  
 Ing. Jiří Crha  
 starosta města

# VPIC Blansko okr. Křiž. Ul. Poříčí - Mlýnská

Navržené technické řešení je v souladu s TM000072.

## 2 Technická zpráva

### 2.1 Vstupní podklady:

Požadavek IPMS int.č. 20725/17/0041 na zpracování CTN: VPIC Blansko okr. křiž. ul. Poříčí – Mlýnská

### 2.2 Navrhované řešení:

Cenový a technický návrh (CTN) řeší ochranu a přeložení SEK spol. CETIN v Blansku, z důvodu výstavby okružní křižovatky v ulici Poříčí \_ Mlýnská.

#### Ochrana prvků SEK

Stávající chráničky, v místech budoucí okružní křižovatky, budou zrevidovány. V případě nutnosti jejich doplnění, či prodloužení, počítá tento CTN s dělenými chráničkami SYSPRO 200/160 a SYSPRO 160/110 + založení rezervní chráničky PE 160mm.

Chráničky, případně místa napojení chrániček, budou obetonované. Konce chrániček budou opatřeny detekčními markery miniBall.

#### Překládka prvků SEK

Stávající metalické kabely EY 20P0,5 a OPV 70P0,5 budou přeloženy mimo budoucí okružní křižovatku a rozšířenou komunikaci.

Bude použito kabelových spojek XAGA a nových tendrovaných kabelů PFLE 15XN 0,6 a PFLE 35XN 0,6.

Pod pojízdnými plochami budou nové prvky SEK vedeny v ochranných trubkách PE110mm.

#### Měření:

Metalické kabely = před provedením překládky bude na metalických kabelech provedeno kontrolní stejnosměrné měření vybraných párů (cca 10%). Po provedení překládky bude provedeno standardní měření na celém profilu kabelů.

Optické kabely = na základě telefonické dohody s p. Reichertem, není nutné optické kabely měřit. Je ovšem nutné provést kontrolu výkopů před záhozem.

### 2.3 Popis tras

viz. přiložené podklady

VVN: ne

El. trakce: ne

Vodní toky: ne

### 2.4 Použitá technologie:

XAGA, PFLE 0,6

Minimarker Ball

SYSPRO, PE

**2.5 Použité předpisy:**

TPP 2001-1 (TP 69a) - Výstavba přístupových sítí -  
Metalické kabely (část I.)  
TPP 2001-2 (TP 69b) - Výstavba přístupových sítí -  
Metalické kabely (část II.)  
TPP 2001-3 (TP 69c) - Výstavba přístupových sítí -  
Metalické kabely (část III.)  
TA 10 (I.-III.) - Výstavba nadzemních sítí  
ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického  
vybavení  
ČSN 334050 - Podzemní sdělovací vedení  
ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení

Výkop, položení a obsazení chráničky je v souladu s ČSN 73 6005

**2.6 Koordinace:**

Ing. Laštůvková Eva: 516 775 127, MT: 775 486 298, [lastuvkova@blansko.cz](mailto:lastuvkova@blansko.cz) \_ Město Blansko, zástupce investora  
Michal Novotný, MT: 725 743 505

**2.7 Ostatní:**

PD: NE

ÚR: NE – stavební titul zajistil stavebník

GEO: ANO \_ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom

VBŘ: ANO \_ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom

GP: pouze na nové trasy SEK (zakresleno v KM) \_ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom

SoUZ: NE

PEW: ANO \_ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom

Před vlastním zahájením prací je nutno zajistit PEW (přerušení metalických kabelů) – min. 40 dnů předem.

RZ je povinný oznámit zahájení výkopových prací a pozvat ke kontrole před záhozem výkopů PC a pracovníka provozní složky.


Technické řešení navržené v CTN zohledňuje pouze podklady dodané k vytvoření CTN.

Případné další podmínky správců sítí, majitelů pozemků a jiné, které nebyly předány ke zpracování CTN, nejsou zohledněny.

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 138223  
Obec: Blansko  
Katastrální území: Blansko-Blánský  
Číslo LV: 13823  
Výměra [m²]: 749  
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  
Mapový list: DKM  
Určení výměry: Ze souhrnů v S-JSK  
Způsob využití: jiná plocha  
Druh pozemku: ostatní plocha

Sousední parcely:  
Vlastníci, jiní oprávnění  
Vlastnické právo  
Město Blansko, r.č.m. Svobody 32/3, 67801 Blansko




Podíl

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 138211  
Obec: Blansko  
Katastrální území: Blansko-Blánský  
Číslo LV: 13821  
Výměra [m²]: 3798  
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  
Mapový list: DKM  
Určení výměry: Ze souhrnů v S-JSK  
Způsob využití: jiné  
Druh pozemku: ostatní plocha

Sousední parcely:  
Vlastníci, jiní oprávnění  
Vlastnické právo  
Město Blansko, r.č.m. Svobody 32/3, 67801 Blansko




Podíl

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 138219  
Obec: Blansko  
Katastrální území: Blansko-Blánský  
Číslo LV: 13821  
Výměra [m²]: 800  
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  
Mapový list: DKM  
Určení výměry: Ze souhrnů v S-JSK  
Způsob využití: ostatní plocha  
Druh pozemku: ostatní plocha

Sousední parcely:  
Vlastníci, jiní oprávnění  
Vlastnické právo  
Město Blansko, r.č.m. Svobody 32/3, 67801 Blansko



Podíl

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 138258  
Obec: Blansko  
Katastrální území: Blansko-Blánský  
Číslo LV: 13821  
Výměra [m²]: 983  
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  
Mapový list: DKM  
Určení výměry: Ze souhrnů v S-JSK  
Způsob využití: zeleň  
Druh pozemku: ostatní plocha

Sousední parcely:  
Vlastníci, jiní oprávnění  
Vlastnické právo  
Město Blansko, r.č.m. Svobody 32/3, 67801 Blansko




Podíl

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 22  
Obec: Blansko  
Katastrální území: Blansko-Blánský  
Číslo LV: 20001  
Výměra [m²]: 153  
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  
Mapový list: DKM  
Určení výměry: Ze souhrnů v S-JSK  
Způsob využití: koryso vodního toku přičítané nebo upravené vodní plocha  
Druh pozemku:

Sousední parcely:  
Vlastníci, jiní oprávnění  
Vlastnické právo  
Město Blansko, r.č.m. Svobody 32/3, 67801 Blansko




Podíl

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 138247  
Obec: Blansko  
Katastrální území: Blansko-Blánský  
Číslo LV: 13821  
Výměra [m²]: 254  
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  
Mapový list: DKM  
Určení výměry: Ze souhrnů v S-JSK  
Způsob využití: jiná plocha  
Druh pozemku: ostatní plocha

Sousední parcely:  
Vlastníci, jiní oprávnění  
Vlastnické právo  
Město Blansko, r.č.m. Svobody 32/3, 67801 Blansko



Podíl

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 138210  
Obec: Blansko  
Katastrální území: Blansko-Blánský  
Číslo LV: 13821  
Výměra [m²]: 816  
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  
Mapový list: DKM  
Určení výměry: Ze souhrnů v S-JSK  
Způsob využití: zeleň  
Druh pozemku: ostatní plocha

Sousední parcely:  
Vlastníci, jiní oprávnění  
Vlastnické právo  
Město Blansko, r.č.m. Svobody 32/3, 67801 Blansko




Podíl


Informace o pozemku

Parcelní číslo: 138242  
Obec: Blansko  
Katastrální území: Blansko-Blánský  
Číslo LV: 13821  
Výměra [m²]: 3116  
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  
Mapový list: DKM  
Určení výměry: Ze souhrnů v S-JSK  
Způsob využití: ostatní plocha  
Druh pozemku: ostatní plocha

Sousední parcely:  
Vlastníci, jiní oprávnění  
Vlastnické právo  
Město Blansko, r.č.m. Svobody 32/3, 67801 Blansko




Podíl

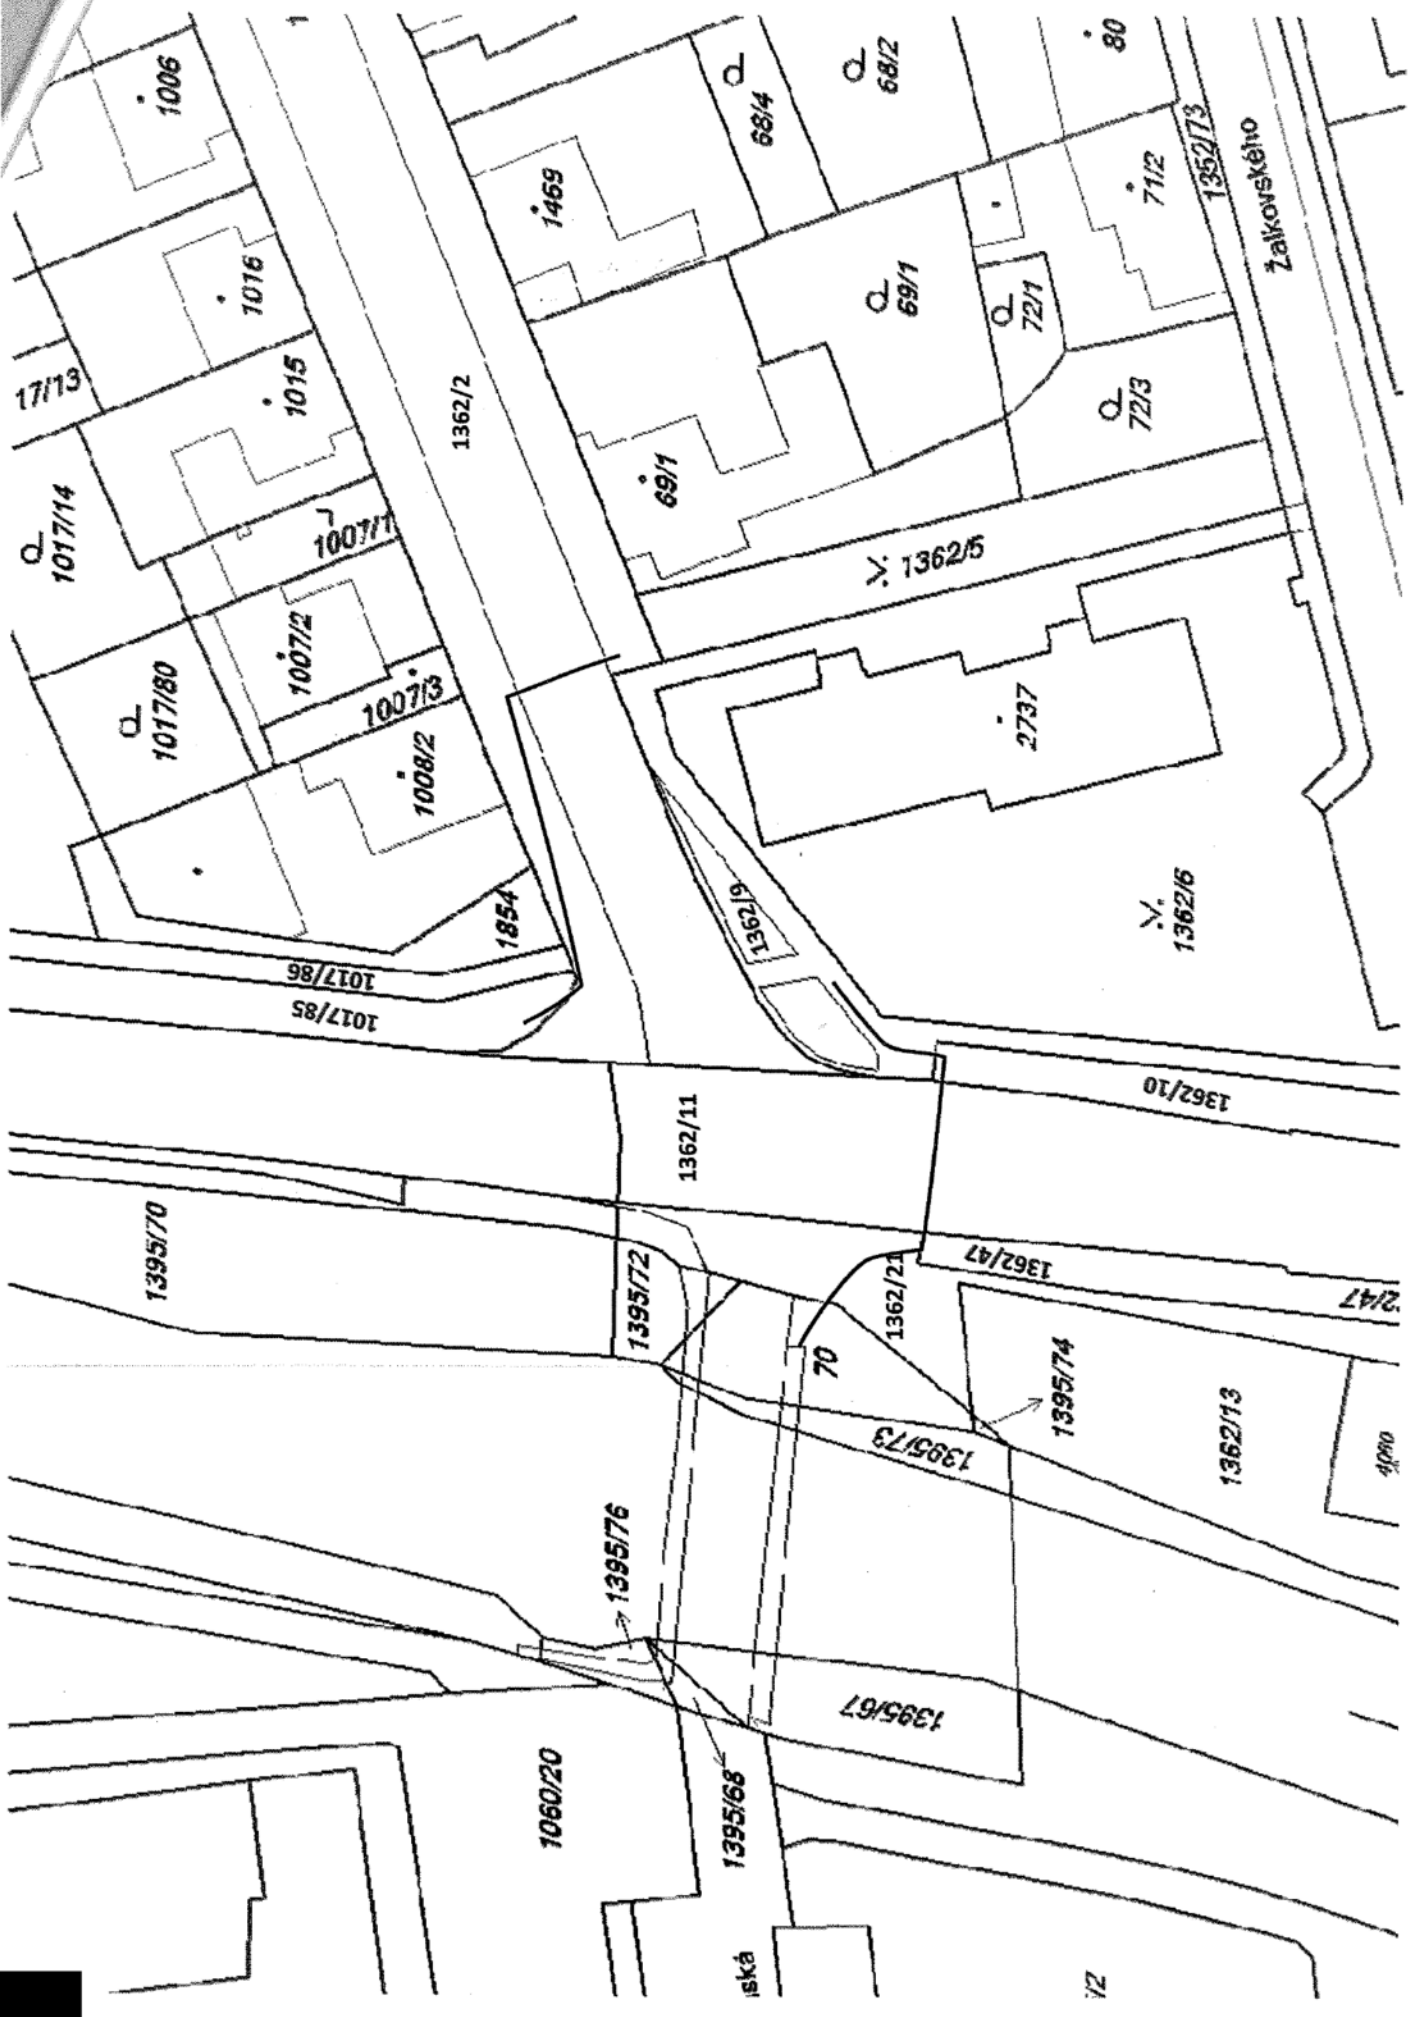

20725/17/0041 VPIC Blansko okr. křiž. ul. Poříčí-Mlýnská



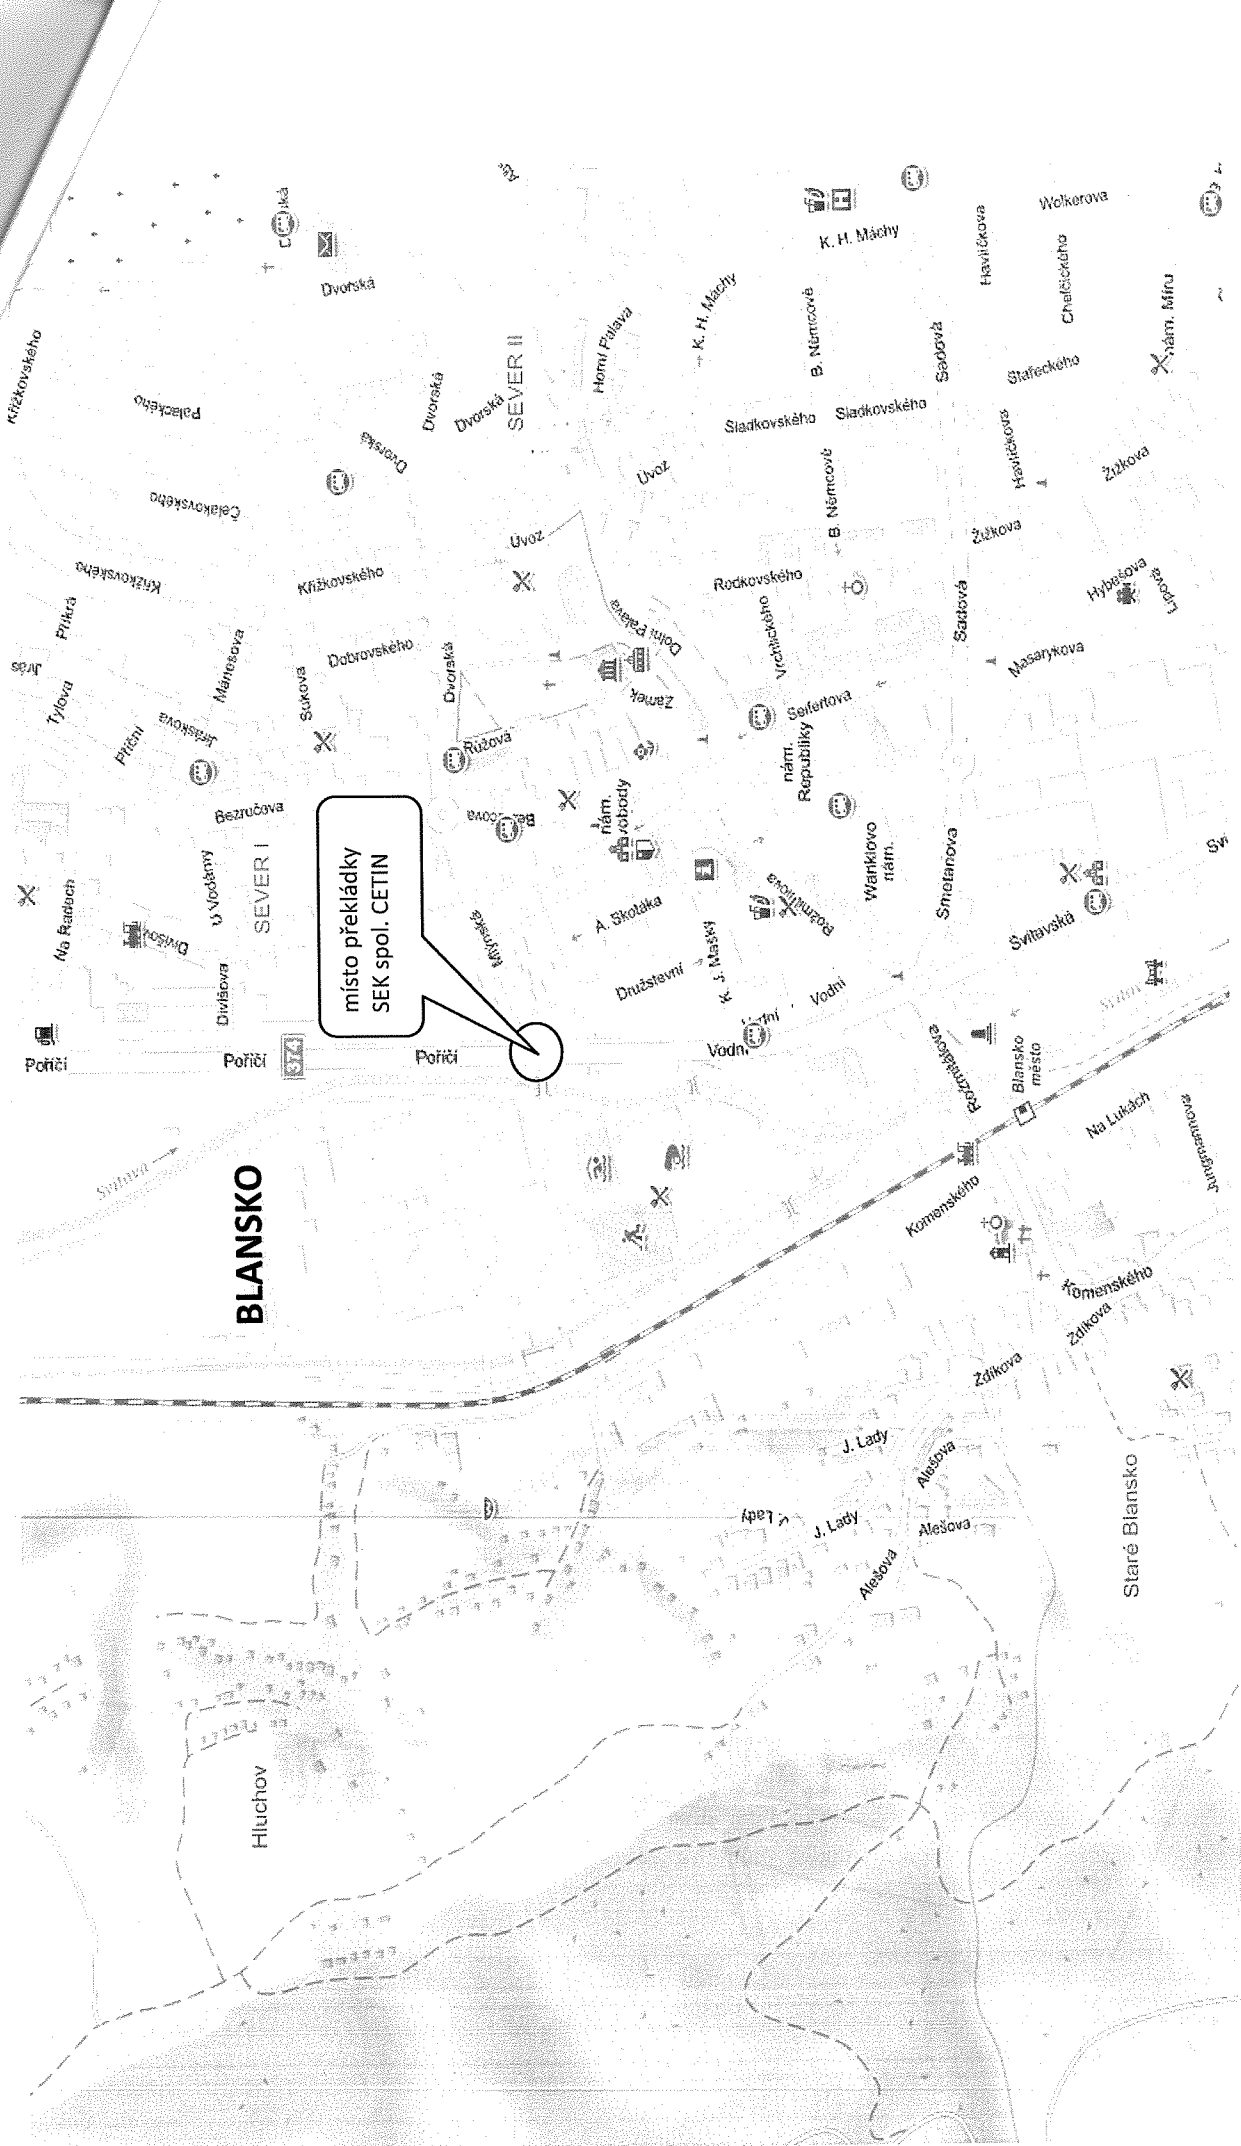


místo překládky  
SEK spol. CETIN

**BLANSKO**

Hlučov

Staré Blansko

20725/17/0041 VPIC Blansko okr. křiž. ul. Poříčí-Mlýnská

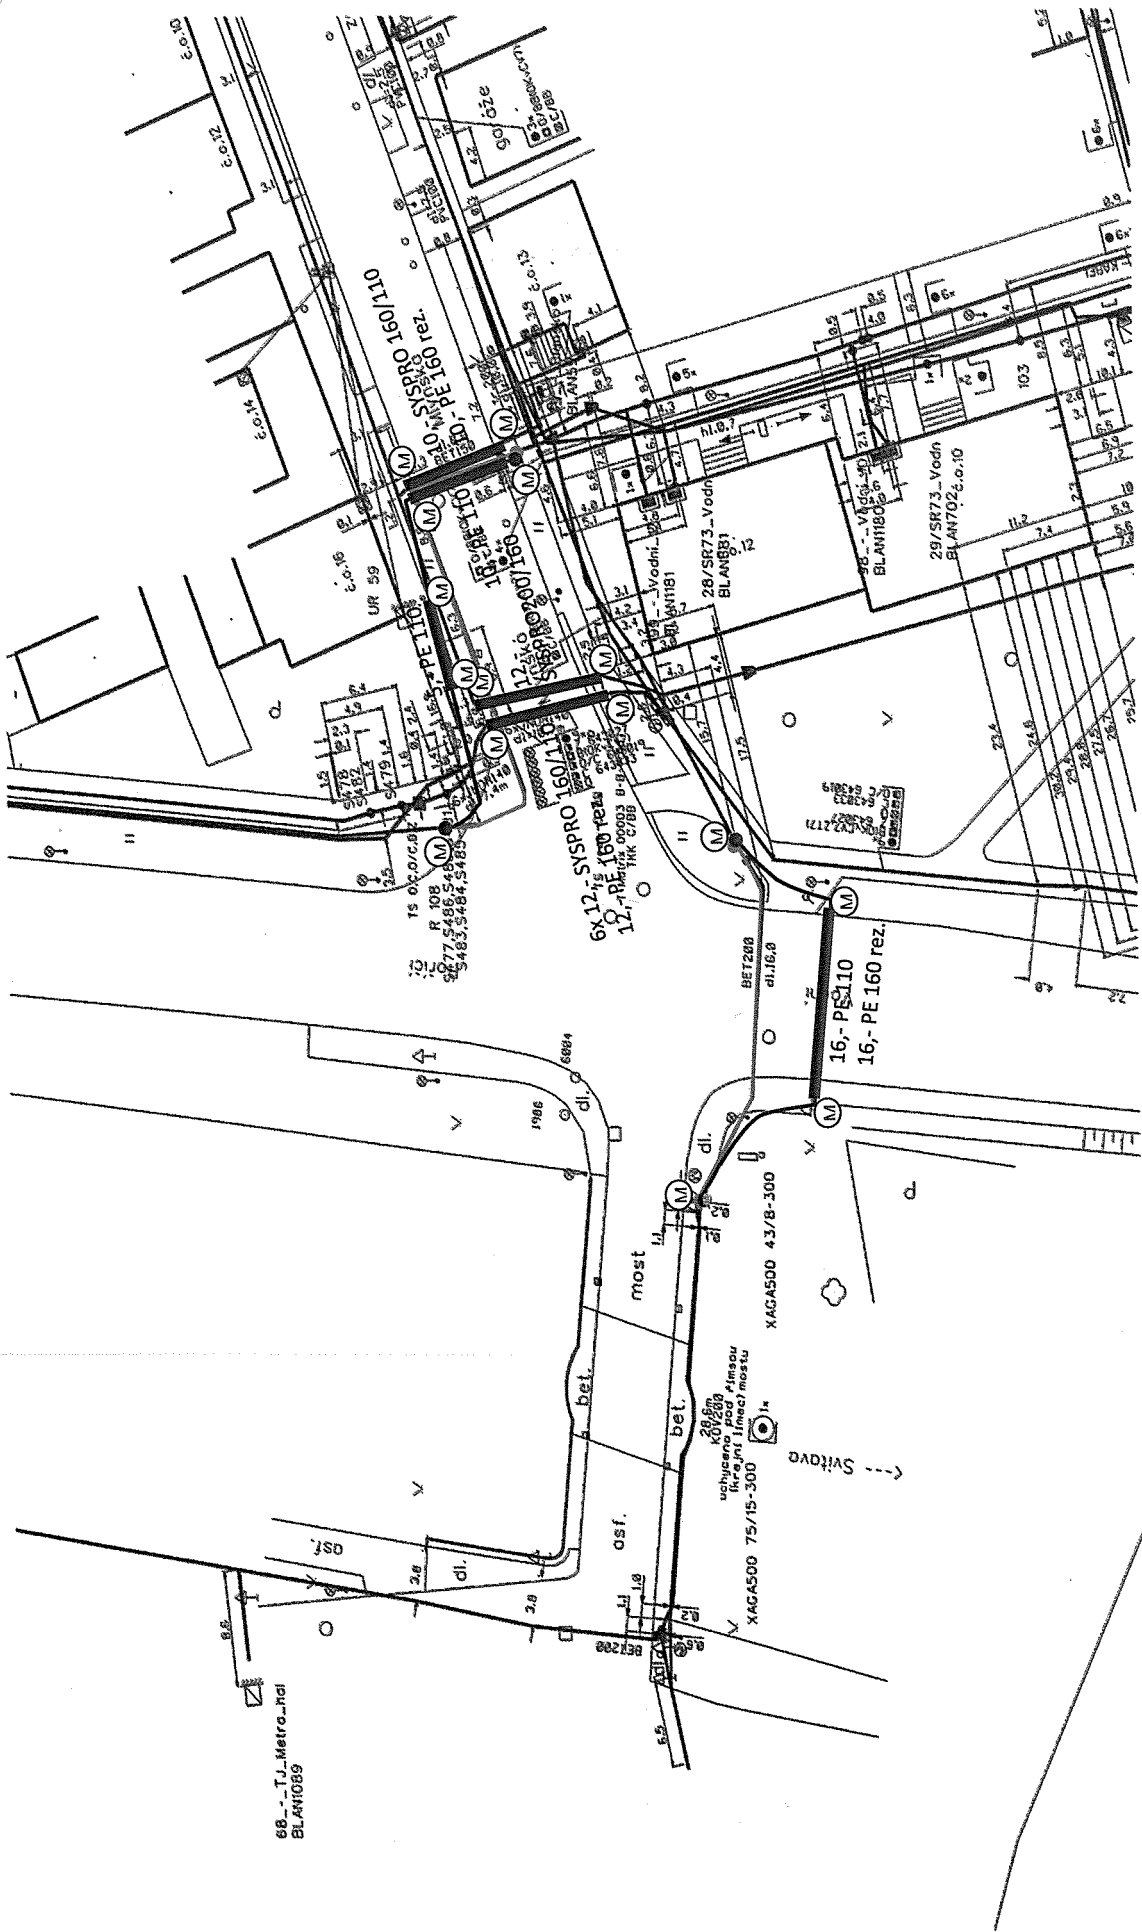

68 - T.J. Metro...  
BLANSKO

6x12,5 SPSRO 160 rez.  
16-PE 160 rez.

16-PE 160 rez.  
16-PE 160 rez.

most

bet.

bet.

osf.

uchyceno  
2020  
kreslo  
75/15-300

XAGA500 43/8-300

XAGA500 75/15-300

SVITKO

20725/17/0041 VPIC Blansko okr. kříž. ul. Poříčí-Mlýnská

Č.O. 16 - Mlýnská - BK  
 BLANI 486  
 xBLANI70/1.2.17/13-14


14. Mlýnská 20.1  
 Mlýnská 1331.16 :  
 Blánsko  
 Blánsko

Hák M12

UR 59

TS D/C  
 TS C 40mm P1  
 TS D 40mm P1  
 TS D 40mm P1

č.p. 931, Blánsko

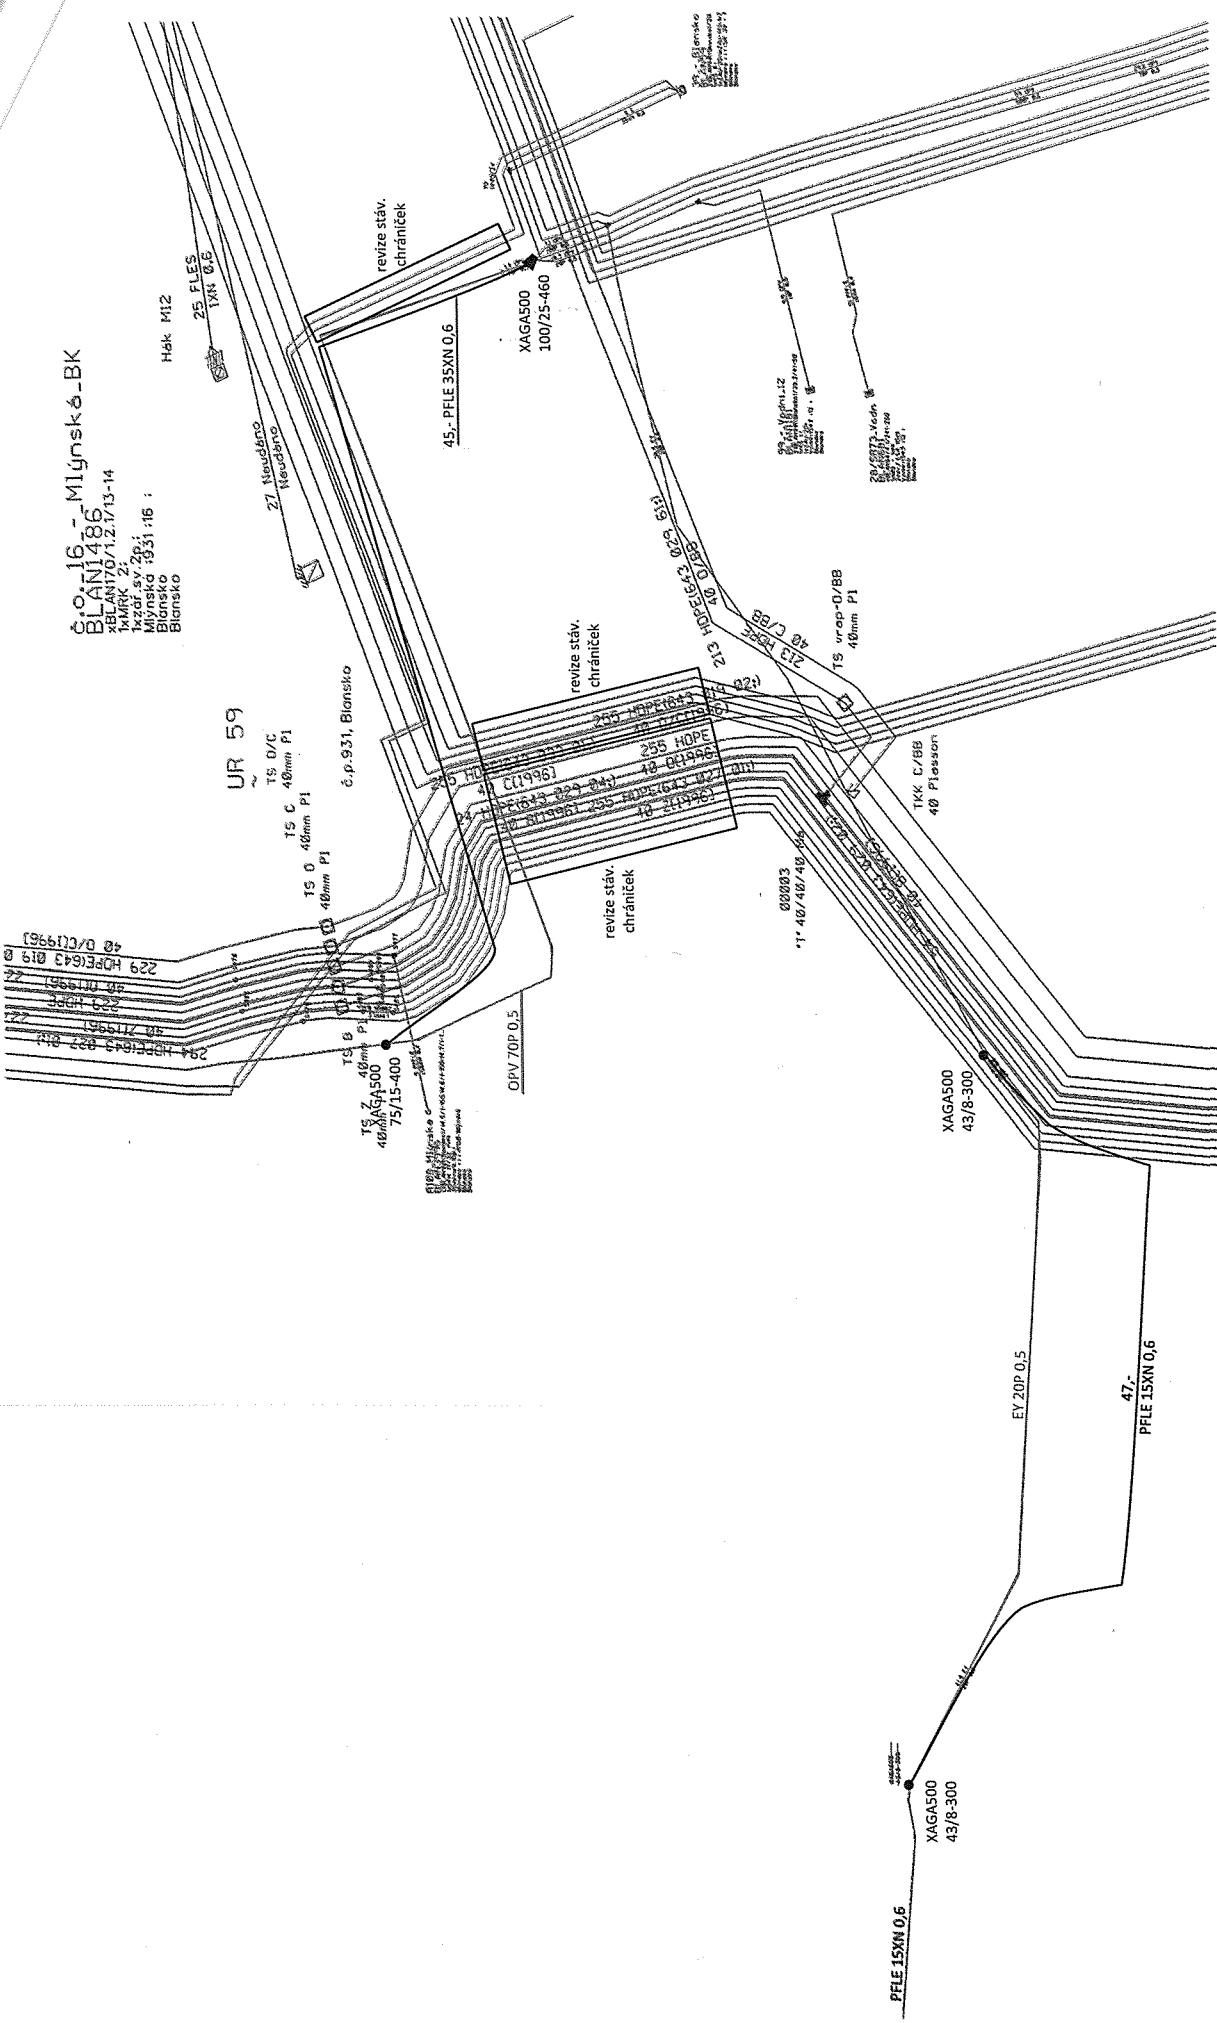

**VPIC Blansko okr. křiž. ul. Poříčí-Mlýnská - specifikace nákladů - aktualizace 2\_2021**

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2021.02

Název stavby: **VPIC Blansko okr. křiž. ul. Poříčí-Mlýnská**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel CTN: Vegacom a.s., Michal Novotný

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	8 101,81 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	216 265,55 Kč
MONTÁŽ	103 125,72 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	15 800,12 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	2 086,80 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	6 140,18 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE	135 870,82 Kč

**Celkové náklady:****487 391,00 Kč**

Číslo SAP	Seznam položek Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA			
958210	Návrh cenový a technický bez projednání zpracování a aktualizace CTN	1.00 ks	
ZEMNÍ PRÁCE			
954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	69.00 m	
955550	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	21.00 m	
951549	Přesun lávky přechodové z ocelové desky	1.00 ks	
955552	Rozšíření prohloubení výk.hl.10cm,š.10cm	105.00 m	
954960	Rýha v chodn.bet.desky35/50-70rozš.o10cm	21.00 m	
954959	Rýha v chodn.zám.dlaž.35/50-70rozš.o10cm	10.00 m	
952359	Rýha v chodníku betonové desky 35/50-70	60.00 m	
952362	Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70	10.00 m	
952355	Rýha v trávě 50/110	18.00 m	
954962	Rýha ve vozovce l.asf.50/130rozš.o 10 cm	141.00 m	
954952	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130	57.00 m	
954956	Rýha vjezd kostky 35/70-90	5.00 m	
954966	Rýha vjezd kostky 35/70-90rozš. o 10 cm	5.00 m	
955054	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	130.00 m	
954972	Znovuosazení obrubníků chodníkových	8.00 m	
951349	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	2.00 ks	
MONTÁŽ			
955031	Demontáž úložných kabelů do 300 XN	155.00 m	
955030	Demontáž úložných kabelů do 50 XN	35.00 m	
955029	Demontáž úložných kabelů do15 XN	15.00 m	
955032	Demontáž úložných kabelů nad 300 XN	80.00 m	
952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	4.00 ks	
952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	60.00 ks	
952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	48.00 ks	

952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	2.00 ks
952647	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	2.00 ks
954999	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	50.00 ks
955000	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	50.00 ks
955268	Montáž podzemní tratě síťové metalické	37200.49 JV
955282	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	2.00 ks
955281	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	2.00 ks
955266	Montáž trubky ochranné	6155.73 JV
	montáž dělených trubek SYSPRO	
954990	Montáž úložných kabelů do 15 XN	62.00 m
954992	Montáž úložných kabelů do 300 XN	155.00 m
954991	Montáž úložných kabelů do 50 XN	80.00 m
954993	Montáž úložných kabelů nad 300 XN	80.00 m
954980	Překládka trubky úložné	100.00 m
957753	Realizace tratě síťové dohodou	10713.60 JV
	doprava betonu, manipulace s betonovou směsí	
958469	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks
955630	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	2.00 ks
958556	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks
955066	Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř.	3.00 ks
<b>GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE</b>		
955198	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks
955278	Provedení geodetického měření pro tratě síťové GEO vytyčení hranic pozemků	6423.20 JV
956286	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	30.00 m
956285	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pev.č.	1.00 ks
<b>VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA</b>		
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks
<b>VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE</b>		
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene náhrada za VBř odhadovaná	500.00 JV
Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.		
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks

Číslo SAP	Limitka materiálu Název položky	Množství	Celková cena
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE</b>			
303918	Deska krycí plast. 300x1000 mm	95.00 ks	
303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	132.00 m	
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	147.00 m	
300119	Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,6	47.00 m	
300271	Kabel plastový TCEPKPFLE 35x4x0,6	45.00 m	
320879	Materiál pro tratě síťové	40348.00 ks	
302550	Mini Marker 1401 3M Ball	15.00 ks	
312425	Modul konektor. 9700-10P	20.00 ks	
320312	Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	1.00 ks	

312863	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ	2.00 ks
312889	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	1.00 ks
303501	Spojka plastová 110/94 mm	3.00 ks
303607	Spojka plastová 160/137mm	4.00 ks
320294	Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460	1.00 ks
319184	Spona trubkySYSPRO	564.00 ks
319209	Trubka dělená SYSPRO 160/110	82.00 m
319210	Trubka dělená SYSPRO 200/160	12.00 m
302655	Trubka PE 110/3,5/6000mm	6.00 ks
302699	Trubka PE 160/9,1/6000mm	7.00 ks



# MĚSTSKÝ ÚŘAD BLANSKO

## ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko

Město Blansko  
nám. Svobody 32/3  
678 01 Blansko 1


Spis. zn.: SMBK-27524/2015-SÚ/Ša  
Čj.: SÚ ÚR 91/2016-16883/2016/Ša

Vyřizuje: Ing. Petr Šamonil  
Tel.: 516 775 720

E-mail: samonil@blansko.cz

Datum: 25.4.2016

### ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA



Dne 29.7.2015 podalo Město Blansko, IČO 00279943, se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko 1, v postavení účastníka řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále též "správní řád"), žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby žadatelem nazvané **rekonstrukce křižovatky Poříčí – Mlýnská v Blansku** na pozemcích parc. č. 70, 1017/85, 1017/86, 1362/2, 1362/5, 1362/6, 1362/9, 1362/10, 1362/11, 1362/21, 1395/70, 1395/72, 1429/1 a 1429/44 v katastrálním území Blansko, spočívající v **umístění nové okružní křižovatky** včetně rozvodů veřejného osvětlení a přeložky telekomunikačních kabelů na uvedených pozemcích. Dnem doručení žádosti bylo zahájeno územní řízení.

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též "stavební zákon"), přezkoumal podle § 90 stavebního zákona podanou žádost. Na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 79 odst. 1 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto

#### rozhodnutí o umístění uvedené stavby.

#### Popis stavby

*Stávající průsečná křižovatka silnice II / 374 totožné zde s ulicí Poříčí a místní komunikace totožné s ulicí Mlýnská bude nahrazena malou okružní křižovatkou. Současný rozsah křižovatky bude ve všech čtyřech nárožích rozšířen, nová konstrukce zpevněné plochy okružního pásu bude odpovídat dopravnímu zatížení krajské silnice. Nová okružní křižovatka bude tvořena středním zeleným kruhovým ostrovem o poloměru 4.50 m lemovaným betonovými obrubníky. Následovat bude zvýšený prstenec šířky 3.0 až 4.0 m z žulových kostek s nerovným povrchem a vlastní jízdní pás s asfaltovým povrchem minimální šířky 4.75 m. V ostrém úhlu severovýchodního kvadrantu styku obou komunikací bude vložena rozšířená srpovitá krajnice s dlážděným krytem v přejezděné úpravě.*

*U obou křižovatkových ramen z ulice Poříčí a z východní strany ulice Mlýnská se vloží zvýšené střední ostrůvky přerušené přechody pro pěší. Ze západní strany ulice Mlýnské dělicí ostrůvek ani přechod pro chodce zřizován nebude. Část dělicího ostrůvku na jižní straně ulice Poříčí bude lemována šikmo osazenými obrubníky pro umožnění přejezdu vozidla správce kanalizační sítě. Kvůli možnosti údržby další podzemní kanalizační komory*



