

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

Číslo související rámcové dohody: S-2238/00066001/2020

mezi

1. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

zastoupeným: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitel

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Pontex/DP Ostrava/G-Consult/HBH/APIS/MMD/Link – RD na PP BIM,

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 – Braník

zastoupena společností **Pontex, spol. s r. o.** (Správce – vedoucí sdružení)

zastoupeným: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem, Ing. Petrem Součkem – jednatelem, (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

bankovní spojení:

IČ: 407 63 439

DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v OR vedením Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994.

Společníci sdružení:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,

zastoupeným předsedou představenstva Ing. Martinem Vilčem,

IČO: 427 67 377

DIČ: CZ42767377 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava Vítkovice,

zastoupeným jednatelem Ing. Michalem Kofroněm,

IČO: 646 16 886

DIČ: CZ64616886 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno,

zastoupeným jednatelem Ing. Radovanem Hrnčářem,

IČO: 449 61 944

DIČ: CZ44961944 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3996

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem Ohradní 1443/24b , 140 00 Praha 4, Michle,

zastoupeným jednatelem Ing. Karlem Nejedlým,

IČO: 618 53 267

DIČ: CZ61853267 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem Národní č. p. 984/15, 110 00 Praha 1,

zastoupeným jednatelem Ing. Radko Buckem a jednatelem Ing. Janem Loško, Ph.D.,

IČO: 485 88 733

DIČ: CZ48588733 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051

Link projekt s.r.o.

se sídlem Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno,

zastoupeným jednatelem Ing. Petrem Damkem,

IČO: 276 78 032

DIČ: CZ27678032 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51304

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)

(č. smlouvy S-1135/00066001/2021, č. smlouvy zhotovitele: 20 171 08)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí, odpovědnost a bez zbytečných prodlení dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“) na minitendr s názvem:

III/2388 Brandýsek, havarijný stav komunikace-PD

dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- a) Dokumentace DUSP včetně všech souvisejících průzkumů (akt. zaměření, apod.)
- b) Výkon autorského dozoru (AD)
- c) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů
Soupis prací s výkazem výměr bude zpracován ve formátu .XC4.
- d) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové dohody

Předmět plnění bude zpracován v souladu s platnou legislativou, vyhláškami a TP. Rozpočet bude reflektovat zatřídění dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.

Součástí prací není zpracování modelu BIM.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou.
4. Výsledky poskytnutých služeb:

Průzkumy a zaměření	1x v listinné podobě a 1x digitálně na flash disku
nebo k žádosti o stavební povolení (DUSP)	1x (potvrzená stavebním úřadem)
Dokumentace pro provedení stavby (PDPS)	4x v listinné podobě a 1x digitálně na flash disku, přičemž 1 x oceněná
Dokladová část	1x v tištěné podobě a 1x digitálně na flash disku

Originál pravomocného územního rozhodnutí včetně dokladové části a stavebního povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně dokladové části a ověřené projektové dokumentace.

1x v tištěné podobě (+ 1x kopie na flash disku).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj.:

a) Dokumentace DUSP

bez DPH: 1 800 000,00 Kč

DPH: 378 000,00 Kč

včetně DPH: 2 178 000,00Kč

b) Projektová dokumentace pro provedení stavby

bez DPH: 400 000,00 Kč

DPH: 84 000,00 Kč

včetně DPH: 484 000,00 Kč

c) Výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení stavby

bez DPH: 700 000,00 Kč

DPH: 147 000,00 Kč

včetně DPH: 847 000,00 Kč

d) Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy

bez DPH: 775,00 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

DPH: 162,75 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

včetně DPH: 937,75 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

Cena celkem:

bez DPH: 3 051 900,00 Kč

DPH: 640 899,00 Kč

včetně DPH: 3 692 799,00 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatелеm odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, mob.: , e-mail:

Šárka Balážová, silniční technik, oblast Kladno, mob.:

e-mail:

Mgr. Martina Řezáčová, správní cestmistr, mob.

e-mail:

Radek Vlasatý, provozní cestmistr CMS Fialka, mob.:

e-mail:

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
2. Zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti Prováděcí smlouvy

Koncept DUSP – do 6 měsíců od podpisu smlouvy

Čistopis DUSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DÚSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP

- Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné, do 1 měsíce od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění

- Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné, do 1 měsíce od schválení poslední příslušné smlouvy

PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP

Technická pomoc - výkon AD – čerpání v průběhu realizace stavby, dle potřeb objednatele

3. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: sídlo zhotovitele, autorský dozor bude prováděn na stavbě.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
Technickou specifikaci předmětu díla.
Fotodokumentaci
3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace

veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy

Článek V.

Další ustanovení

Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly této smlouvy. Zhotovitel souhlasí se vstupem všech kontrolních orgánů (objednatel, Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, orgánů strukturálních fondů EU, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančních úřadů apod.) do svých objektů, ve kterých se realizuje předmět této smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu této smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let ode dne poskytnutí služeb dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související s touto smlouvou. V případě, že část předmětu této smlouvy zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů, je povinen smluvně zajistit, aby i tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto článku smlouvy, pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část této Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
4. Přílohy této smlouvy tvoří:
 - Příloha č. 1: Podrobná specifikace předmětu plnění,
 - Příloha č. 2: Podrobná specifikace ceny,

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Říčanech dne

V Praze dne 10.5.2021

PODEPSÁN

za objednatele: **Krajská správa a údržba
silnic Středočeského kraje, p.o.**

PODEPSÁN

za zhotovitele: **Pontex/DP Ostrava/G-
Consult/ HBH/APIS/MMD/Link – RD
na PP BIM**

.....
Ing. Jan Lichtneger
ředitel

.....
Ing. Martin Havlík
jednatel společnosti

Technická specifikace

Název akce: III/2388 Brandýsek, havarijní stav komunikace - PD

Místo realizace akce: silnice III/2388 v průtahu obcí Brandýsek a to od křižovatky se silnicí III/00712 na konec obce Brandýsek.


Obec Brandýsek, okres Kladno, oblast Kladno, cestmistrovství Fialka.

Staničení: silnice III/2388 ve staničení km 0,000 – 1,200 uzlové body 1223A044 - 1223A060

Celková délka projektovaného úseku silnic je 1 200 m v intarvilánu obce Brandýsek

Silniční mapa

VARŠ CleaveRA

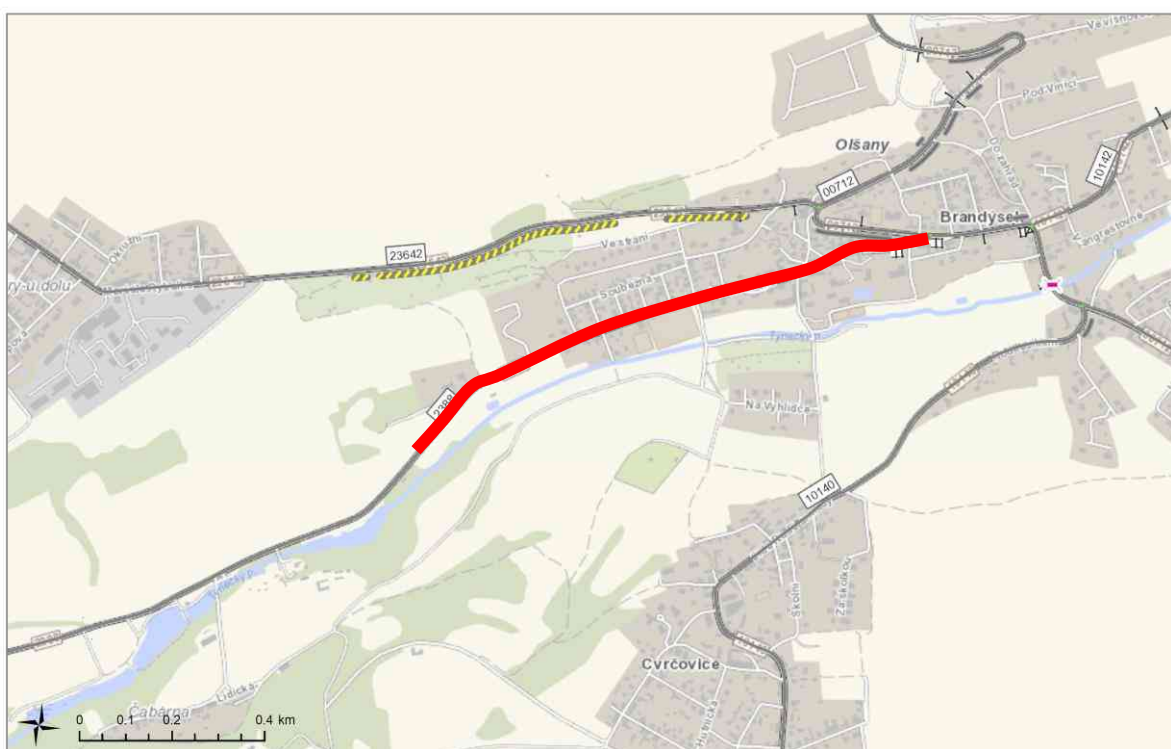

1:9,084

Datum: 2/26/2021

Autor: CleaveRA®

Základní popis akce:

Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):

Jedná se o zpracování PD k rekonstrukci silnice III/2388. V celé délce silnice III/2388 dochází k propadům vozovky (především po inženýrských sítích) a rozpadu živičného krytu vozovky, který není již dále udržitelný. Je třeba doplnit odvodnění, které je umístěno pouze na pravé straně vozovky ve směru na Kladno a místy chybí odvodnění úplně. V úseku u fotbalového hřiště dochází k propadu vozovky. Vhodným řešením by bylo vybudování opěrné zdi. Dále je třeba kompletně vyřešit bývalý autobusový záliv (na úrovni autobusové zastávky „Brandýsek, Olšany“), který se nachází na pozemku ve vlastnictví Středočeského kraje, a který slouží k obsluze přilehlých nemovitostí. Po provedení rekonstrukce by došlo k majetkovému vypořádání s obcí. V řešeném úseku Před fotbalovým hřištěm se též nachází příčný práh, který je třeba zrušit, popřípadě nahradit vhodnou alternativou ve formě dopravního značení.

PD bude zpracována ve stupni DUSP (dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení) se zajištěním pravomocného územního rozhodnutí, PDPS (dokumentace pro provedení stavby dle vyhlášky 69/2016 Sb., v platném znění) a zajištění souvisejícího výkonu IČ k ÚR a SP, včetně majetkoprávní přípravy stavby.

Součástí prací je dále výkon autorské ho dozoru (AD) při dodržení platných norem (např. ČSN 736201, 736101) TKP a TP.

Jedná se o zpracování PD na opravu silnic ve špatném stavu:

- Bude zpracována diagnostika silnice III/2388 v obci Brandýsek. Na základě diagnostiky silnice III/2388 a dále na základě zjištění obsahu PAU bude navržena optimální oprava předmětné silnice.
- Součástí rekonstrukce silnice bude řešení systému likvidace dešťových vod z tělesa předmětné komunikace (dešťová kanalizace). Dále budou řešeny stávající bezpečnostní prvky na předmětných silnicích, případně bude navrženo jejich rozšíření. V rámci rekonstrukce bude řešena optimalizace VDZ a SDZ ve městě (revize dopravního značení a případné úpravy).
- Součástí PD bude řešení stavbou vynucených přeložek IS.
- PD bude koordinována s případnými investičními akcemi obce Brandýsek.
- Projektová dokumentace bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy.
- V průběhu projektové přípravy zhotovitel PD oznámí záměr realizace stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR. V případě kladného stanoviska Archeologického ústavu věd ČR ve věci nutnosti provedení archeologického výzkumu začlení zhotovitel PD do položkového rozpočtu oceněnou položku na základě kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté s archeologickým výzkumem a pro náklady spjaté se sanací území po provedení archeologického výzkumu a dále zpracuje návrh smlouvy na provedení archeologického výzkumu mezi stavebníkem a organizací určenou Archeologickým ústavem Akademie věd ČR k provedení archeologického výzkumu.
- Bude řádně dokončena majetkoprávní příprava této akce, tj. budou smluvně oboustranně upraveny vztahy k pozemkům zabraným dočasně či trvale stavbou – uzavření Smlouvy o právu provedení stavby, Smlouvy o smlouvách budoucích kupních či darovacích, Smlouvy nájemní či o výpůjčce. Budou oboustranně podepsány smlouvy o smlouvách budoucích na provedení přeložek inženýrských sítí a Smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena.
- Součástí PD bude zjištění obsahu PAU a jeho zatřídění - zkoušek a zatřídění stávajících asfaltových směsí podle obsahu PAU v souladu s vyhl. MPO č. 130/2019 Sb.

Návrh řešení:

- v případě potřeby provést doplnění diagnostiky vozovky, geologického a hydrogeologického průzkumu a dále provést zjištění obsahu PAU a jeho zatřídění.
- rekonstrukce silnice jejich součástí a vybavení bude navržena dle výsledků těchto průzkumů.
- obnova a doplnění systému odvodnění řešených silnic.
- vynucené práce např. úprava chodníkových obrubníku, přeložky inž. sítí dle zjištěné skutečnosti apod.
- vybudování opěrné zdi u fotbalového hřiště.
- zrušení příčného prahu.
- na základě jednání s obcí Brandýsek koordinovat přípravu PD s případnými investičními akcemi obce.

Termíny realizace:

Koncept DUSP – do 6 měsíců od podpisu smlouvy

Čistopis DUSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DUSP objednatelem

Podání žádosti o vydání DUSP

- Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné, do 1 měsíce od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,

- Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné, do 1 měsíce od schválení příslušných smluv, nebo od obdržení posledního potřebného vyjádření.

PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP

Technická pomoc - výkon AD – čerpání v průběhu realizace stavby

Objednatel akce:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ 00066001

kontaktní osoby objednatele:

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno,

Šárka Balážová, silniční technik,

Mgr. Martina Řezáčová, správní cestmistr,

Radek Vlasatý, provozní cestmistr,


Fotodokumentace:





REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

2021/2/26 08:28

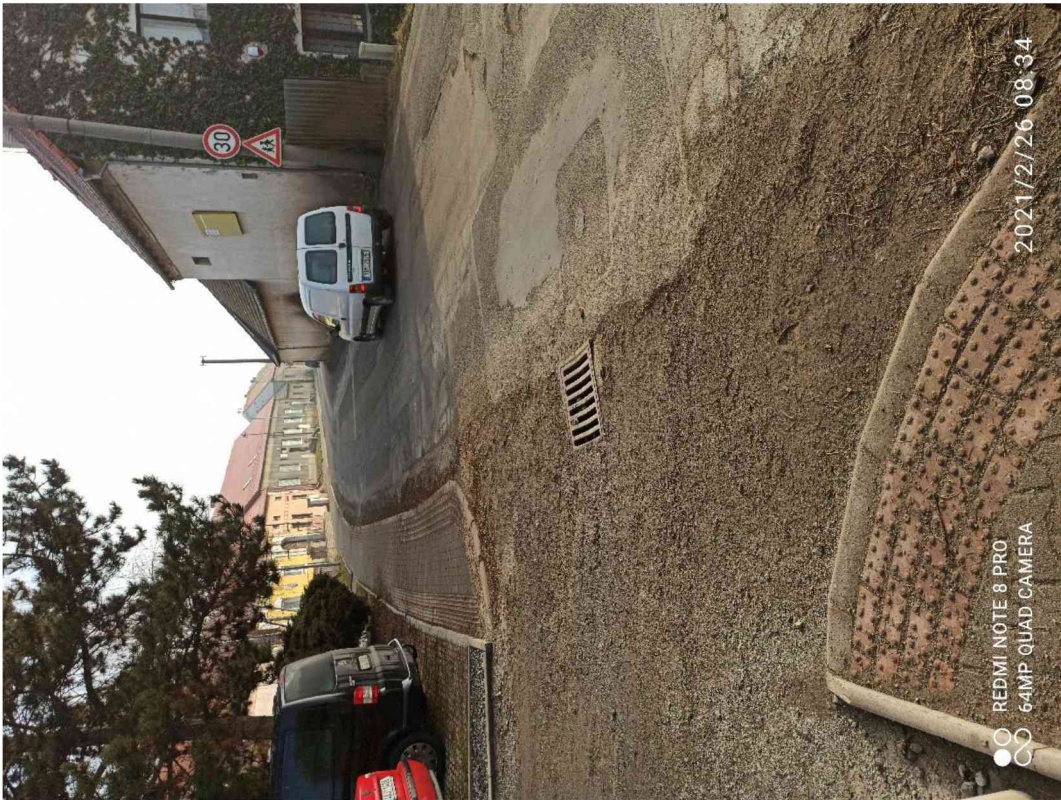

REDMI NOTE 8 PRO
64MP QUAD CAMERA

2021/2/26 08:34

Zpracoval
Karel Motal v březnu 2021

Podrobná specifikace ceny

AKCE

Příloha č. 2

„III/2388 Brandýsek, havarijní stav komunikace " - PD

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DUSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k DUSP vč. majetkop. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
40 000 000	4,500%	1,750%	1,000%	775	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	196	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***)	2 000 000	800 000	440 000	151 900	3 391 900
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	1 800 000	700 000	400 000	151 900	3 051 900
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	90,00%	87,50%	90,91%	100,00%	89,98%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

****) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

**Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a
rozeepsaných cen v tabulce č. 2 - 6**

Kontrolní propoččet Tab. č. 1 a 2 část DSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propoččet Tab. č. 1 a 2. část IČ k SP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propoččet Tab. č. 1 a 2. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

V Praze, dne 16. 4. 2021

Ing. Václav Hvizdal, jednatel
společnosti Pontex, spol. s r.o. -
Správce společnosti Pontex/
DP Ostrava/G-Consult
/HBH/APIS/MMD/Link-RD na PP BIM

„III/2388 Brandýsek, havarijní stav komunikace " - PD

žlutě ocení uchazeč	
0 popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
Průzkumy a podklady - DUSP	
Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa,	120 000,00
Geologická rešerše	50 000,00
Průzkumy potřebné průzkumy pro DUSP (PAU, Hluková, Exhalační studie, Bilance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, diagnostika vozovky, apod.)	240 000,00
Průzkumy DUSP celkem	410 000,00
DUSP	
Průvodní zpráva	20 000,00
Souhrnné technické řešení	100 000,00
Stavební část	1 100 000,00
DIO	100 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	50 000,00
BOZP	20 000,00
DUSP celkem	1 390 000,00
DUSP celkem včetně průzkumů	1 800 000,00
IČ-zajištění vydání DUSP	
projednání dokumentace	300 000,00
majetkoprávní podklady	250 000,00
majetkoprávní řešení stavby (včetně uzavření příslušných smluv)	100 000,00
podání žádosti včetně poplatků	50 000,00
IČ celkem	700 000,00
PDPS	
Technická zpráva	10 000,00
Výkresová část	300 000,00
ZTKP	20 000,00
Soupis prací a rozpočet	70 000,00
PDPS celkem	400 000,00
celkem bez DPH	3 310 000,00

V Praze, dne 16. 4. 2021

— Ing. Václav Hvízdal, jednatel
společnosti Pontex, spol. s r. o. -
Správce společnosti Pontex/
DP Ostrava/G-Consult
/HBH/APIS/MMD/Link-
RD na PP BIM

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

„III/2388 Brandýsek, havarijní stav komunikace " - PD

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	60	775	46 500
Cena AD celkem bez DPH	136		105 400
Celkem	196		151 900

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díličí činnosti při výkonu AD	AD hodin
činnost	
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	8
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	16
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	24
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	24
Vyjádřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	24
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 	40
celkem hodin	136
Kč/hod	775
Celkem Kč bez DPH	105 400

***) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Praze, dne 16. 4. 2021

Ing. Václav Hvizdal, jednatel
společnosti Pontex, spol. s r. o. -
Správce společnosti Pontex/
DP Ostrava/G-Consult/
HBH/APIS/MMD/Link-RD na PP BIM
