

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2020/011
Číslo smlouvy Stavebníka:

SRM:
Registr smluv: Ano

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. VPI/PH/2020/011**

mezi

CETIN a.s.

a

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2020/011
Číslo smlouvy Stavebníka:

SRM:
Registr smluv: Ano

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená Ing. Petrem Holým Ph.D., ředitelem provozu sítě, dle pověření

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „**CETIN**“)

a

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

se sídlem se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn.: Pr 1478

jejímž jménem jedná Ing. Jan Lichtneger, ředitel KSUS SK

číslo smlouvy: 554/00066001/2021

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Srbsko u Karlštejna spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2020/011
Číslo smlouvy Stavebníka:

SRM:
Registr smluv: Ano

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 29. 7. 2020 vydané pod čj. 712430/20, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPI Srbsko II_116,III_11614 průtah**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky,
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2020/011
 Číslo smlouvy Stavebníka:

SRM:
 Registr smluv: Ano

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektu,
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však pět (5) měsíců od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník se zavazuje, nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, jejíž vzor je uveden v Příloze č. 2 Smlouvy a převést na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky. Ve lhůtě dle předchozího odstavce je Stavebník povinen předat společnosti CETIN územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do pěti (5) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
- (c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy;
- (d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2020/011
Číslo smlouvy Stavebníka:

SRM:
Registr smluv: Ano

vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

- 4.5** Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6** Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7** Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1** Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2** Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **2.057.271,- Kč** (slovy: dva miliony padesát sedm tisíc dvě stě sedmdesát jedna korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3** Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do pěti (5) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4** V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2020/011
 Číslo smlouvy Stavebníka:

SRM:
 Registr smluv: Ano

- pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
 - (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
 - (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
 - (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
 - (f) náklady na identifikaci parcel,
 - (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
 - (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
 - (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
 - (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
 - (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
 - (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
 - (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společnostmi CETIN vystaveny takto:

- (a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši **130.829,- Kč** (slovy: jedno sto třicet tisíc osm set dvacet devět korun českých) bude společnostmi CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy,
- (b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.

6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společnostmi CETIN.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2020/011
Číslo smlouvy Stavebníka:

SRM:
Registr smluv: Ano

- 6.3** Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4** Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.
- 6.5** Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
- 6.6** Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1** Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2** Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3** Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8.KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: Ludmila Pažoutová
funkce: Specialista pro výstavbu sítě
e-mail: ludmila.pazoutova@cetin.cz, tel.: 238 462 468

ve věcech technických: Michal Spurný
funkce: Senior specialista pro výstavbu sítě
e-mail: michal.spurny@cetin.cz, tel.: 238 465 525

8.2Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Ing. Jan Lichneger
funkce: ředitel KSUS SK
e-mail: jan.lichtneger@ksus.cz, tel.: 722 972 529

ve věcech technických:
Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, mobil: 723 500 384, e-mail:
karel.motal@ksus.cz
Pavel Špaček, silniční technik, oblast Kladno, mobil: 724 118 323, e-mail:
pavel.spacek@ksus.cz

9.ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1** Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2020/011
Číslo smlouvy Stavebníka:

SRM:
Registr smluv: Ano

je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.

- 9.2** Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3** Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4** Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.
- 9.5** Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.6** Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.7** Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10.ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1** Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marré uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2** Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3** Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4** Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1** Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2020/011
Číslo smlouvy Stavebníka:

SRM:
Registr smluv: Ano

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**GDPR**“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

- 11.2** Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3** Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4** Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5** Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1** Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společností CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
- 12.2** Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2020/011
Číslo smlouvy Stavebníka:

SRM:
Registr smluv: Ano

12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- (a) v listinné podobě;
- (b) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zaručený elektronický podpis**“);
- (c) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;
- (d) e-mailovou zprávou zaslano na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.7 Smlouvy, věta první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem (c) a (d).

12.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.

12.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

12.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

12.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.

12.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:

- § 557;
- § 1767 odst. 2;
- § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
- § 1743.

12.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.

12.10 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2020/011
 Číslo smlouvy Stavebníka:

SRM:
 Registr smluv: Ano

12.11 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

12.12 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

12.13 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktivní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.14 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.

12.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby – vzor

CETIN:

V Praze dne _____

Ing. Petr
 Holý, Ph.D.

Digitálně podepsal Ing.
 Petr Holý, Ph.D.
 Datum: 2021.03.30
 17:24:42 +02'00'

CETIN a.s.
 Ing. Petr Holý Ph.D.
 ředitel provozu sítě

Stavebník:

V _____ dne _____

Ing. Jan Lichtneger

Digitálně podepsal Ing. Jan
 Lichtneger
 Datum: 2021.06.10 10:07:37 +02'00'

**Krajská správa a údržba silnic
 Středočeského kraje**
 Ing. Jan Lichtneger

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2020/011
Číslo smlouvy Stavebníka:


SRM:
Registr smluv: Ano

ředitel KSUS SK


DETAIL 4





DETAIL 3

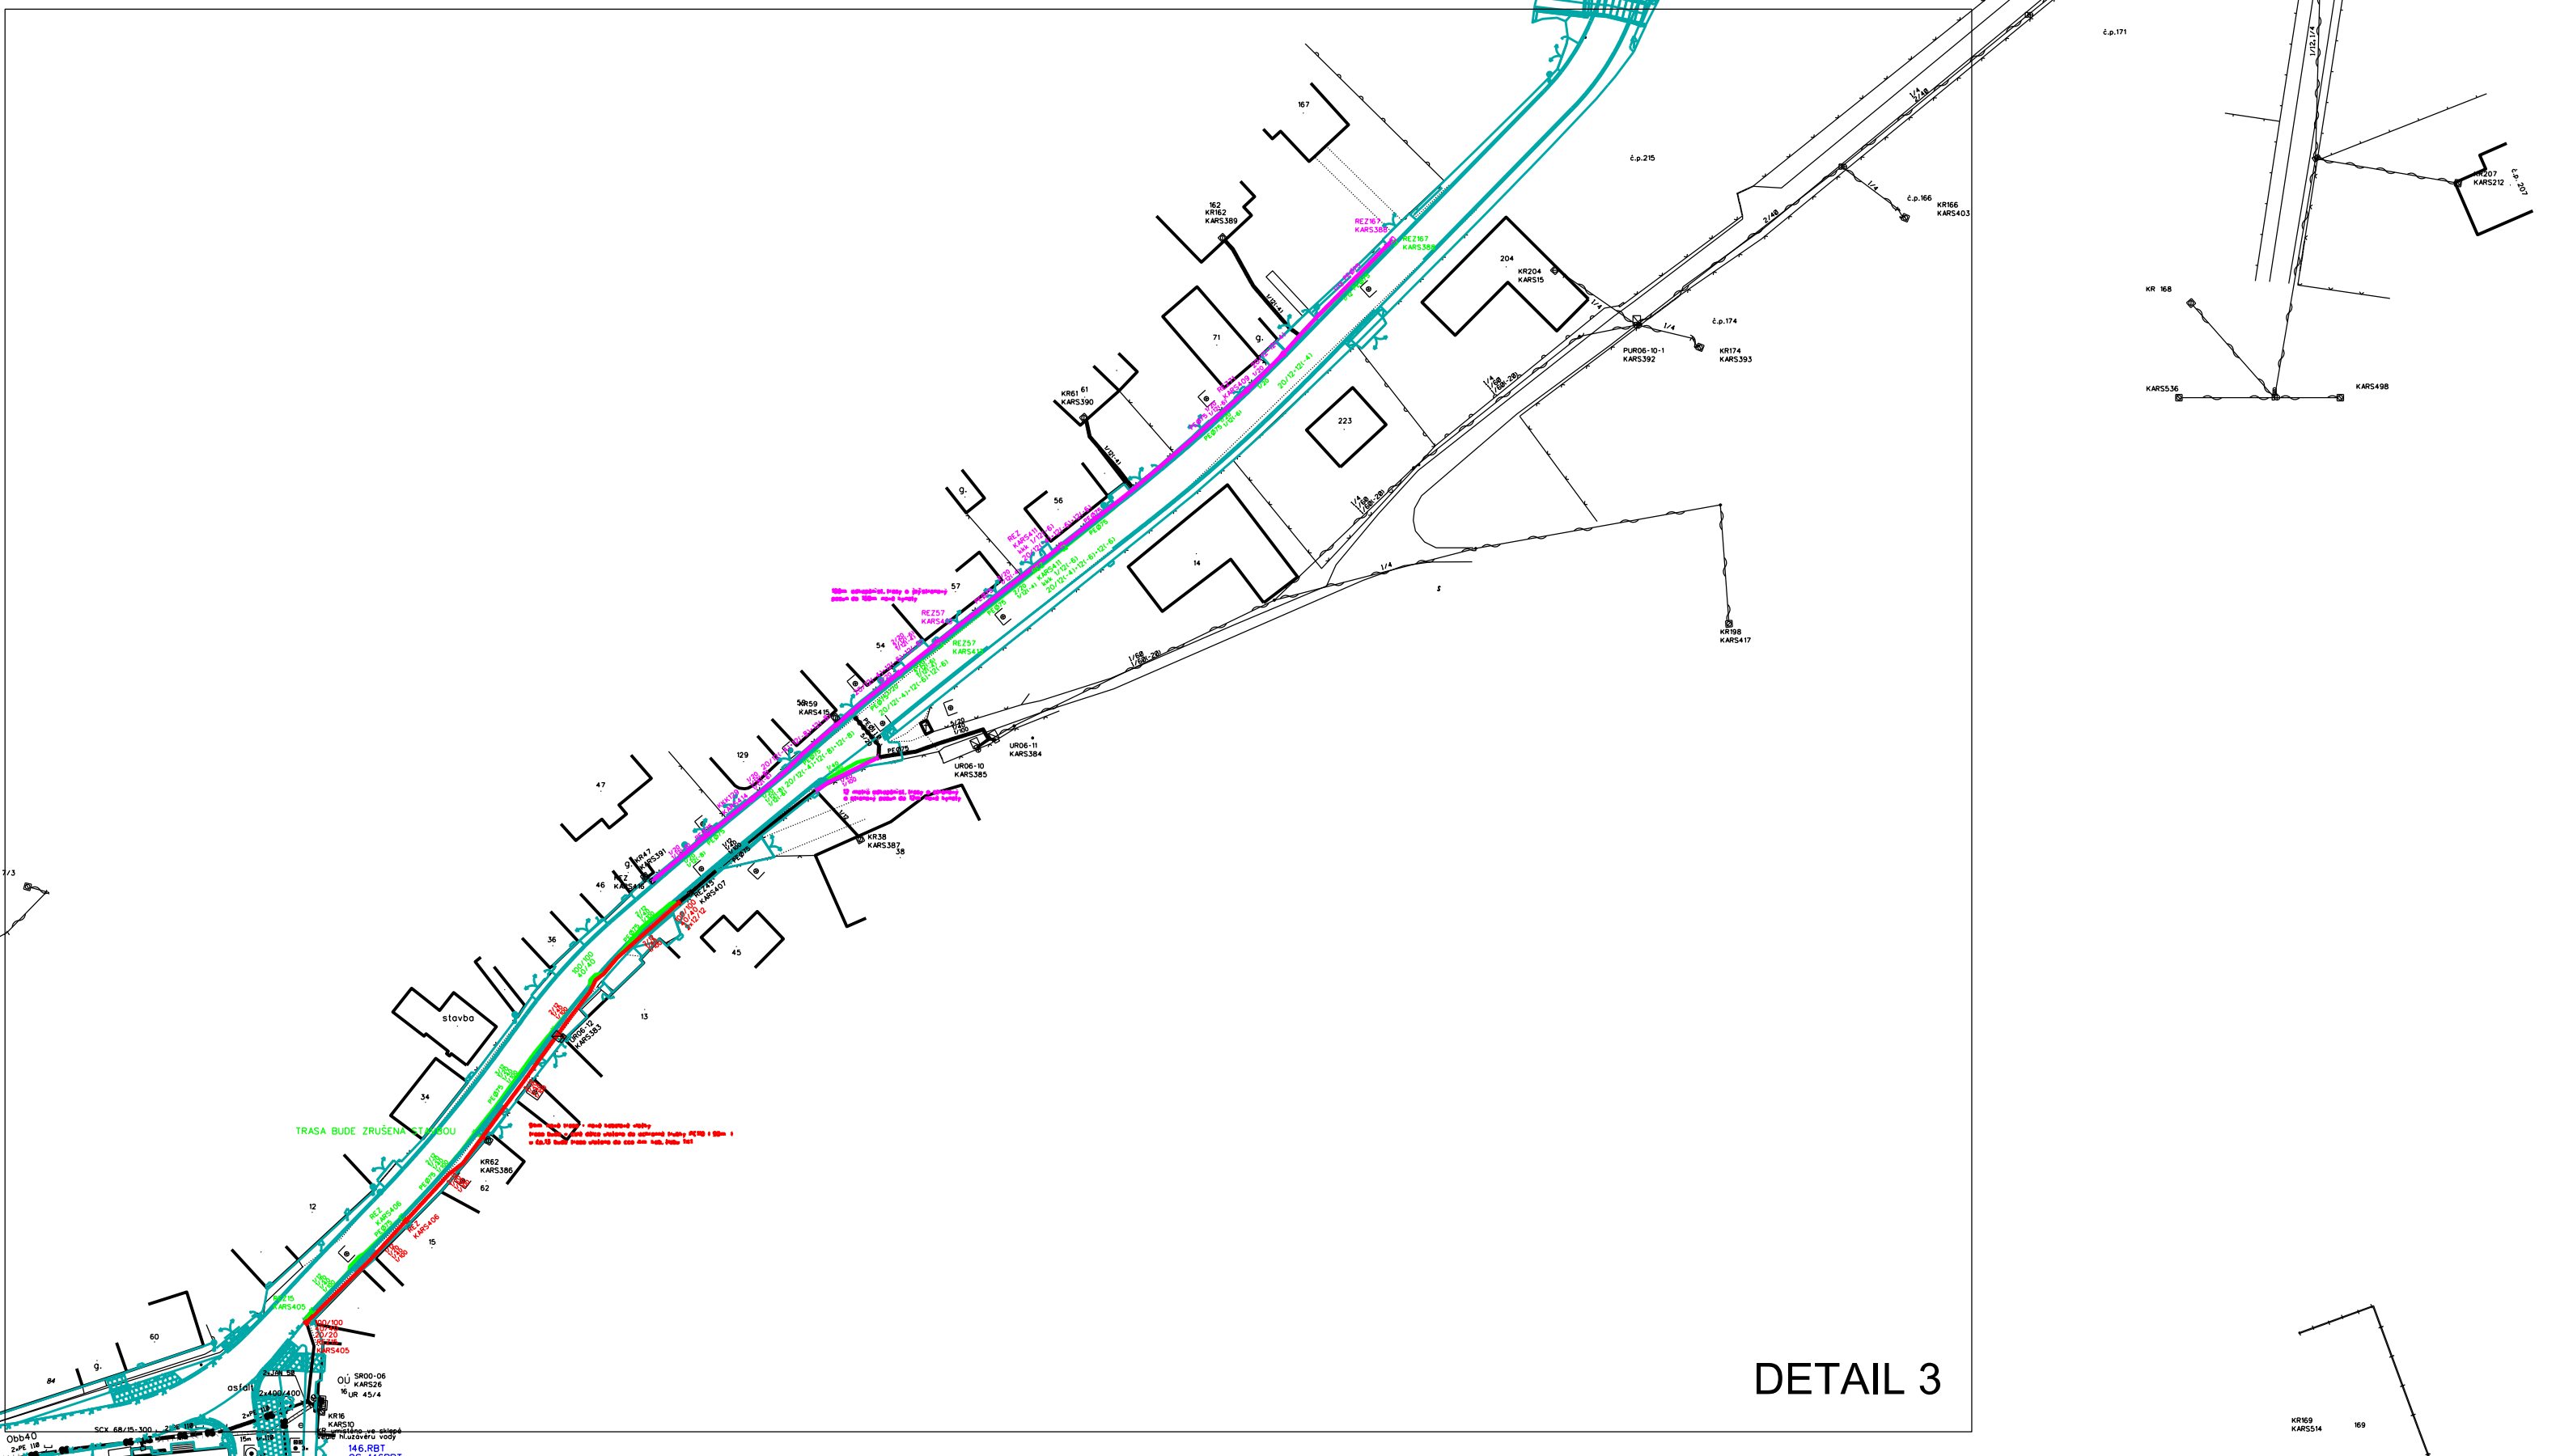

DETAIL 2

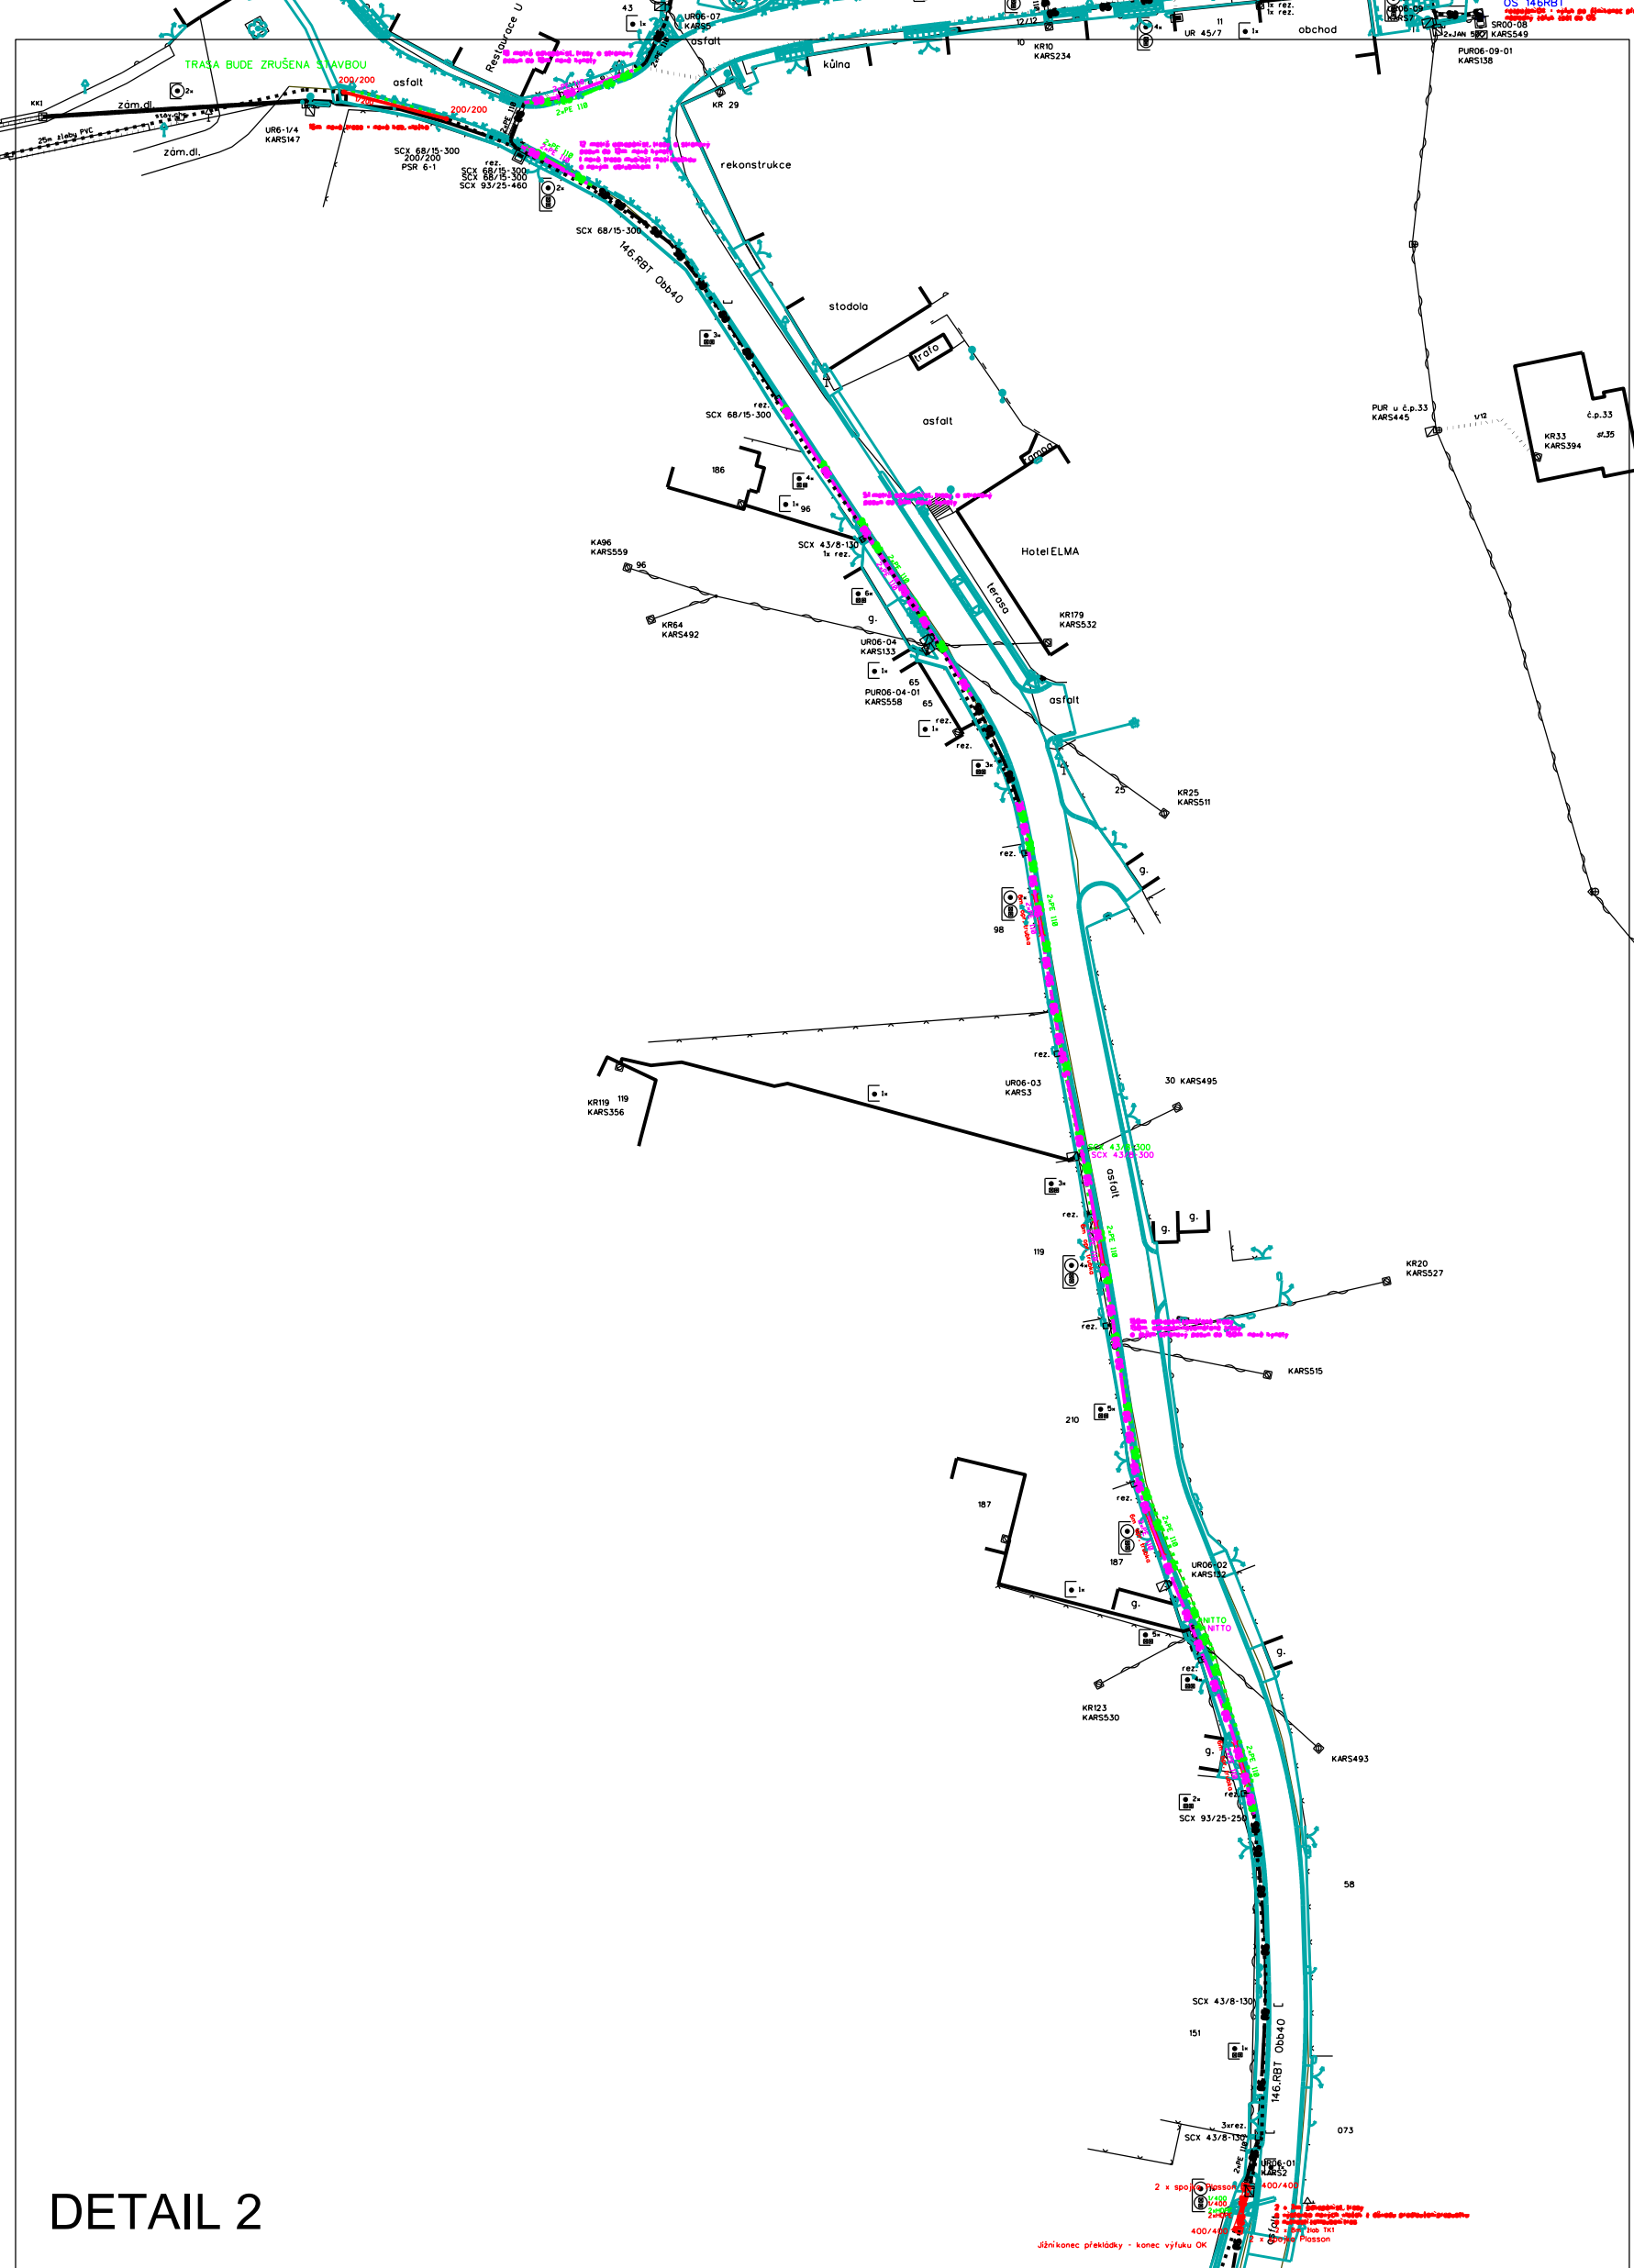

DETAIL 1

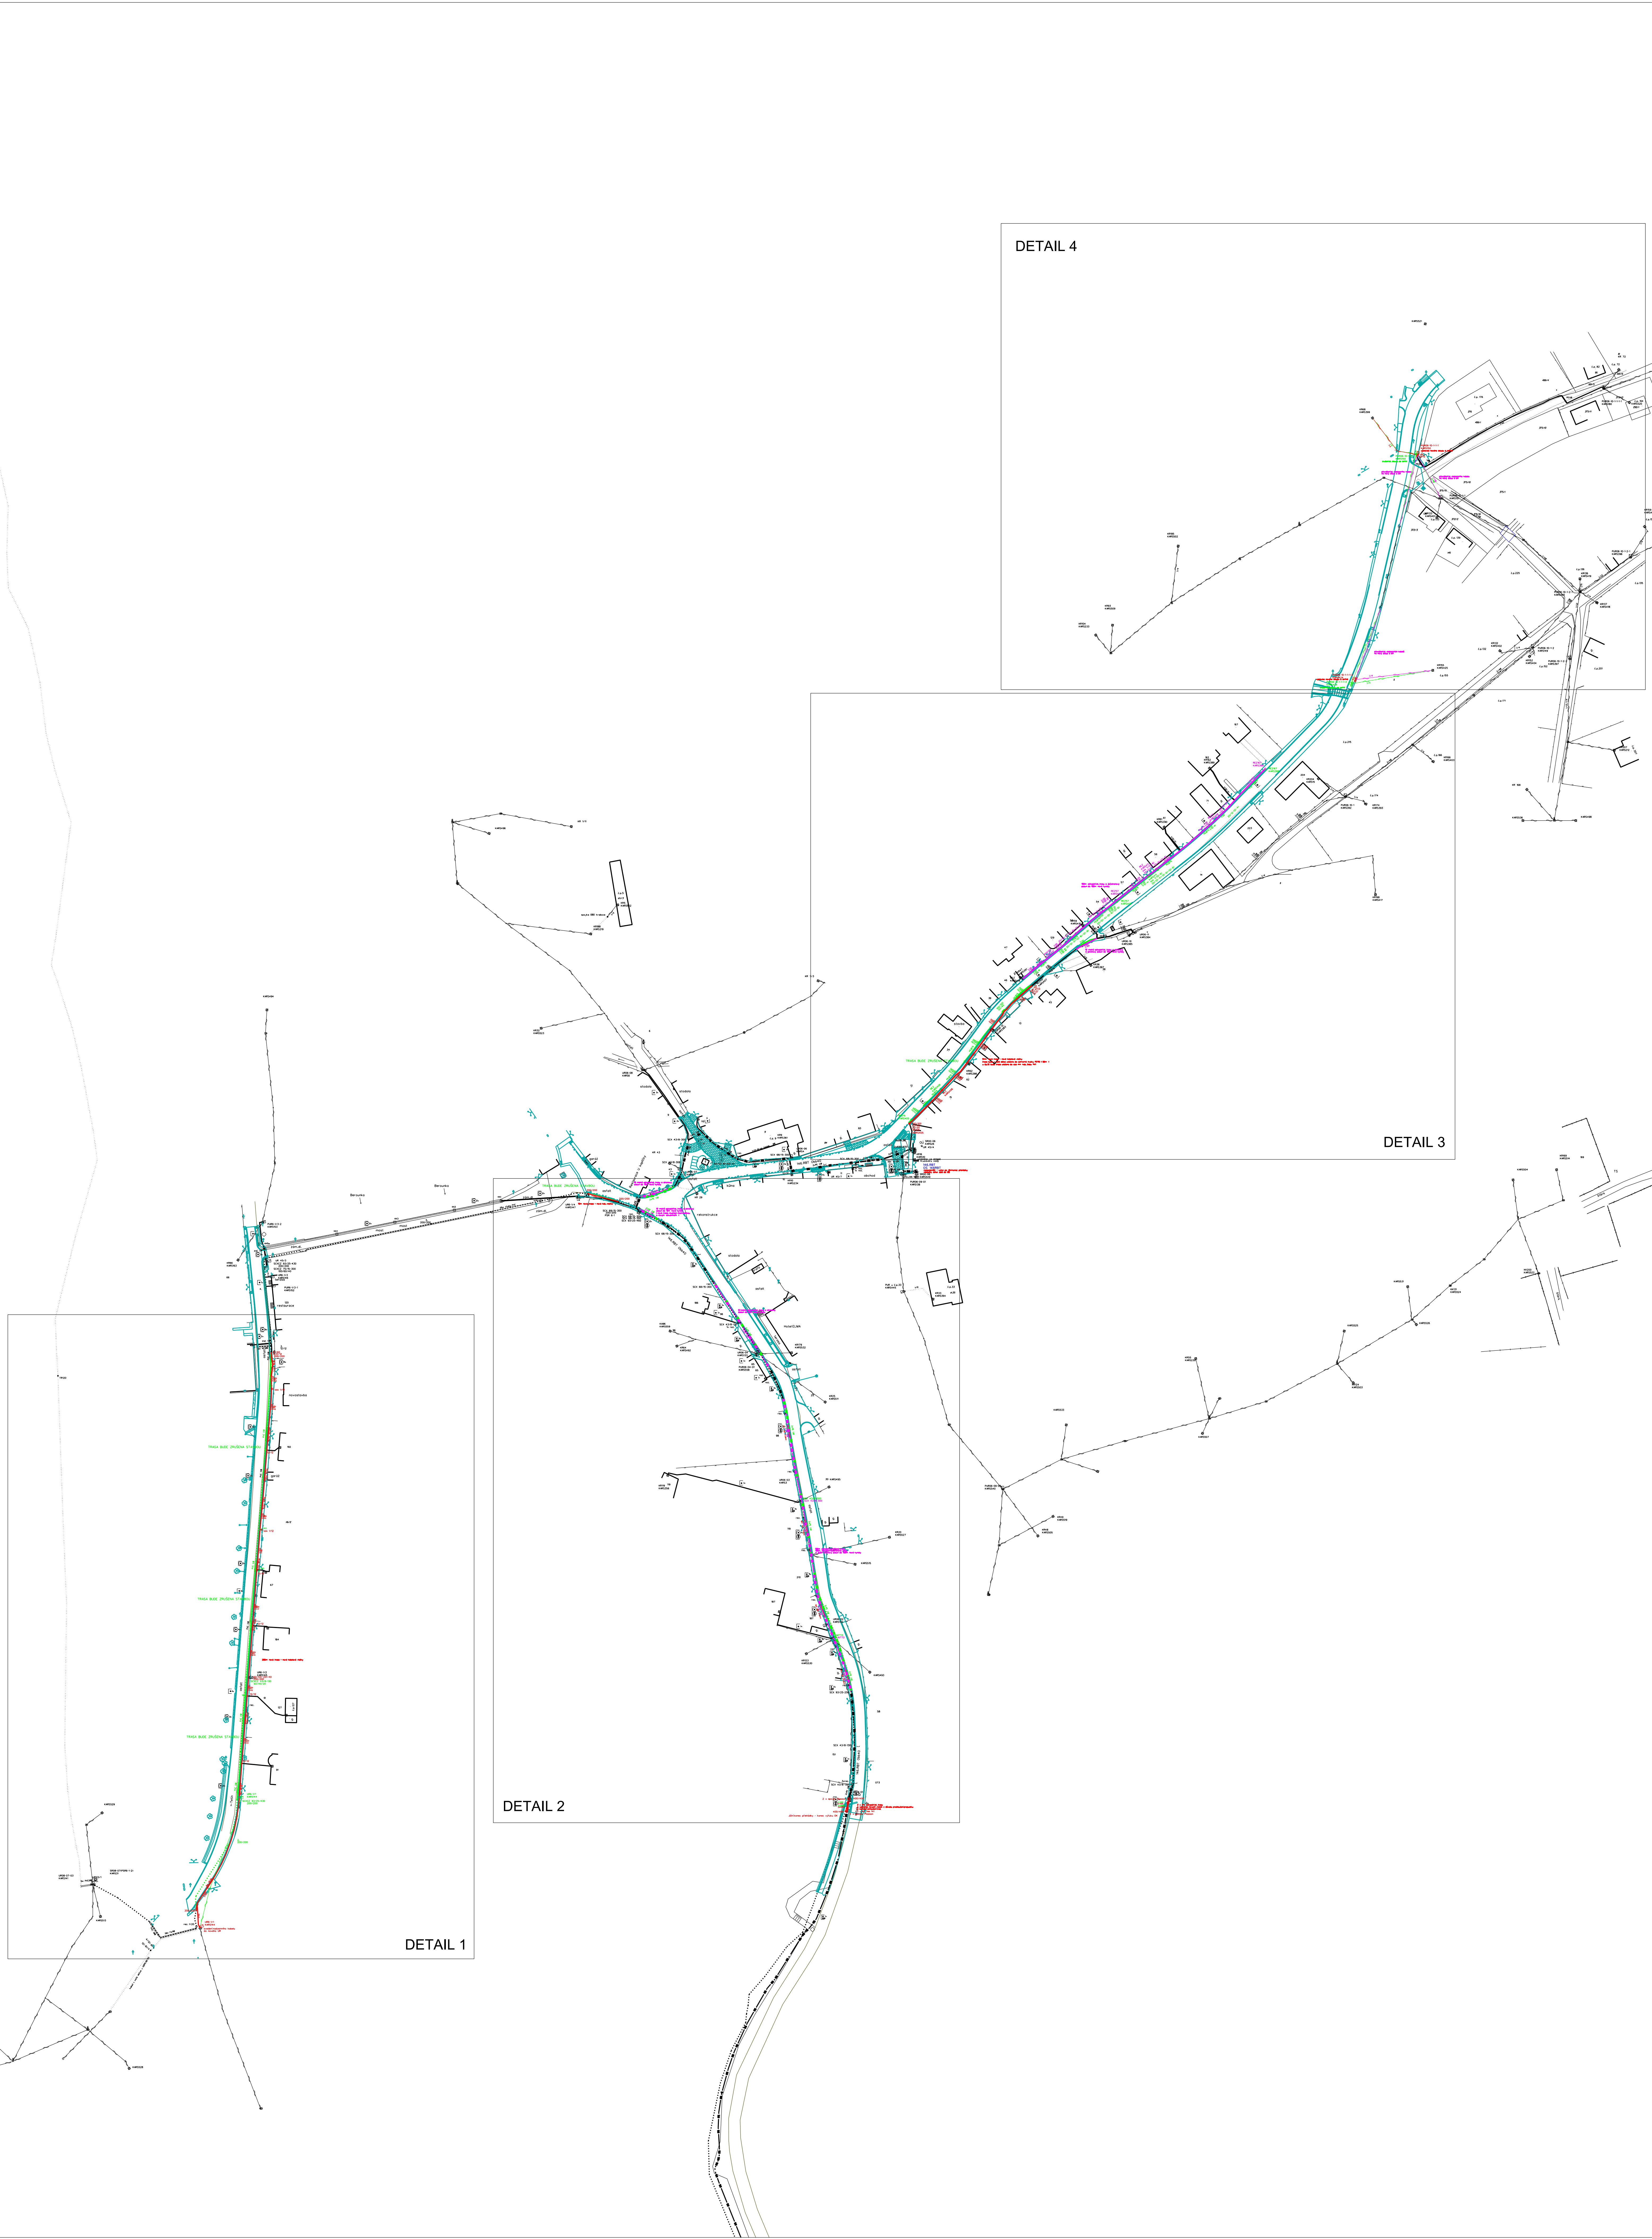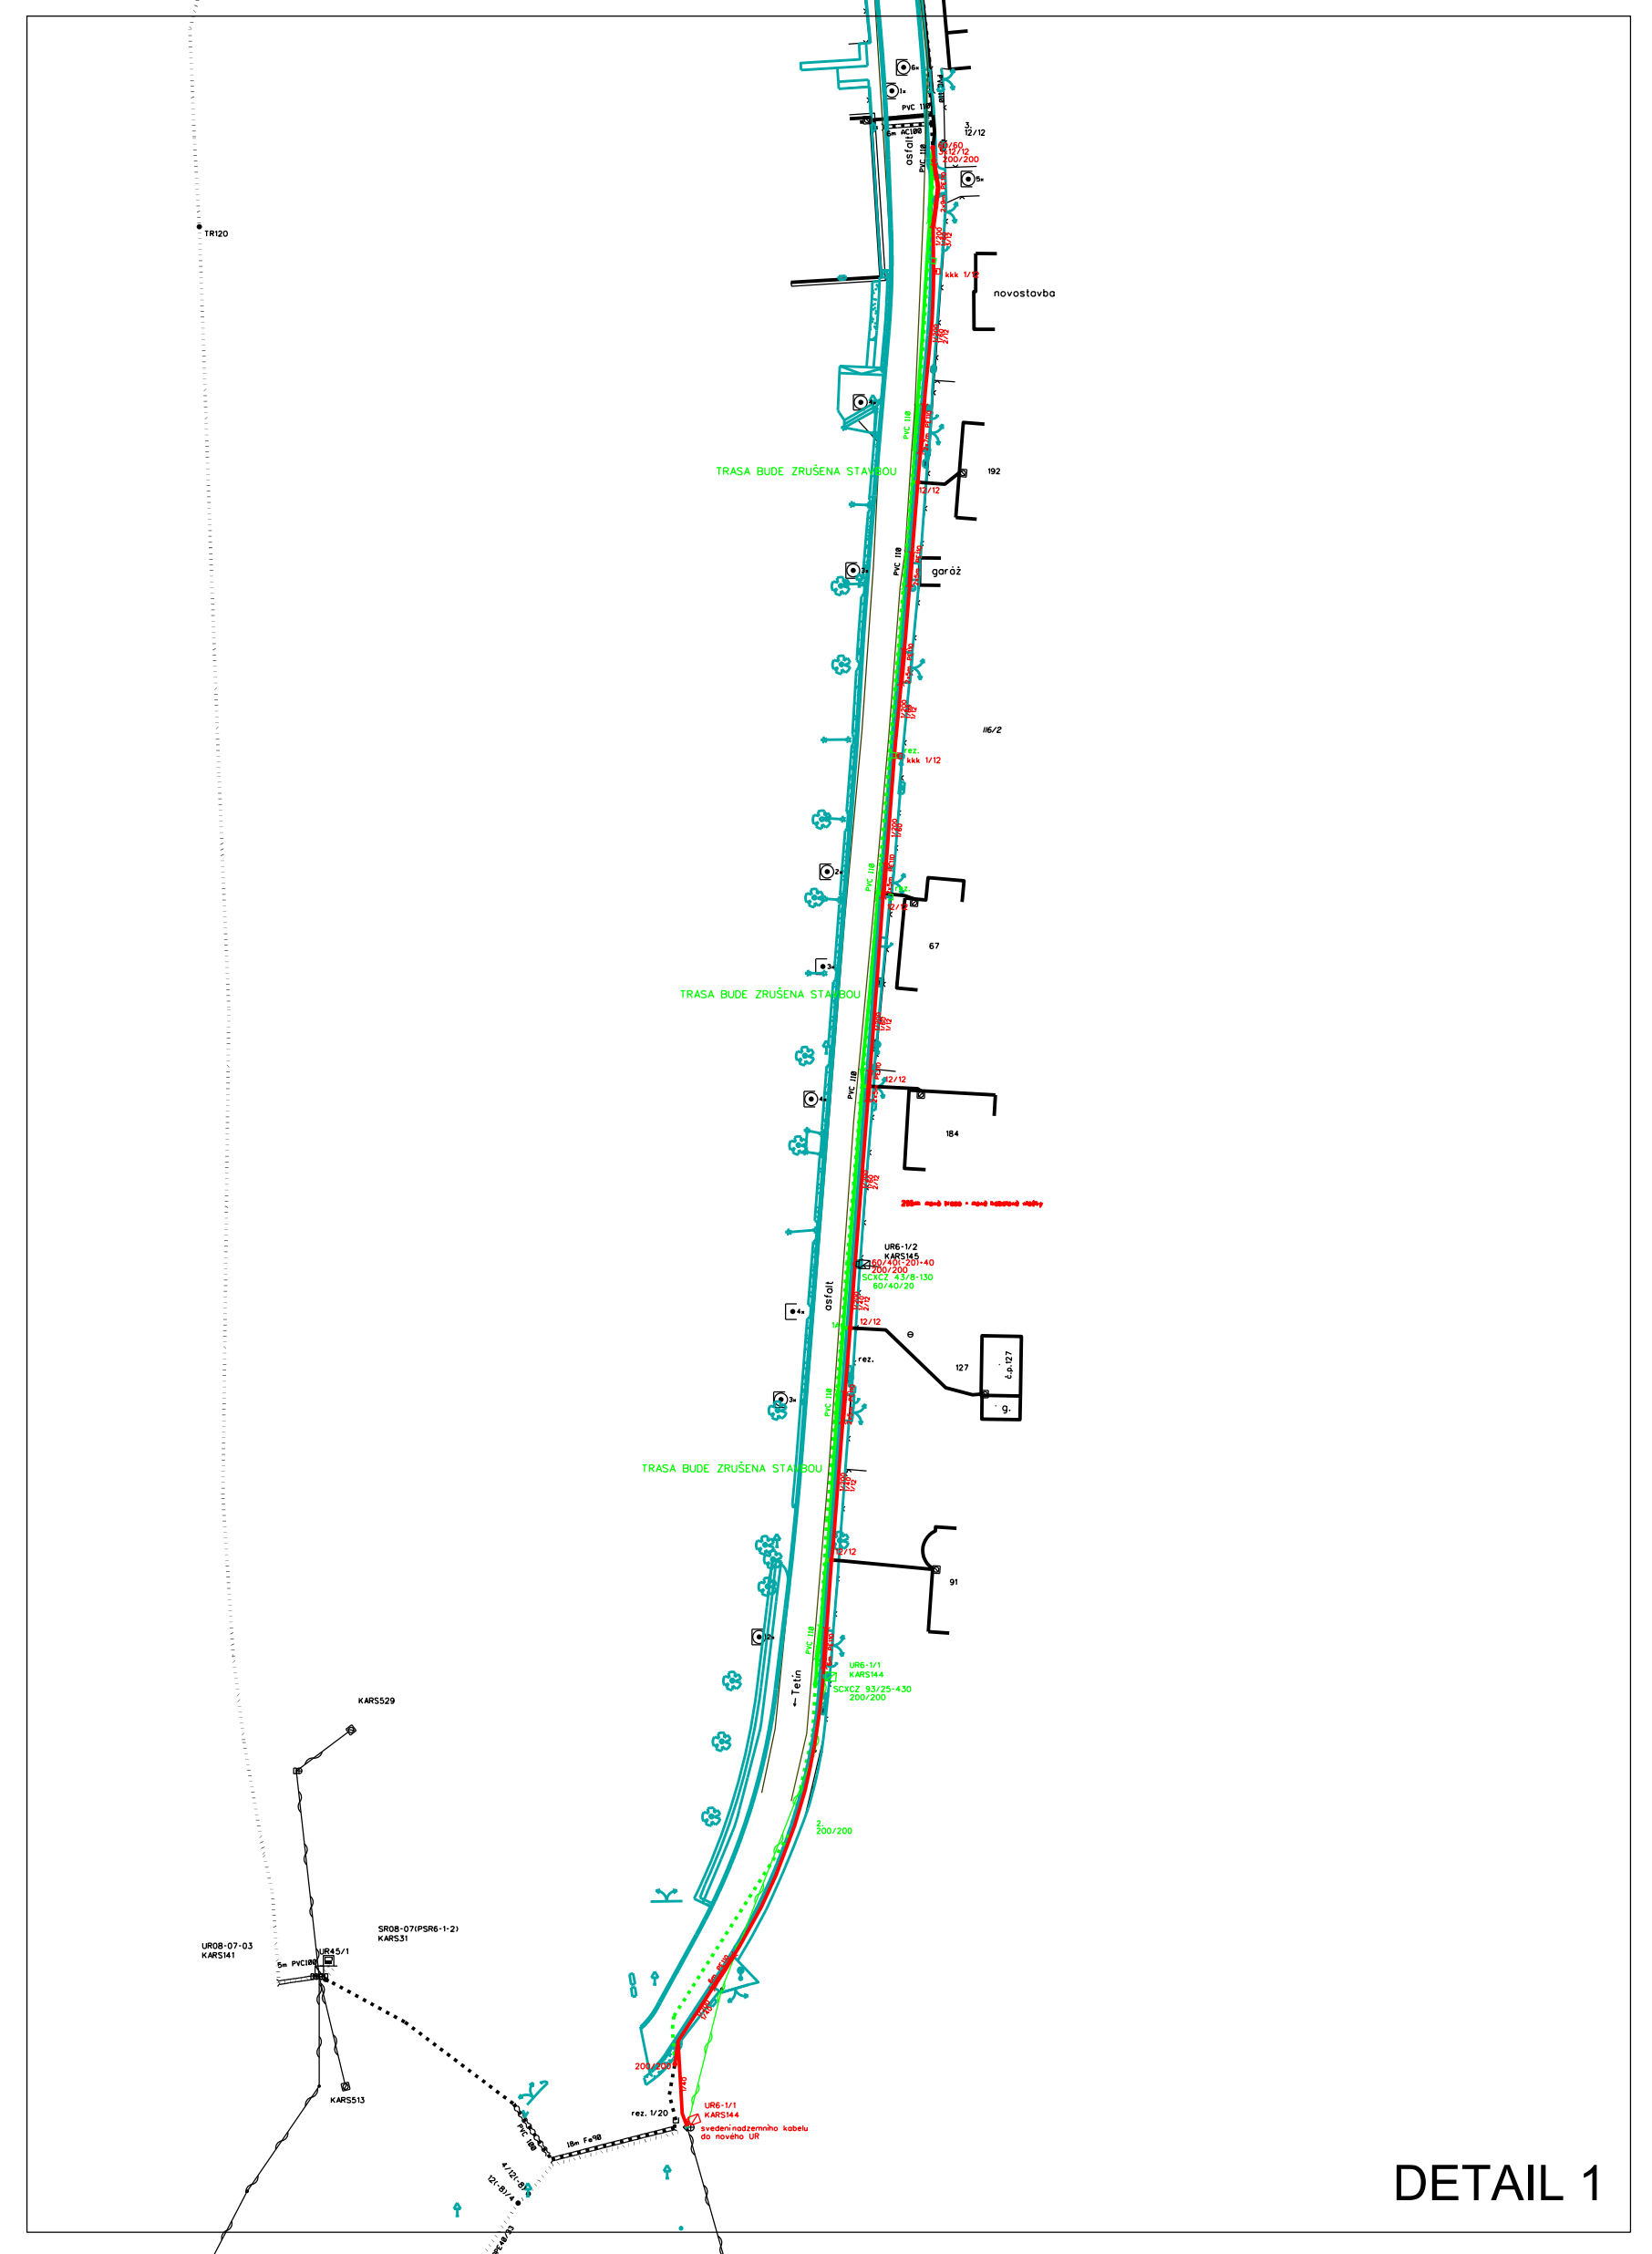

TR120

TRASA BUDE ZRUŠENA STAVBOU

novostavba

192

garáž

16/2

67

184

295m nová trasa - nové kabelové vložky

UR6-1/2
KARS143
60/40/203-40
200/200
SCXCZ 42/8-130
60/40/20

127

6.p.127

TRASA BUDE ZRUŠENA STAVBOU

91

UR6-1/1
KARS144
93/25-430
200/200

KARS529

UR08-07-03
KARS141

UR45/1

SR08-07(PSR6-1-2)
KARS31

KARS513

rez. 1/20
UR6-1/1
KARS144
svedení nadzemního kabelu
do nového UR

18m Fe90

4/12-51
DI-91/4

DETAIL 1



DETAIL 2

Jižní konec překládky - konec výřezu OK



DETAIL 3

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP--VEG - STAND. - 2021.01

Položková databáze: 2021.01

Název stavby: **VPI Srbsko II_116,III_11614 průtah**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: CETIN a.s.

Technické údaje:

KMVYK:	1.227	KMP:	54.626
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	1.535
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000
		KMTRU:	0.024
		KMOK:	1.062
		KMVL:	25.488
		KMTRK:	0.000

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	85,115.94 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	970,558.29 Kč
MONTÁŽ	354,099.30 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	29,018.55 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	29,896.19 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	16,694.40 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	133,361.44 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	3,288.17 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0.00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0.00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	434,238.58 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0.00 Kč
POPLATKY	1,000.00 Kč

Celkové náklady: 2,057,270.86 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST	1,792,080.53 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	265,190.33 Kč

PŘÍPRAVA	85,115.94 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	29,018.55 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	16,694.40 Kč
Příprava celkem	130,828.89 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
	PŘÍPRAVA		
958084	Návrh cenový a technický		1.00 ks
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě		47725.12 JV
954635	Získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby		25028.16 JV

ZEMNÍ PRÁCE

954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	184.00 m
952367 S	Pokládka žlabů TK1	20.00 m
955551 S	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	72.00 m
955550 S	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	180.00 m
955577 S	Rýha v chodníku 35/50-70	84.00 m
954961 S	Rýha v chodníku l.bet.35/50-70rozš.o10cm	320.00 m
952360 S	Rýha v chodníku litý beton 35/50-70	398.00 m
955578 S	Rýha v chodníku rozšíření o10cm	180.00 m
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100	654.00 m
954958 S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	1164.00 m
954955 S	Rýha vjezd litý asfalt 35/70-90	6.00 m
954967 S	Rýha vjezd litý bet. 35/70-90rozš.o 10cm	156.00 m
954957 S	Rýha vjezd litý beton 35/70-90	85.00 m
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	1227.00 m
951349 S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	36.00 ks

MONTÁŽ

955015 S	Demontáž samonos. kabelů do 5 XN	149.00 m
955016 S	Demontáž samonos. kabelů nad 5 XN	40.00 m
955010 S	Demontáž úložné trubky	462.00 m
955031 S	Demontáž úložných kabelů do 300 XN	231.00 m
955030 S	Demontáž úložných kabelů do 50 XN	82.00 m
955029 S	Demontáž úložných kabelů do15 XN	1132.00 m
958310 S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	4.00 ks
958314 S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	4.00 ks
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	71.00 ks
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	546.00 ks
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	8.00 ks
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	580.00 ks
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	15.00 ks
955288 S	Montáž koncovky SKH	4.00 ks
955299 S	Montáž objektu samost. SIS do 50 čtyřek	1.00 ks
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	7531.76 JV
	koordinace se stavbou	
955296 S	Montáž rozvaděče sloupového	2.00 ks
954981 S	Montáž samonosných kabelů do 5 XN	182.00 m
954982 S	Montáž samonosných kabelů nad 5 XN	40.00 m
955279 S	Montáž spojky smršt.dvoupl.do 50 čtyř.	10.00 ks
955280 S	Montáž spojky smršt.dvoupl.nad 50 čtyř.	3.00 ks
955282 S	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	6.00 ks
955281 S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	6.00 ks
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	4.00 ks
952602 S	Montáž trubky úložné	486.00 m
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	2190.00 m
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	243.00 m
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	510.00 m
955303 S	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	3.00 ks
958592 S	Provádění PEW v maintenance window	1.00 ks
958557 S	Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks
958331 S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti	24.00 ks

955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	78.00 ks	
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	21.00 ks	
955306 S	Úprava spojky	1.00 ks	
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV	
	uvedení stavby do provozu		
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	5.00 ks	
954988 S	Vystrojení dvojitého patkovaného stožáru	1.00 ks	
954985 S	Vystrojení jednoduchého patkov.stožáru	1.00 ks	
955028 S	Vystrojení na stávajících podpěrách - zrušení	5.00 ks	
954989 S	Vystrojení na stávajících podpěrách	3.00 ks	
958336 S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	1062.00 m	
958558 S	Zkouška trhací	1.00 ks	
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	
955027 S	Zrušení dvojitého patkovaného stožáru	1.00 ks	
955024 S	Zrušení jednoduch. patkovaného stožáru	1.00 ks	
955107 S	Zrušení rozvaděče sloupového	3.00 ks	
955022 S	Zrušení samonosných kabelů do 5 XN	110.00 m	
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	78.00 ks	
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	21.00 ks	
955012 S	Zrušení úložné trubky	20.00 m	
955042 S	Zrušení úložných kabelů do 300 XN	10.00 m	
955097 S	Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče	3.00 ks	
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA			
955191	Předměření trasy nad 1km	1227.00 m	
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE			
956283 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km	726.00 m	
956282 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	
955199 S	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	5.00 ks	
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	8.00 ks	
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene náhrady	88240.00 JV	
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	8.00 ks	
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	8.00 ks	
PROVOZNÍ PRÁCE			
958464 S	Montáž trubky opravné	24.00 ks	
955204 S	Zrušení převodu v rozvaděci - 1.pár	2.00 ks	
955205 S	Zrušení převodu v rozvaděci - další pár	3.00 ks	
955208 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	2.00 ks	
955209 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár	3.00 ks	
POPLATKY			
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	1000.00 JV	
Limitka materiálu			
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
306577 S	Bleskojistka třípólová 230V 10A/10kA		40.00 ks
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		441.00 ks

305833 S	Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m	12.00 kg
305789 S	Drát ocelový pozink. D 4,0 mm	0.90 kg
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	824.00 m
303777 S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	2600.00 m
322684 S	Hmota zalévací 3M GEL 8882 (2složk) 90ml	3.00 ks
315633 S	Hmoždina sloupová 16x16x30 cm	3.00 ks
319712 S	Kabel opt.LT MiDia FX+,24vl.AWFlex,7,6mm	1062.00 m
300122 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,6	12.00 m
300118 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,6	112.00 m
300120 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,6	102.00 m
300116 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,6	222.00 m
300121 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6	20.00 m
300117 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,6	72.00 m
300145 S	Kabel plastový TCEPKPFLEZE 10x4x0,6	148.00 m
300146 S	Kabel plastový TCEPKPFLEZE 15x4x0,6	174.00 m
300143 S	Kabel plastový TCEPKPFLEZE 3x4x0,6	330.00 m
300156 S	Kabel plastový TCEPKPFLEZE 50x4x0,8	306.00 m
300174 S	Kabel samonosný TCEKFLES 1x4x0,6	37.00 m
400299 S	Kapesníček čistící S 4557 - Z201 A 267	24.00 ks
316534 S	Koncovka smršť. SKH 2 9/20 mm	4.00 ks
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball	37.00 ks
312425 S	Modul konektor. 9700-10P	120.00 ks
309931 S	Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m	24.00 kg
305506 S	Patka stožárová EZP 16x20x290 cm	3.00 ks
305338 S	Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1	40.00 ks
308743 S	Sběrnice zemnicí 12-ti pólová	3.00 ks
306382 S	Skříň rozváděče MRS 20-QT 10-20p-na sloup	1.00 ks
306356 S	Skříň rozváděče MRS 3-QT 100p-na sloup	1.00 ks
306419 S	Skříň rozváděče SIS 1-QT 50p-sloupek	1.00 ks
301339 S	Sloup dřevěný 7m-impregnace Korasit CK	3.00 ks
407578 S	Souprava čistící 4413L	8.00 ks
320312 S	Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	1.00 ks
312845 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	3.00 ks
312863 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ	3.00 ks
312889 S	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	4.00 ks
303501 S	Spojka plastová 110/94 mm	19.00 ks
320294 S	Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460	2.00 ks
303003 S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	4.00 ks
322269 S	Spojka XAGA 500-43/8-150/EZE	8.00 ks
322268 S	Spojka XAGA 500-43/8-300/EZE	2.00 ks
322270 S	Spojka XAGA 500-75/15-400/EZE	3.00 ks
313998 S	Svorka kabelová SH2 pro up. samon.kabelů	5.00 ks
309974 S	Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm	1.00 ks
309992 S	Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm	2.00 ks
309380 S	Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400	10.00 ks
306824 S	Svorník M 20x370x90x25	2.00 ks
306843 S	Svorník M 20x410x90x25	9.00 ks
316090 S	Trubka HDPE 110/1000mm opravná půlená	24.00 ks
300027 S	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	12.00 m
300036 S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	12.00 m

302655 S	Trubka PE 110/3,5/6000mm	31.00 ks
308513 S	Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155	1.00 ks
303204 S	Vodič prop. SM-clip-volný B5 10114-B5U35	21.00 ks
315508 S	Vodič sděl. nf U 2x0,5 rudozelený	10.00 m
316282 S	Zámek skříně 1370 L2 Praha-11342	3.00 ks
302289 S	Zásobník blesk. SID-C 3 pól. 79126-51000	4.00 ks
309814 S	Zemnič tyčový D25 1500 mm FeZn	6.00 ks
305195 S	Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1	20.00 ks
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný		
401646 S	Matice šestihránná M 16,0 ČSN 021601	5.00 ks
401706 S	Matice šestihránná M 20,0 ČSN 021601	22.00 ks
304267 S	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	24.00 ks
301685 S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	24.00 ks
404063 S	Podložka D 17 mm ČSN 021702	5.00 ks
404280 S	Podložka pérová D16,3 mm ČSN 021740	5.00 ks
404231 S	Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M20	22.00 ks
408324 S	Šroub s šestihr.hl. M16x180 ČSN021301	5.00 ks
314473 S	Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY)	30.00 m
402871 S	Vrut s šestihr.hl. 10x80 mm ČSN021810	6.00 ks

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

CETIN a.s.

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
zastoupená [], na základě pověření
(dále jen „**Nabyvatel**“)

a

[•]

se sídlem [•]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u [•]
IČO: [•]
DIČ: [•]
zastoupena [•]
(dále jen „**Převodce**“)

Nabyvatel a Převodce dále společně jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

dne, měsíce a roku níže uvedeného, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“) uzavírají tuto

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

(dále jen „**Dohoda**“)

1. PŘEDMĚT DOHODY

- 1.1 Převodce je na základě rozhodnutí o umístění stavby „[•]“, které bylo vydáno dne [•], [KÝM] pod čj. [•] a nabylo právní moci dne [•] (dále jen „**Rozhodnutí o umístění stavby**“) oprávněn k umístění [•] (dále jen „**Stavba**“). Rozhodnutí o umístění stavby je Přílohou č. 1 Dohody.
- 1.2 Předmětem převodu jsou některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to právo k umístění Stavby za podmínek v citovaném rozhodnutí stanovených, a dále s ním související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, tak jak jsou stanoveny v Rozhodnutí o umístění stavby.

2. PŘEVOD PRÁV

- 2.1 Převodce uzavřením Dohody, s účinností ke dni uzavření Dohody, převádí na Nabyvatele některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to toliko právo k umístění Stavby za podmínek v Rozhodnutí o umístění stavby stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Rozhodnutí o umístění stavby stanoveny.
- 2.2 Převodce se zavazuje postoupení písemně oznámit Správnímu orgánu nejpozději do

třiceti (30) pracovních dnů ode dne uzavření Dohody.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Dohoda, a práva a povinnosti Smluvních stran z Dohody vyplývající, se řídí právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem, a případné spory budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
- 3.2 Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani projev učiněný po uzavření Dohody, jež není v Dohodě uveden, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek ani jedné ze Smluvních stran.
- 3.3 Dohoda může být měněna nebo zrušena pouze písemně; změna jinou formou je vyloučena. Pojmem „písemně“ se pro účely Dohody rozumí předání zpráv v listinné podobě anebo prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zaručený elektronický podpis**“). Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv než výše uvedených.
- 3.4 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Dohody byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Dohody, ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 3.5 Dohoda nabývá platnosti a účinnosti v den jejího uzavření.
- 3.6 Dohoda je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení. / Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.
- 3.7 Smluvní strany ujednaly, že Dohodu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Dohoda je uzavřena doručením Dohody opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.
- 3.8 Následující Přílohy jsou nedílnou součástí Dohody:

Příloha č. 1 – Rozhodnutí o umístění stavby

Nabyvatel:

Převodce:

V _____ dne _____

V _____ dne _____

CETIN a.s.

[]

[]



Evidenční číslo: PŘ/2642/2020

POVĚŘENÍ

Obchodní korporace **CETIN a.s.**, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („**Společnost**“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje zaměstnance pana

Ing. Petra Holého Ph.D.

Ředitel, Provoz

os. č. 68453, nar. dne 25.9.1973, bytem Újezd u Svatého Kříže 67, PSČ 338 24
(„**Zaměstnanec**“)

adresa pro doručování: CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19,
Libeň, 190 00 Praha 9, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovny a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 ods.4 zákona č.127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě a smlouvy nájemní a podnájemní k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti,

- uzavíral veřejnoprávní smlouvy nahrazující správní rozhodnutí v oblasti výstavby sítí elektronických komunikací,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo ukončení shora uvedených právních vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku **5.000.000,- Kč** (slovy: pět milionů korun českých).

Dále je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy (i rámcové) o realizaci, jejich předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě Společnosti pro stavebníka ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku **20.000.000,- Kč** (slovy: dvacet milionů korun českých). Zároveň je oprávněn projednávat jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou, které nejsou uvedeny výše.

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající zrušenému závazku.

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 12.7.2021. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne 03-07-2020

CETIN a.s.
Představenstvo

.....
Ing. Juraj Šedivý
předseda představenstva

.....
Ing. Filip Cába
místopředseda představenstva

Ověření – legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy: *01/184, 212 / 2020*

Ověřuji, že:

Ing. Juraj Šedivý, nar. 23.2.1962-----

bydlištěm Diamantová 743/14, Slivenec, Praha 5-----

Filip Cába, nar. 22.5.1974-----

bydlištěm Kaštanová 927, Buštěhrad-----

před notářem vlastnoručně podepsali tuto listinu-----

Totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy.----

V Praze dne

- 3 -07- 2020

Marcela Šrámková
notářská tajemnice
pověřená Mgr. Radimem Neubauerem
notářem v Praze, se sídlem
Praha 1, Kaprova 6

