
**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. UL 2021_0046**

mezi

CETIN a.s.

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov

Číslo smlouvy CETIN: UL 2021_0046
Číslo smlouvy stavebníka: 08PT-001176

SAP 8030002351
Registr smluv: ANO

Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „**Smlouva**“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) mezi:

CETIN a.s.

Se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. B 20623
zastoupená [REDACTED]
ID DS: qa7425t
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**CETIN**“)

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
ID DS: zjq4rhz
zastoupená: [REDACTED] ředitelem Správy Chomutov, Kochova 3975,
430 01 Chomutov

(dále jen „**Stavebník**“)

(CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni také jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

DEFINICE

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy níže uvedený význam:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy.

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti související s Překládkou a nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, jedná se o zpracování CTN a činnosti uvedené v odst. 4.1 této Smlouvy.

Překládka je stavba v k.ú Česká Kamenice spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví CETIN a/nebo provedení zvýšené mechanické ochrany vedení SEK ve stávající trase, jejíž rozsah je specifikován v CTN.

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém

jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

Vyjádření o existenci SEK je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. ze dne 4.11.2020 vydané společností CETIN pod čj. 810538/20, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.
- 1.2 Stavebník na základě obdrženého Vyjádření o existenci SEK vyvolává, dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích, Překládku dotčené části SEK.
- 1.3 Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Česká Kamenice I/13 Pivovarská ul.**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených touto Smlouvou a závazek Stavebníka, jenž Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Vlastníkem SEK, přeložené na základě této Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.3 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN vůči Stavebníkovi odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

- 4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje v souladu se svými zákonnými povinnostmi po realizaci Překládky zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky a do 60 dnů ode dne určeného dle odst. 4.5 tohoto článku předat dokumentaci skutečného provedení Překládky Stavebníkovi, a to elektronicky ve formátu PDF či JPG na adresu elektronické pošty Stavebníka uvedenou v čl. 7 této smlouvy. Smluvní strany ujednaly a potvrzují si, že dokumentací skutečného provedení Překládky se rozumí geodetické zaměření nové trasy SEK, fotografie klíčových míst Překládky a technická zpráva o pokládce a montáži překládané SEK, dokumentace skutečného provedení Překládky není dokumentací skutečného provedení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
- 4.2 V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje před realizací Překládky písemně vyzvat společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (to vše dále „**Písemná výzva Stavebníka**“).

- 4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky (i) do tří (3) měsíců od doručení Písemné výzvy Stavebníka dle podmínek odst. 4.2 tohoto článku, a to za předpokladu, že ke dni doručení Písemné výzvy Stavebníka jsou splněny povinnosti uvedené v odst. 4.2 této Smlouvy, (ii) jinak nejpozději do tří (3) měsíců od jejich splnění.
- 4.4 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 této Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě této Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle této Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být případně zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.
- 4.5 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v odst. 8.2 této Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky s tím, že pokud Stavebník toto oznámení nepřevzme, pak dnem ukončení realizace Překládky je 5. den od odeslání tohoto oznámení společností CETIN Stavebníkovi.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN ke dni uzavření této Smlouvy činí **396 608,00 Kč** (slovy: tři sta devadesát šest tisíc šest set osm korun českých) (dále jen „**Náklady překládky stanovené na základě CTN**“). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN.
- 5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společností CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě CTN.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníků Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání

- potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
 - (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
 - (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
 - (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
 - (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
 - (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2 této Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě faktury vystavené společností CETIN po realizaci Překládky do 30 dnů ode dne doručení faktury.
- 6.2 Faktura dle odst. 6.1 této Smlouvy bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu odst. 4.5 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.
- 6.3 Faktura bude Stavebníkovi zasílána na adresu **Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov.**
- 6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných faktur vystavených společností CETIN.
- 6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti příslušné faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN

ve věcech smluvních: [REDACTED]
funkce: specialista pro výstavbu sítě
tel.: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]
funkce: specialista pro výstavbu sítě
tel. [REDACTED]

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: [REDACTED]
funkce: ředitel Správy Chomutov
tel.: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]
funkce: vedoucí úseku výstavby
tel.: [REDACTED]

8.3 Kontaktní údaje dle odst. 8.1 a 8.2 Smlouvy a dále též účetní údaje jedné ze Smluvních stran je tato Smluvní strana oprávněna měnit s účinností doručením změněného údaje na adresu druhé Smluvní strany v hlavičce této Smlouvy či na adresu sídla druhé Smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku.

9. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

9.1 Písemná výzva Stavebníka, učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 a 4.3 této Smlouvy, musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou let od uzavření této Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.

9.2 S ohledem na ustanovení odst. 9.1 tohoto článku tedy tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od jejího uzavření, aniž by byla v této lhůtě doručena společnosti CETIN řádná písemná výzva Stavebníka (učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 a odst. 4.3 této Smlouvy). V případě, že dojde k zániku Smlouvy touto rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným osobním údajům v pozici správce.

- 10.2 Účelem předání osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 10.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 10.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou.
- 10.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit **společnosti** CETIN potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy společností CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.
- 11.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 11.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
 - prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zaručený elektronický podpis**“);
 - e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
 - e-mailovou zprávou zaslánou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou

specifikovány v čl. 8 této Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 11.7, věty první Smlouvy a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmeny (c) a (d).

- 11.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.
- 11.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 11.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 11.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena.
- 11.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 11.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 11.10 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 11.11 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 11.12 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 11.13 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními

předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoliv souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

11.14 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.

11.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Specifikace Překládky

V Praze dne

V Chomutově dne


 Digitálně podepsal 
Datum: 2021.06.10 17:16:12
+02'00'


CETIN a.s.


Supervizor, Výstavba PPS Čechy

Ředitelství silnic a dálnic ČR,


ředitel Správy Chomutov

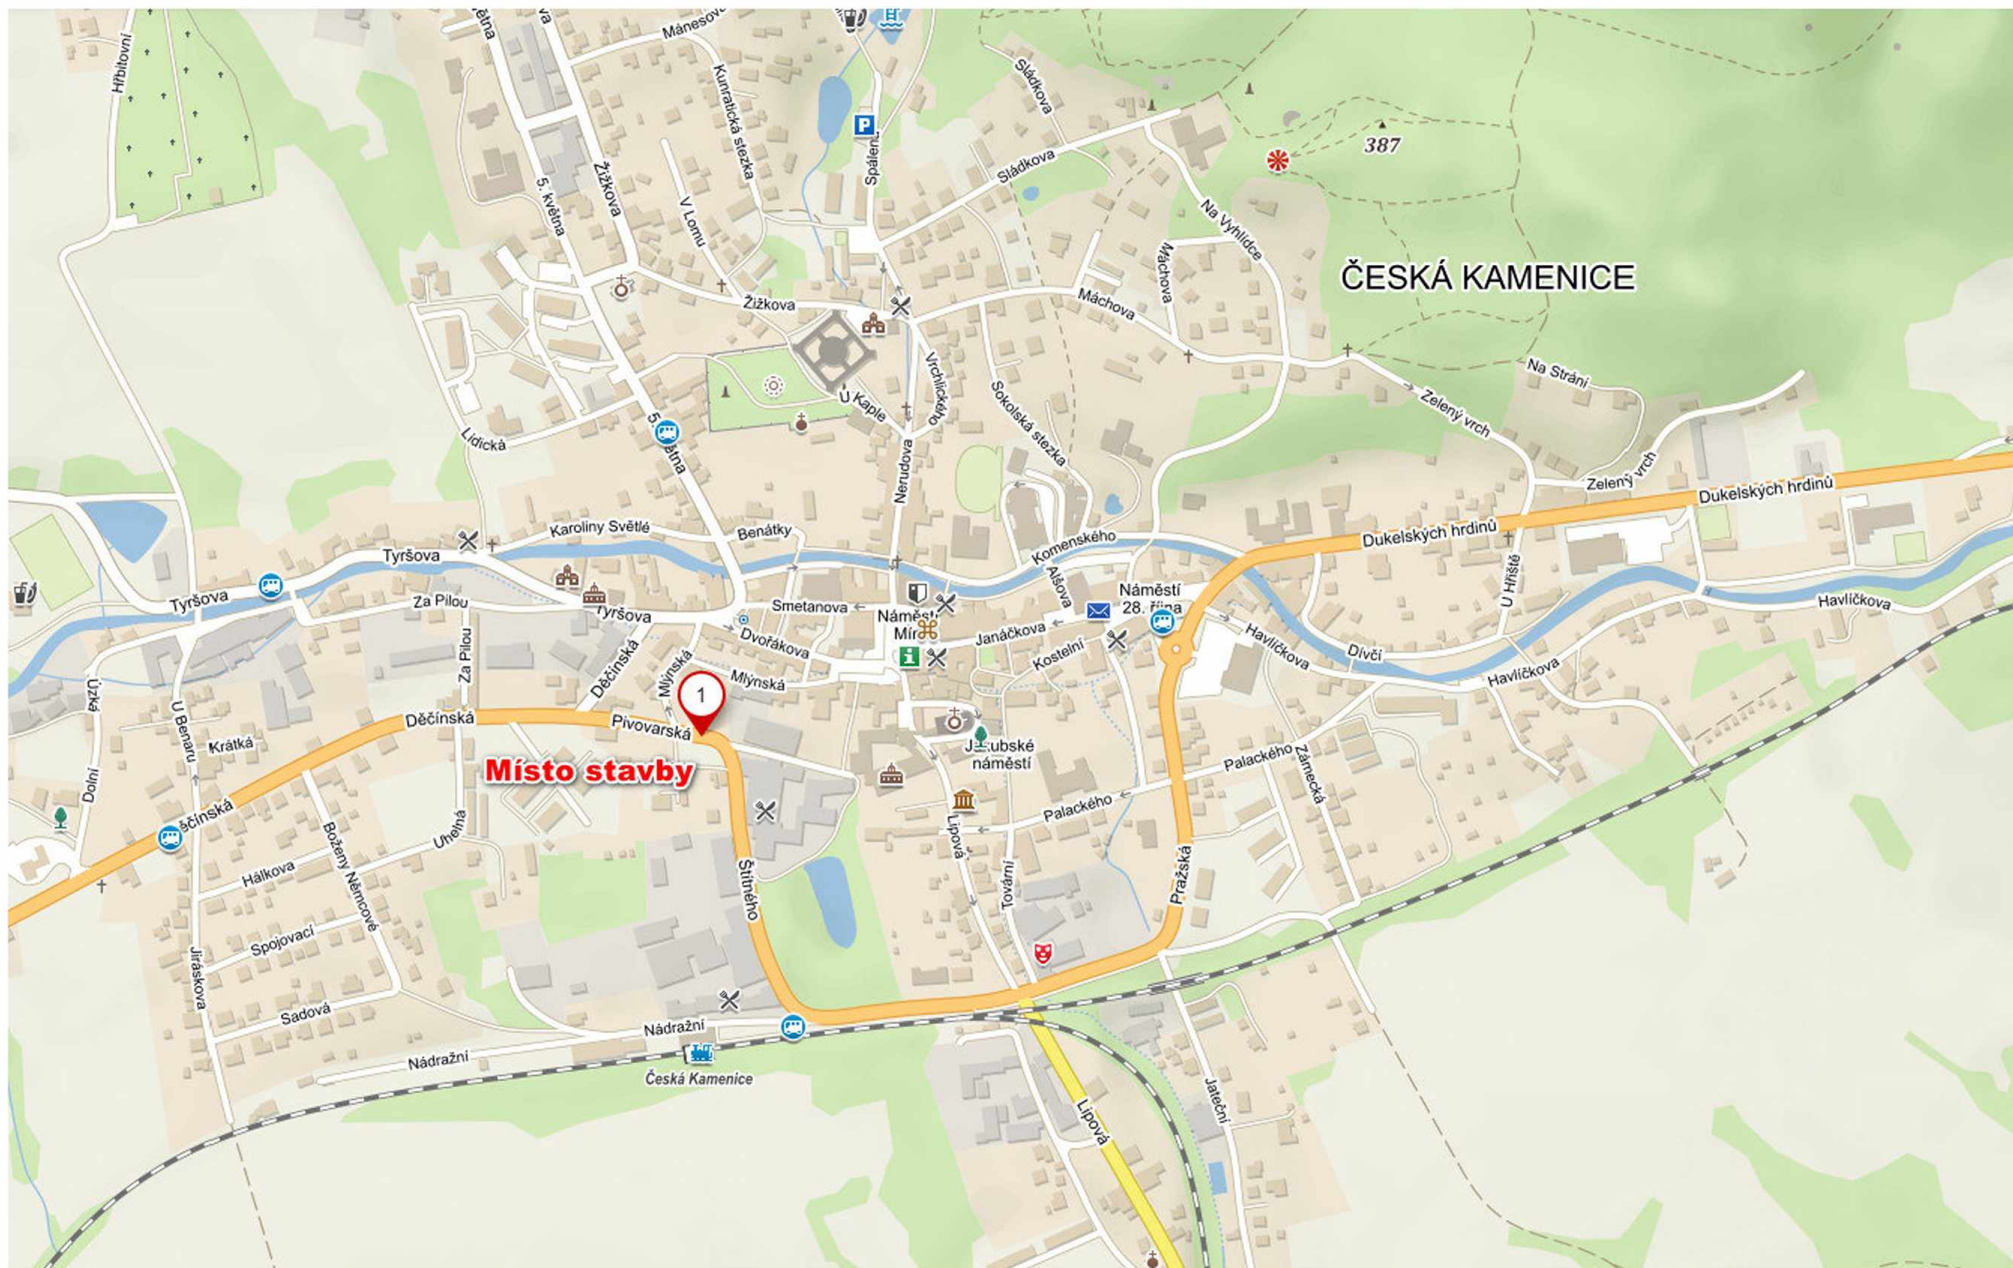

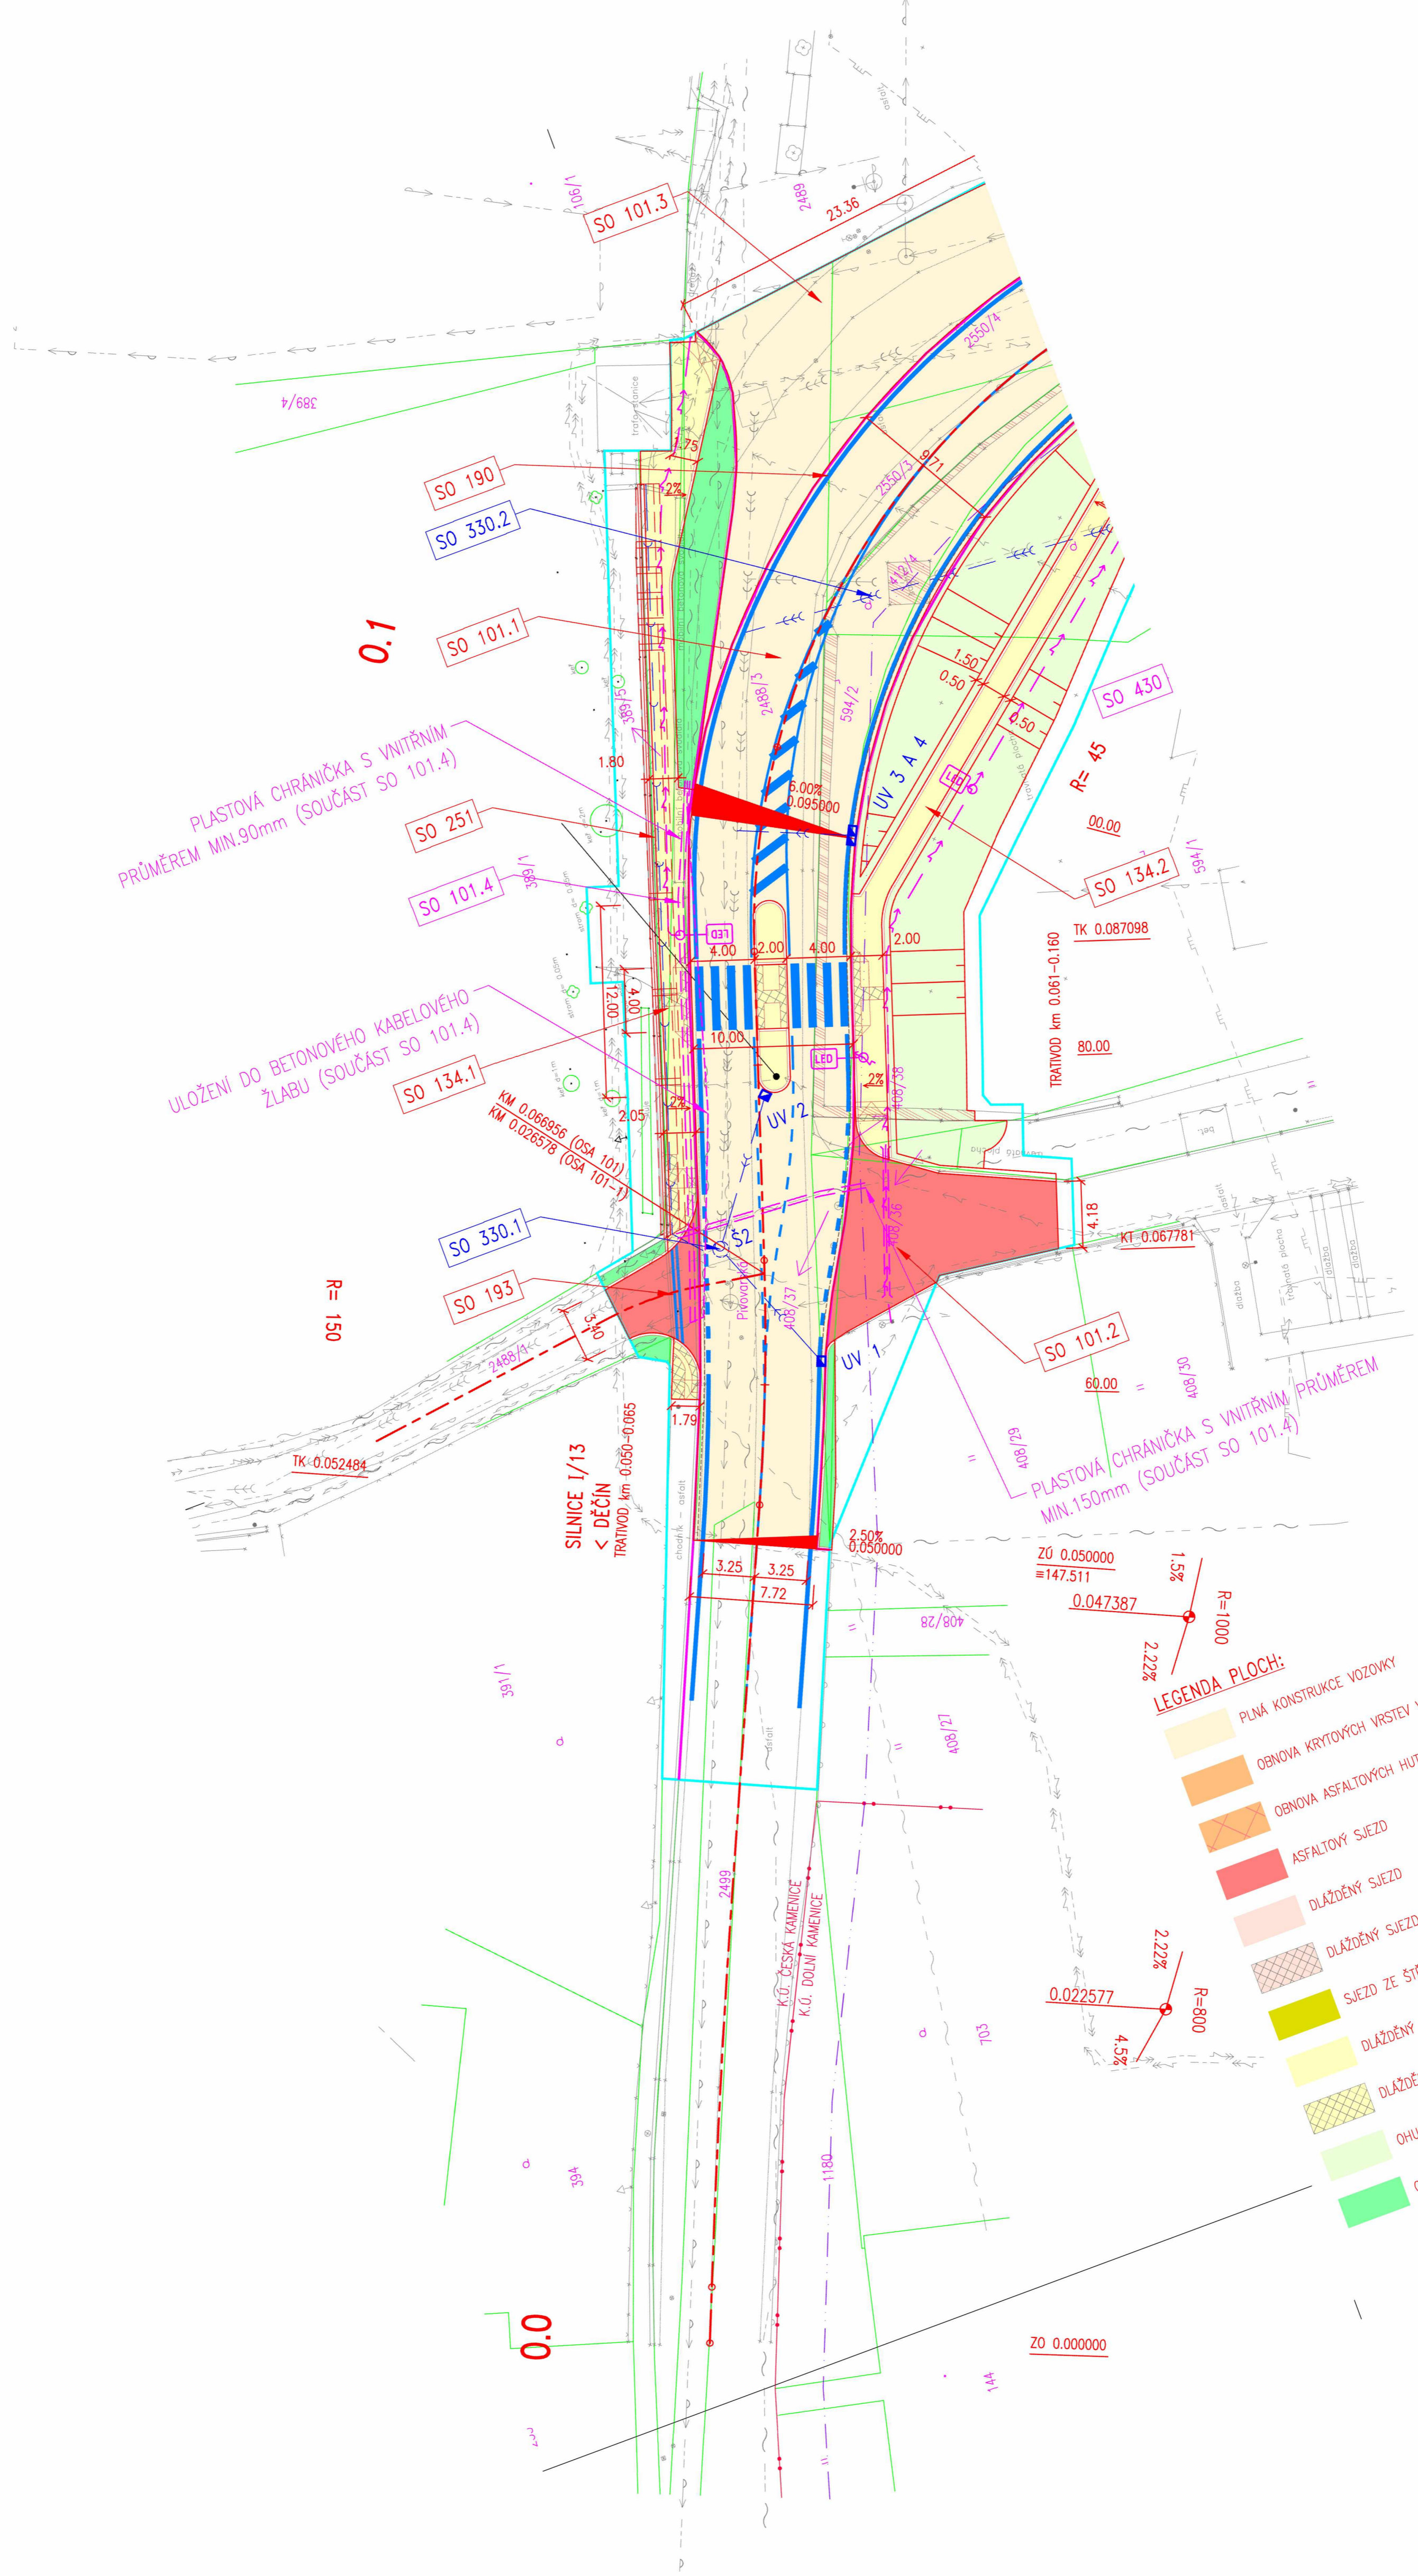

0.1

0.0

PLASTOVÁ CHRÁNIČKA S VNITŘNÍM PRŮMĚREM MN.90mm (SOUČÁST SO 101.4)

ULOŽENÍ DO BETONOVÉHO KABELOVÉHO ŽLABU (SOUČÁST SO 101.4)


PLASTOVÁ CHRÁNIČKA S VNITŘNÍM PRŮMĚREM MN.150mm (SOUČÁST SO 101.4)

SILNICE I/13 < DĚČÍN TRATIVOD, km 0.050-0.065

K.Ú. ČESKÁ KAMENICE K.Ú. DOLNÍ KAMENICE

LEGENDA PLOCH:

- PLNÁ KONSTRUKCE VOZOVKY
- OBNOVA KRYTOVÝCH VRSTEV VOZOVKY
- OBNOVA ASFALTOVÝCH HUTNĚNÝCH VRSTEV
- ASFALTOVÝ SJEZD
- DLÁŽĚNÝ SJEZD
- DLÁŽĚNÝ SJEZD - RELIEFNÍ DLÁŽBA
- SJEZD ZE ŠTĚRKODRTI
- DLÁŽĚNÝ CHODNÍK
- DLÁŽĚNÝ CHODNÍK - RELIEFNÍ DLÁŽBA
- OHUMUSOVÁNÍ VE SVAHU
- OHUMUSOVÁNÍ V ROVINĚ

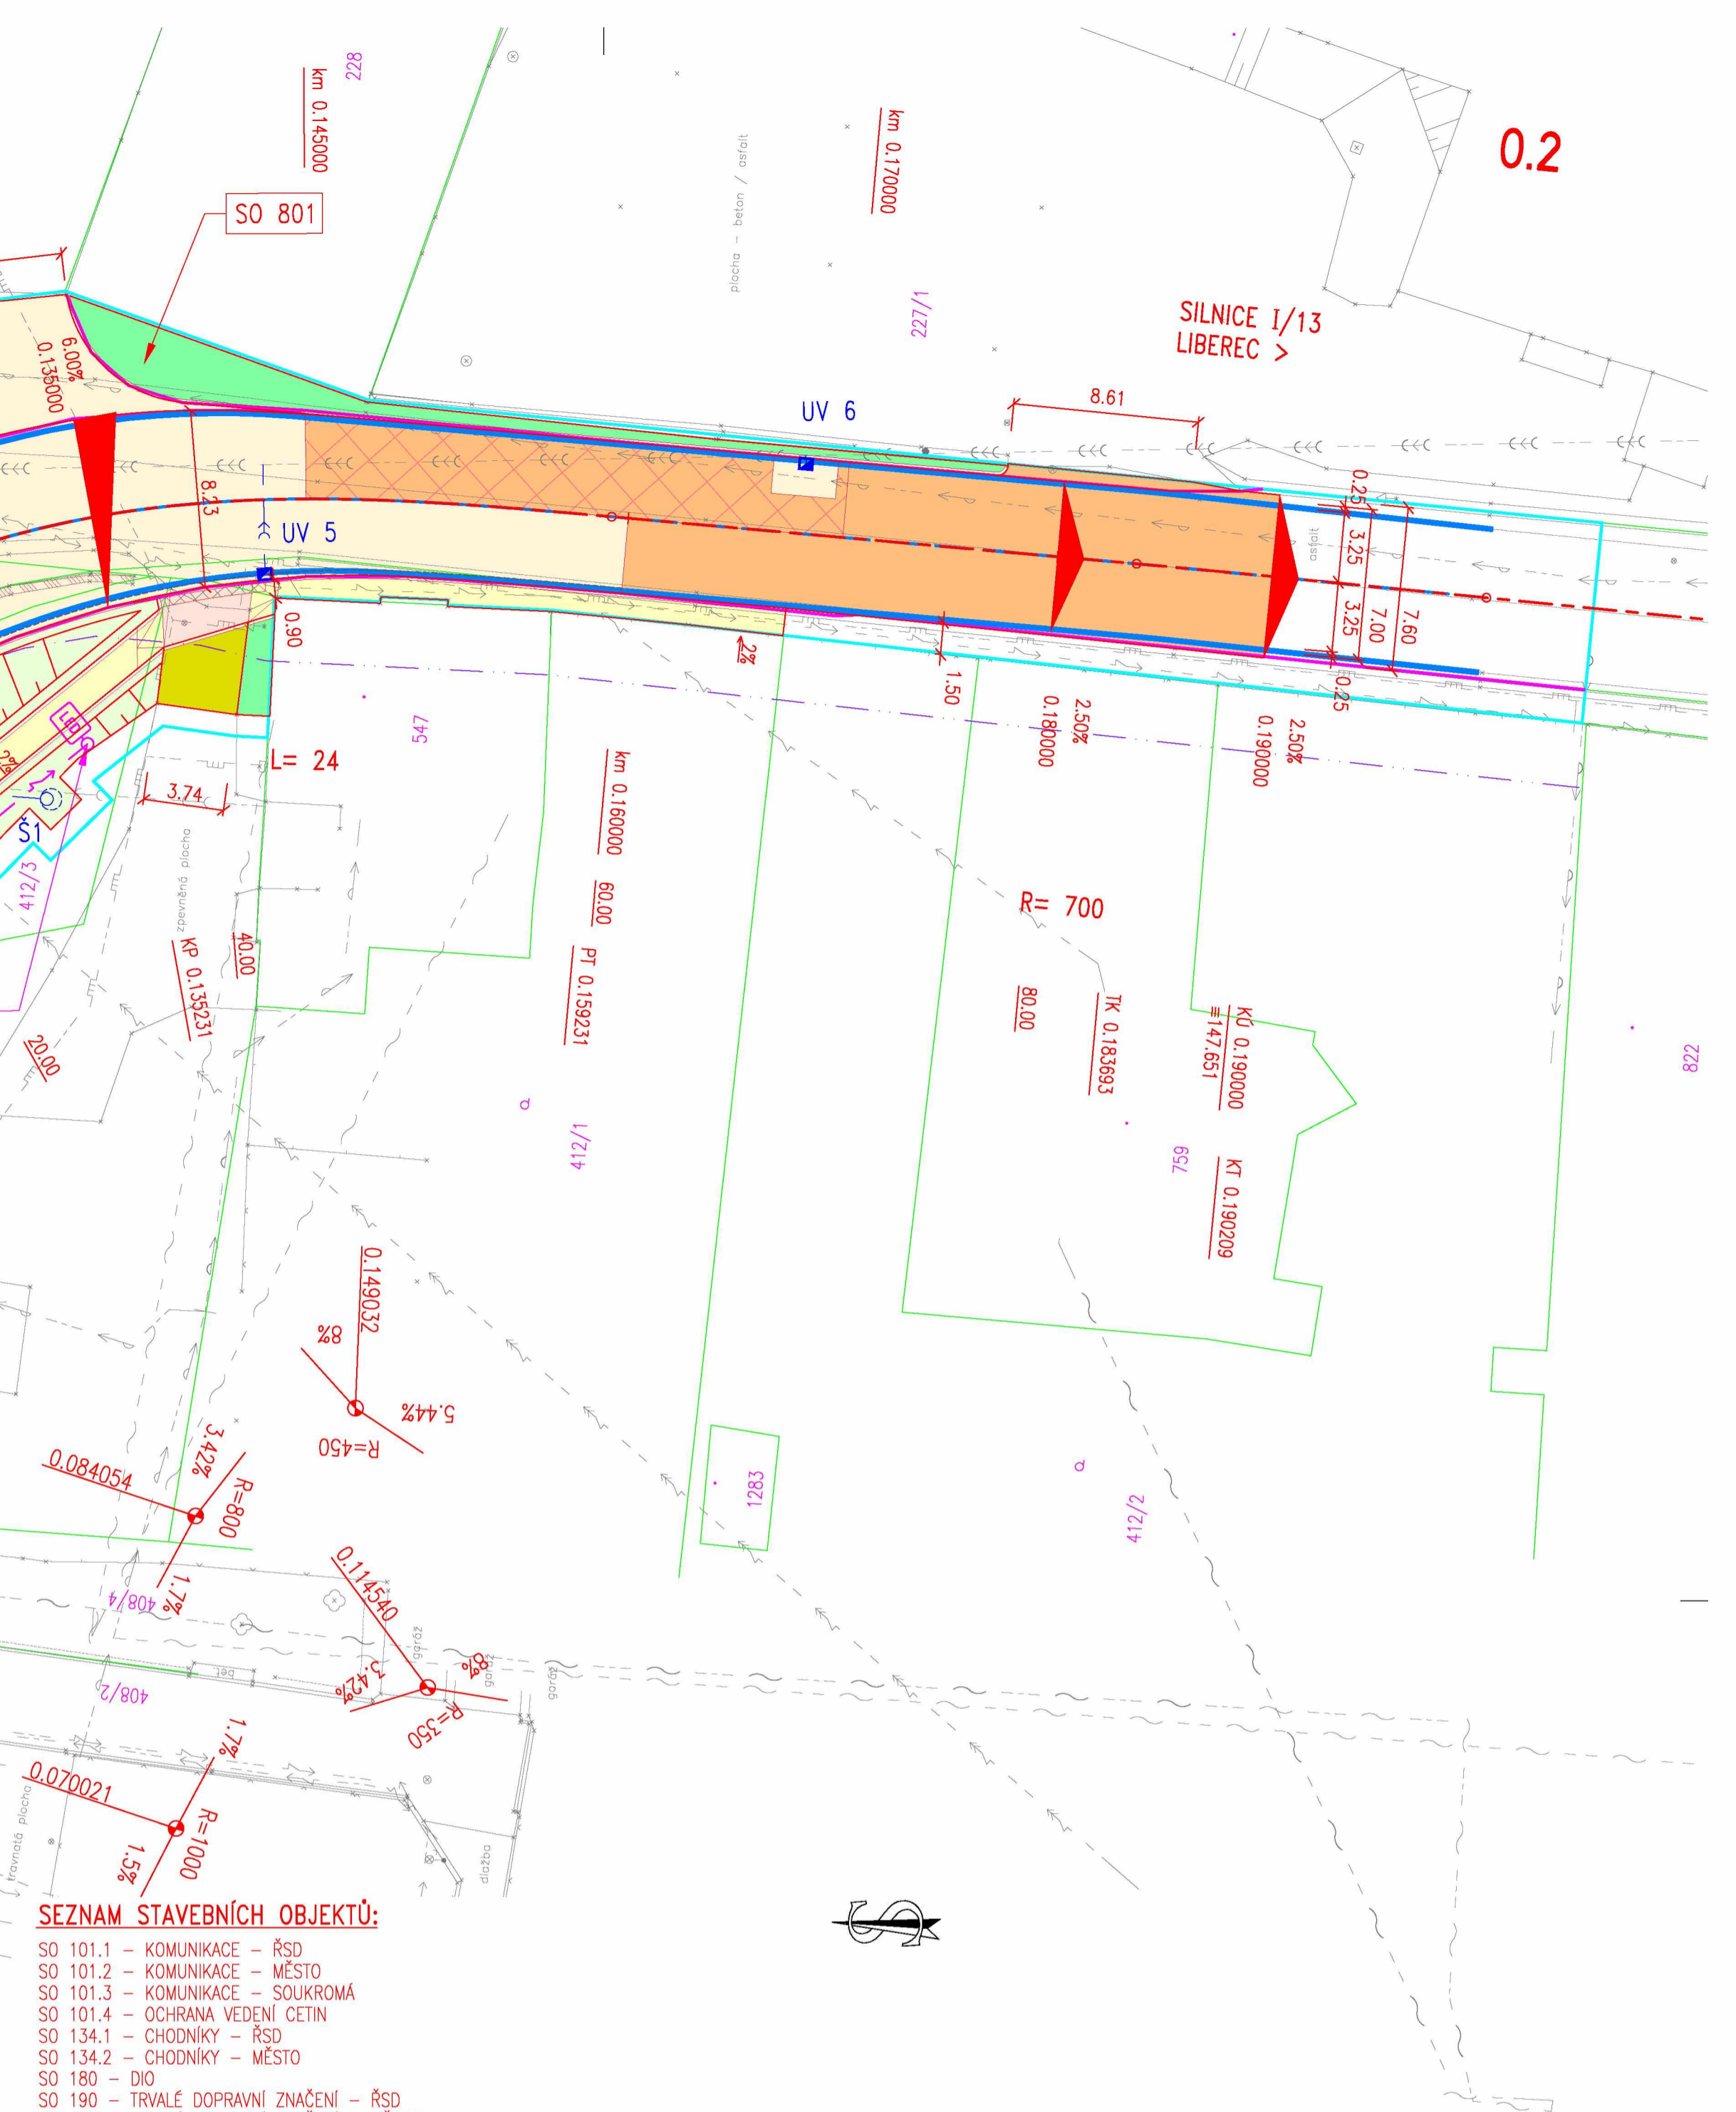

0.2

SILNICE I/13
LIBEREC >

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

- SO 101.1 - KOMUNIKACE - ŘSD
- SO 101.2 - KOMUNIKACE - MĚSTO
- SO 101.3 - KOMUNIKACE - SOUKROMÁ
- SO 101.4 - OCHRANA VEDENÍ CETIN
- SO 134.1 - CHODNÍKY - ŘSD
- SO 134.2 - CHODNÍKY - MĚSTO
- SO 180 - DIO
- SO 190 - TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ŘSD
- SO 193 - TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - MĚSTO
- SO 251 - OPĚRNÁ ZĚď
- SO 330.1 - ÚPRAVA PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - SČVK
- SO 330.2 - ÚPRAVA PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - SOUKROMÁ
- SO 430 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (NENÍ PŘEDMĚTEM DSP)
- SO 801 - SADOVÉ ÚPRAVY (NENÍ PŘEDMĚTEM DSP)

LEGENDA OCHRANNÝCH PÁSEM:

--- Hranice městské pam. zóny

LEGENDA:

- OBVOD STAVBY
- Hranice mezi správci

KATASTRÁLNÍ MAPA:

- 7143/7 Číslo a hranice parcely KN
- Hranice k.ú.


STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- Sdělovací vedení podzemní
- Silové vedení nn podzemní
- Silové vedení nn nadzemní
- Silové vedení vn podzemní
- Silové vedení vn nadzemní
- Vodovod podzemní
- Kanalizace jednotná podzemní
- Kanalizace splašková podzemní
- Plyn středotlak podzemní

POZNÁMKA:
ZÁKRESY STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. ZHOTOVITEL ZAJISTÍ PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ VYTÝČENÍ A OVĚŘENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH A NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. ZHOTOVITEL NESMÍ ZAHÁJIT VÝKOPOVÉ PRÁCE PŘED VYTÝČENÍM A OZNAČENÍM INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PODLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ. VÝKOPOVÉ PRÁCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT TAK, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ.

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
 NA PANKRÁCI 56, 145 05 - PRAHA 4
 správa Chomutov
 KOCHOVA 3975, 403 00 CHOMUTOV

I/13 Česká Kamenice, ul. Pivovarská - úprava komunikace a chodníků




Souřadnicový systém: S-JTSK
 Výškový systém: Bpv


AKTUALIZACE DSP

Číslo zakázky: 19 318 00	HIP:	
Schválil:	Zodp. projektant:	
Tech. kontrola:	Vypracoval:	

Objednatel: ŘSD ČR	Obec: Česká Kamenice	Kraj: Ústecký
Akce: I/13 ČESKÁ KAMENICE, UL. PIVOVARSKÁ - ÚPRAVA KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ	Datum: 07/2020	Stupeň: DSP
Část: C. STAVEBNÍ ČÁST	Souprava: Č. přílohy	
Příloha: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 1:250		C.3

Prázdné trubky PE uložené ve vozovce a chodníku
Ochrana trasy betonovými žlaby

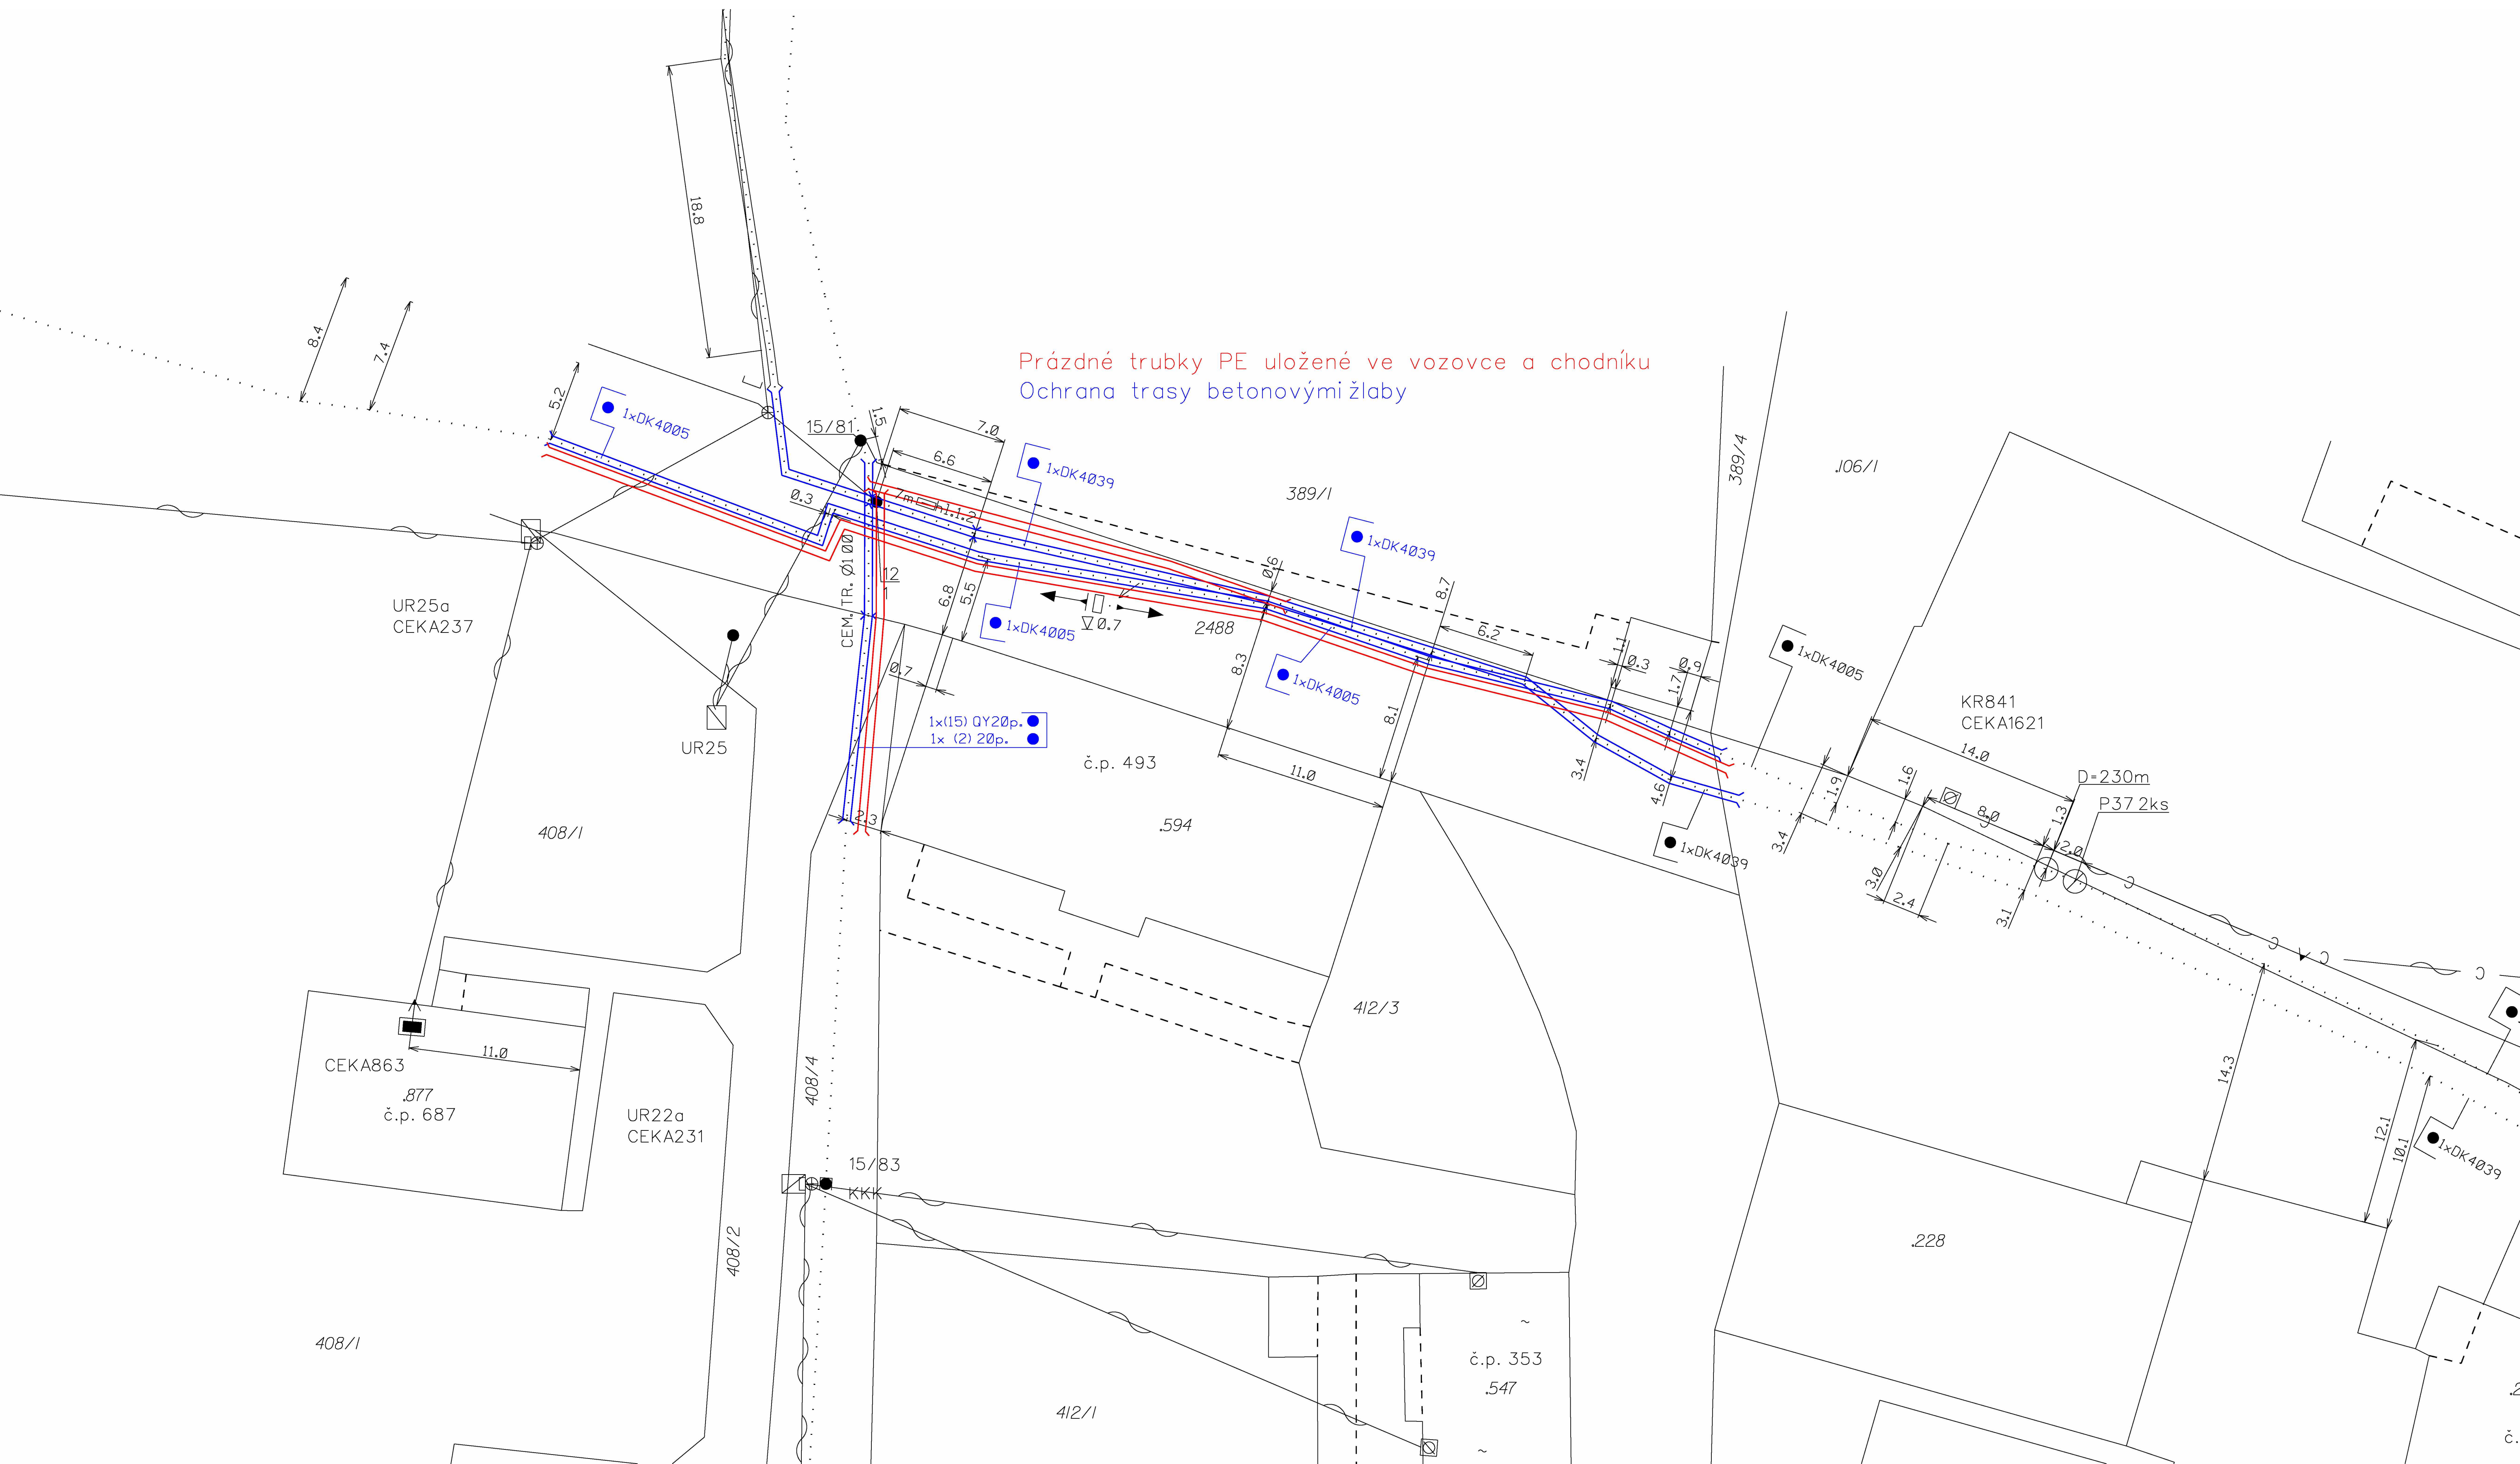

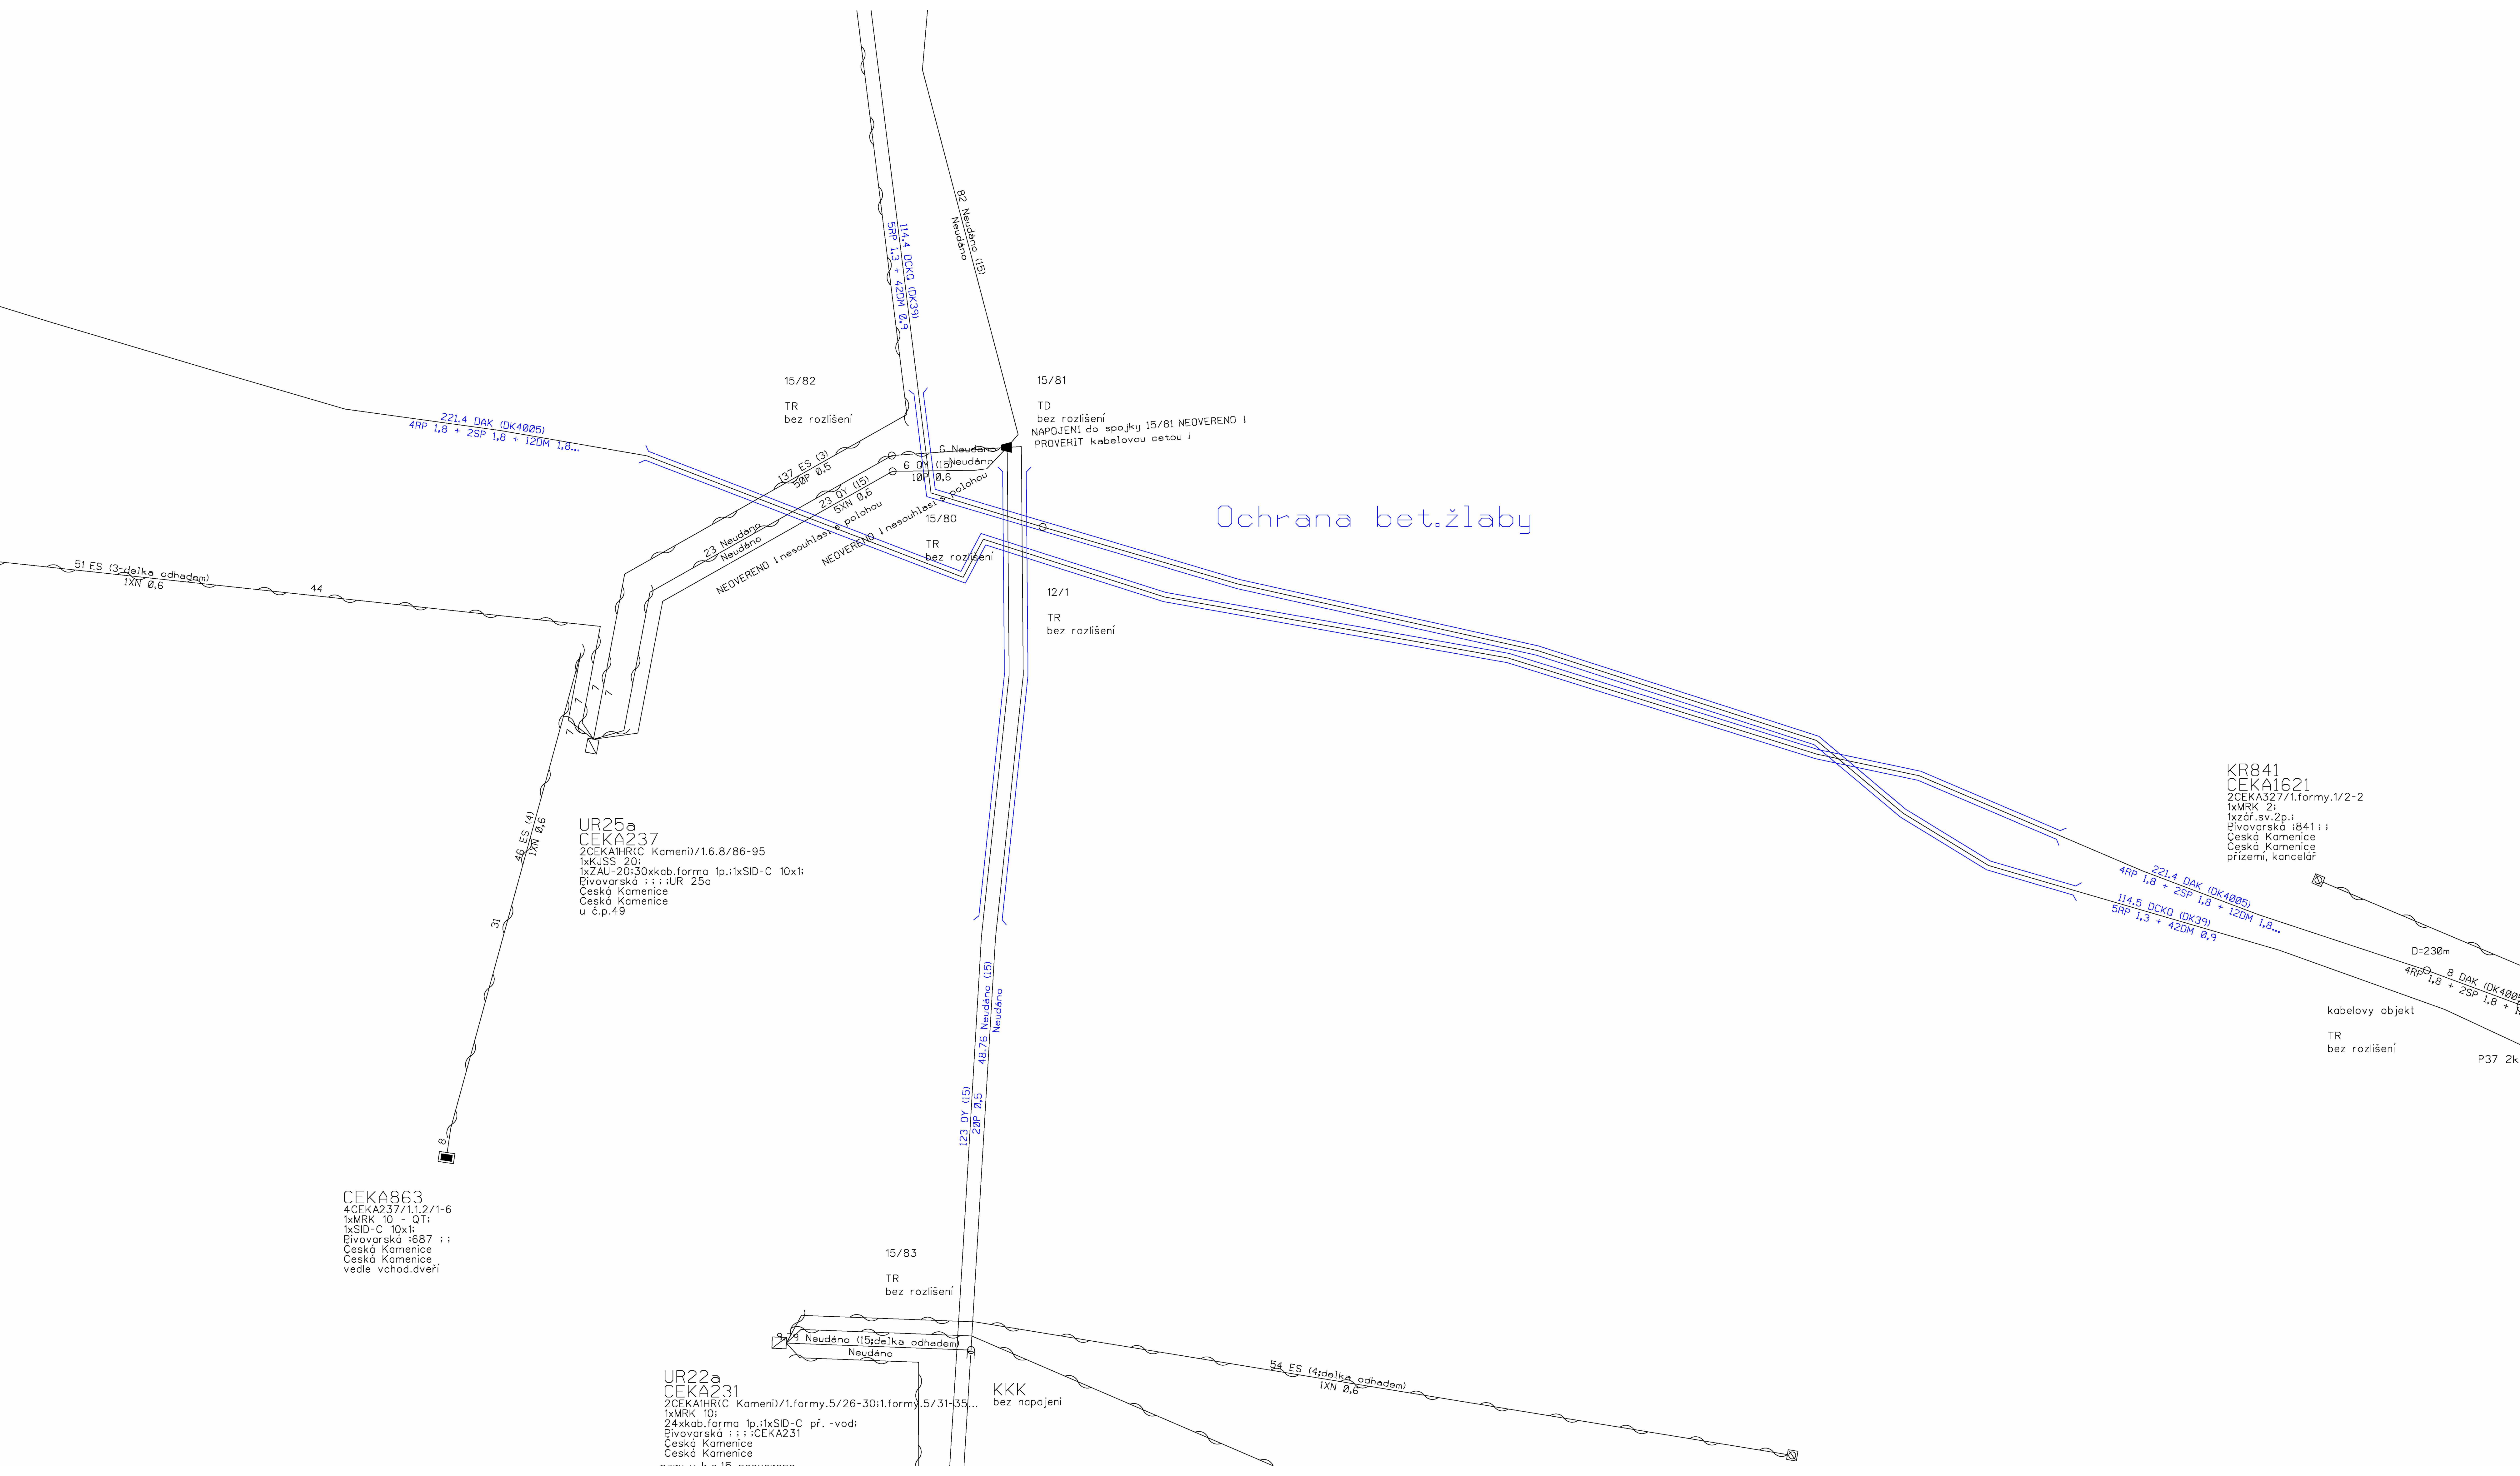

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP- STAND. - 2021-04

Položková d. 2021.04

Název stavby: VPIC česká Kamenice I-13 Pivovarská ul

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.180	KMP:	0.000	bytových HTS	0
KMVYK: voz.	0.180	KMMK:	0.000	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km

Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	13	██████	Kč
ZEMNÍ PRÁCE	279	██████	Kč
MONTÁŽ	23	██████	Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA		██████	Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	7	██████	Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA		██████	Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE		██████	Kč
PROVOZNÍ PRÁCE		██████	Kč
MATERIÁL DOD. CETIN		██████	Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ		██████	Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	72	██████	Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný		██████	Kč
POPLATKY		██████	Kč

Celkové náklady: **396 608 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST 383 106,75 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 13 500,91 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks	██████
957746		Šetření technické rozšířené	1.00 ks	██████
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	135.00 m	██████
952368 S		Pokládka žlabů TK2,T2N	180.00 m	██████
955265 S		Práce zemní pro podzemní tratě síťové	3283.02 JV	██████

Koordinace se stavbou			
955570 S	Rýha ve vozovce litý asphalt 50/100	180.00 m	██████████
955054 S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	180.00 m	██████████
MONTÁŽ			
955030 S	Demontáž úložných kabelů do 50 XN	160.00 m	██████████
955029 S	Demontáž úložných kabelů do15 XN	50.00 m	██████████
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	2.00 ks	██████████
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	8.00 ks	██████████
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	2.00 ks	██████████
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	3283.02 JV	██████████
Koordinace se stavbou			
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	50.00 m	██████████
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	160.00 m	██████████
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV	██████████
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	3.00 ks	██████████
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	██████████
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	80.00 m	██████████
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částk:	1.00 ks	██████████

Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	360.00 m	██████████ Kč
305356 S		Poklop žlabu beton 50x23x6 cm k TK 2	360.00 ks	██████████ Kč
302423 S		Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	135.00 m	██████████ Kč
305232 S		Žlab kabelový beton 100x23x19 cm TK 2	180.00 ks	██████████ Kč
