

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)
(dále jen „smlouva“)

pro realizaci veřejné zakázky
„Výměna topného zdroje - Deštné v Orlických horách“
objekt Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje
SMVS: 114V172000021

Článek I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
IČ: 75151545
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 23235881/0710
Telefon: 
E-mail: 
Datová schránka: urnai6d
(dále jen „objednatel“)
2. **Zhotovitel:** ELMON spol. s r.o.
Sídlo: **třída Masarykova 277, 550 01 Broumov**
Zastoupený: 
IČO: 47452161
DIČ: CZ47452161
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 1147452161/5500
Telefon: 
E-mail: 
Datová schránka: gfn3vhs

Zapsán v obchodním rejstříku ,vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C , vložka 2547
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), tuto smlouvu o dílo (dále jen smlouva)

3. Zástupci smluvních stran pro věci technické

- 3.1 Zástupcem objednatele pro věci technické - technický dozor stavebníka nad prováděním díla je  jež je fyzickou osobou

oprávněnou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, která bude zajišťovat činnosti dle § 152 bod 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

- 3.2** Dalším zástupcem objednatele pro věci technické je [REDAKCE] oddělení správy nemovitého majetku, [REDAKCE]
- 3.3** [REDAKCE], je na základě Pověření, které tvoří přílohu č. 7 této smlouvy o dílo, odpovědný za odborné vedení provádění stavby ve smyslu § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) ve znění pozdějších předpisů jako stavbyvedoucí a má pro tuto činnost oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, osvědčení o autorizaci ČKAIT číslo 0601116 obor pozemní stavby (dále jen stavbyvedoucí).
- 3.4** Objednatel si vyhrazuje změnu závazku, a to ve změně osoby stavbyvedoucího pouze za podmínky, že nová osoba bude splňovat minimálně stejnou kvalifikaci, jaká byla požadována u původní osoby stavbyvedoucího jako podmínka účasti v zadávacím řízení. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou osoby stavbyvedoucího do 3 pracovních dnů od doručení žádosti zhotovitele o změnu osoby, po předložení potřebných dokladů objednateli.
- 3.6** Výše uvedení zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat ve věcech technických, zejména ve věcech:
- předání a převzetí staveníště,
 - řešení technických problémů při provádění díla,
 - koordinace poddodavatelů,
 - kontroly provedených a zakrývaných konstrukcí a prací,
 - předběžného projednávání změn a doplňků stavebních částí díla a změn materiálů
 - provedení dodatečných zkoušek či ověření,
 - pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich zastavení v souladu se smlouvou,
 - vyloučení pracovníků zhotovitele a pracovníků poddodavatelů, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla,
 - odsouhlasení soupisu provedených prací,
 - předání a převzetí dokončeného díla

Tito uvedení zástupci nejsou oprávněni sjednávat změny smlouvy.

Článek II. Předmět smlouvy

- 1.** Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo tak, jak je popsáno v této smlouvě a poskytnout mu v této souvislosti další plnění ve smlouvě uvedená a závazek objednatele při provádění díla poskytnout potřebnou součinnost, řádně provedené dílo převzít a za provedené dílo zhotoviteli uhradit cenu za podmínek smlouvou sjednaných.
- 2.** Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 11. června 2021, která byla na základě zadávacího řízení vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

3. Specifikace díla:

- 3.1 Dílem se rozumí provedení stavebních a montážních prací včetně poskytnutí dodávek a služeb dle vypracované projektové dokumentace pro provádění stavby pod názvem „**KŘP Khk – Deštné v Orlických horách – kotelna**“. Přesný rozsah a popis stavebních a montážních prací včetně dodávek je určen výše uvedenou projektovou dokumentací se soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr.

Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen PD) příloha č. 1 této smlouvy) byla vypracována firmou Radko Vondra – PRIDOS, Na Potoce 648, 500 11 Hradec Králové 11, IČ: 75151545, včetně Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v souladu s dalšími přílohami této smlouvy, určujícími dílo v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět plnění díla, jeho hmotové, materiálové, stavebně technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled, jakost a způsob plnění a dále za splnění všech podmínek stanovených v této smlouvě.

Jedná se o stavební úpravy, které dle novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vyžadují stavební povolení. Objekt je ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu Krajskému ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

Součástí předmětu plnění ze strany zhotovitele je rovněž:

- odvoz a likvidace přebytečných materiálů, výkopků a odpadů vyprodukovaných realizací akce u oprávněných příjemců;
- průběžný úklid stavbou dotčených prostor a samotného prostoru staveniště. Průběžným úklidem se rozumí denní hrubý a závěrečný čistý úklid všech prostor stavebními úpravami dotčených;
- vybudování a následná likvidace zařízení staveniště vč. řádného oddělení staveniště zábranami, instalace prachových zábran (fólie apod.) v aktuálních pracovních zónách, popř. oplocením od okolních prostor;
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla (s ověřením, že odpovídá skutečnému provedení) se zakreslením veškerých změn a odchylek od předané PD (1x digitálně, 2x tisková podoba);
- fotodokumentace z průběhu prováděných prací a zakrývaných konstrukcí (elektronicky na paměťovém mediu při předání dokončeného díla);
- pevně stanovené poplatky spojené s připojením do sítě ČEZ - dle výkazu výměr

Veškeré další stavební úpravy jsou podrobně popsány v PD.

- 3.2 Suroviny, materiály a výrobky (včetně prostředků) použité při realizaci musí být schváleny nebo certifikovány (certifikačním orgánem, popř. státní zkušebnou), popř. musí mít atest na jakost a budou po dobu existence stavby splňovat požadavky na běžnou údržbu, požadovanou pevnost, stabilitu, hygienické požadavky, ochranu zdraví, životního prostředí, bezpečnost při užívání, požární bezpečnost a úsporu energie. Toto prokáže zhotovitel platnými certifikáty a atesty na jakost. Objednatel doporučuje použití ekologicky šetrných materiálů.
- 3.3 V případě, že část předmětu plnění díla bude plněna formou poddodávky, bude součástí této smlouvy **Seznam poddodavatelů zhotovitele veřejné zakázky** (příloha č. 3 této smlouvy), obsahující části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů nebo seznam poddodavatelů, s uvedením, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

Tato příloha č. 3 bude před podpisem smlouvy o dílo doplněna o identifikační údaje poddodavatelů, pokud mu byli známi. Poddodavatelé, kteří nebyli dodavatelem identifikováni podle první věty či v nabídce dodavatele, a kteří se následně zapojí do plnění

veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Tato povinnost bude považována za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku podle jiného právního předpisu (§ 157 zákona č. 183/2006 Sb. – stavební zákon).

Identifikačními údaji se dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ rozumí obchodní firma nebo název, identifikační číslo, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu.

Změna poddodavatelů uvedených v příloze č. 3 této smlouvy je možná pouze se souhlasem Objednatele, pokud zhotovitel pomocí tohoto poddodavatele prokazoval splnění kvalifikace. Pokud zhotovitel prokázal pomocí jiné osoby kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, musí tato nová osoba disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen tuto skutečnost ihned písemně oznámit objednateli a předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou poddodavatele do 5 dnů od doručení žádosti zhotovitele a potřebných dokladů objednateli, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby poddodavatele bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem předloženy příslušné doklady. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy zhotovitel a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl on sám.

4. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

- 4.1 Zjistí-li zhotovitel při realizaci díla potřebu změn závazku ze smlouvy, je povinen bezodkladně předložit objednateli písemný návrh formou soupisu jednotlivých změn včetně jejich odůvodnění, popisu jednotlivých položek oceněných podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen Cenové soustavy URS platných pro příslušný rok realizace díla, odkaz www.cs-urs.cz . Dále je povinen předložit návrh úpravy harmonogramu o dobu plnění nezbytnou k provedení těchto změn. Objednatel před schválením návrhu změn závazku ze smlouvy posoudí, zda jsou změny oprávněné dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2 Zjistí-li objednatel při realizaci díla potřebu oprávněných změn závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je povinen bezodkladně předložit zhotoviteli písemný návrh formou soupisu jednotlivých změn včetně jejich odůvodnění, popisu jednotlivých položek, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen Cenové soustavy URS platných pro příslušný rok realizace díla, odkaz www.cs-urs.cz . Dále zhotovitel předloží návrh úpravy harmonogramu o dobu plnění nezbytnou k provedení těchto změn.
- 4.3 Teprve po písemném schválení změn objednatel bude zhotovitel vyzván k poskytnutí potřebné součinnosti k uzavření dodatku smlouvy o dílo.

Do doby, než objednatel posoudí změnu závazku ze smlouvy, nebude zhotovitel provádět práce, které souvisí se změnou závazku, ale bude pokračovat v realizaci díla na pracích, které se změnou nesouvisí. V případě, že nebude možné pokračovat v díle do uzavření dodatku, bude rovněž o tuto dobu upraven termín dokončení díla. V případě, že by došlo k přerušení provádění díla, je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení

nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytovaných úřady atp.).

Teprve po podpisu tohoto dodatku smlouvy o dílo má zhotovitel právo na realizaci předmětných změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

4.4 Změny závazku ze smlouvy mohou být realizovány a následně uhrazeny až na základě písemného dodatku ke smlouvě. Schválení změn závazku ze strany objednatele podléhá schválení nadřizenými orgány objednatele, což může mít vliv na další průběh realizace díla.

5. Vyhrazené změny závazku

- 5.1 Objednatel si vyhrazuje možnost změny dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky podle § 100 odst. 2 ZZVZ podle § 222 odst. 10 písm. a) ZZVZ v případě, že tato smlouva o dílo bude ukončena jinak, než řádným vypořádáním všech závazků v ní uvedených. Smlouva o dílo v takovém případě může být uzavřena s účastníkem zadávacího řízení, který se umístil při hodnocení nabídek na dalším místě v pořadí, a který splnil podmínky předmětného zadávacího řízení. Tento účastník bude pokračovat ve zhotovení díla podle své nabídky přiměřeně, přičemž mohou být přiměřeně posunuty všechny původní související termíny.
- 5.2 Objednatel si dále vyhrazuje právo změny závazku podle § 222 odst. 10 písm. b) ZZVZ pokud změna v osobě dodavatele je důsledkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou dodavatele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, a nový dodavatel splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení.

**Článek III.
Místo a doba plnění**

1. Místem plnění je **objekt Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Deštné v Orlických horách čp. 131, PSČ 517 91, okr. Rychnov nad Kněžnou, na pozemcích č. 457 a 748/3 v obci a katastrálním území Deštné v Orlických horách**. Objekt je ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu Krajskému ředitelství policie Královéhradeckého kraje.
2. **Místo plnění je zároveň místem staveniště**. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a zařízení staveniště. Prostor staveniště musí být oddělen od ostatních prostor. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci stavby prostor větší než obvod vlastního staveniště v majetku objednatele vymezený v PD, zajistí si jej na vlastní náklady.
3. **Doba plnění** začíná termínem zahájení plnění předmětu díla a končí termínem dokončení plnění předmětu díla.
4. **Za termín zahájení plnění předmětu díla** je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště (dále jen „termín zahájení díla“).
5. **Za termín dokončení plnění předmětu díla** je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků v souladu s čl. VII. této smlouvy (dále jen „termín dokončení díla“).
6. **Termín zahájení díla:** 1. července 2021
7. **Termín dokončení díla:** 31. října 2021
8. Řádně dokončené dílo může být předáno v dřívějším termínu, nesmí však dojít k nedodržení

stanovených technologických lhůt a podmínek výrobců a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

9. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla.

Článek IV.

Cena díla

1. Vzhledem k tomu, že prostory, ve kterých budou prováděny stavební práce, které jsou předmětem plnění této smlouvy, nejsou využívány k ekonomické činnosti objednatele, ale výhradně k výkonu veřejné správy, **nejedná se o režim přenesené daňové povinnosti na objednatele** ve smyslu § 92 písm. e) zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, protože **objednatel není v postavení osoby povinné k dani. Z uvedených důvodů je cena díla stanovena včetně DPH.**
2. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce na veřejnou zakázku, zpracované na základě oceněného Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Cena díla bez DPH: 345 810,69 Kč

vyčíslení 21 % DPH: 72 620,24 Kč

Cena díla včetně 21% DPH: 418 430,93 Kč

3. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu díla mimo okolností, které nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy.
4. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno měnit pouze za podmínek stanovených v této smlouvě, obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla. Jednotkové ceny v Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou pevné a jsou uvedeny v Kč bez DPH.
5. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy a to u ceny díla při splnění následujících podmínek:
 - se změnou daňových předpisů, které budou mít vliv na výši ceny;
 - v případě schválených změn závazku (v souladu se smlouvou).

Článek V.

Platební podmínky

1. Před vystavením faktury je zhotovitel povinen předložit objednateli - zástupci pro věci technické a technickému doзору stavebníka (dále jen „TDI“) soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami dle položek uvedených adresně v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v členění podle přílohy č. 2 této smlouvy a v souladu s projektovou dokumentací. Objednatel odsouhlasí a ověří tento soupis skutečně provedených prací **do 5 dnů** od jeho předložení TDS, na důkaz toho, že přejímá dodávku a montáž předmětné části díla. Po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem vystaví zhotovitel daňový doklad (fakturu), jejíž nedílnou součástí musí být objednatelem ověřený a odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu skutečně provedených prací je daňový doklad (faktura) neplatný. Daňový doklad (fakturu) předloží zhotovitel objednateli nejpozději **do 5 dnů** po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací.

2. Den odsouhlasení a ověření soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb s výkazem výměr objednatelem je považován za den zdanitelného plnění dle § 21 odst. 5 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
3. Objednatel uhradí daňový doklad (fakturu) zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po jejím doručení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad (fakturu) do 30 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.
4. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.
5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů, tj. označení faktury a její číslo, firmu (obchodní jméno) a sídlo zhotovitele a objednatele, jejich identifikační čísla, údaj o zápisu v obchodním rejstříku (nebo jiné evidenci, včetně spisové značky) předmět plnění, číslo jednacích této smlouvy o dílo, cenu díla k úhradě a označení identity díla: „**KŘP Khk – Deštné v Orlických horách – kotelna**“.
6. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat cenu bez DPH, vyčíslení DPH a cenu včetně DPH.
7. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude daňový doklad (faktura) zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) vrátit k přepracování nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tímto dostal do prodlení se splatností faktury.
8. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn uplatňovat na objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.
9. Faktury se považují za proplacené okamžikem odepsání fakturovaných částek z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

Článek VI. Provádění díla

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob a zhotovitel ho převezme v termínu podle čl. III. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště, je považován za **den zahájení plnění díla**.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je dobře seznámen se staveništěm i riziky na něm a že je mu znám rozsah prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy. Objednatel není povinen hradit náklady vzniklé z neznalosti staveniště, nebo z jakéhokoliv omylu ze strany zhotovitele.
4. Při předání a převzetí staveniště, tj. v den zahájení díla, předloží zhotovitel objednateli jmenný seznam všech pracovníků, kteří budou vstupovat do areálu Policie ČR (jméno, příjmení, firma, číslo občanského průkazu). V případě pracovníků, kteří se následně zapojí do provádění díla, předloží zhotovitel objednateli jmenný seznam těchto pracovníků, a to před zahájením plnění díla těmito pracovníky, či splní tuto povinnost uvedením těchto údajů do stavebního deníku podle jiného právního předpisu (§ 157 zákona č. 183/2006 Sb. – stavební zákon).
5. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
6. Přístup na staveniště je zajištěn po veřejných přístupových komunikacích.

7. Zhotovitel vybuduje v souladu s projektovou dokumentací potřebné zařízení staveniště nezbytné pro provedení díla. Po dokončení díla v termínu dle čl. III. provede jeho likvidaci a veškeré plochy dotčené zařízením staveniště uvede do původního stavu.
8. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen bezodkladně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to znamená každodenní odvoz sutí a demontovaného zařízení (a hrubý úklid) a s ním spojeného materiálu, aby nedocházelo k jeho skladování a následnému hromadění v prostorách objednatele, včetně poplatků za uložení vybouraných hmot na povolenou skládku (u oprávněných příjemců). Tato povinnost se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné komunikace.
9. Zhotovitel je povinen zabránit vniknutí nepovolaných osob na staveniště a učinit maximum opatření proti krádežím materiálu a poškozování již provedených částí díla. Zhotovitel zajistí v případě potřeby na svůj náklad oplocení, osvětlení a jiné vhodné zabezpečení staveniště.
10. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a při své činnosti je povinen dodržovat požární a hygienické předpisy a předpisy o ochraně životního prostředí. Budou dodrženy dotčené právní předpisy.
11. Při provádění díla bude zhotovitel respektovat podmínky stanovené ve stavebním povolení a územního souhlasu, tyto budou předány dodavateli nejpozději do doby předání staveniště.
12. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, a podmínky uvedené v zadávací dokumentaci a projektové dokumentaci. Pokud nedodržením tohoto ustanovení vznikne jakákoliv škoda zaviněním zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
13. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat zákonné standardy pracovních podmínek dle zákoníku práce, právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP.
14. Veškeré odborné práce při provádění díla musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel neprokáže příslušnou kvalifikaci pracovníků zhotovitele, objednatel požaduje nahrazení těchto pracovníků pracovníky, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen zajistit nad realizací díla odborný dohled a postup prací organizovat tak, aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci díla.
15. Stavební práce budou realizovány za nepřerušného provozu objednatele, tj. v pracovní dny **mezi 7:00 – 16:00 hod.**, pokud nebude při předání a převzetí staveniště dohodnuto jinak. Postup prací zhotovitele bude koordinován s uživatelem tak, aby nebyl narušen výkon služby policistů a pracovní činnost zaměstnanců Policie ČR.
16. Objednatel, resp. jím určený zástupce pro věci technické a technický dozor stavebníka je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla. Pokud tak objednatel, resp. technický dozor stavebníka neučiní, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně.
17. Zhotovitel je povinen též zajistit:
 - odvoz a ekologickou likvidaci přebytečných materiálů a odpadů vyprodukovaných realizací díla u oprávněných příjemců;
 - průběžný úklid stavbou dotčených prostor a samotného prostoru staveniště. Průběžným úklidem se rozumí denní hrubý a závěrečný čistý úklid všech prostor stavebními úpravami dotčených;
 - vybudování a následná likvidace zařízení staveniště vč. řádného oddělení staveniště zábranami, instalace prachových zábran (fólie apod.) v aktuálních pracovních zónách, popř. oplocením od okolních prostor.

18. Poskytovatel je povinen udržovat v platnosti nepřetržitě po dobu platnosti této smlouvy **pojistnou smlouvu** o odpovědnosti za škodu způsobenou poskytovatelem při plnění předmětu smlouvy s pojistným plněním **minimálně ve výši 1 mil. Kč**. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (výluky z pojištění) s výjimkou takových výluk, které odpovídají standardně uplatňovaným výlukám ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění. Poskytovatel je povinen předložit objednateli originál platné a účinné pojistné smlouvy či Potvrzení o pojištění, u níž řádně a včas uhradil pojistné, včetně dokladu o zaplacení pojistného nejpozději před podpisem této smlouvy a na vyžádání objednatelem kdykoliv v průběhu platnosti smlouvy. Úředně ověřená kopie pojistné smlouvy nebo potvrzení o platné pojistné smlouvě je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 5.
19. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vyplývajících z platných právních předpisů, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
20. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce případných poddodavatelů řádně koordinovat.
21. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy, **stavební deník v rozsahu přílohy č. 9 k vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění**, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zhotovitele,
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) objednatele,
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zpracovatele PD,
- název stavby dle smlouvy o dílo
- místo stavby
- jméno a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby
- jméno a příjmení osob vykonávajících technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta
- seznam nebo odkazy na dokumenty ke stavbě (např. smlouva o dílo, sdělení stavebního úřadu atd.)
- přehled všech provedených zkoušek jakosti,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam konstrukcí a prací podléhajících kontrole před zakrytím (termíny kontroly budou dohodnuty po zahájení stavby, nejméně **5 pracovních dnů** před termínem konání).

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

22. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze zástupce objednatele pro věci technické, technický dozor stavebníka, případně jiný objednatelem pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy a příslušné odborné orgány MV. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě, za podmínek stanovených touto smlouvou.
23. Stavební deník, který vede stavbyvedoucí, musí být uložen na stavbě na přístupném místě, dostupný kontrole v pracovních dnech v době od 7.00 hod. do 15.30 hod. Stavební deník lze odnášet ze stavby pouze po vzájemné dohodě.
24. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatelem pověřený zástupce,

technický dozor stavebníka, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do **5-ti pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. **O takových provedených zápisech ve stavebním deníku je stavbyvedoucí povinen neprodleně informovat zástupce pro věci technické - technický dozor stavebníka písemně, e-mailem.**

25. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do **5-ti pracovních dnů** od data, kdy byl zápis do stavebního deníku proveden. V případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele, se zhotovitel zavazuje tuto skutečnost bezodkladně oznámit písemně, e-mailem objednateli, který je povinen vyjádřit se k tomuto zápisu do **5-ti pracovních dnů** ode dne, kdy byl o této skutečnosti zhotovitelem informován.
26. Objednatel je oprávněn dle svého uvážení svolávat jednání o průběhu prací, tzv. "kontrolní dny stavby", ke kterým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě (např. projektanta, orgány státní správy, odborné služby objednatele apod.). Jmenný seznam těchto zástupců uvede objednatel v pozvánce zaslané účastníkům jednání nejpozději 3 pracovní dny před termínem jednání. Stavbyvedoucí je povinen se účastnit kontrolních dnů stavby a zaujmout stanovisko k řešeným problémům, případně si přizvat zástupce poddodavatele, bude-li jeho účast nutná. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam.
27. K odstranění vad zjištěných při kontrolním dnu stanoví objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu, která se zapíše do zápisu z kontrolního dne. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení. Pokud zhotovitel vady neodstraní do max.60-ti dnů, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
28. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejméně **3 pracovní dny** před zakrytím či znepřístupněním písemně, nebo zápisem ve stavebním deníku a o provedeném zápisu telefonicky informovat zástupce objednatele pro věci technické a technický dozor stavebníka. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Nedostaví-li se zástupce objednatele a technický dozor stavebníka do 3 pracovních dnů, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, nejpozději do termínu oznámeného zakrytí, budou konstrukce zakryty. **Zhotovitel je povinen provádět a objednateli poskytnout průběžnou fotodokumentaci z průběhu prováděných prací a všech zakrývaných konstrukcí a prací a tuto souborně předat při předání díla dle čl. VII odst. 2 této smlouvy.**
29. Objednatel, autorský dozor a technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provedení díla, zejména jsou-li práce a dodávky realizovány podle projektové dokumentace a dalších podkladů, smluvních podmínek, technických norem a dalších předpisů, a to kdykoli v průběhu jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli, autorskému dozoru a technickému dozoru stavebníka umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli, autorskému dozoru a technickému dozoru stavebníka veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelům požadované doklady.
30. Náklady spojené s plněním výše uvedených podmínek pro provádění díla a podmínek objednatele na provádění díla, zhotovitel zohlednil ve své nabídce v jednotkových cenách oceněného položkového výkazu výměr soupisu prací.

Článek VII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně nebo e-mailem oznámit objednateli nejpozději **5 pracovních dnů** předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Přípravenost k odevzdání díla musí být v takovém časovém předstihu, ve kterém zhotovitel odstraní zjištěné vady a nedodělky, předá veškeré doklady dle čl. VII. odst. 2 této smlouvy, **aby mohl být sepsán protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků nejpozději v termínu dokončení díla dle čl. III. této smlouvy.** Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. Termín zahájení přejímacího řízení oznámí objednatel zhotoviteli písemně nebo e-mailem, popř. zápisem do stavebního deníku.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:

- písemný adresný seznam dokladů předávaných při přejímacím řízení objednateli;
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů, výrobků a zařízení (certifikáty, atesty, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků a zařízení, v souladu s § 108 a § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a jeho novely 350/2012 Sb., doklady o shodě podle z. č. 22/1997 Sb a NV č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a zákona č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění NV č.251/2003 Sb. a NV č. 128/2004 Sb., a prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č.3052/2011 (doložit v tištěné podobě).,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení,
- zprávy a protokoly o provedených revizních, provozních zkouškách a měřeních,
- zhotovitelem ověřenou dokumentaci skutečného provedení díla (v tištěné podobě ve dvojím vyhotovení ověřené zhotovitelem a 1x v digitální podobě v editovatelném formátu např. *dwg, *doc a 1x digitálně ve formátu *pdf se zakreslením veškerých změn a odchylek od PD
- stavební deník (originál),
- potvrzené záruční listy, případné návody k obsluze,
- doklad o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců,
- případně další doklady vyžádané objednatelem,
- průběžnou fotodokumentaci (v elektronické podobě na USB Flash disku.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

3. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky pro úplné dokončení stavebních prací, uvedené výše, vyklizení stavebními pracemi dotčených prostor, předání všech dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, potřebných provozních řádů, certifikátů použitých výrobků a materiálů, záručních listů a návodů k obsluze, dokladu o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku, veškerých dokladů vyplývajících z čl. VII. odst. 2 této smlouvy, předání PD skutečného provedení stavby ve trojím vyhotovení v tištěné podobě, následné podepsání protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků včetně případného dokladu o odstranění případných závad.
4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol o předání a převzetí díla. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky pro úplné dokončení stavebních prací, uvedených v čl. II. této smlouvy, bez vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. VII. bod 2. této smlouvy. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci ve věcech technických obou smluvních stran v souladu s čl. I. odst. 3 této smlouvy, je dílo považováno za převzaté objednatelem.
5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, pokud vykazuje zjevné vady a

nedodělky.

6. Nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště, odstranit objekty zařízení staveniště a veškeré plochy dotčené zařízením staveniště uvést do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud je neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši Kč 1.000,- Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne jeho úplného vyklizení.

Článek VIII.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.
2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla.
3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle odstavce 2.
4. Odpovědnost za škody na zhotovené věci nese od začátku plnění díla do předání a převzetí díla zhotovitel.

Článek IX.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla **v délce 60 měsíců** ode dne podepsání protokolu o předání a převzetí díla vyjma zařízení a předmětů, u nichž bude záruční doba stanovena výrobcem. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které bez zbytečného odkladu reklamoval.
2. U dodaných strojů, zařízení a jiných předmětů, které jsou součástí provedeného díla, dodaných jejich výrobcí s odpovědností za vady po dobu jimi poskytovaných záručních lhůt, nahrazuje se doba uvedená v předešlém odstavci těmito záručními lhůtami, minimálně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel předá objednateli k těmto strojům, zařízením a jiným předmětům záruční listy potvrzené výrobcí s odpovědností za vady.
3. Záruční doba se u částí díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která uplynula od předložení reklamace do odstranění vady (vad).
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují, případně požadovaný termín k jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do **5 dnů** po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává a vady odstraní v termínu do **14 dnů** od obdržení reklamace, nebo v termínech požadovaných objednatelem v reklamaci. V těchto případech zároveň platí ustanovení tohoto článku odst. 8 této smlouvy. Po odstranění vad, vyzve písemně objednatele k provedení přejímky odstraněných vad.
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
7. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady bránící užívání do **24 hodin**,

k odstranění reklamovaných vad nebránících užívání nejpozději do **10-ti dnů** po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani **do 14 dnů** po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel, přičemž není zbaven sankcí v souladu s tímto článkem odst. 7. této smlouvy do odstranění reklamované vady.
9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

X.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen:

- a) podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů,
- b) archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích příloh a dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10-ti let od zániku této smlouvy.

XI.

Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu:

- a) pokud zhotovitel nezahájí plnění předmětu díla, resp. nepřevzme staveniště ve sjednaném termínu zahájení díla dle čl. III této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení;
- b) pokud zhotovitel neodstraní vady zjištěné při kontrolním dnu stavby ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení;
- c) pokud zhotovitel nedodrží smluvní termín dokončení díla, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení;
- d) pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady bránící užívání do **24 hodin** a k odstranění reklamovaných vad nebránících užívání nejpozději do **10-ti dnů** po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu;
- e) pokud zhotovitel nejpozději do **10 dnů** po předání a převzetí díla nevyklidí staveniště, neodstraní objekty zařízení staveniště a veškeré plochy dotčené zařízením staveniště

neuveđe do původního stavu, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši Kč 500,- Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne jeho úplného vyklizení.

2. Povinnost zaplatit úrok z prodlení se řídí ustanoveními OZ.
3. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele dále řádně realizovat předmět díla ve sjednané kvalitě.
4. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn uplatňovat na objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.
5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů ode dne jejich uplatnění.
6. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
7. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v tomto článku, trvá i po skončení účinnosti této smlouvy, jakož i po té, co dojde i odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

XII.

Ukončení závazku ze smlouvy

1. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na ukončení závazku z této smlouvy, se považuje zejména, pokud zhotovitel:
 - nezahájí plnění díla, resp. nepřevzme staveniště ani do 30 dnů po sjednaném termínu zahájení díla;
 - je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele, a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit;
 - bezdůvodně přeruší práce na dobu delší než 30 dnů, nebo dvakrát na dobu delší než 15 dnů;
 - neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne dle čl. VI. bod 27. této smlouvy, a to ani do 60-ti dnů po lhůtě stanovené v zápisu z kontrolního dne;
 - přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací nebo s touto smlouvou, případně pokyny objednatele;
2. Objednatel má dále právo na ukončení závazku z této smlouvy dále pokud:
 - probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo byl konkurz zrušen proto, že je majetek zhotovitele zcela nepostačující;
 - v případě zahájení exekučního řízení, nebo daňové exekuce proti zhotoviteli;
 - zhotovitel vstoupí do likvidace.
3. Zhotovitel má právo na ukončení závazku z této smlouvy, pokud objednatel:
 - je v prodlení s předáním staveniště (místa plnění) po dobu delší než 30 dnů,
 - je v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu

delší než 90 dnů od předání daňového dokladu k úhradě.

4. Pokud některá ze smluvních stran bude uplatňovat své právo na ukončení závazku z této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna ukončení závazku z této smlouvy oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému ukončení závazku z této smlouvy požaduje. V ukončení závazku z této smlouvy musí být dále uveden důvod, pro který strana ukončení závazku z této smlouvy požaduje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je návrh na ukončení závazku z této smlouvy neplatný. Účinky takového ukončení závazku z této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle ukončit závazek z této smlouvy druhé smluvní straně.
5. Ukončením závazku z této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku porušení povinností stanovených touto smlouvou zhotovitelem, smluvní pokuty a povinnosti zhotovitele o mlčenlivosti.
6. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem na ukončení závazku z této smlouvy druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do **10-ti dnů** po obdržení oznámení o ukončení závazku z této smlouvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem na ukončení závazku z této smlouvy souhlasí.
7. Ukončí-li závazek z této smlouvy některá ze stran na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak;
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do **5-ti dnů** od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".
8. Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemně ukončení závazku z této smlouvy a písemně si potvrdí, že bylo vzájemně vypořádáno poskytnuté plnění. Případným ukončením závazku z této smlouvy zůstávají zachovány ostatní nároky z ní vyplývající, jako např. nároky na náhradu škody, na zaplacení smluvních pokut, vlastnického práva apod. Zhotoviteli je zachován nárok na úhradu všech účelně vynaložených nákladů.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran oprávněných k podpisu této smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými zástupci obou smluvních stran, popř. je možné po dohodě obou stran provést novaci smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
3. Tato smlouva je vyhotovena pouze elektronicky.
4. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran a změnu právní

subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.

5. Veškeré písemnosti zhotovitele budou objednateli zasílány na adresu: **Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové.**
6. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které se týkají činnosti druhé smluvní strany.
7. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 smlouvy o dílo :

Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná firmou : Radko Vondra – PRIDOS, Na Potoce 648, 500 11 Hradec Králové 11, IČ: 75151545

Příloha č. 2 smlouvy o dílo:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, s výkazem výměr

Příloha č. 3 smlouvy o dílo:

Seznam poddodavatelů dodavatele veřejné zakázky

Příloha č. 4 smlouvy o dílo:

Pojistná smlouva

Příloha č. 5 smlouvy o dílo:

Prohlášení osoby, jejímž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost

Příloha č. 6 smlouvy o dílo:

Pověření osoby, jejímž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost

V Hradci Králové

Za objednatele:



plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku
podepsáno elektronicky

V Dobrušce

Za zhotovitele:



ELMON spol. s r.o.

podepsáno elektronicky

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DESTNE
Stavba: Stavební úpravy kotelny

KSO:
Místo: Deštné v Orl. horách

CC-CZ:
Datum: 29. 10. 2020

Zadavatel:
KŘP Khk

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Přidos Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	345 810,69
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	345 810,69	72 620,24
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	418 430,93
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:


Razítko

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	DESTNE	Datum:	29. 10. 2020
Stavba:	Stavební úpravy kotelny	Projektant:	Přidos Hradec Králové
Místo:	Deštné v Orl. horách	Zpracovatel:	
Zadavatel:	KŘP Khk		
Uchazeč:			

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		345 810,69	418 430,93
DESTNE 1	SO-01-kotelna	345 810,69	418 430,93

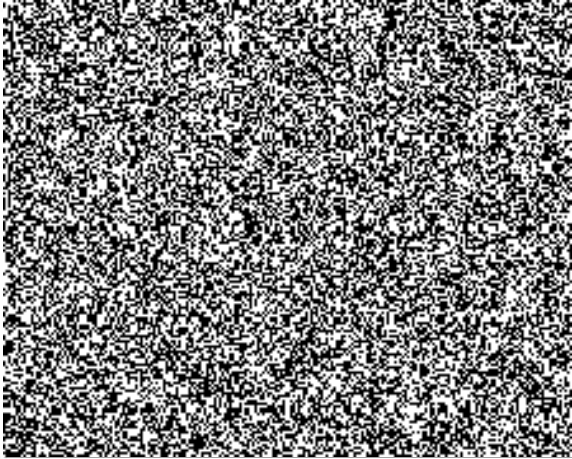

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy kotelny

Objekt:

DESTNE 1 - SO-01-kotelna

KSO:

Místo: Deštné v Orl. horách

CC-CZ:

Datum: 29. 10. 2020

Zadavatel:

KŘP Khk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Pridos Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	345 810,69
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	345 810,69	21,00%	72 620,24
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	418 430,93
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy kotelny

Objekt:

DESTNE 1 - SO-01-kotelna

Místo:

Deštné v Orl. horách

Datum:

29. 10. 2020

Zadavatel:

KŘP Khk

Projektant:

Pridos Hradec
Králové

Uchazeč:

Vyplň údaj


Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	345 810,69
HSV - Práce a dodávky HSV	25 353,51
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 300,39
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 693,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 689,50
997 - Přesun sutě	3 035,61
998 - Přesun hmot	1 634,88
PSV - Práce a dodávky PSV	307 457,18
721 - Zdravotechnika	14 251,01
731 - Ústřední vytápění - kotelny	158 026,55
741 - Elektroinstalace - silnoproud	120 018,79
766 - Konstrukce truhlářské	4 368,12
771 - Podlahy z dlaždic	4 994,79
783 - Dokončovací práce - nátěry	739,20
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 058,72
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	13 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 400,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 600,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy kotelny

Objekt: DESTNE 1 - SO-01-kotelna

Místo: Deštné v Orl. horách

Datum: 29. 10. 2020

Zadavatel: KŘP Khk

Projektant: Přidos Hradec
Králův

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

345 810,69

D HSV

Práce a dodávky HSV

25 353,51

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

5 300,39

1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,032	5 424,00	173,57	CS ÚRS 2020 01
	vv		0,85*0,15*0,25		0,032			
2	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,015	50 400,00	756,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		"I č.100" 0,85*2*0,00832*1,08		0,015			
3	K	346234311	Zazdívka rýh pro ventilační průduchy 150x300 mm z cihel s vytvořením průduchu 150x150 mm	m	2,800	222,00	621,60	CS ÚRS 2020 01
4	K	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	4,770	786,00	3 749,22	CS ÚRS 2020 01
	vv		(0,55+1,835)*2		4,770			

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10 693,13

5	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	2,800	378,00	1 058,40	CS ÚRS 2020 01
6	K	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	2,800	150,00	420,00	CS ÚRS 2020 01
7	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	17,858	366,00	6 536,03	CS ÚRS 2020 01
8	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	17,858	150,00	2 678,70	CS ÚRS 2020 01

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 689,50

9	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kN/m2	m2	6,800	78,00	530,40	CS ÚRS 2020 01
	vv		2,8+4,0		6,800			
10	K	952901111	Výčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	6,800	144,00	979,20	CS ÚRS 2020 01
11	K	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,140	102,00	14,28	CS ÚRS 2020 01
	vv		2,8*0,05		0,140			
12	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	2,800	280,80	786,24	CS ÚRS 2020 01
13	K	973031151	Výsekání výklenků ve zděvu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,141	1 860,00	262,26	CS ÚRS 2020 01
	vv		0,55*1,835*0,14		0,141			
14	K	974032664	Výsekání rýh ve stěnách z dutých cihel nebo tvárníc pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	1,700	258,00	438,60	CS ÚRS 2020 01
	vv		0,85*2		1,700			
15	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	2,800	102,00	285,60	CS ÚRS 2020 01
16	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	17,858	78,00	1 392,92	CS ÚRS 2020 01
	vv		(2,0+1,4)*2*2,8-0,6*1,97		17,858			

D 997

Přesun sutě

3 035,61

17	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,593	678,00	1 080,05	CS ÚRS 2020 01
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,593	318,00	506,57	CS ÚRS 2020 01
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,337	14,40	206,45	CS ÚRS 2020 01
	vv		1,593*9		14,337			
20	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,593	780,00	1 242,54	CS ÚRS 2020 01

D 998

Přesun hmot

1 634,88

21	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,080	786,00	1 634,88	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------	----------------

D PSV

Práce a dodávky PSV

307 457,18

D 721

Zdravotechnika

14 251,01

22	K	721001	D+M vnitřní rozvody ZTI	kpl	1,000	14 251,01	14 251,01	
----	---	--------	-------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

D 731

Ústřední vytápění - kotelny

158 026,55

23	K	731001	ÚT-výměna kotle	kpl	1,000	158 026,55	158 026,55	
----	---	--------	-----------------	-----	-------	------------	------------	--

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

120 018,79

24	K	741001	Vnitřní rozvody elektro	kpl	1,000	120 018,79	120 018,79	
----	---	--------	-------------------------	-----	-------	------------	------------	--


D 766

Konstrukce truhlářské

4 368,12

25	K	766001	D+M nové dveřní křídlo do stáv. ocelové zárubně 80/197cm	ks	1,000	4 140,00	4 140,00	
26	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	102,00	102,00	CS ÚRS 2020 01
27	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	3,000	42,04	126,12	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 771			Podlahy z dlaždic	4 994,79				
28	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu vč. soklíků	m2	3,220	66,00	212,52	CS ÚRS 2020 01
VV			2,8*1,15	3,220				
29	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	3,220	318,00	1 023,96	CS ÚRS 2020 01
30	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	3,220	528,00	1 700,16	CS ÚRS 2020 01
31	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	3,542	540,00	1 912,68	CS ÚRS 2020 01
VV			3,22*1,1 *Přepočtené koeficientem množství	3,542				
32	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	3,000	48,49	145,47	CS ÚRS 2020 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry	739,20				
33	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	1,100	186,00	204,60	CS ÚRS 2020 01
34	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,100	150,00	165,00	CS ÚRS 2020 01
35	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,100	162,00	178,20	CS ÚRS 2020 01
36	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,100	174,00	191,40	CS ÚRS 2020 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	5 058,72				
37	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech včkv do 3.80m	m2	46,840	30,00	1 405,20	CS ÚRS 2020 01
VV			2,8*17,858+0,6*1,97+25,0	46,840				
38	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech včkv do 3.80 m	m2	46,840	78,00	3 653,52	CS ÚRS 2020 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	13 000,00				
D VRN3			Zařízení staveniště	2 400,00				
39	K	032002000	Vybavení staveniště	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2020 01
40	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě-voda,elektro	soubor	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2020 01
41	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2020 01
D VRN4			Inženýrská činnost	10 600,00				
42	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,000	10 600,00	10 600,00	CS ÚRS 2020 01

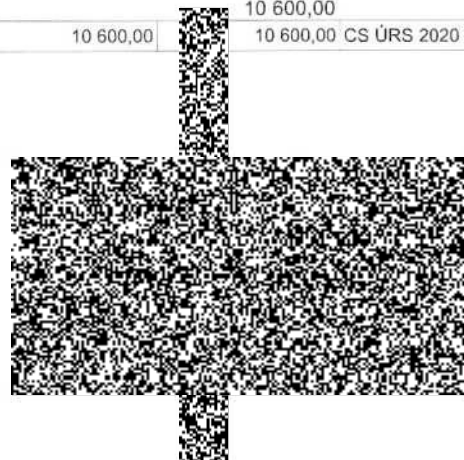

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : D.1.4.a) - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB	JKSO :
Stavba :	Název stavby : KŘP Khk - Deštné v Orlických horách - kotelna	SKP :
Projektant :	Radko Vondra - PRIDOS	Počet měrných jednotek :
Objednatel :	Krajské ředitelství policie KHK	Náklady na MJ :
Ulrichovo náměstí 810/4, 500 02 Hradec Králové		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :
Balažovič Tomáš		-

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	
Z Montáž celkem	
R HSV celkem	
N PSV celkem	
ZRN celkem	
HZS	
RN II.a III.hlavy	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele
Datum :	Jméno :
	Datum :
	Podpis:
	Za objednatele
	Jméno :
	Datum :
	Podpis :
CENA ZA OBJEKT CELKEM BEZ DPH	158 027 Kč

Poznámka :

ROZPOČET
(nedílnou součástí je projektová dokumentace)

Stavba : Objekt :		KRP Khk - Deštné v Orlických horách - kotelná D.1.4.a) - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB			
CENOVÁ ÚROVEŇ 4Q/2020					
P.č.	Číslo položky	Název položky			
HSV		Práce a dodávky HSV			
Díl: 1	Bourací práce prostupy				
7310001001	Demontáž a likvidace stávajícího kotle na tuhá paliva včetně potrubí a armatur				4 018,30
7310001002	Demontáž a likvidace stávající otevřené expanzní nádoby v půdě vč. izolace a zaslepení potrubí				803,66
7310001003	Bourací práce pro prostupy vedení				1 808,22
Celkem za	1 Bourací práce prostupy				6 630,18
HSV Celkem		6 630,18			
PSV		Práce a dodávky PSV			
Díl: 2	Trubní vedení - vytápění				
7310002001	Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 15x1				2 282,00
7310002002	Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 18x1				7 864,50
7310002003	Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 22x1				11 940,80
7310002004	Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 35x1,5				11 278,50
7310002005	Napojení na stávající rozvod vytápění				1 205,48
7310002006	Vypuštění rozvodu, napuštění rozvodu, odvzdušnění rozvodu				2 812,81
7310002007	Ochrana trubek izolačními trubiciemi				3 139,92
7310002008	Zkouška těsnosti potrubí				64,08
7310002009	Nosný systém potrubí, kotvení				15,26
7310002010	Lešení pomocné				146,74
7310002011	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m				234,08
Celkem za	2 Trubní vedení - vytápění				702,24
4	Technická místnost				
7310004001	Topná zkouška				3 214,64
7310004002	D+M Závěsný elektro kotel, modulovatelný výkon 2-24kW, 400V (závěsný elektrokotel určený pro vytápění, plynulá regulace, rozsah výkonu 2 – 24 kW, pro třířázové připojení 3 x 40 A).				19 471,64
7310004003	Připojovací armatury				3 341,91
7310004004	Montáž sestavy kotle a příslušenství, zaregulování, nastavení				9 519,18
7310004005	D+M Tlaková expanzní nádoba 50 litrů				3 490,09
7310004006	Přesun hmot pro technické místnosti v objektech v do 12 m				153,56
Celkem za	4 Technická místnost				39 191,02
5	Armatury				
7310005001	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2				4 459,98
7310005002	Termostatická hlavice antivandal				10 091,68
7310005003	Vyřiznutí potrubí v místě kohoutu, navaření mezikusu se závitů				18 001,92
7310005004	Svémé šroubení				2 206,08
7310005005	Ventil přímý				5 740,48
7310005006	Rohové r sroubení DN15				3 983,52
7310005007	D+M Pojistný ventil pro topení - 2,5bar				301,32
7310005008	D+M Kulový kohout KK32				735,42
7310005009	D+M Filtř do potrubí F32				229,82
7310005010	D+M Zpětný ventil ZV32				215,77
7310005011	D+M Přepouštěcí ventil DN32				1 964,99
7310005012	D+M Teploměr				638,40
7310005013	D+M Manometr				510,72

ROZPOČET


(nedílnou součástí je projektová dokumentace)

Stavba : **KRP Khk - Deštné v Orlických horách - kotelna**
 Objekt : **D.1.4.a) - ZARÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB**

CENOVÁ ÚROVEŇ 4Q/2020

č.p.	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42	7310005014	D+M Automatický odvzdušňovací ventil AOV		kus	2,00	229,82	459,64
43	7310005015	D+M Vypouštěcí kohout VK15		kus	2,00	99,59	199,18
44	7310005016	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 12 m		%	2,50	204,93	512,33
45	Celkem za		5 Armatury				50 251,25
46	6	Otopná tělesa					
47	7310006001	Montáž otopných těles panelových / žebříkových		kus	1,00	482,19	482,19
48	7310006002	22-060120-60-VK		kus	1,00	3 587,59	3 587,59
49	7310006003	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m		%	2,00	4,82	9,64
50	Celkem za		6 Otopná tělesa				4 079,42
51	8	Měření a regulace MaR					
52	7310008001	D+M Měření a regulace vytápění - ekvitemní (řídící systém, rozvaděč, čidla, kabeláž, komplet) včetně GSM přístupu pro ovládání		ks	1,00	8 563,97	8 563,97
53	Celkem za		8 Měření a regulace MaR				8 563,97
54	PSV		PSV Celkem				146 714,77
55	Díl: 9	VRN + práce					
56	7310009001	VRN (doprava, zařízení staveniště)		ks	1,00	1 170,40	1 170,40
57	7310009002	Projektové práce dle skutečného provedení		ks	1,00	3 511,20	3 511,20
58	Celkem za		9 VRN + práce				4 681,60
59							158 026,55
60							
61							


NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU VÝMĚR / ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY.

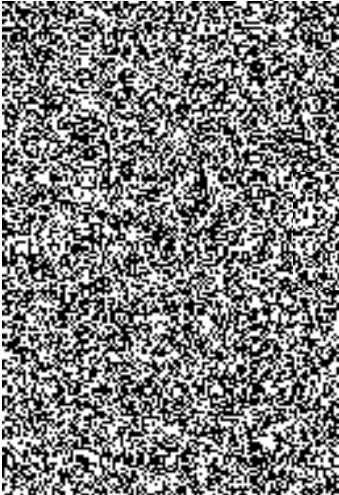

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : JKSO : D.1.4.e) - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ	
Stavba :	Název stavby : SKP :	
KŘP Khk - Deštné v Orlických horách - kotelna		
Projektant :	Radko Vondra - PRIDOS	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Obec Škrdlovice, čp.48, ŽnS	Náklady na MJ : 0
Ulrichovo náměstí 810/4, 500 02 Hradec Králové		Zakázkové číslo : 0
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	-	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

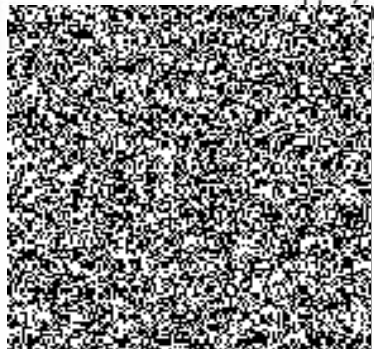Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem		
Z	Montáž celkem		
R	HSV celkem		
N	PSV celkem		
ZRN	celkem		
	HZS		
	RN II.a III.hlavy	Ostatní VRN	
	ZRN+VRN+HZS	VRN celkem	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:		

CENA ZA OBJEKT CELKEM BEZ DPH

14 251 Kč

Poznámka :

ROZPOČET (nedílnou součástí je projektová dokumentace)

Stavba : KRP Khk - Deštné v Orlických horách - kotelná
Objekt : D.1.4.e) - ZARÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

CENOVÁ ÚROVEŇ 4Q/2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
HSV						
Práce a dodávky HSV						
Díl: 1	Bourací práce prostupy					
7210001001	Bourací práce pro prostupy vedení					1 607,32
Celkem za	1 Bourací práce prostupy					1 607,32
HSV Celkem						
PSV						
Práce a dodávky PSV						
4	Trubní vedení - vnitřní přípojovací a stoupací gravitační kanalizace					
7210004001	Potrubi kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 50	m	4,00	559,49	2 237,96	
7210004002	Potrubi kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 75	m	2,00	576,94	1 153,88	
7210004003	Nápojení na stávající rozvod kanalizace	kus	1,00	301,37	301,37	
7210004004	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou	m	6,00	1,60	9,60	
7210004005	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	2,00	23,30	46,60	
Celkem za	4 Trubní vedení - vnitřní přípojovací a stoupací gravitační kanalizace					3 749,41
5	Trubní vedení - kanalizace tvarovky, armatury, výpustky					
7210005001	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,00	69,91	139,82	
7210005002	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 75	kus	1,00	84,78	84,78	
7210005003	Zapachová uzávěrka - pro úkap pojistného ventilu HL21	kus	2,00	360,36	720,72	
7210005004	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	2,00	3,15	6,30	
Celkem za	5 Trubní vedení - kanalizace tvarovky, armatury, výpustky					951,62
8	Trubní vedení - vnitřní rozvod studené vody, teplé vody a cirkulace					
7210008001	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 20 mm PN20	m	5,00	384,13	1 920,65	
7210008002	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 25 mm PN20	m	5,00	436,33	2 181,65	
7210008003	Nápojení na stávající rozvod vody	kus	1,00	301,37	301,37	
7210008004	Ochrana vodovodních trubek izolačními trubkami	m	11,00	55,75	613,25	
7210008005	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	m	11,00	1,60	17,60	
7210008006	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	m	11,00	1,60	17,60	
7210008007	Nosný systém potrubí, kotvení	kg	5,00	106,86	534,30	
7210008008	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	2,00	40,18	80,36	
Celkem za	8 Trubní vedení - vnitřní rozvod studené vody, teplé vody a cirkulace					5 666,78
9	Trubní vedení - vodovod armatury, zařízení					
7210009001	D+M Kulový kohout KK15	kus	1,00	137,07	137,07	
7210009002	D+M Kulový kohout KK20	kus	1,00	186,34	186,34	
7210009003	D+M Vypouštěcí kohout VK15	kus	1,00	132,94	132,94	
7210009004	Vývední výpustku	kus	1,00	334,69	334,69	
7210009005	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 12 m	%	2,00	40,18	80,36	
Celkem za	9 Trubní vedení - vodovod armatury, zařízení					871,40
PSV Celkem						
11 239,21						
Díl: 10	VRN + práce					
7210010001	VRN (doprava, zařízení staveniště)	kus	1,00	234,08	234,08	
7210010002	Projektové práce dle skutečného provedení	kus	1,00	1 170,40	1 170,40	
Celkem za	10 VRN + práce					1 404,48
14 251,01						

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU VÝMÉR / ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY.

Rozpočet akce: "KŘP Khk – Deštné v Orlických horách č.p. 131 –
kotelna, - vypracování projektové
dokumentace"

(Výkaz výměr akce) Část: D1.4.g) - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ
ELEKTROTECHNIKY

Datum: 15.11.2020

Vyhotovil:

Ing. Radko Vondra

Archivní číslo:

Sazba za hodinu:

380,00 Kč

Kontroloval:

Cenová úroveň :

09/2020

ZÁKLADNÍ NÁKLADY:

1. Dodávky celkem :		47 540,90	Kč
2. Doprava (4%) a přesun (2%) dodávek :	6,0%	2 852,45	Kč
3. Montážní materiál :		24 395,38	Kč
4. Montážní práce :		34 006,70	Kč
5. Zemní práce :		0,00	Kč
MEZISOUČET 1		108 795,43	Kč

PPV z montáží :	5,0%	1 700,34	Kč
PPV ze ZP :	1,5%	0,00	Kč
MEZISOUČET 2		1 700,34	Kč

Zhotovení dokumentace SKP:	1,5%	1 631,93	Kč
Nepředvídatelné práce, rizika :	2,0%	2 175,91	Kč
ZÁKLADNÍ NÁKLADY CELKEM		114 303,61	Kč

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Zařízení staveniště a mimostaveništní doprava (ZS + MSD):	1,5%	1 714,55	Kč
Provozní vlivy :	1,5%	1 714,55	Kč
VEDLEJŠÍ NÁKLADY CELKEM		3 429,11	Kč

Kompletační činnost :	2,0%	2 286,07	Kč
-----------------------	------	----------	----

NAKLADY CELKEM

120 018,79 Kč

ROZPOČET - "KŘP Khk – Deštné v Orlických horách č.p. 131 – kotelna, - vypracování projektové dokumentace"

	měrné jednotky	počet jednotek	objem jednotek	Souhrn materiál	Montáž jednotková	Souhrn montáž	Souhrn za celek
ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUDÉ ROZVODY, OSVĚTLENÍ, NOSNÉ TRASY, POSPOJENÍ							
1 1D DODÁVKY							
Elektroměrová rozvodnice RE pro 3 obchodní měření 3-fázové přímé + pro 3x přijímač HDO, rozvodnice v oceloplechovém zapuštěném provedení (480*1760*200mm) s výklopným rámem, s požární odolností EI-S30 DP1, provedení rozvodnice NER217 3+3 EI-S 30 DP1 (dle v.č. 1E30)	ks	1	26 780,00	26 780,00			26 780,00
Hlavní jistič instalační na DIN-lištu, 3-polový 40A/3/B, 10kA, 400V (k zabudování do RE pro nové odběrné místo)	ks	1	760,90	760,90			760,90
Připojovací poplatek distributoru ČEZ Distribuce za zřízení nového odběrného místa 40A/3fáze (40A á 500,-Kč = 20.000,-Kč)	ks	1	20 000,00	20 000,00			20 000,00
Σ1D SOUHRN DODÁVEK				47 540,90			47 540,90
8 2E ELEKTROMONTÁŽE, STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE							
9 Elektromontáže silnoproudé, slaboproudé a stavební přípomocce							
Demontáž stávající přípojky (hlavního domovního vedení = HDV) ze skříně HDS do stávajícího elektroměrového rozvaděče REM	Nh	3			350,00	1 050,00	1 050,00
Demontáž stávajícího elektroměrového rozvaděče REM na chodbě (se zachováním vývodů) zabudování nového elektroměrového rozvaděče KE do stavební niky připravené od stavebního dodavatele,	Nh	5			350,00	1 750,00	1 750,00
+ požární zapravení akrylátovým tmelem PROMASEAL Mastic v kartuši po celém vnějším obvodu požárního uzávěru (pro vyplnění vzniklé spáry mezi zdívkou a uzávěrem EI-S)	Nh	6			350,00	2 100,00	2 100,00
Zpětné zavedení stávajících kabelů vnitřní instalace do nového RE	Nh	1,5			350,00	525,00	525,00
Zavedení nové přípojky HDV do nového RE	Nh	1,5			350,00	525,00	525,00
Zapojení rozvaděče RE vč. přeložení 2 stávajících distribučních měření + 2x HDO do tohoto nového NER	Nh	8			350,00	2 800,00	2 800,00
Zavedení kabelů do svorkovnice PAS	Nh	0,5			350,00	175,00	175,00
Demontáž stávající elektroinstalace v kotelně	NH	6			350,00	2 100,00	2 100,00
Zapravení a zčištění drážky s přípojkovým kabelem HDV v trubce P32	m	10			203,50	2 035,00	2 035,00
21 Elektroinstalace silnoproudé s materiálem a montáží							
Kabel *J4x16	m	20	233,40	4 668,00	44,10	882,00	5 550,00
Kabel *J5x6	m	20	108,34	2 166,80	33,60	672,00	2 838,80
Kabel *O2x1,5 (tarif)	m	20	11,33	226,60	31,50	630,00	856,60
Kabel *J4x1,5 (termostat) - délka podle umístění termostatu	m	25	21,96	549,00	31,50	787,50	1 336,50
Kabel *J3x2,5 (zásuvka)	m	10	31,16	311,60	31,50	315,00	626,60
Instalační lišta hranatá vkladací LHD 50x20	m	15	39,58	593,70	70,35	1 055,25	1 648,95
Instalační lišta hranatá vkladací LV 20x20	m	20	18,78	375,60	61,95	1 239,00	1 614,60
Rohový kryt 50x20 vnější, vnitřní, ohybový	ks	6	29,68	178,08	7,00	42,00	220,08
Rohový kryt 20x20 vnější, vnitřní ohybový	ks	8	17,70	141,60	7,00	56,00	197,60
Kryt spojovací 50x20	ks	4	22,03	88,12	7,00	28,00	116,12
Kryt spojovací 20x20	ks	7	11,43	80,01	7,00	49,00	129,01
Pojistková vložka nožová PN000 80A gG, 500V	ks	3	49,69	149,07	1,00		149,07
Zásuvka 230 V / 16 A nástěnná, IP44	ks	1	78,73	78,73	169,75	169,75	248,48
Zářivka přisazená 2x 36 W, IP40, včetně 2 zdrojů - zářivek 36W/840	ks	1	797,77	797,77	332,50	332,50	1 130,27
Spínač 1-polový pod omítku 230V/10A, řazení 1, IP20	ks	1	137,24	137,24	51,80	51,80	189,04
Hmoždinka stavební HM8 s vrutem	ks	50	1,33	66,50	17,50	875,00	941,50
Trubka tuhá hrdlová P 32, 1250N, 2m, černá	m	20	107,65	2 153,00	32,90	658,00	2 811,00
Koleno pro trubku tuhou hrdlovou P32	ks	3	43,90	131,70	7,00	21,00	152,70
Krabice instalační hluboká s víčkem KU68-1920	ks	2	10,77	21,54	70,00	140,00	161,54
Krabice instalační přístrojová hluboká KU68	ks	2	5,86	11,72	31,85	63,70	75,42
Sádra stavební (6ks á 5 kg)	kg	30	5,35	160,50	1,00		160,50
Akrylátový požární tmel PROMASEAL Mastic (v kartuši 310 ml)	ks	1	669,50	669,50	1,00		669,50
45 Zemnění, pospojování							
Vodič CYA 4 mm2 zelená/žlutá ohebný (8ks á 5m + 2ks á 10)	m	60	13,23	793,80	23,80	1 428,00	2 221,80
48 Stavební přípomocce							
Stavební přípomocce z elektromontáží celkem	prc.	10%	35 000,00	3 500,00			3 500,00
51 Ostatní náklady							
Inženýrská činnost hlavního zhotovitele a koordinace při provádění (NH-GD = Nh+15%)	NH-GD	8			402,50	3 220,00	3 220,00
Autorský občasný dozor GP a technická koordinace při provádění (NH-PD = Nh+35%)	NH-PD	6			473,00	2 838,00	2 838,00
Cestovné k občasnému AD pro GP a technické koordinace při provádění (2x 45km*2)	km	180	16,50	2 970,00			2 970,00
Cestovné k elektromontážím (4x 18km*2)	km	144	15,80	2 275,20			2 275,20
Výchozí revize elektrického zařízení (NH-RT = Nh+30%)	NH-RT	8			455,40	3 643,20	3 643,20
Spolupráce zhotovitele s RT při výchozí revizi elektrického zařízení	Nh	4			350,00	1 400,00	1 400,00
Poplatek za uložení odpadů na skládku dle vyhlášky o odpadech	set	1	1 100,00	1 100,00			1 100,00
Manipulace a doprava odpadů na skládku dle vyhlášky o odpadech	Nh	1					350,00
Σ2E SOUHRN ELEKTROMONTÁŽE, STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE				24 395			58 402,08

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Název veřejné zakázky:

„Výměna topného zdroje - Deštné v Orlických horách“ objekt Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Identifikační údaje zadavatele


Název Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
IČO 75151545
Osoba oprávněná jednat Plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš, náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

Identifikační údaje uchazeče

Obchodní název ELMON spol. s r.o.
Sídlo třída Masarykova 277, 550 01 Broumov
IČO 47452161
DIČ CZ47452161
Zastoupena 

Poddodavatel			Činnost poddodavatele, kterou bude při realizaci provádět
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.	provedení činnosti autorizovaného stavbyvedoucího
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Nádražní 460, 51773 Opočno	
	IČO:	45535124	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	CZ45535124	
	Tel./fax:		
	E-mail:		
	Prokázání splnění části kvalifikačních předpokladů:	Autorizace	

V Dobrušce dne 7. 6. 2021



DODATEK č. 1

(dále také jen „dodatek“)

k pojistné smlouvě č.

8074463011

(dále také jen „pojistná smlouva“)

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí

53002 Pardubice, Česká republika

IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 567

(dále jen pojistitel)



pojistitele zastupuje:



a

ELMON spol. s r.o.

se sídlem / místem podnikání třída Masarykova 277

55001, Broumov

IČO: 47452161

KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2547

(dále jen „pojistník“)

pojistníka zastupuje:



se dohodly, že výše uvedená pojistná smlouva se mění a doplňuje takto:

Článek I.

Změna již existujících právních vztahů pojištění sjednaných pojistnou smlouvou

1. Živelní pojištění sjednané článkem II. pojistné smlouvy se ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku mění následovně:

NOVÉ

Pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že pojištění se ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku **NOVĚ VZTAHUJE i na následující hodnoty pojistného zájmu (následující nové předměty pojištění)**, a to s parametry pojištění uvedenými u jednotlivých nových hodnot pojistného zájmu (nových předmětů pojištění):

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Živelní pojištění VPP Z 2014 (dále jen "VPP Z 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

předmět pojištění: 16. Soubor staveb vyjma věcí uvedených v čl. III odst. 2. a 3. VPP		specifikace předmětu pojištění: vč. vedlejších staveb, oplocení	
místo pojištění: Masarykova tř. 277, Broumov; Běstviny 11; Malá Kostelní 393, Dobruška 51801		vlastnictví předmětu pojištění: vlastní i cizí	pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění: ¹⁾	spoluúčast:
FLEXA	48 000 000		5 000 Kč
Sklo all risks	20 000	1R	1 000 Kč

¹⁾Zkratkou „1R“ se pro účely této pojistné smlouvy rozumí pojištění prvního rizika a v tomto případě je horní hranice pojistného plnění stanovena limitem pojistného plnění; je-li pole výše uvedené tabulky ve sloupci „Způsob pojištění“ prázdné, rozumí se tím pro účely této pojistné smlouvy, že pojištění není sjednáno ve výše uvedeném speciálním právním režimu a horní hranice pojistného plnění je určena pojistnou částkou.

VÝKLAD POJMŮ

Pojmem **FLEXA** se pro účely této pojistné smlouvy rozumí živelní pojištění sjednané pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění způsobené pojistným nebezpečím dle čl. II odst. 1. VPP Z 2014.

ZMĚNY

Pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku **SE MĚNÍ obsah právního vztahu pojištění ve vztahu k následujícím dosavadním hodnotám pojistného zájmu (následujícím dosavadním předmětům pojištění)**. Pojistitel a pojistník výslovně a v zájmu předejití jakýmkoliv budoucím právním sporům o výklad pojistné smlouvy a tohoto dodatku uvádějí pro přehlednost níže vždy celý obsah právního vztahu pojištění vztahující se k jednotlivé hodnotě pojistného zájmu (k jednotlivému předmětu pojištění), a to i v těch jeho částech či dílčích parametrech, které tímto dodatkem změněny nebyly:

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Živelní pojištění VPP Z 2014 (dále jen "VPP Z 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

předmět pojištění: 1. Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP		specifikace předmětu pojištění: vč. stavebních souč. a příslušenství budov	
místo pojištění: Malá Kostelní 392, 518 01 Dobruška Malá Kostelní 393, 51801 Dobruška Domašínská 635, 518 01, Dobruška Masarykova tř. 277, 550 01 Broumov Běstvíny 11, 51801	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní	pojistná hodnota: nová cena	
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění: ¹⁾	spoluúčast:
FLEXA	1 450 000		5 000 Kč

předmět pojištění: 2. Skla osazená ve stavbách		specifikace předmětu pojištění:	
místo pojištění: Malá Kostelní 392, 518 01 Dobruška Malá Kostelní 393, 51801 Dobruška Domašínská 635, 518 01, Dobruška Masarykova tř. 277, 550 01 Broumov Běstvíny 11, 51801	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní i cizí	pojistná hodnota: nová cena	
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění: ¹⁾	spoluúčast:
Sklo all risks	50 000	1R	1 000 Kč

předmět pojištění: 3. Soubor zásob s výjimkou věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP		specifikace předmětu pojištění: vč. rozpracované výroby	
místo pojištění: Malá Kostelní 392, 518 01 Dobruška Malá Kostelní 393, 51801 Dobruška Domašínská 635, 518 01, Dobruška Masarykova tř. 277, 550 01 Broumov Běstvíny 11, 51801	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní	pojistná hodnota: nová cena	
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění: ¹⁾	spoluúčast:
FLEXA	6 500 000		5 000 Kč

předmět pojištění: 4. Soubor cenností		specifikace předmětu pojištění:	
místo pojištění: Malá Kostelní 392, 518 01 Dobruška Malá Kostelní 393, 51801 Dobruška Domašínská 635, 518 01, Dobruška Masarykova tř. 277, 550 01 Broumov Běstvíny 11, 51801	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní	pojistná hodnota: nová cena	
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění: ¹⁾	spoluúčast:
FLEXA	500 000	1R	1 000 Kč

předmět pojištění: 5. Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP		specifikace předmětu pojištění: vč. věcí převzatých a v užívání	
místo pojištění: ČR		vlastnictví předmětu pojištění: vlastní i cizí	pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění: ¹⁾	spoluúčast:
FLEXA	350 000		5 000 Kč

předmět pojištění: 6. Soubor zásob s výjimkou věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP		specifikace předmětu pojištění: vč. rozpracované výroby	
místo pojištění: ČR		vlastnictví předmětu pojištění: vlastní	pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění: ¹⁾	spoluúčast:
FLEXA	250 000		5 000 Kč

předmět pojištění: 8. - Všechny věci pojištěné touto smlouvou v rozsahu FLEXA dle VPP Z 2014 čl. II odst.1, kromě věcí pojištěných na zde sjednaná nebezpečí samostatně		specifikace předmětu pojištění:	
místo pojištění: Malá Kostelní 392, 518 01 Dobruška Malá Kostelní 393, 51801 Dobruška Domašínská 635, 518 01, Dobruška Masarykova tř. 277, 550 01 Broumov Běstviný 11, 51801		vlastnictví předmětu pojištění: vlastní i cizí	pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění: ¹⁾	spoluúčast:
Doplňková živelní nebezpečí	10 000 000	1R	5 000 Kč
Ujednává se, že pojištění v rozsahu dle VPP Z 2014 čl. II odst. 2. se sjednává i pro případ poškození či zničení předmětu pojištění zatečením atmosférických srážek (např. déšť, mrholení) a nebo vody z tajícího sněhu do budovy (dále jen 'zatečení atmosférických srážek') pokud k takovému zatečení došlo jinak, než působením některého pojistného nebezpečí dle VPP Z 2014 čl. II. Tímto ujednáním nejsou nijak dotčeny výluky z pojištění dle VPP Z 2014 čl. VI. Pojištění v rozsahu pojistného nebezpečí zatečení atmosférických srážek se dále nevztahuje na škodné události: a) vzniklé působením plísní a hub, b) způsobené atmosférickými srážkami, které před zatečením do budovy již dopadly na zemský povrch, c) způsobené v příčinné souvislosti s prováděním oprav nebo rekonstrukcí, d) spočívající v úhradě nákladů vynaložených k odstranění příčiny zatečení atmosférických srážek. Součet pojistných plnění vyplacených za pojistné události způsobené pojistným nebezpečím zatečení atmosférických srážek, nastalé v každém jednom roce trvání účinnosti této pojistné smlouvy, nesmí přesáhnout limit pojistného plnění ve výši 50 000 Kč. Spoluúčast pojištěného se sjednává ve výši 5 000 Kč.			
Povodeň nebo záplava	10 000 000	1R	5 000 Kč
Vodovodní škoda	3 000 000	1R	5 000 Kč
Zkrat nebo přepětí	100 000	1R	1 000 Kč

¹⁾Zkratkou „1R“ se pro účely této pojistné smlouvy rozumí pojištění prvního rizika a v tomto případě je horní hranice pojistného plnění stanovena limitem pojistného plnění; je-li pole výše uvedené tabulky ve sloupci „Způsob pojištění“ prázdné, rozumí se tím pro účely této pojistné smlouvy, že pojištění není sjednáno ve výše uvedeném speciálním právním režimu a horní hranice pojistného plnění je určena pojistnou částkou.

VÝKLAD POJMŮ

Pojmem **FLEXA** se pro účely této pojistné smlouvy rozumí živelní pojištění sjednané pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění způsobené pojistným nebezpečím dle čl. II odst. 1. VPP Z 2014.

Pojmem **Doplňková živelní nebezpečí** se pro účely této pojistné smlouvy rozumí živelní pojištění sjednané pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění způsobené pojistným nebezpečím dle čl. II odst. 2. VPP Z 2014.

UKONČENÍ

Pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že **pojištění se ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku nově NEVZTAHUJE na následující dosavadní hodnoty pojistného zájmu (následující dosavadní předměty pojištění)**. Níže specifikované hodnoty pojistného zájmu (předměty pojištění) tak od data nabytí účinnosti tohoto dodatku již předmětem pojištění nejsou:

předmět pojištění: 7. Stavba		specifikace předmětu pojištění: vč. vedl. staveb, oplocení	
místo pojištění: Masarykova tř. 277, Broumov 55001	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní	pojistná hodnota: nová cena	
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění: ¹⁾	spoluúčast:
FLEXA	24 000 000		5 000 Kč

¹⁾ Zkratkou „1R“ se pro účely této pojistné smlouvy rozumí pojištění prvního rizika a v tomto případě je horní hranice pojistného plnění stanovena limitem pojistného plnění; je-li pole výše uvedené tabulky ve sloupci „Způsob pojištění“ prázdné, rozumí se tím pro účely této pojistné smlouvy, že pojištění není sjednáno ve výše uvedeném speciálním právním režimu a horní hranice pojistného plnění je určena pojistnou částkou.

2. Pojištění odcizení sjednané článkem II. pojistné smlouvy se ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku mění následovně:

ZMĚNY

Pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že **ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku SE MĚNÍ obsah právního vztahu pojištění ve vztahu k následujícím dosavadním hodnotám pojistného zájmu (následujícím dosavadním předmětům pojištění)**. Pojistitel a pojistník výslovně a v zájmu předejítí jakýmkoliv budoucím právním sporům o výklad pojistné smlouvy a tohoto dodatku uvádějí pro přehlednost níže vždy celý obsah právního vztahu pojištění vztahující se k jednotlivé hodnotě pojistného zájmu (k jednotlivému předmětu pojištění), a to i v těch jeho částech či dílčích parametrech, které tímto dodatkem změněny nebyly:

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění odcizení VPP K 2014 (dále jen "VPP K 2014"), které tvoří přílohu této pojistné smlouvy.

Dále se toto pojištění řídí také Doplnkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2014 (dále jen "DPP PZK 2014"), které jsou také nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Je-li touto pojistnou smlouvou v souladu s čl. II. odst. 2. VPP K 2014 pojištění sjednáno i pro případ pojistného nebezpečí vandalismus, je limit pojistného plnění ve výši 50 000 Kč horní hranicí pojistného plnění za pojistnou událost způsobenou poškozením nebo zničením předmětu pojištění nebo jeho části jakýmkoliv znečištěním, zabarvením, kresbami či nápisy.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

předmět pojištění: 8. - Všechny věci pojištěné touto smlouvou v rozsahu FLEXA dle VPP Z 2014 čl. II odst. 1, kromě věcí pojištěných na zde sjednaná nebezpečí samostatně		specifikace předmětu pojištění:	
místo pojištění: Česká republika; Malá Kostelní 392, 518 01 Dobruška Malá Kostelní 393, 51801 Dobruška Domašínská 635, 518 01, Dobruška Masarykova tř. 277, 550 01 Broumov Běstvíny 11, 51801	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní i cizí	pojistná hodnota: nová cena	
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění: ¹⁾	spoluúčast:
Pojištění odcizení	500 000	1R	1 000 Kč
Odchylně od kódu stupně zabezpečení Z2, Z3, Z7 a Z17 čl. III DPP PZK 2014 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění až do výše 2 násobku limitu pojistného plnění stanoveného v DPP PZK 2014 pro výše uvedený kód stupně zabezpečení.			
Vandalismus	500 000	1R	10 %, min. 1 000 Kč

předmět pojištění: 9. Soubor cenností		specifikace předmětu pojištění:	
místo pojištění: Česká republika; Malá Kostelní 392, 518 01 Dobruška Malá Kostelní 393, 51801 Dobruška Domašínská 635, 518 01, Dobruška Masarykova tř. 277, 550 01 Broumov Běstvíny 11, 51801	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní	pojistná hodnota: nová cena	
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění: ¹⁾	spoluúčast:
Pojištění odcizení	500 000	1R	1 000 Kč

¹⁾Zkratkou „1R“ se pro účely této pojistné smlouvy rozumí pojištění prvního rizika a v tomto případě je horní hranice pojistného plnění stanovena limitem pojistného plnění; je-li pole výše uvedené tabulky ve sloupci „Způsob pojištění“ prázdné, rozumí se tím pro účely této pojistné smlouvy, že pojištění není sjednáno ve výše uvedeném speciálním právním režimu a horní hranice pojistného plnění je určena pojistnou částkou.

VÝKLAD POJMŮ

Pojmem **Pojištění odcizení** se pro účely této pojistné smlouvy rozumí pojištění sjednané pro případ vzniku škodné události působením pojistných nebezpečí dle čl. II odst. 1. VPP K 2014.

Článek II. Speciální smluvní ujednání

Souhrnné roční limity pojistného plnění:

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši 10 000 000 Kč je horní hranicí pojistného plnění pojistitele z pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za pojistné události nastalé v každém jednom roce trvání účinnosti dle této pojistné smlouvy a způsobené pojistnými nebezpečími **vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, lavina, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesení, tíha sněhu nebo námraza, náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna**. Tento limit pojistného plnění se vztahuje i na pojištění přerušení nebo omezení provozu z důvodu věcné škody, došlo-li k věcné

škodě z příčiny vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, lavina, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesení, tíha sněhu nebo námraza, náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna, je-li v pojistné smlouvě sjednáno. Pokud jsou pojištění s pojistnými nebezpečími vyjmenovanými tímto odstavcem sjednána v čl. II v samostatné části Pojištění vozidel nebo Pojištění přepravovaného nákladu, limit pojistného plnění se na ně nevztahuje.

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši **10 000 000 Kč** je horní hranicí pojistného plnění pojistitele z pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za pojistné události nastalé v každém jednom roce trvání účinnosti dle této pojistné smlouvy a způsobené pojistnými nebezpečími **povodeň nebo záplava**. Tento limit pojistného plnění se vztahuje i na pojištění přerušení nebo omezení provozu z důvodu věcné škody, došlo-li k věcné škodě z příčiny povodeň nebo záplava, je-li v pojistné smlouvě sjednáno. Pokud jsou pojištění s pojistným nebezpečím záplava, povodeň sjednána v čl. II v samostatné části Pojištění vozidel nebo Pojištění přepravovaného nákladu, limit pojistného plnění se na ně nevztahuje.

Článek III.

Změny ve výši pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou po nabytí účinnosti tohoto dodatku

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

Pojištění	Změna ročního pojistného	Roční pojistné po změnách
1. Živelní pojištění	6 467 Kč	27 489 Kč
2. Pojištění odcizení	0 Kč	12 471 Kč
3. Pojištění elektronických zařízení	0 Kč	1 690 Kč
4. Pojištění přepravovaného nákladu	0 Kč	3 606 Kč
5. Pojištění odpovědnosti za újmu	0 Kč	42 993 Kč
Součet	6 467 Kč	88 251 Kč

Změna pojistného celkem	5 769 Kč
Od 09.02.2021 00:00 hodin do 01.01.2022 00:00 hodin	
Součet splátek pojistného z předešlého dodatku číslo 0	40 892 Kč
Od 09.02.2021 00:00 hodin do 01.01.2022 00:00 hodin	
Součet	46 661 Kč

Změna pojistného = pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění a zároveň se toto pojištění znovu sjednává z důvodu změny pojištění, je to rozdíl mezi původní a novou výší pojistného (kladná nebo záporná částka) *nebo* pokud se tímto dodatkem sjednává nové pojištění, je to výše pojistného za nové sjednané pojištění (kladná částka) *nebo* pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění, je to výše pojistného za zrušené pojištění (záporná částka)

Změna ročního pojistného = změna pojistného vyjádření v ročním pojistném

Roční pojistné po změnách = pojistné za všechna platná pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a dodatky pojistné smlouvy vyjádřené v ročním pojistném

Splátkový kalendář

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a po změnách provedených tímto dodatkem pojistné smlouvy se do 01.01.2022 00:00 hodin řídí následujícím splátkovým kalendářem:

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
09.02.2021	2 536 Kč
01.07.2021	44 125 Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet JCI a.s.
 číslo 279990311/0300
 konstantní symbol 3558,
 variabilní symbol 8074463011
 Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet JCI a.s.

Pojistitel a pojistník sjednávají délku pojistného období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy následovně:

- a) první pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce ode dne počátku všech pojištění sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy do nejbližšího následujícího dne konce pojistného období všech pojištění sjednaných samotnou pojistnou smlouvou, nebo je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak se první pojistné období sjednává v délce rovné pojistné době;
- b) druhé a každé další pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce shodné s délkou pojistných období ve všech pojištěních sjednaných samotnou pojistnou smlouvou.

Výše pojistného za další pojistné období se řídí splátkovým kalendářem zaslaným pojistníkovi na začátku dalšího pojistného období.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem **09.02.2021**

2. Prohlášení pojistníka

2.1. **Prohlášení pojistníka, je-li pojistník fyzickou osobou:** Prohlašuji a svým podpisem níže stvrzuji, že:

- a) jsem byl před uzavřením pojistné smlouvy, zcela v souladu s ustanovením čl. 13 a čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen "GDPR"), pojistitelem řádně a detailně (co do vysvětlení obsahu a významu všech jeho jednotlivých ustanovení) seznámen s Informacemi o zpracování osobních údajů (tzv. Informačním memorandem);
- b) seznámení s Informačním memorandem za pojistitele provedla právě ta konkrétní fyzická osoba, která za pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu (přičemž adresátem uvedených informací může být pojišťovací makléř, coby pojišťovací zprostředkovatel zastupující pojistníka);
- c) po seznámení se s Informačním memorandem a před uzavřením pojistné smlouvy mně byl dán naprosto dostatečný časový prostor pro vlastní seznámení se s Informačním memorandem a pro zodpovězení všech mých případných dotazů k Informačnímu memorandu;
- d) беру на ведоми а jsem srozuměn s informací pojistitele o tom, že Informační memorandum je a bude zájemci o pojištění resp. pojistníkovi a jinému účastníkovi pojištění k dispozici na internetových (webových) stránkách pojistitele na adrese www.csobpoj.cz nebo na vyžádání pojistníka u té konkrétní fyzické osoby, která jménem pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu, anebo na kterémkoliv obchodním místě pojistitele.

2.2. Prohlašuji a svým podpisem níže stvrzuji, že:

- a) jsem byl před uzavřením této pojistné smlouvy, zcela v souladu s ustanovením § 2774 občanského zákoníku, pojistitelem řádně a detailně (co do vysvětlení obsahu a významu všech jejích jednotlivých ustanovení) seznámen s Infolistem produktu, s Informačním dokumentem o pojistném produktu, s rozsahem pojištění a s všeobecnými pojistnými podmínkami (dále také jen "pojistné podmínky"), které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy;
- b) jsem byl před uzavřením této pojistné smlouvy podrobně seznámen se všemi vybranými ustanoveními pojistných podmínek zvlášť uvedenými v dokumentu „Infolist produktu“, která by mohla být považována za ustanovení neočekávaná ve smyslu ustanovení § 1753 občanského zákoníku, a souhlasím s nimi. Dále prohlašuji, že mé odpovědi na písemné dotazy pojistitele ve smyslu ustanovení § 2788 občanského zákoníku jsou pravdivé a úplné;
- c) seznámení s Informačním dokumentem o pojistném produktu a s pojistnými podmínkami za pojistitele provedla právě ta konkrétní fyzická osoba, která za pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu (přičemž adresátem uvedených informací může být pojišťovací makléř, coby pojišťovací zprostředkovatel zastupující pojistníka);

- d) po seznámení se s obsahem všech předsmuvních a smluvních dokumentů a před uzavřením pojistné smlouvy mně byl dán naprosto dostatečný časový prostor pro vlastní seznámení se s obsahem a významem těchto dokumentů a pro zodpovězení všech mých případných dotazů k těmto dokumentům;
- e) před uzavřením pojistné smlouvy mi byly v listinné podobě poskytnuty Informační dokument o pojistném produktu a pojistné podmínky;
- f) jsem v dostatečné době před uzavřením této pojistné smlouvy obdržel od pojišťovacího makléře Záznam z jednání, včetně všech jeho příloh;
- g) v souladu s ustanovením § 128 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, uděluji pojistiteli souhlas s poskytnutím informací týkajících se pojištění:
- členům skupiny ČSOB, jejichž seznam je uveden na internetových stránkách www.csob.cz/skupina a
 - ostatním subjektům podnikajícím v pojišťovnictví a zájmovým sdružením či korporacím těchto subjektů.
3. Ostatní ustanovení pojistné smlouvy, než ustanovení výslovně zmíněná v tomto dodatku, se tímto dodatkem nijak nemění.
4. Správce pojistné smlouvy: Ing. Ladislav Marek
5. Počet stran dodatku pojistné smlouvy bez příloh: 9
6. Tento dodatek pojistné smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech shodné právní síly, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojistník, jedno makléř a zbývající pojistitel.
7. Smluvní strany tohoto dodatku po jeho důkladném přečtení výslovně prohlašují, že tento dodatek přečetly, že jej uzavírají podle své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod tlakem či za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své vlastní podpisy svých oprávněných zástupců.

V Broumově dne 08.02.2021

V Pardubicích dne 08.02.2021

Splátkový kalendář k dodatku č. 1 pojistné smlouvy č. 8074463011

Tento splátkový kalendář upravuje splátky pojistného za změnu pojištění dle výše uvedeného dodatku pojistné smlouvy na pojistné období nebo na pojistnou dobu **od 09.02.2021 00:00 hodin do 01.01.2022 00:00 hodin**.

Pojistník je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách:

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
09.02.2021	2 536 Kč
01.07.2021	44 125 Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet JCI a.s.

číslo 279990311/0300

konstantní symbol 3558,

variabilní symbol 8074463011

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet JCI a.s.

V Pardubicích dne 08.02.2021

Ověřovací doložka pro vidimaci
Podle ověřovací knihy pošty: Dobruška

Poř.č.: 51801-0085-0109

Tato úplná kopie, obsahující 10 stran, souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopis, obsahující 10 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek.

Dobruška, dne 22.06.2021

PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že budu provádět odborné vedení provádění stavby – jako stavbyvedoucí v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebním zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména v souladu s ustanoveními § 153, 158 a 160 zákona, na akci:

„Výměna topného zdroje - Deštné v Orlických horách“ objekt Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje“

Dále prohlašuji, že jsem oprávněná osoba, dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, autorizovaný inženýr/technik pro obor pozemní stavby, ČKAIT 0601116

V Opočně, dne 11.6.2021

Autorizovaný inženýr/technik

Jméno:

Adresa:

Telefon:


Podpis:

nebo elektronický podpis:

Otisk autorizačního razítka:

Poznámka: uveďte vždy i příslušný obor autorizace, pokud bude označeno autorizačním razítkem, není třeba dokládat výpisem z komory, stává se veřejnou listinou

POVĚŘENÍ

V souladu s ustanoveními § 153, 158 a 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebním zákon), ve znění pozdějších předpisů, pověřujeme pana  autorizovaného inženýra/technika v oboru pozemní stavby, ČKAIT 0601116,  bydlícím  k odbornému vedení provádění stavby, tj. stavbyvedoucím, na akci

„Výměna topného zdroje - Deštné v Orlických horách“ objekt Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje“

V Dobrušce, dne 7. 6. 2021


Firma: ELMON spol. s r.o.


Adresa: třída Masarykova 277, 55001
Broumov 

Telefon: 

Jméno jednatele: 


Podpis jednatele:


nebo elektronický podpis 

Razítko: 

Pověření ve výše uvedeném rozsahu na výše uvedenou akci přijímám.

V Opočně, dne 11.6.2021

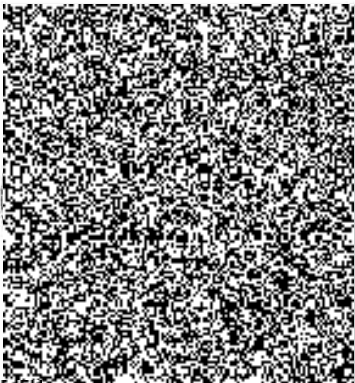Jméno stavbyvedoucího: 

Autorizační razítko: 

Podpis: 

Telefon: 

Ověřovací doložka pro vidimaci
Podle ověřovací knihy pošty: Dobruška

Poř.č: 51801-0085-0108

Tato úplná kopie, obsahující 1 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopis, obsahující 1 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje
viditelný zajišťovací prvek.

Dobruška, dne 22. 06. 2021

