

Číslo smlouvy CETIN: PN 2021_0005
Číslo smlouvy stavebníka č. 1 :
Číslo smlouvy stavebníka č. 2 : 2021/003824

SAP: 8030002412
Registr smluv: ANO

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. PN 2020_0005**

mezi

CETIN a.s.

a

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

a

Statutární město Plzeň

Číslo smlouvy CETIN: PN 2021_0005
Číslo smlouvy stavebníka č. 1 :
Číslo smlouvy stavebníka č. 2 : 2021/003824

SAP: 8030002412
Registr smluv: ANO

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. B 20623
zastoupená Josefem Slovákem, manažerem, Výstavba pevné přístupové sítě
ID DS: qa7425t
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2019160003/6000
(dále „**CETIN**“)

a

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

sídlem Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň
IČO: 72053119
DIČ: CZ72053119
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp.zn. Pr 737
zastoupená Ing. Miroslavem Doležalem, generálním ředitelem
datová schránka: qbep485
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 5146600001/5500
(dále „**Stavebník č. 1**“)

a

Statutární město Plzeň

se sídlem nám. Republiky 1/1, 301 00, Plzeň
IČO: 00075370
DIČ: CZ00075370
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím odboru investic MMP
odbor investic MMP, Škroupova 5, PSČ 306 32, Plzeň
ID DS: 6iybfxn
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 4819860277/0100
(dále „**Stavebník č. 2**“)

Stavebník č. 1 a Stavebník č. 2 jsou dále společně označováni jako „**Stavebník**“. CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy níže uvedený význam:

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky, která je přílohou č. 1 této Smlouvy.

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

Překládka je stavba v k.ú Bolevec spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví CETIN, jejíž rozsah je specifikován v Projektu.

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování Projektu, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písm. (a) Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

Vyjádření o existenci SEK je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN ze dne 3.7.2020 pod č.j. 689778/20 jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník.

„Zákon o vyvlastnění“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.

1.2 Stavebník na základě obdrženého dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích Překládku dotčené části SEK.

1.3 Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPIC Plzeň 28. října II_231 2.část, MK+OK“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a závazek Stavebníka, jenž Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v Projektu.
- 3.2 Předpoklady (podmínkami) pro realizaci Překládky jsou:
- i) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky,
 - ii) zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou nebo vyvlastnění takového práva.
- (vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN vůči Stavebníkovi odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.
- 3.6 Pokud je touto Smlouvou k čemukoliv zavázán či povinen Stavebník a není-li tuto Smlouvou stanoveno jinak (např. dle odst. 5.2. věta druhá stanovující poměr nákladů spojených s Překládkou), jsou Stavebník č. 1 a Stavebník č. 2 zavázáni a povinni společně a nerozdílně. Pokud je touto Smlouvou ve vztahu ke Stavebníkovi zavázána či povinna společnost CETIN a není-li tuto Smlouvou stanoveno jinak, považuje se jednání učiněné společností CETIN ve vztahu k Stavebníkovi za řádně a včas učiněné kterékoli z osob na straně Stavebníka.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

- 4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje
- a) před realizací Překládky:
 - i) - uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy,
 - b) po realizaci Překládky:
 - i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky (dokumentace skutečného provedení Překládky není dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění),
 - ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
 - iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.
- 4.2 V souvislosti s Překládkou se Stavebník zavazuje

a) před realizací Překládky:

- i) zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky písemně vyzvat společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (to vše dále „**Písemná výzva Stavebníka**“) s tím, že Písemná výzva Stavebníka může být učiněna nejdříve čtyři (4) měsíce od uzavření Smlouvy.

Stavebník prohlašuje, že mu pro stavbu Překládky svědčí řádné a platné územní rozhodnutí a ke dni uzavření této Smlouvy převádí na společnost CETIN následující práva a povinnosti z územního rozhodnutí Magistrátu města Plzně – rozhodnutí o umístění stavby II/231 v úseku U Velkého rybníka – hranice okresu, rekonstrukce silnice, č.j. 5079/2005-MMP/STA V_JIR ze dne 25.7.2006, které nabylo právní moci dne 2.9.2006, a z rozhodnutí Magistrátu města Plzně o prodloužení platnosti č.j. STAV/5962/08/JIR ze dne 20.10.2008, které nabylo právní moci 25.11.2008 (společně dále jen „**Územní rozhodnutí**“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v tomto Územním rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Územním rozhodnutí výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Územní rozhodnutí je Přílohou č. 2 Smlouvy.

- 4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky v koordinaci se Stavebníkem (i) do pěti (5) měsíců od doručení Písemné výzvy Stavebníka dle podmínek odst. 4.2 Smlouvy, a to za předpokladu, že ke dni doručení Písemné výzvy Stavebníka jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v odst. 3.2 Smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v odst. 4.2 Smlouvy, (ii) jinak nejpozději v koordinaci se stavebníkem do pěti (5) měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.
- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s a ve vyvlastňovacím řízení.
- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě této Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinností dle této Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být případně zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.

- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v odst. 8.2 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky s tím, že pokud Stavebník toto oznámení nepřevzme, pak dnem ukončení realizace Překládky je pátý (5.) den od odeslání tohoto oznámení společností CETIN Stavebníkovi.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s Překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu ke dni uzavření této Smlouvy činí **908 421,00,00 Kč** (slovy: devět set osm tisíc čtyři sta dvacet jedna korun českých); specifikace nákladů je uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy. Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty. Stavebník se bude podílet na nákladech spojených s Překládkou na základě samostatných a oddělených faktur vystavených v poměru:
Stavebník č. 1 je povinen uhradit 50 % nákladů spojených s Překládkou,
Stavebník č. 2 je povinen uhradit 50 % nákladů spojených s Překládkou.
- 5.3 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Mezi nezbytné náklady na Překládku patří zejména, nikoliv však výlučně:

- i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v Čl. 4 bodu 4.4 této smlouvy),
- ii) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy,
- iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vážnoci na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru nemovitostí,
- iv) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- vi) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- vii) náklady na identifikaci parcel,
- viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,

- x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- xi) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- xiv) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

5.4 Výše nákladů na Překládku se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě daňového dokladu (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou vystaveny společností CETIN do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu odst. 4.7 Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti .
- 6.2 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.3 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresy uvedené v hlavičce této Smlouvy.
- 6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných faktur vystavených společností CETIN každému z osob na straně Stavebníka v poměru stanoveném v odst. 5.2 Smlouvy.
- 6.5 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.6 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturami vystavenými společností CETIN stanoveno jinak.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

7.4 Zánikem Smlouvy rozvazovací podmínkou dle čl. 9 této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: [REDAKCE]

funkce: specialista pro výstavbu sítě

e-mail: [REDAKCE]

ve věcech technických: [REDAKCE]

funkce: specialista pro výstavbu sítě

e-mail: [REDAKCE]

8.2 Za Stavebníka č. 1:

ve věcech smluvních: [REDAKCE]

funkce: právník, veřejné zakázky

e-mail: [REDAKCE]

ve věcech technických: [REDAKCE]

funkce: vedoucí přípravy a realizace staveb Plzeň-město

e-mail: [REDAKCE]

Za Stavebníka č. 2:

ve věcech smluvních: [REDAKCE]

funkce: vedoucí odboru investic MMP

e-mail: [REDAKCE]

ve věcech technických: [REDAKCE]

funkce: referent OI MMP

e-mail: [REDAKCE]

9. Odstoupení od smlouvy

9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.

9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.

9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.

9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že

odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.

- 9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Písemná výzva Stavebníka musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Písemná výzva Stavebníka výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou.

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník č. 1 se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy společností CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- a) v listinné podobě;
- b) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zaručený elektronický podpis**“);
- c) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
- d) e-mailovou zprávou zaslánou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 této Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.7, věty první Smlouvy a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmeny (c) a (d).

12.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.

- 12.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
- 12.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.10 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoliv svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.11 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.12 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.13 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).
- Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a

Číslo smlouvy CETIN: PN 2021_0005
Číslo smlouvy stavebníka č. 1 :
Číslo smlouvy stavebníka č. 2 : 2021/003824

SAP: 8030002412
Registr smluv: ANO

realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.14 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.

12.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

- Příloha č. 1 - Projekt
- Příloha č. 2 - Specifikace nákladů Překládky
- Příloha č. 3 - Územní rozhodnutí – o umístění stavby č.j.: 5079/2005-MMP/STAV-JIR ze dne 25.7.2006
- Příloha č. 4 - Územní rozhodnutí – prodloužení platnosti č.j.: STAV/5962/08/JIR-3 ze dne 20.10.2008

CETIN:

Stavebník:

V Praze dne

V Plzni dne

CETIN a.s.
Josef Slovák
manažer, Výstavba pevné přístupové sítě


Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel


V Plzni dne


statutární město Plzeň
Ing. Pavel Grisník
vedoucí odboru investic MMP





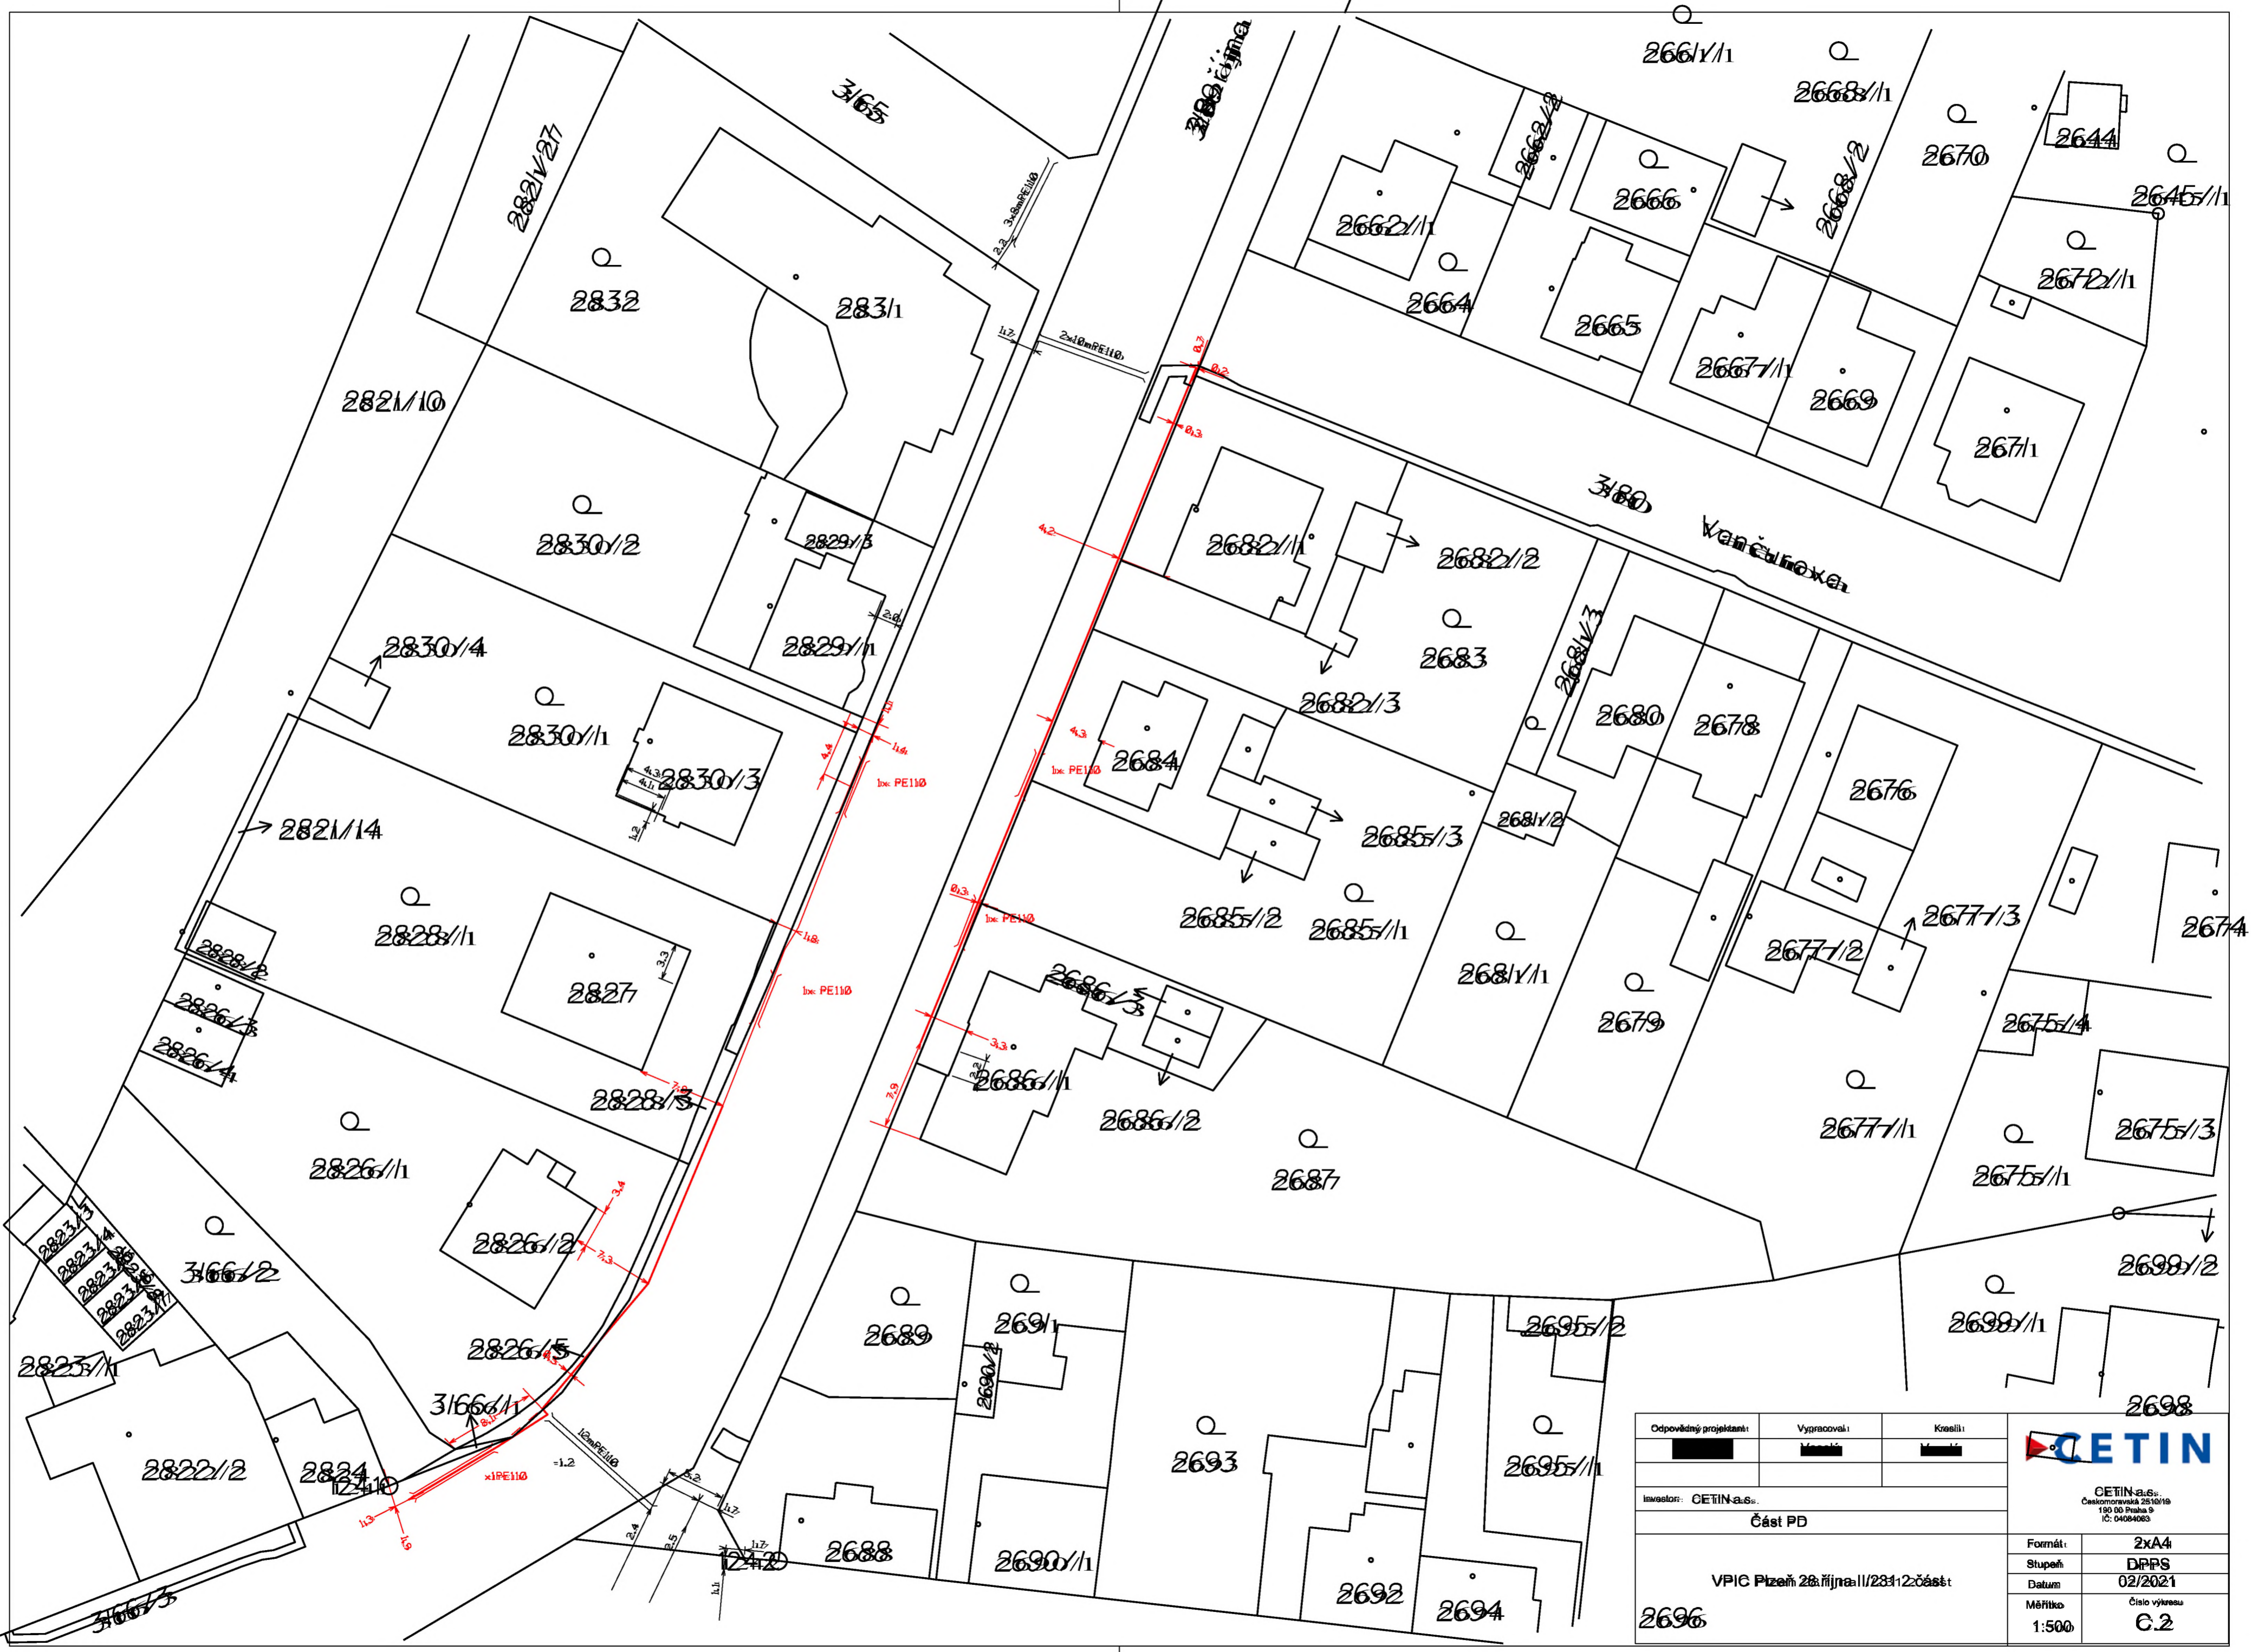


Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kreml:	CETIN
Investor: CETIN a.s.			CETIN a.s. Českomoravská 2510/19 190 03 Praha 9 IČ: 04084083
Část PD			Formát: 2xA4
VPIC Píseň 28. října II/2812: část			Stupeň: DRPS
			Datum: 02/2021
			Měřítko: 1:500
			Číslo výkresu: C.1

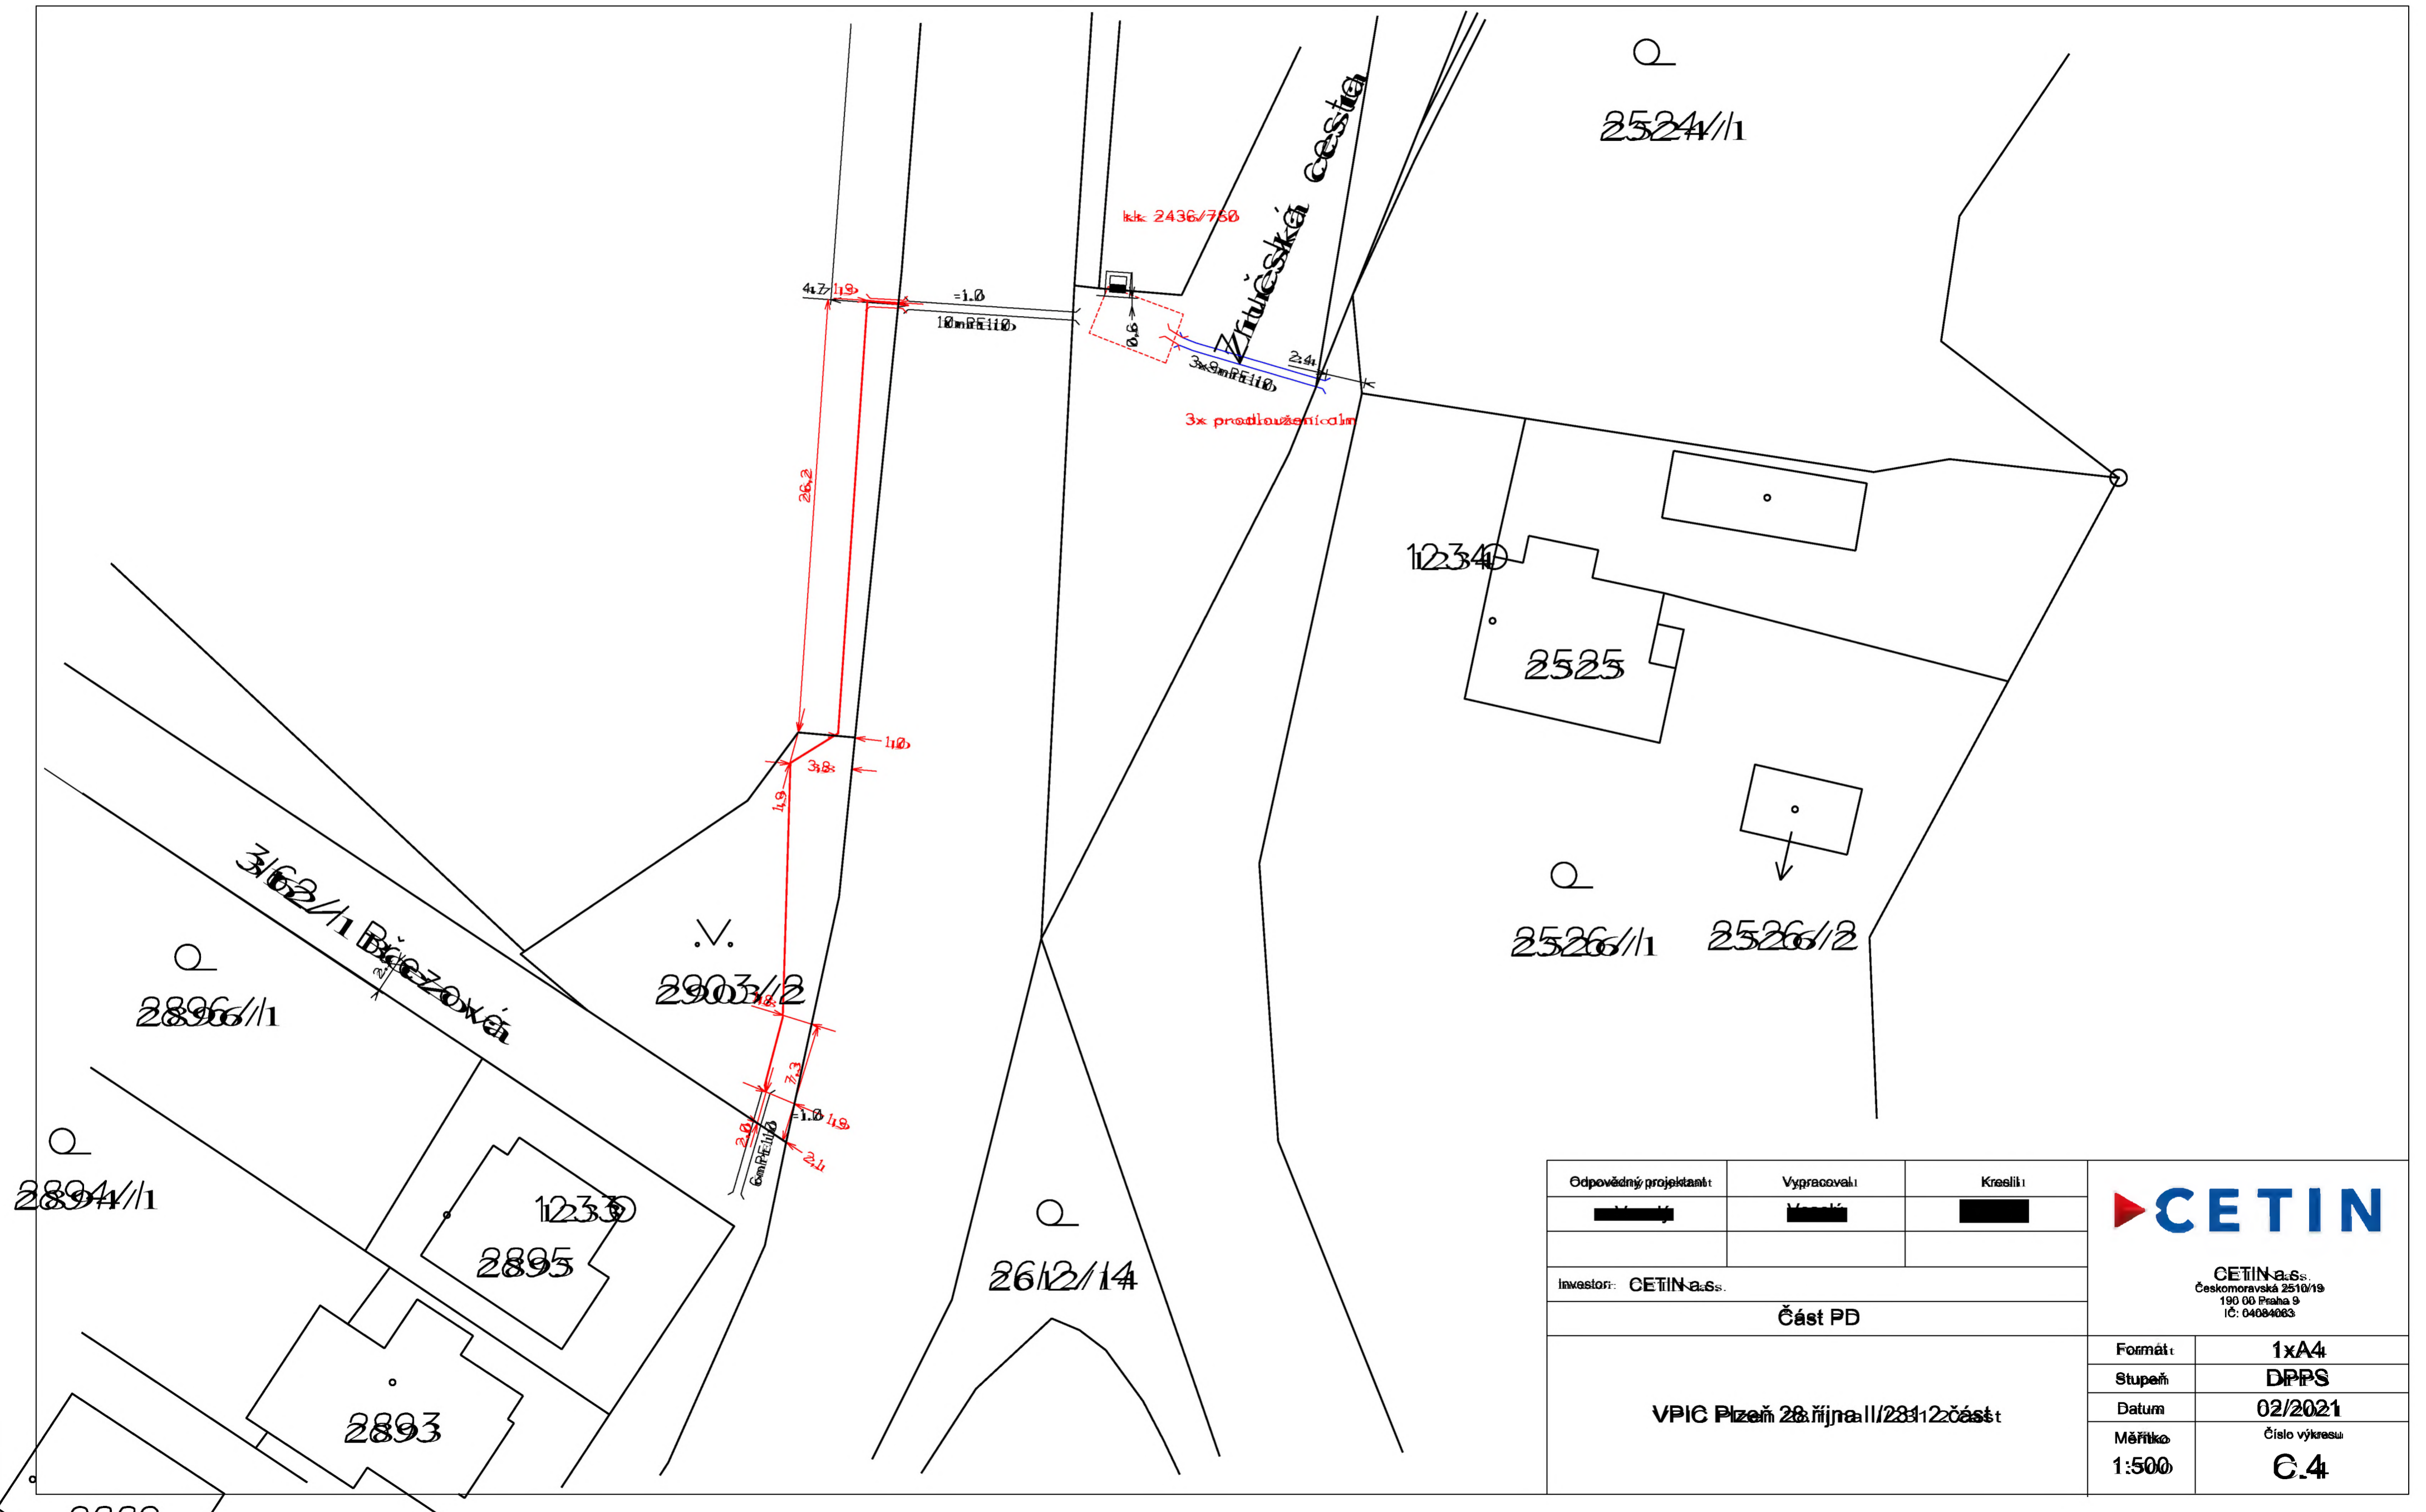


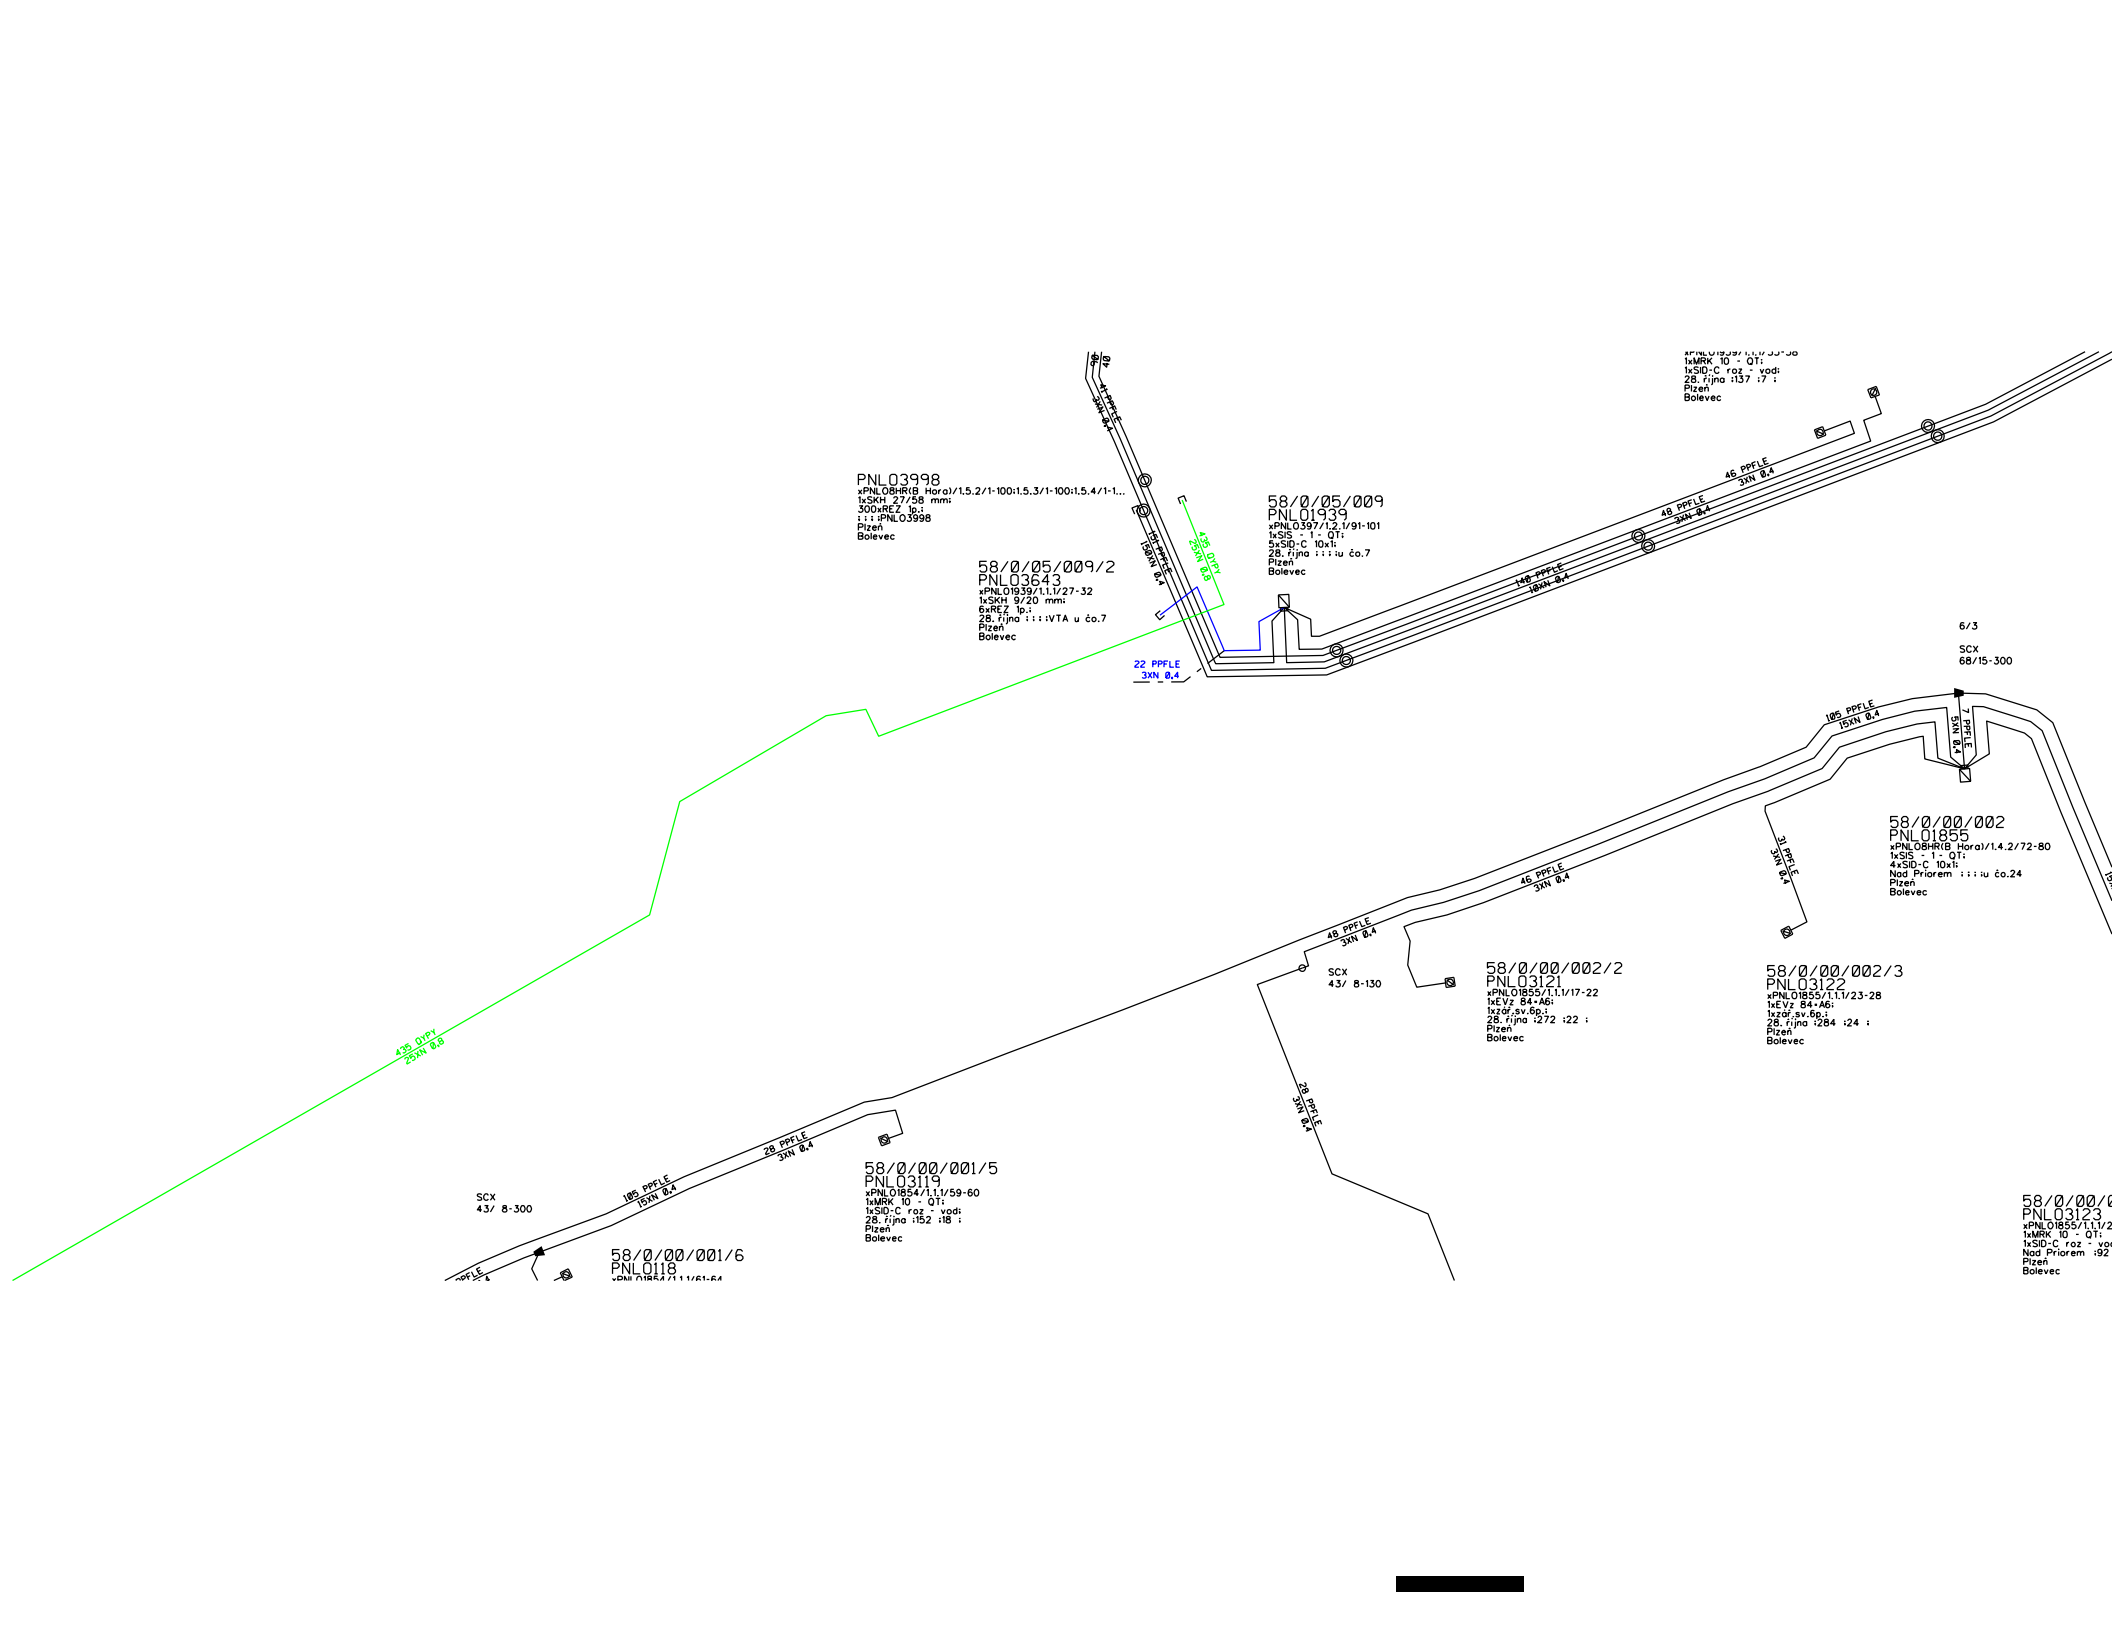
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kremlil:	 CETIN a.s. Českomoravská 2514/19 190 00 Praha 9 IČ: 04084083
Investor: CETIN a.s.			Formát: 2xA4
Část PD			Stupeň: DRPS
VPIC Plocha 28. října II/2312 část			Datum: 02/2021
2696			Měřítko: Číslo výřezu: C.2
			1:500



Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kretil:	 <p>CETIN a.s. Českomoravská 2510/19 190 00 Praha 9 IČ: 04084063</p>
			
Investor: CETIN a.s.			
Část PD			Formát: 1xA4
VPIC Píseň 28. října II/2812 část			Stupeň: DPPS
			Datum: 02/2021
			Měřítko: 1:500 Číslo výkresu: C.4

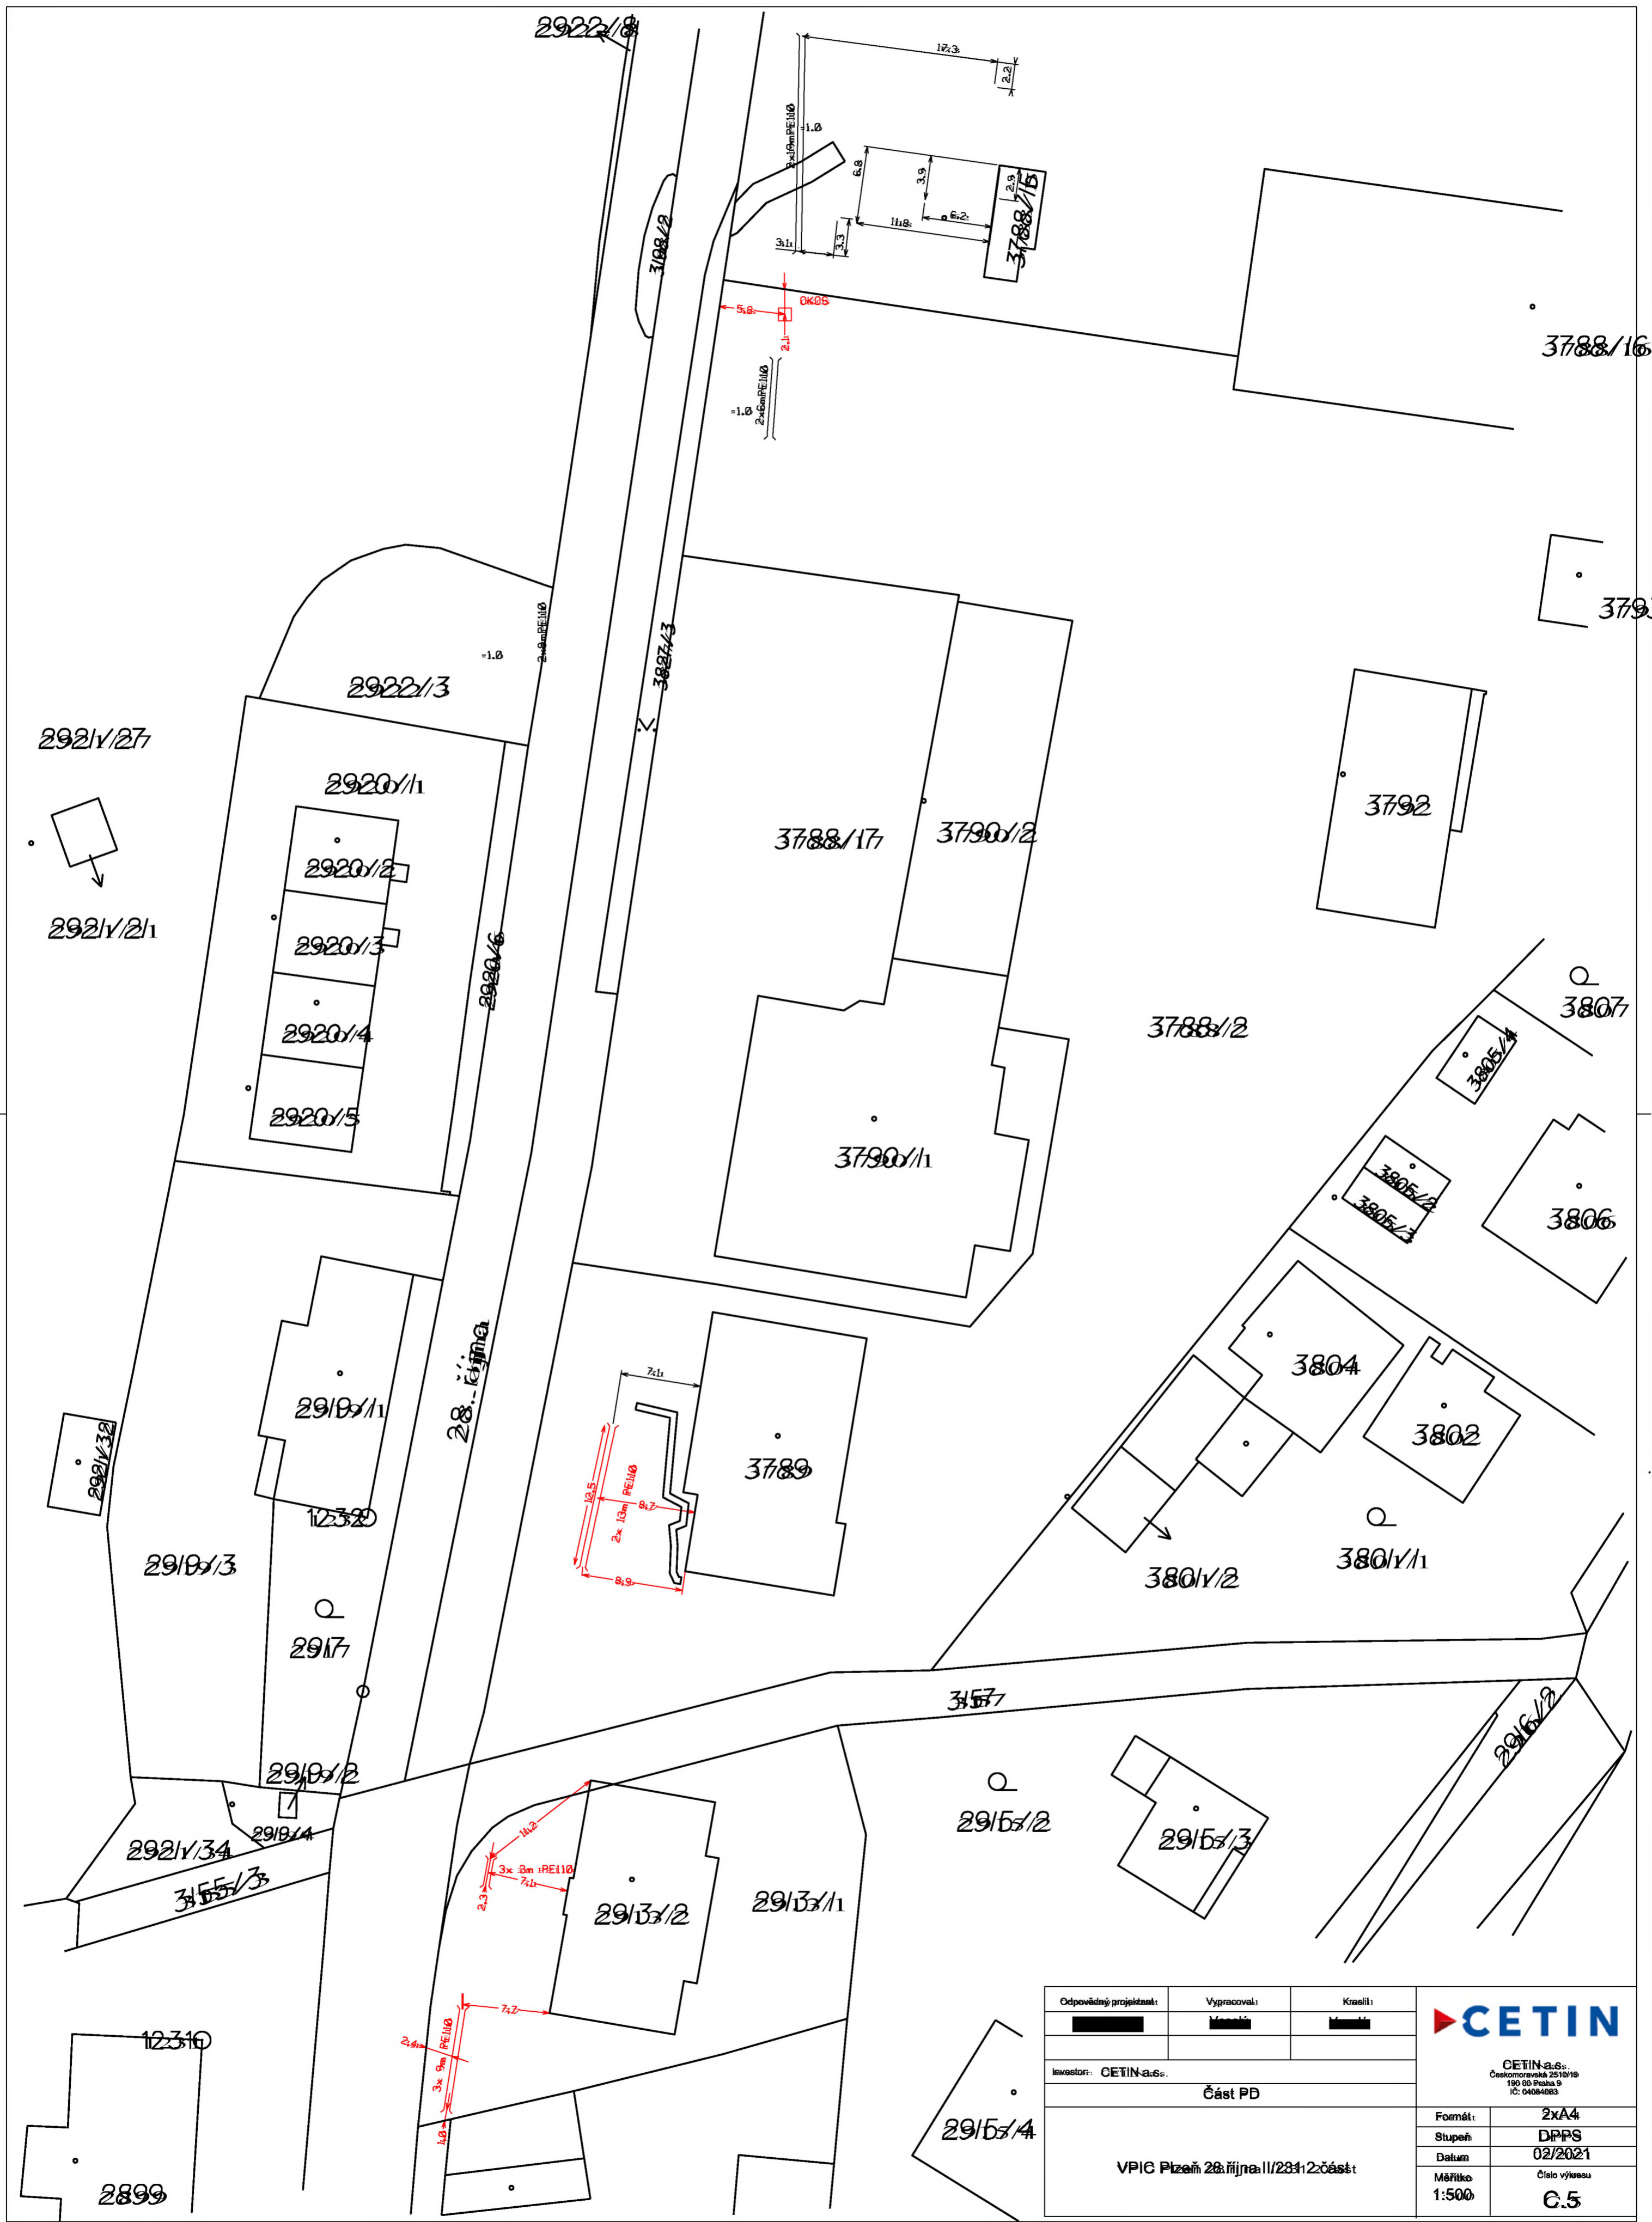

Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	 CETIN a.s. Českomoravská 2510/19 190 00 Praha 9 IČ: 04084083
Investor: CETIN a.s.	Část PD		
VPIC Píseň 28. října II/23112 část I			
Formát:	2x4		
Stupeň:	DPPS		Formát:
Datum:	02/2021		Stupeň:
Měřítko:	1:500		Datum:
			Měřítko:
			Číslo výkresu:
			C.5



xPNL01939/1.1/1/1-00
xMRK 10 - OT1
xSIS-C roz - vpd:
28. října :157 :17 :
Pízeň
Bolevec

PNL03998
xPNL08HR(B Horal)/1.5.2/1-100:1.5.3/1-100:1.5.4/1-1...
xSKH 27/58 mm:
300REZ 16:
:::PNL03998
Pízeň
Bolevec

58/0/05/009
PNL01939
xPNL0397/1.1/1/91-101
xSIS - 1 - OT1
xSIS-C 10x1:
28. října ::: u č.7
Pízeň
Bolevec

58/0/05/009/2
PNL03643
xPNL01939/1.1/1/27-32
xSKH 9/20 mm:
0PREZ 16:
28. října ::: VTA u č.7
Pízeň
Bolevec

6/3
SCX
68/15-300

58/0/00/002
PNL01855
xPNL08HR(B Horal)/1.4.2/72-80
xSIS - 1 - OT1
4xSIS-C 10x1:
Nad Priorém ::: u č.24
Pízeň
Bolevec

58/0/00/002/2
PNL03121
xPNL01855/1.1/1/17-22
xVz 64-66:
xzf sv.60:
28. října :272 :22 :
Pízeň
Bolevec

58/0/00/002/3
PNL03122
xPNL01855/1.1/1/23-28
xVz 64-66:
xzf sv.60:
28. října :284 :24 :
Pízeň
Bolevec

58/0/00/001/5
PNL03119
xPNL01854/1.1/1/59-60
xMRK 10 - OT1
xSIS-C roz - vod:
28. října :152 :18 :
Pízeň
Bolevec

58/0/00/001/6
PNL0118
xPNL01854/1.1/1/61-62

58/0/00/001/7
PNL03123
xPNL01855/1.1/1/2
xMRK 10 - OT1
xSIS-C roz - vod:
Nad Priorém :92
Pízeň
Bolevec

009/3


33-38

od;
;


58/0/05/009/4
PNL03399
xPNL01939/1.1.1/39-44
1xMRK 10 - QT;
1xSID-C roz - vod;
28. října ;618 ;9 ;
Plzeň
Bolevec

117/1
Plasson

T16/1
Plasson

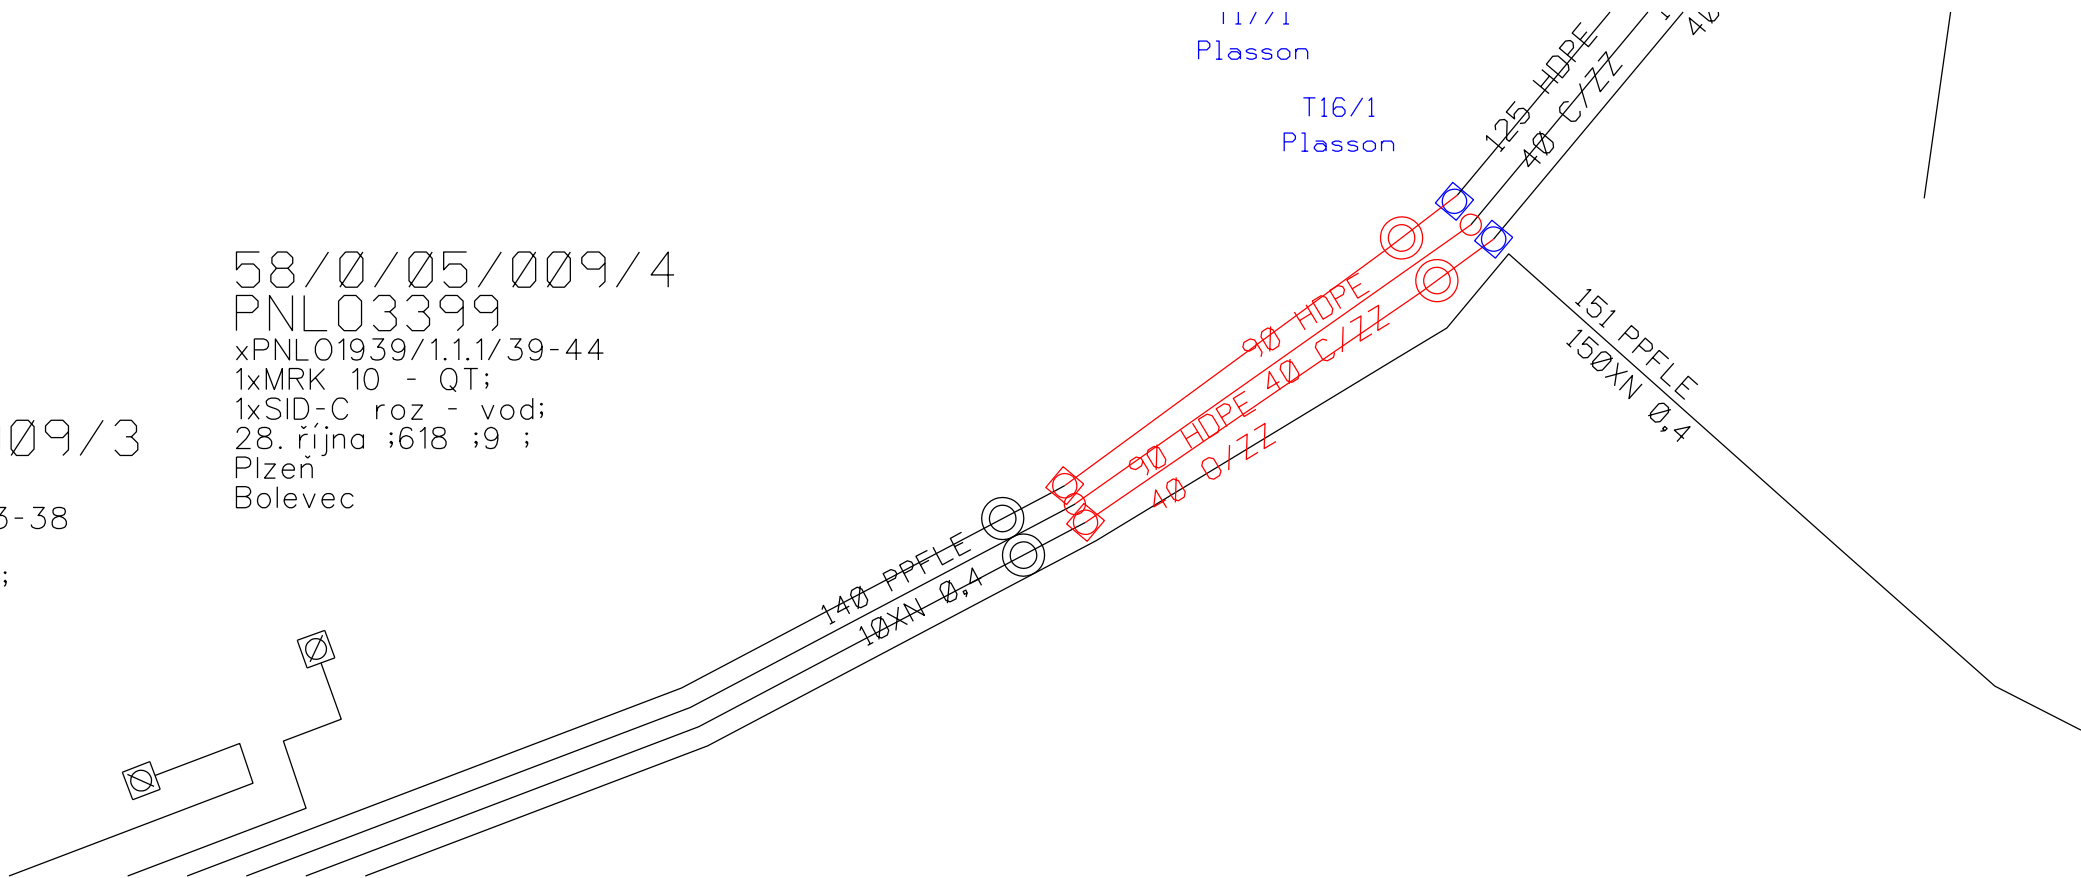

58/0/05/003/1
Dál 03375

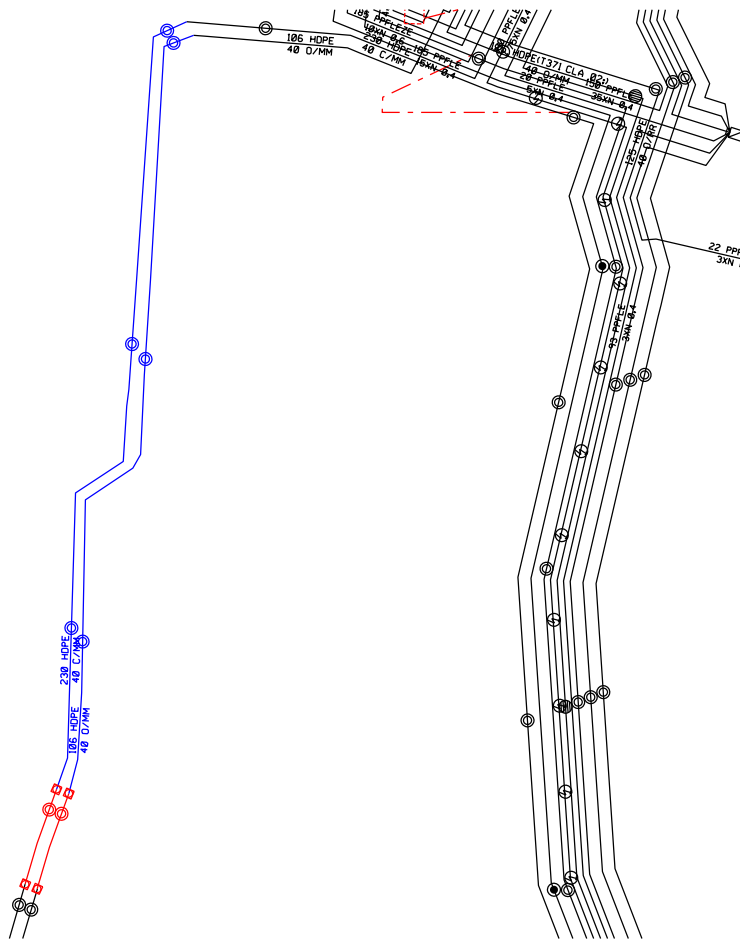

58/0/03/014
PNL01902
xPNL0395/1,1/351-360
1xSD - 1 - Q1:
4xSD-C 10x5
Zručská cesta : : : w co.84-86
Pízeň
Bolevec

58/0/03/014/4
PNL03286
xPNL0902/1,1/29-34
1xMRK 10 - Q1:
1xSD-C roz - vodi:
Zručská cesta :801:84 :
Pízeň
Bolevec



PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP- STAND. - 2021.02

Položková d: 2021.02

Název stavby: VPIC Plzeň 28. října II231 2.část

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.784	KMP:	1.790	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.150	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.026	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	30 578,05 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	552 797,61 Kč
MONTÁŽ	200 482,72 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	5 564,78 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	23 928,62 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	2 086,80 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	5 848,87 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	79 133,30 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	8 000,00 Kč

Celkové náklady: **908 421 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST	856 342,25 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	52 078,50 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	5 817,73 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	24760.32 JV	24 760,32 Kč
Vyhotovení projektu pro generálního projektanta				
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	150.00 m	2 788,50 Kč
954977 S		Povrchy nad rámeč litý beton	1.00 m2	703,83 Kč
955265 S		Práce zemní pro podzemní tratě síťové beton na obetonování překopů včetně dopravy	19840.00 JV	19 840,00 Kč
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	290.00 m	157 090,10 Kč
954951 S		Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70	316.00 m	260 175,44 Kč
952351 S		Rýha v chodníku zámková dlažba 25/50	2.00 m	1 062,38 Kč
952355 S		Rýha v trávě 50/110	138.00 m	63 286,80 Kč
954955 S		Rýha vjezd litý asfalt 35/70-90	38.00 m	42 893,26 Kč
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	445.00 m	4 957,30 Kč
MONTÁŽ				
955031 S		Demontáž úložných kabelů do 300 XN	22.00 m	709,72 Kč
955030 S		Demontáž úložných kabelů do 50 XN	80.00 m	1 780,80 Kč

955029 S	Demontáž úložných kabelů do15 XN	825.00 m	15 336,75 Kč	
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	1935.00 m	7 101,45 Kč	
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	31.00 ks	4 995,03 Kč	
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	335.00 ks	12 455,30 Kč	
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	335.00 ks	8 304,65 Kč	
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	31.00 ks	2 689,56 Kč	
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	36.00 ks	892,44 Kč	
955281 S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	6.00 ks	7 064,82 Kč	
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	8.00 ks	384,56 Kč	
955266 S	Montáž trubky ochranné	94206.52 JV	94 206,52 Kč	
	pokládka ochranných trubek 234m PE 110 dělených vč. materiálu a příslušenství + beton na obetonování			
952602 S	Montáž trubky úložné	26.00 m	312,26 Kč	
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	721.00 m	15 227,52 Kč	
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	14.00 m	520,52 Kč	
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	30.00 m	781,80 Kč	
954980 S	Překládka trubky úložné	240.00 m	3 825,60 Kč	
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	49.00 ks	1 214,71 Kč	
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	18.00 ks	6 469,74 Kč	
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	9.00 ks	9 950,67 Kč	
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 731,81 Kč	
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	49.00 ks	849,17 Kč	
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	18.00 ks	2 677,32 Kč	
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA				
956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	5 564,78 Kč	
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE				
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	6.00 ks	18 363,84 Kč	
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	5 564,78 Kč	
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	2 086,80 Kč	
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 504,15 Kč	
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	3 136,03 Kč	
958459	Zápis dokumentu do systému Objednatele	1.00 ks	208,69 Kč	
POPLATKY				
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	8000.00 JV	8 000,00 Kč	
	poplatky, VBŘ			
Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	1.00 m	3,84 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	516.00 m	2 280,72 Kč
300106 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4	20.00 m	546,00 Kč
300107 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,4	5.00 m	193,10 Kč
300000 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	115.00 m	1 595,05 Kč
300109 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4	5.00 m	500,20 Kč
300105 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4	5.00 m	87,95 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	8.00 ks	184,48 Kč
312845 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	6.00 ks	2 552,64 Kč
303501 S		Spojka plastová 110/94 mm	3.00 ks	104,28 Kč
303003 S		Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	8.00 ks	1 173,12 Kč
319209 S		Trubka dělená SYSPRO 160/110	150.00 m	69 244,50 Kč
300029 S		Trubka HDPE 40/33 černá -2x zelené pruhy	5.00 m	128,35 Kč
300023 S		Trubka HDPE 40/33 černá	8.00 m	205,36 Kč
300038 S		Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x zelené pr.	5.00 m	128,35 Kč
300030 S		Trubka HDPE 40/33 oranžová	8.00 m	205,36 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267 S		Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	7.00 ks	0,00 Kč

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní

1009/06

Škroup

SEPRÁVA PLZEŇSKÝCH SILNIC KRALOVICE	
Došlo: 31-07-2006	doper.
Č.j. 2045	Zpracovatel MO

Plzeň, dne: 25.07.2006

Č.J.: 5079/2005-MMP/STAV-JIR

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Navrhovatel: Plzeňský kraj zastoupený Správou a údržbou silnic Kralovice, Zatecká 732, 331 41 Kralovice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č. 3703

Dne 21.12.2005 podal Plzeňský kraj zastoupený Správou a údržbou silnic Kralovice, Zatecká 732, 331 41 Kralovice, IČ 75779, návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

II/231 v úseku U Velkého rybníka - hranice okresu, rekonstrukce silnice

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako stavební úřad příslušný dle § 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), posoudil návrh podle § 37 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle § 39 stavebního zákona a § 4 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění vyhlášky č. 492/2002 Sb.,

rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu: II/231 v úseku U Velkého rybníka - hranice okresu, rekonstrukce silnice tak, jak je zakresleno na situacích 1 : 500. Tyto ověřené situace budou po nabytí právní moci předány: navrhovateli územního rozhodnutí, ÚMO Plzeň 1, Městskému úřadu Nýřany, pracoviště Plzeň, Obecnímu úřadu Zruč-Senec, a jedna situace bude založena v dokumentaci na odboru stavebně správním Magistrátu města Plzně.

V souladu s § 123 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), si odbor stavebně správní Magistrátu města Plzně vyhradil vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

Stavba bude obsahovat:

celkovou obnovu komunikace II/231 od křižovatky ulic Na Roudné a U Velkého rybníka přes městskou část Bílá Hora až na křižovatku silnic II/231 a III/18012 na začátku obce Zruč - Senec. Součástí stavby je i obnova navazujících silnic v nezbytném rozsahu, návrh silničního mostu a lávky pro pěší a cyklisty přes vodoteč - přepad Boleveckého rybníka. Úpravy řeší zastávkové zálivy autobusových linek, podélné parkování při průtahu v přidruženém dopravním prostoru, úpravy sjezdů na přilehlé pozemky a realizace chodníků a cyklistické stezky s ochrannými ostrůvky v místě křížení s vozovkou. Úpravy zahrnují kromě terénních úprav a zemních prací realizaci odvodňovacích rigolů, opěrných zdí a propustků pod sjezdy.

Stavba řeší i novou pětiramennou okružní křižovatku v místě stávající křižovatky II/231 a III/18012.

Celkový rozsah stavby je 2935 m.

Kromě vlastních úprav komunikačních ploch řeší návrh vyvolané překládky na inženýrských sítích, obnovu vodovodních řadů a přípojek, dešťovou kanalizaci pro odvodnění komunikace a obnovu veřejného osvětlení.

Součástí stavby je odstranění stávající zeleně a dřevin a kácení lesní zeleně v prostoru nové trasy silnice nad Feronou. Původní trasa bude v tomto prostoru rekultivována.

Pro umístění a projektovou přípravu se stanoví tyto podmínky:

1. Změna stavby veřejného vodovodu, nové systémy kanalizace a úprava koryta vodního toku podléhají jakožto vodní dílo povolení odboru stavebně správního MMP.
2. Součástí projektové dokumentace ke stavebnímu povolení budou vegetační úpravy.
3. Dokumentace ke stavebnímu povolení musí splňovat požadavky § 3 včetně přílohy č. 1 vyhlášky č. 369/2000 Sb.
4. Investor požádá o ukončení nájemní smlouvy na pozemek č.par. 12803/1 k.ú. Plzeň u SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU, příspěvkovou organizaci.
5. Cyklistickou stezku propojující místní komunikaci Zručská cesta s obytnou zónou posunout do přirozené trasy.
6. Z okružní křižovatky doplnit sjezd na cyklistickou stezku ve směru do Plzně.
7. Součástí stavby bude pokládka jedné trubky pro optické kabely v celé délce trasy, dle požadavků zástupců SITMP. Pokládka trubek bude realizována jako samostatný objekt.
8. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení prověří možnost umístění okružní křižovatky do prostoru kontaktu ulice 28. října se Zručskou cestou km 1.2. Pro umístění okružní křižovatky lze využít městský pozemek.
9. V případě realizace kruhového objezdu komunikace I/20 v pozdějším časovém termínu než realizace křižovatky „U Součků“, řešit provizorní světelnou signalizaci společně navazující křižovatkou.
10. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení bude projednána se všemi dotčenými organizacemi.
11. O stavební povolení, na základě projednané dokumentace, investor požádá speciální stavební úřad pro pozemní komunikace při odboru stavebně správním MMP.
12. Součástí stavby bude realizace trasy optického kabelu pro Zruč-Senec.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námítky účastníků řízení nebyly vzneseny.

Odůvodnění

Navrhovatel podal návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: II/231 v úseku U Velkého rybníka - hranice okresu, rekonstrukce silnice .

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní oznámil dne 14.06.2006 zahájení řízení o umístění stavby a nařídil ústní jednání na den 20.07.2006 konané v místě: Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, Škroupova 4, Plzeň, zasedací místnost, přízemí, č.dv. 109. Námitky a připomínky účastníků řízení o umístění stavby, stanoviska dotčených orgánů státní správy mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání. Dne 09.01.2006 bylo řízení přerušeno. Po odstranění závad bylo v řízení pokračováno.

Návrh byl předepsaným způsobem doložen projektovou dokumentací, těmito podklady stanovisky a rozhodnutími :

- = určení stavebního úřadu k vydání územního rozhodnutí o umístění této stavby č.j. RR/1769/05 ze dne 25.5.2005
- = výpis z katastru nemovitostí ze dne 7.12.2005
- = osvědčení o autorizaci Ing. Karla Nedvěda
- = zřizovací listina Správy a údržby silnic Kralovice Ministerstvem dopravy a spojů ČR
- = seznam sousedních pozemků
- = udělení souhlasu s dočasným odnětím pozemku č.par. 1018/5 k.ú. Zruč-Senec ze ZPF č.j. ŽP/130/06 ze dne 23.2.2006 – Městský úřad Nýřany, odbor životního prostředí
- = udělení souhlasu s trvalým odnětím pozemku č.par. 1018/5 k.ú. Zruč-Senec ze ZPF č.j. ŽP/131/06 ze dne 23.2.2006 – Městský úřad Nýřany, odbor životního prostředí
- = udělení souhlasu se stavbou do 50m od kraje lesa č.j. ŽP/79/06 ze dne 25.5.2006 – Městský úřad Nýřany, odbor životního prostředí
- = vyjádření Byt-Real, a.s. č.j. KR/2006 ze dne 24.1.2006
- = vyjádření ÚMO Plzeň 1, oddělení dopravy č.j. DOP/00922006 ze dne 17.2.2006

- = stanovisko odboru dopravy Městského úřadu Nýřany, pracoviště Plzeň č.j. OD/16/06 ze dne 30.1.2006
- = rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace III. a IV. tř (chodníky, vozovky) č.j. VSD/0092/06/ZdSo ze dne 2.2.2006 – ÚMO Plzeň 1
- = rozhodnutí o povolení úpravy místních komunikací a sjezdů k sousedním nemovitostem k silnici II/231 č.j. DOP/99/06 ze dne 10.2.2006 - OD MMP
- = vyjádření odboru životního prostředí MMP č.j. ŽP/3286/05-Br ze dne 23.5.2005
- = souhlas s odnětím půdy ze ZPF č.j. ŽP/5840/05-201/1 ze dne 18.10.2005
- = stanovisko odboru životního prostředí Městského úřadu Nýřany č.j. ŽP/1271/05 ze dne 1.6.2005
- = stanovisko odboru dopravy Městského úřadu Nýřany č.j. OD/122/05 ze dne 27.5.2005
- = rozhodnutí o souhlasu se stavbou, která se dotkne lesa vydaném odborem životního prostředí KÚPK č.j. ŽP/7193/05 ze dne 12.8.2005
- = rozhodnutí o souhlasu vodoprávního úřadu ke křížení Boleveckého potoka stavbou č.j. ŽP/4548/05-Pra ze dne 3.8.2005
- = rozhodnutí o souhlasu s umístěním stavby v pásmu 50 m od kraje lesa č.j. ŽP/4502/05 ze dne 5.8.2005
- = rozhodnutí o souhlasu k odlesnění nad 0,5 ha a k zásahu do VKP č. 8312 č.j. ŽP/3904/05-Vai ze dne 4.7.2005
- = vyjádření odboru životního prostředí MMP č.j. 500/2005/01ZPR ze dne 15.6.2005
- = vyjádření a souhlas se stavbou Obecního úřadu Zruč-Senec č.j. KV/479/2005 ze dne 24.5.2005
- = rozhodnutí o povolení zřízení vzájemného připojení komunikací do navržené kruhové křižovatky silnice II/231 v extravilánu obce Zruč-Senec č.j. OD/122a/05 ze dne 27.5.2005
- = stanovisko ZČE, a.s. č.j. 8500500421 ze dne 4.5.2005
- = vyjádření OSS MMP č.j. 2296/2005-MMP/STAV-JIR ze dne 1.6.2005
- = stanovisko KHSPK č.j. khs/hok/9201-21/05 ze dne 5.5.2005
- = stanovisko OŘ Policie ČR č.j. ORPS-4-220/DI-2005 ze dne 18.5.2005
- = souhlas se stavbou OD ÚMO Plzeň 1 č.j. 2144/2005/01VSD ze dne 16.5.2005
- = vyjádření ZČPlynárenské a.s. ze dne 15.5.2005
- = vyjádření SŽPZP v ČR č.j. 11.5.2005/Ka-124
- = vyjádření PMDP a.s. č.j. Ds 404/JR/Š/05 ze dne 13.5.2005
- = vyjádření Policie ČR MŘ DI č.j. MRPM-4/DI-2005 ze dne 10.5.2005
- = vyjádření SIT MP č.j. SITMP-389/05 ze dne 9.5.2005
- = vyjádření ČSAD autobusy Plzeň, a.s. č.j. DÚ/01o/05-Li ze dne 4.5.2005
- = vyjádření Karneval Media s.r.o. č.j. M00642/2005 ze dne 3.5.2005
- = vyjádření HZSPK č.j. HSPM-612-2/OP/SPD-2005 ze dne 22.4.2005
- = vyjádření VODÁRNÝ PLZEŇ a.s. č.j. 3204/2004 ze dne 3.11.2004 , č.j. 514/2005 ze dne 16.3.2005
- = vyjádření Povodí Vltavy s.p. č.j. 8460/04/342/uh ze dne 9.11.2004
- = vyjádření VUSS č.j. 1146-ÚP/2004-1451 ze dne 29.7.2004
- = žádost o zařazení mezi účastníky řízení Občanského sdružení „Zručská cesta“ ze dne 26.12.2005
- = vyjádření ČESKÉHO TELECOMU a.s. č.j. 20709/04/PN/ŽM ze dne 8.4.2005
- = stanovisko odboru krizového řízení MMP č.j. OKŘ/00433/06 ze dne 21.6.2006
- = vyjádření odboru dopravy MMP č.j. DOP/994/05 ze dne 9.5.2005
- = vyjádření odboru rozvoje a plánování MMP č.j. ORP/3036/06 ze dne 14.6.2006
- = složka projednání stavby se správci inženýrských sítí
- = majetkoprávní elaborát
- = hluková studie zpracovaná ing. Olgou Havlíkovou
- = požární bezpečnostní řešení zpracované Jiřím Kupilíkem
- = návrh na rozšíření průtočného profilu pod železniční vlečkou – Křížení silnice II/231 s Boleveckým potokem
- = zpráva o výsledcích geologickoprůzkumných prací
- = zpráva o výsledcích hydrogeologického průzkumu
- = dendrologický průzkum
- = záborové elaboráty
- = souhlasné vyjádření vlastníků dotčených pozemků

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 34 stavebního zákona. Vzhledem k tomu, že se jedná o liniovou stavbu nebo o stavbu zvlášť rozsáhlou s velkým počtem účastníků řízení, vedl stavební úřad v souladu s § 36 odst. 4 stavebního zákona územní řízení veřejnou vyhláškou.

Do územního rozhodnutí byly zahrnuty podmínky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, vyjádření organizací a účastníků řízení, které se týkají umístění staveb a zpracování dokumentace pro stavební povolení. Požadavky organizací a účastníků řízení, které se umístění stavby a zpracování dokumentace pro stavební povolení netýkají, mohou být uplatněny při stavebním povolení.

Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanovených vyhláškou č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se účastníci řízení o umístění stavby mohou odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u odboru stavebně správního Magistrátu města Plzně.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky od nabytí právní moci, nepozbývá však platnosti, pokud v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení. Rozhodnutí o umístění stavby pozbývá platnosti též dnem, kdy bylo stavebnímu úřadu doručeno oznámení navrhovatele nebo jeho právního zástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje.



Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce Magistrátu města Plzně, na úřední desce příslušné obce a úřední desce příslušného ÚMO min. 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

Obdrží:

Navrhovatel : Správa a údržba silnic Kralovice, Žatecká 732, 331 41 Kralovice

Dotčené orgány státní správy :

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství, Kaplířova 9, P.O.BOX 18, 320 68 Plzeň 20

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 1188/15, 301 25 Plzeň 3

Krajský úřad Plzeňského kraje - odbor dopravy a silničního hospodářství, Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň 6

Krajský úřad Plzeňského kraje - odbor životního prostředí, Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň 6

Magistrát města Plzně - odbor dopravy, Škroupova 1900/5, 306 32 Plzeň 1

Magistrát města Plzně - odbor krizového řízení, Kopeckého sady 97/11, 306 32 Plzeň

Magistrát města Plzně - odbor životního prostředí, Kopeckého sady 97/11, 306 32 Plzeň 3

Městský úřad Nýřany, odbor dopravy, Americká tř. 39, 304 66 Plzeň

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor krizového řízení a obrany, Americká 39, 304 66 Plzeň

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, Odbor životního prostředí, Americká 39, 304 66 Plzeň

ÚMO Plzeň 1 - odbor výstavby a dopravy, oddělení dopravy, alej Svobody 882/60, 323 18 Plzeň

ÚMO Plzeň 1 - odbor životního prostředí, alej Svobody 882/60, 323 18 Plzeň

Prosíme o vyvěšení, sejmutí a následné zaslání potvrzeného rozhodnutí zpět:

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, Americká 39, 304 66 Plzeň

Obecní úřad Zruč - Senec, 330 08 Zruč

MMP – odbor vnitřních věcí

ÚMO Plzeň 1, odbor výstavby a dopravy

Od správního poplatku byl navrhovatel osvobozen podle § 8a) zákona č. 634/2004 Sb.

76
11691/06

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní
Škroupova 4, Plzeň


Č.j.: 5079/2005-MMP/STAV-JIR

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:



SPRÁVA	KRALOVICE
D. lo:	Plzeň
25.07.2006	
1410	PO

dne: 04.09.2006


Navrhovatel: Plzeňský kraj zastoupený Správou a údržbou silnic Kralovice, Žatecká 732, 331 41 Kralovice



OZNÁMENÍ

O NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI ROZHODNUTÍ

Oznamujeme Vám, že územní rozhodnutí o umístění stavby, které vydal Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní dne 25.07.2006 pod č.j.: 5079/2005-MMP/STAV-JIR ve věci územního rozhodnutí o umístění - II/231 v úseku U Velkého rybníka - hranice okresu, rekonstrukce silnice, bylo doručeno všem účastníkům řízení a nabylo právní moci dne 2.9.2006.



Obdrží:

Správa a údržba silnic Kralovice, Žatecká 732, 331 41 Kralovice + 6 x potvrzené situace

ÚMO Plzeň 1 - odbor výstavby a dopravy, alej Svobody 882/60, 323 18 Plzeň + 6 x potvrzené situace

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, Americká 39, 304 66 Plzeň + 6 x potvrzené situace

Obecní úřad Zruč - Senec, 330 08 Zruč + 6 x potvrzené situace

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní
Škroupova 4, Plzeň

1526/08

Sp.zn.: STAV/5962/08/JIR
Vyřizuje: [redacted]
Telefon: [redacted]
Fax: [redacted]
E-mail: [redacted]

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC KRALOVICE	
Došlo: 21-10-2008	Čís. dopor.
Č.j. J.200	Zpracovatel HO

Plzeň, dne: 20.10.2008
Č.J.: STAV/5962/08/JIR-3

Žadatel:

Správa a údržba silnic Kralovice, Žatecká 732, 331 41 Kralovice příspěvková organizace Plzeňského kraje

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Plzně, jako stavební úřad příslušný dle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v aktuálním znění a § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v aktuálním znění (dále jen stavební zákon), rozhodl ve věci žádosti o vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby č. 3703 – „ II/231 v úseku U Velkého rybníka – hranice okresu, rekonstrukce silnice “, kterou dne 21.08.2008 podala Správa a údržba silnic Kralovice, Žatecká 732, 331 41 Kralovice, příspěvková organizace Plzeňského kraje, IČ 75779, takto:

Stavební úřad v souladu s ustanovením § 93 odst. 3 stavebního zákona

p r o d l o u Ź u j e

platnost územního rozhodnutí o umístění stavby č. 3703 – „ II/231 v úseku U Velkého rybníka – hranice okresu, rekonstrukce silnice “

do 30.06.2010.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námítky ani připomínky nebyly vzneseny.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je Správa a údržba silnic Kralovice, Žatecká 732, 331 41 Kralovice, IČ 75779, příspěvková organizace Plzeňského kraje

O d ů v o d n ě n í

Dne 21.08.2008 podala Správa a údržba silnic Kralovice, Žatecká 732, 331 41 Kralovice, IČ 75779, příspěvková organizace Plzeňského kraje, žádost o vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby č. 3703.

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby.

Územní rozhodnutí o umístění stavby č. 3703 – „ II/231 v úseku U Velkého rybníka – hranice okresu, rekonstrukce silnice “ bylo vydáno dne 25.07.2006 pod č.j. 5079/2005-MMP/STAV-JIR a nabylo právní moci dne 02.09.2006.

Toto územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona planost 2 roky ode dne nabytí právní moci. Citované územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 02.09.2006.

Žadatel v žádosti uvedl důvody, podle nichž nemůže v době planosti územního rozhodnutí podat žádost o stavební povolení a potvrdil záměr stavbu, která je předmětem uvedeného územního rozhodnutí, realizovat.

Magistrát města Plzně opatřením ze dne 09.09.2008 oznámil v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu a § 93 odst. 3 stavebního zákona zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a stanovisek dotčených orgánů.

Odůvodnění rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námítky ani připomínky nebyly vzneseny.

V řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by bránily prodloužení platnosti předmětného územního rozhodnutí. Proto stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona jsou:

Správa a údržba silnic Kralovice, Žatecká 732, 331 41 Kralovice příspěvková organizace Plzeňského kraje
Technický náměstek primátora města Plzně, zastupující obec

P o u č e n í

Proti rozhodnutí se podle § 81 až § 86 správního řádu lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje a to podáním učiněným u správního orgánu, který rozhodnutí vydal. V odvolání je nutno uvést, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

V souladu s § 40 odst. 1 správního řádu se do běhu lhůty pro odvolání nezapočítává den doručení rozhodnutí. Případně-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

Odvolání se podává v potřebném počtu 3 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán (se zohledněním ustanovení § 144 odst. 5 správního řádu).



Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce Magistrátu města Plzně a úřední desce ÚMO Plzeň 1, Městského úřadu Nýřany, Obecního úřadu Zruč-Senec min. 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Razítko:

.....

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

Obdrží účastníci řízení:

Správa a údržba silnic Kralovice, Žatecká 732, 331 41 Kralovice

Technický náměstek primátora města Plzně, zastupující obec

Obdrží dotčené orgány:

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství, Kaplířova 9, P.O.BOX 18, 320 68 Plzeň 20
 Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 1188/15, 301 25 Plzeň 3
 Krajský úřad Plzeňského kraje - odbor dopravy a silničního hospodářství, Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň
 Krajský úřad Plzeňského kraje - odbor životního prostředí, Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň
 Městský úřad Nýřany, ODBOR DOPRAVY, Americká tř. 39, 304 66 Plzeň
 Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor krizového řízení a obrany, Americká 39, 304 66 PLzeň
 Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, Odbor životního prostředí, Americká 39, 304 66 Plzeň
 MMP, Odbor dopravy, Škroupova 1900/5, 306 32 Plzeň
 MMP, Odbor krizového řízení, Kopeckého sady 97/11, 306 32 Plzeň
 MMP, Odbor životního prostředí, Kopeckého sady 97/11, 306 32 Plzeň
 ÚMO Plzeň 1, Odbor výstavby a dopravy, alej Svobody 882/60, 323 00 Plzeň
 ÚMO Plzeň 1, Odbor životního prostředí, alej Svobody 882/60, 323 00 Plzeň

Prosíme o vyvěšení, sejmutí a následné zaslání potvrzeného oznámení zpět :


MMP, Odbor vnitřních věcí, náměstí Republiky 1/1, 306 32 Plzeň
 ÚMO Plzeň 1, Odbor výstavby a dopravy, alej Svobody 882/60, 323 00 Plzeň
 Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, Americká 39, 304 66 Plzeň
 Obecní úřad Zruč-Senec, , 330 08 Zruč

1786/08

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní
Škroupova 4, Plzeň

Plzeň, dne: 11.12.2008

Sp.zn.: STAV/5962/08/JIR
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:



SPRÁVA A UDRŽBA SILNIC KRALOVICE	
Došlo:	Čís. dopr.
17 -12- 2008	
Č.j.	Zpracovatel
1786	MO




Žadatel:
Správa a údržba silnic Kralovice, Žatecká 732, 331 41 Kralovice příspěvková organizace Plzeňského kraje,

O Z N Á M E N Í
O N A B Y T Í P R Á V N Í M O C I R O Z H O D N U T Í

Oznamujeme Vám, že rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, které vydal Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní dne 13.10.2008 pod Č.J.: **STAV/5962/08/JIR** ve věci žádosti o vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby č. 3703 – „II/231 v úseku U Velkého rybníka – hranice okresu, rekonstrukce silnice“ bylo oznámeno všem účastníkům řízení a nabylo právní moci dne **25.11.2008**.

pově
odbor



Obdrží :
Správa a údržba silnic Kralovice, Žatecká 732, 331 41 Kralovice příspěvková organizace Plzeňského kraje
ÚMO Plzeň 1, odbor výstavby a dopravy
Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, Americká 39, 304 66 Plzeň
Obecní úřad Zruč-Senec, , 330 08 Zruč

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní
Škroupova 4, Plzeň

Sp.zn.: SZ MMP/057699/10/REI

Plzeň, dne: 7.3.2011

Č.j.: MMP/034759/11

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

IDDS: 6iybfxn

Vypraveno dne:

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

A:

Výroková část:

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 2.4.2010 podaly

Statutární město Plzeň, IČ 00075370, náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 1, které zastupuje MMP, Odbor investic, IČ 00075370, Škroupova 1900/5, Vnitřní Město, 306 32 Plzeň,

Plzeňský kraj, IČ 70890366, Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň, který zastupuje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ 72053119, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí-Plzeň, 306 13 Plzeň 3,

RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

Silnice II/231 Plzeň, ul. 28. října, Bílá Hora (km 0,600-1,600 dle PD DÚR)

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2523, 2527, 2612/1, 2612/13, 2821/1, 2821/2, 2821/4, 2821/5, 2826/1, 2828/1, 2840/1, 2880, 2897, 2901/1, 2903/1, 2903/2, 2908/2, 2909, 2913/1, 2914, 2917, 2919/3, 2919/4, 2920/1, 2921/34, 2922/1, 2922/3, 3155/3, 3157, 3158, 3159, 3162/1, 3162/2, 3162/4, 3162/5, 3164, 3165, 3166/1, 3166/3, 3167, 3168, 3171/3, 3177, 3180, 3181, 3184, 3185, 3198, 3199, 3788/1, 3788/2, 3788/4, 3788/6, 3788/24, 3800, 3825/1, 3826, 3827 v katastrálním území Bolevec, parc. č. 968/1 (968 dle EN), 980/14 (dle GP č. 830-23/2009 ze dne 11.5.2009 č.par. 980/22), 980/19, 980/20, 981/1 v katastrálním území Senec u Plzně.

Stavba obsahuje:

SO 101 Silnice II/231 - MS2 16/7,5/50 - B

Stavební objekt řeší návrh rekonstrukce ulice 28. října (silnice II/231) v úseku zastavěné části Bílé Hory v délce 1140 m (v úseku staničení km 0,570 - km 1,710). Vozovka je navržena v kategorii MS2 16/7,5/50 - B, úpravy zachovávají stávající organizaci dopravy. Povrch vozovky je navržen z živice ACO 11+ 30/50 tl. 40 mm. V celém rozsahu je komunikace navržena v šířce 6,5 m mezi obrubami s jízdním pruhem š. 3 m s případným rozšířením v oblouku. V úseku cca km 1,550 – konec úprav je vozovka rozšiřována z důvodu vložení dělicího ostrůvku pro regulaci rychlosti na vjezdu do města, současně došlo k doplnění o

jednostranný pohyb chodců. Úpravy v navazujících místních komunikacích se předpokládají za plné uzavírky.

B:

Výroková část:

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 2.4.2010 podaly

**Statutární město Plzeň, IČ 00075370, náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 1, které zastupuje MMP, Odbor investic, IČ 00075370, Škroupova 1900/5, Vnitřní Město, 306 32 Plzeň,
Plzeňský kraj, IČ 70890366, Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň, který zastupuje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ 72053119, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí-Plzeň, 306 13 Plzeň 3,
RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

Silnice II/231 Plzeň, ul. 28. října, Bílá Hora (km 0,600-1,600 dle PD DÚR)

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2523, 2527, 2612/1, 2612/13, 2821/1, 2821/2, 2821/4, 2821/5, 2826/1, 2828/1, 2840/1, 2880, 2897, 2901/1, 2903/1, 2903/2, 2908/2, 2909, 2913/1, 2914, 2917, 2919/3, 2919/4, 2920/1, 2921/34, 2922/1, 2922/3, 3155/3, 3157, 3158, 3159, 3162/1, 3162/2, 3162/4, 3162/5, 3164, 3165, 3166/1, 3166/3, 3167, 3168, 3171/3, 3177, 3180, 3181, 3184, 3185, 3198, 3199, 3788/1, 3788/2, 3788/4, 3788/6, 3788/24, 3800, 3825/1, 3826, 3827 v katastrálním území Bolevec, parc. č. 968/1 (968 dle EN), 980/14 (dle GP č. 830-23/2009 ze dne 11.5.2009 č.par. 980/22), 980/19, 980/20, 981/1 v katastrálním území Senec u Plzně.

Stavba obsahuje:

IO 001 Příprava území

V rámci přípravy území budou pokáceny stromy, keřové porosty, lesní zeleň v ploše 4173 m². Dále bude v tl. 10 cm sejmuta ornice v ploše 2 469 m².

IO 403 Stacionární radary vč. elektropřípojek

Objekt řeší přípojky elektrické energie pro dva stabilní radarové měřiče rychlosti umístěné v ul. 28. října na příjezdu směrem od Plzně (před objektem č.p. 12/147) a od Zruče (poblíž čerpací stanice PHM). Připojení je navrženo ze stávajícího stožáru venkovního vedení nn. V trase kabelu bude položen zemnicí drát.

IO 411 Veřejné osvětlení

Projekt řeší návrh osvětlení zájmového území. Navržená osvětlovací soustava je jednostranná. Pro osvětlení budou použita svítidla SR100, 100 W příp. 150 W osazená na silničních stožárech v. 10 m příp. 12 m s výložníkem, cyklistická stezka bude osvětlena svítidly SR50, 50 W na stožáru v. 6 m bez výložníku. Rozvaděče a pojistkové skříně budou ponechány stávající, nově bude umístěna SR1 v ul. Senecká a SR2 v ul. Březová. Nové osvětlovací body se napojí ze stávajícího kabelového rozvodu veřejného osvětlení, napájecí kabel se povede smyčkově přes nové stožáry, kromě toho jednotlivé skříně

- spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.
10. Stavebník je povinen dodržet povinnosti vyplývající z ustanovení § 22 – 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
 11. Stavba musí být provedena v souladu s vyhláškou č. 369/2001 Sb., v platném znění, kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
 12. Stavebník ve spolupráci s vedením stavby oznámí min. 14 dní předem vlastníkům stávajících objektů zahájení zemních prací, při kterých dojde k omezení příjezdu vozů pro zásobování a garážování. Vozům záchranných služeb bude přístup trvale umožněn.
 13. Všechny výkopy a překopy musí být řádně zajištěny a osvětleny. Tam, kde se předpokládá pohyb osob budou zřízeny můstky v šířce min. 1,30 m.
 14. Pro provedení stavby budou použity jen takové materiály, které splňují platná nařízení vlády ČR o technických požadavcích na výrobky.
 15. Při provádění zemních prací musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 73 3050 Zemní práce, všeobecná ustanovení.
 16. Budou přijata taková opatření; aby nedocházelo ke znečištění komunikací staveništní dopravou včetně poškození silničního tělesa stavebními stroji. Pokud dojde k znečištění komunikací, zajistí stavebník neodkladně jejich očistu.
 17. Před zahájením prací požádá zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu (nejpozději 30 dní před zahájením prací - § 39, odst. 3 vyhlášky č. 104/1997 Sb.) o povolení uzavírky podle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pozemních komunikacích) a dále o povolení zvláštního užívání dle § 25, odst. 6, písm. c), bod 2 a 3 zákona o pozemních komunikacích.
 18. Staré, nefunkční vedení inženýrských sítí v pozemních komunikacích bude v rámci stavby odstraněno. Pouze v případě písemného souhlasu vlastníka pozemní komunikace s ponecháním nefunkčního vedení na místě, bude od splnění podmínky upuštěno.
 19. Součástí stavby bude případné zřízení náhradních zastávek MHD včetně zajištění odpovídajícího obratiště. Omezení provozu MHD linek včetně vlastního umístění náhradních zastávek bude projednáno s Plzeňskými městskými dopravními podniky, a.s. (PMDP, a.s.) a Odborem dopravy Magistrátu města Plzně (OD, MMP) s dostatečným předstihem (10 dní) před předpokládaným omezením tak, aby OD, MMP jako příslušný správní úřad mohl případně rozhodnout o jeho omezení.
 20. Označnický zastávek včetně jejich přístřešků na nástupišťích zastávek budou stavebně uspořádány dle ČSN 736425-1.
 21. Návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích pro jednotlivé etapy výstavby, bude minimálně 30 dní před zahájením prací na její instalaci aktualizován, popřípadě upřesněn a po písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR a na základě žádosti zhotovitele, bude Odborem dopravy Magistrátu města Plzně tato úprava stanovena v souladu s § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
 22. Návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích bude minimálně 30 dní před zahájením prací na její instalaci aktualizován, popřípadě upřesněn a po písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR a na základě žádosti zhotovitele, bude Odborem dopravy Magistrátu města Plzně tato úprava stanovena v souladu s § 77 zákona o silničním provozu stanovena.
 23. K žádosti o stanovení místní i přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích je nutné předložit zákres stávající úpravy. Dopravní značení bude osazeno až po stanovení příslušných úprav.
 24. Stavebník zajistí, aby Odbor dopravy Magistrátu města Plzně byl informován v dostatečném časovém předstihu o termínech kontrolních dnů stavby (pokud budou realizovány).
 25. Všechny zastávky budou osazeny označnický typ Značky Praha a vybaveny přístřešky v obou směrech.
 26. Při provádění stavby bude respektováno vzdušné a kabelové vedení NN distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Výkopy od opěrných bodů je nutné provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k porušení jejich stability. Pokud dojde v průběhu prací k odkrytí kabelů v majetku ČEZ Distribuce, a.s., bude před opětovným záhozem provedena kontrola pracovníkem ČEZ Distribuční služby, s.r.o., tel. [REDAKCE]. Pokud dojde k poškození energetického zařízení bude neprodleně kontaktováno Call centrum společnosti.
 27. Společnost RWE Distribuční služby, s.r.o. bude stavebníkem včas informována o zahájení výběrového řízení na zhotovitele komunikace z důvodu koordinace realizace stavebních a inženýrských objektů stavby.

43. Veškeré plochy zasažené stavbou budou po akci prostory stavebních zbytků a kamenů. Poškozené travnaté plochy budou obnoveny dle ČSN 83 9031, tj. pokryty vrstvou min. 10 cm substrátu, osety parkovou travní směsí, po vzejití posečeny.
44. Po vybudování nových uličních vpustí, před jejich obetonováním je nutné přizvat pracovníka VODÁRNY PLZEŇ a.s. (██████████) ke kontrole napojení na stávající kanalizaci.
45. Zahájení prací bude předem oznámeno VODÁRNĚ PLZEŇ a.s., provozu kanalizací Plzeň, Jateční 40, tel. ██████████ a provozu vodovodů Plzeň, Údolní 6, tel. ██████████
46. Pro mířže nových uličních vpustí bude použit ocelový rám silně pogumovaný.
47. Zhotovitel zajistí staveniště proti vniknutí látek a stavebních hmot do kanalizačního systému, které neodpovídají podmínkám pro vypouštění odpadních vod dle Kanalizačního řádu města Plzně.
48. V případě obnažení rozvodů vodovodu a kanalizace přizvat odpovědné pracovníky z příslušných provozů VODÁRNY PLZEŇ a.s. ke kontrole.
49. Pracovníci OSI MMP a VODÁRNY PLZEŇ a.s. budou přizváni na kontrolní dny stavby a k technickým přejímkám dokončených stavebních objektů, které budou ve správě OSI MMP a provozovány VODÁRNOU PLZEŇ a.s..
50. Dodavatel případně stavebník předá po dokončení stavby 2 výtisky realizační projektové dokumentace opravené podle skutečného provedení, včetně výškopisného a polohopisného zaměření v digitální i papírové podobě OSI MMP a VODÁRNĚ PLZEŇ a.s..
51. Zástupce oddělení ML SVSMP bude přítomen předání a převzetí staveniště na lesních pozemcích. Kácení lesních dřevin zajistí ML SVSMP.
52. Sadové úpravy budou realizovány pouze v klimaticky vhodném termínu tj. od října do dubna dle platných norem pro sadovnictví a krajinářství ČSN 83 9011 – 83 9061 a dle platných oborových norem ČSN 46 4902 – 46 4942.
53. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník potvrzení o předání zaměření skutečného provedení stavby. Zaměření bude provedeno v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv, 3. třídě přesnosti a ověřeno úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. Kresba, (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru předána na flash-disku, CD-ROM, nebo e-mailem: (sluzbygis@plzen.eu). Potvrzení o kontrole provedeného zaměření stavebníkovi při předání vydá oddělení GIS SITMP, které zajišťuje správu technické mapy města Plzně na adrese Tylova 20, Plzeň u pana ██████████
54. S příslušným vlastníkem silnice nebo místní komunikace stavebník projedná staveništní dopravu. Bude zajištěno, aby nedocházelo ke znečištění komunikací staveništní dopravou včetně poškození silničního tělesa stavebními stroji. Pokud dojde k znečištění, zajistí stavebník neprodleně jejich očistu.
55. Užívání komunikace nebo veřejně přístupného pozemku v majetku města Plzně pro výkopové práce, zařízení staveniště, lešení apod. je možné pouze na základě předem uzavřené Dohody o technických podmínkách (zajišťuje SVSMP, oddělení zvláštního užívání, Klatovská 12 Plzeň.), ve které budou stanoveny podmínky pro provádění výkopů a překopů na pozemcích v majetku města. Před výkopovými pracemi musí být vytyčeny trasy stávajících podzemních vedení od správců těchto sítí a výkopy v jejich blízkosti provádět dle příslušných bezpečnostních opatření.
56. Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.. Zahájení stavební činnosti bude předem oznámeno pracovníkovi společnosti pověřeného ochranou sítě (POS). Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je nutno zastavit práce a skutečnost oznámit POS. V pracích lze pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu stanoveného POS.
57. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena jako závěrečná před vydáním kolaudačního souhlasu.
58. Stavba bude dokončena do 31.12.2014.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Statutární město Plzeň, IČ 00075370, náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 1, které zastupuje MMP, Odbor investic, IČ 00075370, Škroupova 1900/5, Vnitřní Město, 306 32 Plzeň, Plzeňský kraj, IČ 70890366, Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň, který zastupuje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ 72053119, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí-Plzeň, 306 13 Plzeň 3,
RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klášská 940, 401 17 Ústí nad Labem

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 2010/004818 mezi stat. městem Plzeň a společností NARETEC s.r.o.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 2010/004819 mezi stat. městem Plzeň a V.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 2010/000908 mezi stat. městem Plzeň a společností ESN - ekonomická správa nemovitostí, spol. s r.o.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 2010/000942 mezi stat. městem Plzeň a M.

Smlouva o budoucí smlouvě budoucí směnné čj. 2010/001853 mezi stat. městem Plzeň a

Nájemní smlouva mezi stavebníkem a mezi stat. městem Plzeň a

Nájemní smlouva čj. 2010/001883 mezi stat. městem Plzeň a společností SIELAFF Bohemia s.r.o.

Nájemní smlouva čj. 2010/000451 mezi stat. městem Plzeň a společností ESN - ekonomická správa nemovitostí, spol. s r.o.

Nájemní smlouva čj. 2010/002719 mezi stat. městem Plzeň a

Nájemní smlouva č. B/98551002 mezi stat. městem Plzeň a Lesy České republiky, s.p. včetně dodatku č.2

Nájemní smlouva mezi stat. městem Plzeň a

Nájemní smlouva mezi stat. městem Plzeň a

Nájemní smlouva mezi stat. městem Plzeň a

Nájemní smlouva mezi stat. městem Plzeň a

Nájemní smlouva mezi stat. městem Plzeň a obcí Zruč - Senec


Nájemní smlouva čj. 2010/001548 mezi stat. městem Plzeň a společností NARETEC s.r.o.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků stavebního řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:



Poplatek:

Rozhodnutí je osvobozeno od správního poplatku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném znění.

Doručí se:

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

MMP, Odbor investic, Škroupova č.p. 1900/5, Vnitřní Město, 306 32 Plzeň
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
RWE GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

Další účastníci řízení:

dle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány:

ČR - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Krajské ředitelství, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor vnější služby Plzeň - sever, Dopravní inspektorát, IDDS: 5ixai69
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Městské ředitelství policie Plzeň, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát Plzeň, IDDS: 5ixai69
MMP, Odbor dopravy, Škroupova č.p. 1900/5, 306 32 Plzeň 1
MMP, Odbor životního prostředí, Kopecského sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p
Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, Odbor dopravy, IDDS: 8hrbtcq
Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, Odbor životního prostředí, IDDS: 8hrbtcq
ÚMO Plzeň 1, Odbor životního prostředí a dopravy, IDDS: 2dibh62

Žádáme o vyvěšení, sejmutí a zaslání potvrzené písemnosti zpět:

MMP, Odbor správních činností, náměstí Republiky č.p. 1/1, Vnitřní Město, 306 32 Plzeň


Žádáme o vyvěšení:


ÚMO Plzeň 1, Odbor výstavby, IDDS: 2dibh62
Městský úřad Nýřany, IDDS: 8hrbtcq

STAVBA POVOLENA

Stavba: **Silnice II/231 Plzeň, ul.28. října, Bílá Hora (km 0,600-1,600 dle PD DÚR)**

Stavebník: Statutární město Plzeň, které zastupuje MMP, Odbor investic,
Plzeňský kraj, který zastupuje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace,
RWE GasNet, s.r.o.

Stavební podnikatel: ... 

Stavbu povolil: Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní 

Stavební povolení: Sp.zn.: SZ MMP/057699/10/REI, Č.j.: MMP/034759/11 nabylo právní moci dne 8.4.2011

Termín dokončení: 31.12.2014

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní
Škroupova 4, Plzeň

Sp.zn.: SZ MMP/057699/10/REI
Č.j.: MMP/062669/11
Vyřizuje: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
IDDS: 6iybfxn

Plzeň, dne: 12.4.2011

Vypraveno dne:

SDĚLENÍ

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že stavební povolení na stavbu: **Silnice II/231 Plzeň, ul.28. října, Bílá Hora (km 0,600-1,600 dle PD DÚR)** ze dne 7.3.2011 Sp. zn.: SZ MMP/057699/10/REI a Č.j.: MMP/034759/11

n a b y l o p r á v n í m o c i

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů **dne 8.4.2011** a je vykonatelné.

Magistrát města Plzně
odbor ⁽²⁾
stavebně správní

[REDACTED]
referent odboru stavebně správního
Magistrátu města Plzně

"otisk úředního razítka"

Obdrží:

MMP, Odbor investic, Škroupova č.p. 1900/5, Vnitřní Město, 306 32 Plzeň
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
RWE GasNet, s.r.o., IDDS: rdzxhzt

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní
Škroupova 4, Plzeň

Sp.zn.: SZ MMP/075519/13/REI
Č.j.: MMP/118151/13
Vyřizuje: [redacted]
Telefon: 378 934 159
Fax: [redacted]
E-mail: [redacted]
IDDS: 6iybfxn

Plzeň, dne: 4.6.2013

Vypraveno dne:

Nabytí [redacted]

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

A:

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 8.4.2013 podaly

Statutární město Plzeň, IČ 00075370, náměstí Republiky č.p. 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň, které zastupuje MMP, Odbor investic, IČ 00075370, Škroupova č.p. 1900/5, Vnitřní Město, 306 32 Plzeň,

Plzeňský kraj, IČ 70890366, Škroupova č.p. 1760/18, 306 13 Plzeň, který zastupuje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ 72053119, Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

(dále jen "stavebník"), podle § 115 odst. 4 stavebního zákona

p r o d l o u ŷ u j e

o **2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí** platnost stavebního povolení, které vydal Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní dne 7.3.2011 pod sp.zn.: SZ MMP/057699/10/REI č.j.: MMP/034759/11 na stavbu

Silnice II/231 Plzeň, ul.28. října, Bílá Hora (km 0,600-1,600 dle PD DÚR)

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2523, 2527, 2612/14, 2612/15, 2821/1, 2821/2, 2821/4, 2821/5, 2826/5, 2828/3, 2840/1, 2880, 2897, 2901/1, 2903/1, 2903/2, 2908/2, 2909/3, 2913/1, 2914, 2917, 2919/3, 2919/4, 2920/6, 2921/34, 2922/1, 2922/3, 3155/3, 3157, 3158/1, 3159, 3162/1, 3162/2, 3162/4, 3162/5, 3164, 3165, 3166/1, 3166/3, 3167, 3168, 3171/3, 3177, 3180, 3181, 3184, 3185, 3198, 3199, 3788/1, 3788/2, 3788/4, 3788/6, 3788/24, 3800, 3825/1, 3826, 3827 v katastrálním území Bolevec, parc. č. 968/1 (968 dle EN), 980/14 (dle GP č. 830-23/2009 ze dne 11.5.2009 č.parc. 980/22), 980/19, 980/20, 981/1 v katastrálním území Senec u Plzně.

Stavba obsahuje:

- SO 101 Silnice II/231 - MS2 16/7,5/50 - B
- SO 104 Úpravy napojení navazujících MK a sjezdů
- SO 132 Chodníky, cyklistické stezky a TÚ
- SO 121 Zastávkové zálivy na II/231
- SO 131 Prodloužení cyklistické stezky na p.p.č. 980/14
- SO 151 Dopravní značení II/231

Odůvodnění:

Stavebník oznámil stavebnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy stavební povolení nabylo právní moci, a proto požádal o prodloužení jeho platnosti. Nezahájení stavby v době platnosti stavebního povolení bylo zdůvodněno nezajištěným finančním krytím.

Stavební úřad posoudil důvod, pro který nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za kterých bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti resp. byla prodloužena platnost stanovisek dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl.

V řízení byla uplatněna stanoviska:

MÚ Nýřany, OŽP, č.j.: OŽP-Han/6603/2013 ze dne 22.2.2013

MÚ Nýřany, OŽP, č.j.: OŽP-Ber/12747/2012 ze dne 20.6.2012- rozhodnutí

MMP, ORP, zn.: MMP/057649/13 ze dne 2.4.2013

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení podle § 109 stavebního zákona:

statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 306 32 Plzeň, které zastupuje MMP, Odbor investic, Škroupova č.p. 1900/5, Vnitřní Město, 306 32 Plzeň, Plzeňský kraj, Škroupova č.p. 1760/18, 306 13 Plzeň, který zastupuje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1, RWE GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, Telefonica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p. 266/2, Míchle, 140 00 Praha 4, Obec Zruč-Senec, Plzeňská 100, Senec 33008 Zruč-Senec, ČSAD autobusy Plzeň a.s., V Malé Doubravce č.p. 1242/27, Doubravka, 312 00 Plzeň 12, Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., Denisovo nábřeží č.p. 920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň 1, účastníci identifikovaní pomocí označení pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: parc. č. 2524/1, 2524/3, 2525, 2526/1, 2526/3, 2526/5, 2612/1, 2612/2, 2612/4, 2612/7, 2612/10, 2612/11, 2612/13, 2613/3, 2618, 2619, 2620, 2621/2, 2622, 2624/1, 2627, 2629, 2630, 2654, 2655, 2656, 2658, 2660, 2661/1, 2661/2, 2662/1, 2663, 2664, 2682/1, 2683, 2684, 2685/1, 2686/1, 2687, 2688, 2689, 2715, 2802, 2803/1, 2804, 2806/1, 2806/2, 2807, 2809, 2811/1, 2811/2, 2813, 2815, 2817, 2818, 2821/9, 2822, 2823/2, 2824, 2826/1, 2826/2, 2827, 2828/1, 2829/1, 2829/3, 2830/1, 2830/2, 2830/3, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837/1, 2837/2, 2838, 2839/1, 2840/2, 2840/3, 2841, 2843, 2844/1, 2879/2, 2879/4, 2881, 2882/1, 2883, 2884, 2889, 2890, 2893, 2895, 2896/1, 2898/1, 2899, 2902, 2904, 2905, 2907/1, 2907/2, 2907/3, 2907/4, 2908/1, 2909/1, 2913/2, 2919/1, 2919/2, 2920/1, 2920/2, 2920/3, 2920/4, 2920/5, 3161, 3162/3, 3166/2, 3788/5, 3788/8, 3788/11, 3788/15, 3788/16, 3788/17, 3789, 3790/1, 3790/2, 3795, 3796, 3797, 3798, 3799, 3818, 3821/1, 3821/2, 3821/3, 3822 v katastrálním území Bolevec, parc. č. 889/8 v katastrálním území Senec u Plzně; budova s č.p. 801 část obce Bolevec na parcele 2525, budova s č.p. 847 část obce Bolevec na parcele 2524/3, budova s č.p. 1166 část obce Bolevec na parcele 2526/5, budova s č.p. 1848 část obce Bolevec na parcele 2612/10, budova s č.p. 1557 část obce Bolevec na parcele 2613/3, budova s č.p. 676 část obce Bolevec na parcele 2618, budova s č.p. 839 část obce Bolevec na parcele 2620, , budova s č.p. 772 část obce Bolevec na parcele 2622, budova s č.p. 366 část obce Bolevec na parcele 2627, budova s č.p. 702 část obce Bolevec na parcele 2629, budova s č.p. 587 část obce Bolevec na parcele 2654, budova s č.p. 704 část obce Bolevec na parcele 2656, budova s č.p. 705 část obce Bolevec na parcele 2658, budova s č.p. 474 část obce Bolevec na parcele 2661/2, budova s č.p. 444 část obce Bolevec na parcele 2662/1, budova s č.p. 378 část obce Bolevec na parcele 2686/1, budova s č.p. 306 část obce Bolevec na parcele 2688, budova s č.p. 284 část obce Bolevec na parcele 2802, budova s č.p. 272 část obce Bolevec na parcele 2804, budova s č.p. 1204 část obce Bolevec na parcele 2806/2, budova s č.p. 152 část obce Bolevec na parcele 2807, budova s č.p. 148 část obce Bolevec na parcele 2811/1, budova s č.p. 2128 část obce Bolevec na parcele 2811/2, budova s č.p. 147 část obce Bolevec na parcele 2813, budova s č.p. 144 část obce Bolevec na parcele 2815, budova s č.p. 51 část obce Bolevec na parcele 2817, budova bez č.p./č.e. na parcele 2821/9, budova s č.p. 137 část obce Bolevec na parcele 2822, budova bez č.p./č.e. na parcele 2823/2, budova s č.p. 618 část obce Bolevec na parcele 2824, budova s č.p. 892 část obce Bolevec na parcele 2826/2, budova s č.p. 2104 část obce Bolevec na parcele 2827, budova s č.p. 331 část obce Bolevec na parcele 2829/1, budova bez č.p./č.e. na parcele 2829/3, budova s č.p. 1698 část obce Bolevec

Obdrží:

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

MMP, Odbor investic, Škroupova č.p. 1900/5, Vnitřní Město, 306 32 Plzeň
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
RWE GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

Další účastníci řízení:

dle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány:

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Policie České republiky, Městské ředitelství policie Plzeň, Územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, IDDS: Sixai69
MMP, Odbor dopravy, Škroupova č.p. 1900/5, Vnitřní město, 306 32 Plzeň
MMP, Odbor životního prostředí, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p
Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, Odbor dopravy, IDDS: 8hrbtcq
Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, Odbor životního prostředí, IDDS: 8hrbtcq
ÚMO Plzeň 1, Odbor životního prostředí a dopravy, IDDS: 2dibh62

Žádáme o vyvěšení, sejmutí a zaslání potvrzené písemnosti zpět:

MMP, Odbor správních činností, nám. Republiky č.p. 1/1, 306 32 Plzeň 1


Žádáme o vyvěšení:


ÚMO Plzeň 1, Odbor investiční a stavebně správní, IDDS: 2dibh62
Městský úřad Nýřany, IDDS: 8hrbtcq

STAVBA POVOLENA

Stavba: **Silnice II/231 Plzeň, ul.28. října, Bílá Hora (km 0,600-1,600 dle PD DÚR)**

Stavebník: Statutární město Plzeň, které zastupuje MMP, Odbor investic,
Plzeňský kraj, který zastupuje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace,
RWE GasNet, s.r.o.

Stavební podnikatel: ... 

Stavbu povolil: Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní 

Stavební povolení: Sp.zn.: SZ MMP/210380/11/REI, Č.j.: MMP/006794/12 nabylo právní moci dne 8.4.2011

Termín dokončení: 31.12.2016
