

Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/17 Čáslav-Koudelov, oprava povrchu vozovky a doplnění svodidel

Stavební práce v otevřeném řízení

SMLOUVA O DÍLO

Tato Smlouva o dílo byla sepsána

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:

číslo smlouvy: 02PU-001633

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ 608 38 744

společnost je zapsaná u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupeným :

číslo smlouvy: 841/FCEC/007/17

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby Dílo I/17 Čáslav-Koudelov, oprava povrchu vozovky a doplnění svodidel, **ISPROFOND 500 111 0007** bylo realizováno dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve výši dvacetdevětmiliónůtřístapadesátjedenatisícdevětsetpadesátšedm Kč a čtyřicet dva haléřů bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	<u>Nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH</u>	DPH	<u>Celková nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč včetně DPH</u>
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
I/17 Čáslav-Koudelov, oprava povrchu vozovky a doplnění svodidel	29.351.957,42	6.163.911,10	35.515.868,52

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce I/17 Čáslav-Koudelov, oprava povrchu vozovky a doplnění svodidel, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 645083 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem – Obecné podmínky (díl 2, část 2 zadávací dokumentace)⁴
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem - Zvláštní podmínky (díl 2, část 3 zadávací dokumentace)⁵
- (f) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace)
- (g) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – výkaz výměr
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Harmonogram a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohou)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11. dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace) – netýká se.
 - Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12. dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Základní datum je 8.11.2016

⁴ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

⁵ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/17 Čáslav-Koudelov, oprava povrchu vozovky a doplnění svodidel

Stavební práce v otevřeném řízení

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení Díla a odstranění vad na něm, Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na **důkaz** toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 16 -03- 2017

Datum: - 8 -03- 2017

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce

PODEPSÁN

Funkce:

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

za dodavatele/zhotovitele

STRABAG a.s.

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednají:

z m o c ň u j e
své zaměstnance

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námitky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2017.

V Praze dne 4.1.2017

Zmocnění přijímám:



V Praze dne: 02 -02- 2017

Číslo zakázky: 02PU-001633

Č.j.: 1044/21/17-21300-Rock

Vyřizuje:

STRABAG, a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na Stavební práce nazvanou

„I/17 Čáslav-Koudelov, oprava povrchu vozovky a doplnění svodidel“

zadávací řízení zahájeno dne 26. 09. 2016, ve Věstníku veřejných zakázek ev. č. 645082 / ISPROFIN: 500 111 0007 (dále jen „Zakázka“), Vám tímto v souladu s § 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), v souvislosti se Zakázkou oznamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 7 níže uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí jednotlivých nabídek.
2. Jako nejvhodnější nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 4,

která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky obsahovala nejnižší nabídkovou cenu,
podaná uchazečem

STRABAG a.s.

IČ: 60838744

se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Celková nabídková cena uchazeče: 29 351 957,42,- Kč (bez DPH)

3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 2, podaná uchazečem

TANNACO, a.s.

IČ: 61677272

se sídlem Choťánky 38, 290 01 Poděbrady

Celková nabídková cena uchazeče: 29 777 777,- Kč (bez DPH)

4. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 6, podaná sdružením uchazečů

Společnost Čáslav - Koudelov, Robstav + Firesta

vedoucí společník:

ROBSTAV stavby k.s.

IČ: 27430774

se sídlem Pražská 483, 397 01 Písek

člen:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

IČ: 25317628

se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Celková nabídková cena sdružení uchazečů: 31 743 079,49,- Kč (bez DPH)

5. Jako čtvrtá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 1, podaná uchazečem

EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924

se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Celková nabídková cena uchazeče: 37 691 854,82,- Kč (bez DPH)

6. Jako pátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 5, podaná sdružením uchazečů

Sdružení B E S + K D S

Správce:

BES s.r.o.

IČ: 43792553

se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

společník:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

IČ: 28447085

se sídlem Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice

Celková nabídková cena sdružení uchazečů: 39 277 171,18,- Kč (bez DPH)

7. Jako šestá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 7, podaná uchazečem

M-SILNICE a.s.

IČ: 42196868

se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Celková nabídková cena uchazeče: 46 492 971,69,- Kč (bez DPH)

8. Jako sedmá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 3, podaná uchazečem

COLAS CZ, a.s.

IČ: 26177005

se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Celková nabídková cena uchazeče: 48 861 190,86,- Kč (bez DPH)

Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané uchazečem číslo 4 – STRABAG a.s. jako nejvhodnější, neboť se podle hodnotících kritérií Zakázky jednalo o nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

Poučení:

Námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů a v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 zákona.

V Praze dne 07.02. 2017.

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: I/17 Čáslav-Koudelov, oprava povrchu vozovky a doplnění svodidel

PRO: Ředitelství silnic a dálnic, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Název Díla	Nabídková cena v Kč bez DPH *	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z ceny (a)	(c) = (a) + (b)
I/17 Čáslav-Koudelov, oprava povrchu vozovky a doplnění svodidel	29.351.957,42	6.163.911,10	35.515.868,52

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
- (f) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace)
- (g) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a

Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/17 Čáslav-Koudelov, oprava povrchu vozovky a doplnění svodidel

Stavební práce v otevřeném řízení

- (h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
- Oceněný soupis prací – Výkaz výměr
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Harmonogram a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů – Netýká se.
 - Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění Smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

řádně oprávněn podepsat Nabídku jménem či v zastoupení za STRABAG a.s.

Adresa: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Datum 5.12.2016

Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/17 Čáslav-Koudelov, oprava povrchu vozovky a doplnění svodidel
Stavební práce v otevřeném řízení

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: I/17 Čáslav-Koudelov, oprava povrchu vozovky a doplnění svodidel

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky.

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.2.2, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.2.3, 1.3	STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Jméno a adresa Správce stavby	1.1.2.4, 1.3	
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	130 dní bez zimní technologické přestávky, tj. období od 1. 11. do 28. (29.) 2. kalendářního roku
Doba pro uvedení stavby do provozu	1.1.3.10	75 dní bez zimní technologické přestávky, tj. období od 1. 11. do 28. (29.) 2. kalendářního roku, od zahájení prvního dopravního omezení na předmětu plnění

Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/17 Čáslav-Koudelov, oprava povrchu vozovky a doplnění svodidel
Stavební práce v otevřeném řízení

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Záruční doba	1.1.3.7	60 měsíců na stavební práce a 36 měsíců na vodorovné dopravní značení plastem
Dílo	1.1.5.8	I/17 Čáslav-Koudelov, oprava povrchu vozovky a doplnění svodidel
Elektronické přenosové systémy	1.3	Datové schránky
Rozhodné právo	1.4	právo České republiky
Rozhodný jazyk	1.4	Čeština
Jazyk pro komunikaci	1.4	Čeština
Doba pro přístup na stavenišť	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1
Výše Zajištění splnění smlouvy	4.2	10 % Přijaté smluvní částky, formou bankovní záruky
Záruka za odstranění vad	4.25	3 % Přijaté smluvní částky
Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli	4.28 a)	Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku

Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/17 Čáslav-Koudelov, oprava povrchu vozovky a doplnění svodidel
Stavební práce v otevřeném řízení

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
smluvní pokutu		4.4 110.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 c)	<i>Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-článku 4.31</i> 30.000,- Kč za každý případ porušení
	4.28 d)	<i>Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 poslední odstavec</i> 220.000,- Kč za každý případ porušení
	4.28 e)	<i>Za nedodržení Doby pro dokončení</i> 22.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	4.28 f)	<i>Za nedodržení Doby pro uvedení stavby do provozu</i> 44.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	4.28 g)	<i>Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4</i> 4.400,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	30 % Přijaté smluvní částky
Procento Podmíněných obnosů	13.5.(b) (ii)	Nepoužije se.
Úpravy v důsledku změn nákladů	13.8	Použije se Pod-článek 13.8.1.
	14.6. c)	<i>Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25</i> 10 % průběžné platby
	14.6 d)	<i>Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7</i> 10 % průběžné platby
	14.6 e)	<i>Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 8.3</i> 10 % průběžné platby


Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/17 Čáslav-Koudelov, oprava povrchu vozovky a doplnění svodidel

Stavební práce v otevřeném řízení

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
	14.6 f)	<i>Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18</i> 10 % průběžné platby
Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržovaných plateb)	14.6	30 % Přijaté smluvní částky
Měny plateb	14.15	koruna česká
Výše pojistného plnění	18.2	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1% Přijaté smluvní částky
Způsob rozhodování sporů	20	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem
Datum do kdy musí být jmenována DAB	20.2	Nepoužije se.
Počet členů DAB	20.2	Nepoužije se.
Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede	20.3	Nepoužije se.

Datum: 5.12.2016

Za STRABAG a.s.



NIC ČR

CIFIKACE

ŇÍ PODMÍNKY

Název zakázky: I/17 Čáslav-Koudelov, oprava povrchu vozovky a doplnění svodidel

Číslo: 02PU-001633

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 3 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE

DÍL 3, ČÁST 1 TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Název zakázky: I/17 Čáslav-Koudelov, oprava povrchu vozovky a doplnění svodidel

Číslo: 02PU-001633

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 3, ČÁST 2 ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Název zakázky: I/17 Čáslav-Koudelov, oprava povrchu vozovky a doplnění svodidel

Číslo: 02PU-001633

ASPE 9

Firma: VALBEK, SPOL. S R.O.

Soupis objektů s DPH

Stavba:16032 - I/17 ČÁSLAV - KOUDELOV

Varianta:ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 29 351 957,42

OC+DPH: 35 515 868,52

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
000	VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY			
101	REKONSTRUKCE SILNICE I/17 ČÁSLAV - KOUDELOV			
181	DIO NA SILNICI I/17 ČÁSLAV - KOUDELOV			
301	ODVODNĚNÍ SILNICE I/17			

Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/17 Čáslav-Koudelov, oprava povrchu vozovky a doplnění svodidel

Stavební práce v otevřeném řízení

DÍL 1, ČÁST 4 FORMULÁŘ 4.4.2 ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: STRABAG a.s., NA Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 608 38 744

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „I/17 Čáslav-Koudelov, oprava povrchu vozovky a doplnění svodidel“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 645083 (dále „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy (dále „Smlouva“) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

- **Úplatkářství (Corrupt practice)** znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.
- **Podvodné jednání (Fraudulent practice)** znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
- **Objednatel (Employer)** je osoba takto označená v příloze k nabídce.
- **Veřejný činitel (Public official)** je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídicí, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- **Zakázané praktiky (Prohibited practice)** znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

Datum: 5.12.2016

Za STRABAG a.s.

Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/17 Čáslav-Koudelov, oprava povrchu vozovky a doplnění svodidel
Stavební práce v otevřeném řízení

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.5
ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Název veřejné zakázky: I/17 Čáslav-Koudelov, oprava povrchu vozovky a doplnění svodidel

Společnost STRABAG a.s.,
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,
IČ: 608 38 744,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/17 Čáslav-Koudelov, oprava povrchu vozovky a doplnění svodidel, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 645083 (dále jen „uchazeč“),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena
obrus		

Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Uchazeč se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Uchazeč tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/17 Čáslav-Koudelov, oprava povrchu vozovky a doplnění svodidel

Stavební práce v otevřeném řízení

Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

Datum: 5.12.2016

Za STRABAG a.s.

DÍL 1, ČÁST 4 FORMULÁŘ 4.4.6 HARMONOGRAM A ROZDĚLENÍ PRACÍ

Společnost STRABAG a.s.,
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,
IČ: 608 38 744,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/17 Čáslav-Koudelov, oprava povrchu vozovky a doplnění svodidel, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 645083 (dále jen „uchazeč“), tímto

uvádí, že

při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:

1. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem dokončení stavby v následujících krocích: Samostatná příloha harmonogramu stavebních prací,
2. dodržovat časový plán realizace stavby představovaný programem prací, jehož součástí je rovněž harmonogram odevzdání jednotlivých částí RDS a harmonogram technologických činností, viz příloha. Program prací bude blíže konkretizován prostřednictvím podrobného programu prací vypracovaného v souladu s požadavky stanovenými ve Smluvních podmínkách.
3. realizovat minimálně níže uvedené části díla vlastními kapacitami, přičemž za vlastní kapacity se považují (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky:
 - pokládka asfaltových vrstev

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce rozsah prací, které v souladu se Smlouvou zamýšlí zadat subdodavatelům:

Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/17 Čáslav-Koudelov, oprava povrchu vozovky a doplnění svodidel

Stavební práce v otevřeném řízení

Práce zadávané subdodavateli	Obchodní jméno a sídlo subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny díla	Zkušenosti z obdobných staveb (uvést detaily)
DIO a dopravní značení	Asig s.r.o., Budovatelů 324, Chvaletice	3 %	Zkušenosti ve Středočeském kraji
Piloty, záporové pažení a mikropiloty	GEOINDUSTRIE s.r.o., Velký Osek, Prokopa Holého 586, PŠČ 28151	7 %	Stavby po celé ČR
CELKEM %		10 %	

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu prací.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny.

Datum: 5.12.2016

Za STRABAG a.s.

Příloha: Časový harmonogram prací s rozdělením na technologie prací (bourání, frézování, betonáže, apod.) a harmonogram předání RDS.

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	III 2017				IV 2017				V 2017				VI 2017							
				13.	20.	27.	6.	13.	20.	27.	3.	10.	17.	24.	1.	8.	15.	22.	29.	5.	12.	19.	
0	I/17 Čáslav-Koudelov, oprava povrchu vozovky a doplnění svodidel	72 dny	1.3. 17	1.3. 8.6.																			
1	Zahájení stavby	1 den	1.3. 17	◆ 1.3.																			
2	Předání RDS objednateli	1 den	1.3. 17	◆ 1.3.																			
3	VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	53 dny	1.3. 17	1.3. 12.5.																			
4	Všeobecné konstrukce a práce	53 dny	1.3. 17	1.3. 12.5.																			
5	REKONSTRUKCE SILNICE I/17 ČÁSLAV - KOUDELOV	53 dny	1.3. 17	1.3. 12.5.																			
6	Všeobecné konstrukce a práce	53 dny	1.3. 17	1.3. 12.5.																			
7	Zemní práce	40 dny	1.3. 17	1.3. 25.4.																			
8	Základy	15 dny	13.3. 17	13.3. 31.3.																			
9	Vodorovné konstrukce	5 dny	13.3. 17	13.3. 17.3.																			
10	Komunikace	20 dny	14.4. 17	14.4. 11.5.																			
11	Přidružená stavební výroba	5 dny	20.3. 17	20.3. 24.3.																			
12	Potrubí	10 dny	13.3. 17	13.3. 24.3.																			
13	Ostatní konstrukce a práce	35 dny	27.3. 17	27.3. 12.5.																			
14	DIO NA SILNICI I/17 ČÁSLAV - KOUDELOV	72 dny	1.3. 17	1.3. 8.6.																			
15	Všeobecné konstrukce a práce	72 dny	1.3. 17	1.3. 8.6.																			
16	ODVODNĚNÍ SILNICE I/17	53 dny	1.3. 17	1.3. 12.5.																			
17	Všeobecné konstrukce a práce	53 dny	1.3. 17	1.3. 12.5.																			
18	Zemní práce	30 dny	13.3. 17	13.3. 21.4.																			
19	Vodorovné konstrukce	30 dny	27.3. 17	27.3. 5.5.																			
20	Potrubí	35 dny	20.3. 17	20.3. 5.5.																			
21	Ostatní konstrukce a práce	53 dny	1.3. 17	1.3. 12.5.																			
22	Uvedení stavby do provozu	1 den	12.5. 17	◆ 12.5.																			
23	Dokončení stavby	19 dny	15.5. 17	◆ 15.5.																			
24	Předání stavby objednateli	1 den	8.6. 17	◆ 8.6.																			

Projekt: I/17 Čáslav-Koudelov, opr Datum: 2.12. 16	Úkol		Vnější milník	◆	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Neaktivní úkol		Ruční souhrn	
	Milník	◆	Neaktivní milník	○	Pouze zahájení	
	Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Ruční úkol		Konečný termín	
	Vnější úkoly		Pouze s dobou trvání		Průběh	

Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/17 Čáslav-Koudelov, oprava povrchu vozovky a doplnění svodidel
Stavební práce v otevřeném řízení

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.7
SYSTÉM VÝSTUPNÍ KONTROLY RDS

Společnost STRABAG a.s.,
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,
IČ: 608 38 744,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/17 Čáslav-Koudelov, oprava povrchu vozovky a doplnění svodidel, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 645083 (dále jen „uchazeč“), tímto s ohledem na povinnost zhotovitele **zajistit účinnou a kvalifikovanou výstupní technickou kontrolu realizační dokumentace stavby (RDS) projektantem zejména z hlediska její věcné správnosti a souladu s platnými a účinnými právními předpisy, technickými normami a Smlouvou (včetně zejména technických podmínek), uvádí, že na výstupní kontrole realizační dokumentace stavby (RDS) se bude podílet následující osoba:**





Název / jméno	IČ / datum narození	Sídlo / bydliště
STRABAG a.s. - Útvar výstupní kontroly RDS pro stavbu	608 38 744	Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5

Přílohou tohoto dokumentu je systém výstupní kontroly realizační dokumentace stavby (RDS) uchazeče, podle kterého bude kontrola výše uvedenou osobou prováděna.

Datum: 5.12.2016

Za STRABAG a.s.

Příloha k formuláři 4.4.7: Systém výstupní kontroly Realizační dokumentace stavby

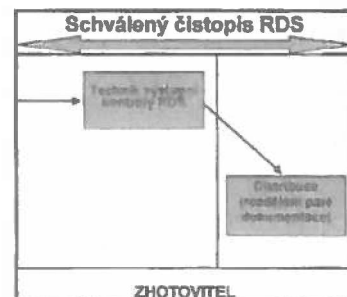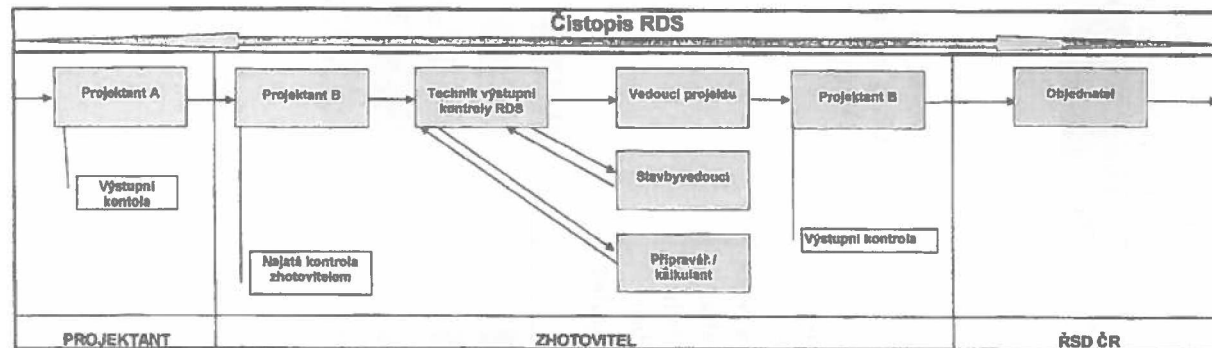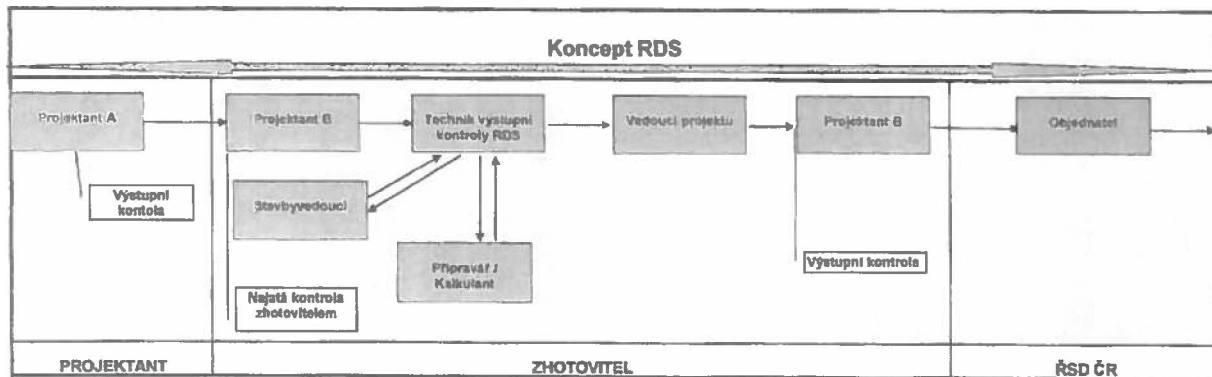

55

Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/17 Čáslav-Koudelov, oprava povrchu vozovky a doplnění svodidel
Stavební práce v otevřeném řízení

**DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.12
SEZNAM SUBDODAVATELŮ**

NETÝKÁ SE – PŘEDKLÁDÁ SE AŽ PO DOKONČENÍ STAVBY

Společnost STRABAG a.s.,
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,
IČ: 608 38 744,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce I/17 Čáslav-Koudelov, oprava povrchu vozovky a doplnění svodidel, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 645083 (dále jen „dodavatel“),

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok].

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení subdodavatele	IČ (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	Údaj v %, kolik bylo subdodavatelům uhrazeno za plnění subdodávky [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

alternativa A

Žádný se subdodavatelů nemá formu akciové společnosti.

nebo

alternativa B

62

Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/17 Čáslav-Koudelov, oprava povrchu vozovky a doplnění svodidel

Stavební práce v otevřeném řízení

Dodavatel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele:

Identifikační údaje subdodavatele	Identifikační údaje akcionáře
bude doplněno	bude doplněno
bude doplněno	bude doplněno
bude doplněno	bude doplněno
bude doplněno	bude doplněno
bude doplněno	bude doplněno

Zavazujeme se tímto nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy, nebo v případě, že plnění Smlouvy přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložit zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 10 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavatelem stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost. Výše uvedené údaje budou předloženy dle struktury uvedené v tomto formuláři.

Datum: 5.12.2016

Za STRABAG a.s.
