



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na **dodávku stavby** na akci:

„Oprava MK od Polní cesty Očov po ulici Perunská“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN
Adresa: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín
IČO: 002 84 891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100
Zastoupené: ve smluvních věcech Liborem Střechou, starostou města
v technických věcech [redacted]
(referent odboru investic MěU)

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Adresa: Jahodová 60, 620 00 Brno
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: 212269343/0300
Zastoupené: Ing. Tomášem Hrabínou - ředitelem oblasti Hodonín a
Ing. Jiřím Štukavcem - výrobně-technickým ředitelem
oběma na základě plné moci

/dále jen zhotovitel/

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE

Stavba: Oprava MK od Polní cesty Očov po ulici Perunská
Místo: Hodonín – část ulice Perunská

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou smlouvnou cenu.
- 3.2. Předmětem zakázky „Hodonín – oprava MK od Polní cesty Očov po ulici Perunská“ je rekonstrukce živičného krytu v rozsahu dle přílohy č. 1.
- 3.3. **Předmětem díla jsou rovněž činnosti**, práce a dodávky, které nejsou v zadávací dokumentaci obsaženy, ale jsou nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých by zhotovitel podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl.
- 3.4. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec výkazu výměr, které bude nutno realizovat v důsledku oprávněných požadavků a **rozhodnutí dotčených orgánů** v rámci prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.

3.5. Součástí předmětu díla je rovněž zajištění povolení a realizace úpravy **dopravního značení**, potřebné pro zhotovení díla.

4 TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1 Zhotovitel provede dílo v těchto lhůtách a termínech:
předání staveniště: do 5 dnů od účinnosti smlouvy
zahájení prací: do 3 dnů od předání staveniště
ukončení prací: do 14 dní od zahájení prací
předání díla: do 7 dnů od ukončení prací

4.2 Plnění termínů realizace díla je podmíněno rovněž vhodnými **klimatickými podmínkami**. Změna termínu realizace díla může být provedena při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy se nový termín realizace díla posune o počet dnů, o které byla stavba přerušena z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Počet dnů, o které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn na pokyn objednatele a odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele (viz. čl. 1. SOD) záznamem do stavebního deníku a zápisem na KD.

5 CENA ZA DÍLO

5.1 Cena díla zahrnuje **veškeré náklady** potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle Přílohy č. 1 a je cenou nejvýše přípustnou ve výši:

187 946,81 Kč bez DPH

39 468,84 Kč DPH 21 %

227 415,65 Kč včetně DPH

5.2 Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě **položkového rozpočtu** (Příloha č. 1), který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

5.3 Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění **smluvních pokut**.

5.4 Cena díla podle odst. 5.1. je cenou **nejvýše přípustnou** a může být změněna jen dodatkem smlouvy.

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel **neposkytuje zálohy**.

6.1 Faktura bude vystavována po ukončení díla dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb. **Přílohou faktury musí být** odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb, předávací protokol a protokol o odstranění vad a nedodělků, potvrzené objednatelem.

6.2 Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného **doručení do sídla objednatele**. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.

7 ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

7.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí v souladu s ustanoveními § 2604 a násl. občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno

v souladu s **jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb. a zákonem 13/1997 Sb.** ve znění změn a platných doplňků, příslušných podzákoných norem nebo ČSN včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků. Aplikace ust. § 2605 odst. 1 a 2 občanského zákoníku se vylučuje.

- 7.2 Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a **informační tabulí** s identifikačními údaji stavby, (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora a koordinátorovi BOZP) dle vzoru předaného objednatelem.

Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady. Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění **předem projednat** s objednatelem.

V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo výměnu tabule. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a **dobrém (čitelném) stavu**.

- 7.3 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích které provádí **stavební deník** v souladu s Vyhl.č.499/2006.
- 7.4 Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude jménem zhotovitele odborně řídit provádění stavby - **stavbyvedoucí** v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce. V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže jejich **odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost**, požadovanou v zadávací dokumentaci VZ. **Změna osoby stavbyvedoucího** musí být bezodkladně písemně oznámena objednateli.
- 7.5 **Koordinátor BOZP** je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, je ohrožena bezpečnost stavby, hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.
- 7.6 Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů:

Název	IČO	Rozsah prací
-----	-----	-----

- 7.7 Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 7.8 Zhotovitel je povinen předat objednateli **do 5 dnů** od zahájení prací písemný **seznam poddodavatelů**, kteří se budou podílet na realizaci díla v objemu prací vyšším než **20 %** celkového rozsahu díla (v poměru k celkovým nákladům díla).
- 7.9 Zhotovitel je povinen nejpozději do **7 dnů** po ukončení díla **vyklidit staveniště** a veškeré dotčené okolní plochy a objekty uvést do původního stavu.
- 7.10 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla, uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc). Minimální pojistné plnění související s výkonem podnikatelské činnosti je 1 000 000,00 Kč. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu provádění díla.
- 7.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), vůči všem osobám, které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to, zda jsou práce předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jeho zaměstnanci i osobami vykonávající práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně spravedlivého a rovného odměňování v práci a vyloučení diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

- 7.12 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění stavebních prací učiní opatření, která jsou nezbytná k ochraně životního prostředí. Zhotovitel se tedy zavazuje zejména zabránit nadměrnému znečišťování ovzduší a půdy imisemi pocházejícími z výstavby; není-li možné imisím zabránit, Zhotovitel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k jejich eliminaci. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

8 ZMĚNY DÍLA

- 8.1 **Veškeré** změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- 8.2 **Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z **důvodů**:

- 8.2.1 **neprovedení dohodnutých stavebních prací**, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
8.2.2 **provedení dodatečných stavebních prací**, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
8.2.3 **požadavků správců** technické infrastruktury,
8.2.4 **zlepšení efektivity**, hospodárnosti a účelnosti **budoucího provozu** díla.

- 8.3 **Pokud** objednatel právo na změnu díla uplatní, **je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit** a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity stanovené zejména v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak.

- 8.4 **Pokud** objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 4. (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně **návrh Změnového listu** nejpozději na nejbližším KD k projednání.

- 8.5 **Změnový list** (Příloha č. 2).

- 8.5.1 **Před vlastním provedením** musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována v návrhu Změnového listu a ten **odsouhlasen** objednatel.
8.5.2 **Návrh** změnového listu bude **zpracován dle vzoru** předaného zhotoviteli (Příloha č. 2). Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla **odpovídá zhotovitel**.
8.5.3 Změnové listy budou **odsouhlaseny** objednatel **formou schválení dodatku ke smlouvě**.

Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení objednatelem.

- 8.5.4 **Ocenění** víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno **s použitím položkových cen** položkových rozpočtů (Příloha č. 1).
- 8.5.5 **Soupis** prací **jednoho** stavebního nebo inženýrského **objektu**, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat **pouze na jednu cenovou soustavu** pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci.
- 8.5.6 Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta **individuální kalkulace**.
- 8.5.7 K hlavním rozpočtovým nákladům **není zhotovitel oprávněn připočítat přírůžku** na podíl vedlejších rozpočtových nákladů **VRN**, koordinační činnost a jiné přírůžky. K celkovým nákladům pak bude dopočtena **DPH** podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění

9 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat **o předání díla zápis**, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
- 9.2 Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné **vady a nedodělky**, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách.
- 9.3 Převzetím díla přechází na objednatele **vlastnické právo** k dílu.

10 REKLAMACE

10.1 Postup při reklamaci:

- 10.2 Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje **do 7 dnů** od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.
- Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky
 - datum zjištění vady
 - rozsah vady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách“, které **nemají podstatný** vliv na funkci dokončeného díla, **zahájí do 15 dnů** od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady **odstraní do 30 dnů** od obdržení písemného oznámení reklamace. U reklamace, která **má „podstatný vliv“** na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady **odstraní do 15 dnů** od obdržení písemného oznámení reklamace. Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

- 10.3 I když, **reklamace nebude oprávněná**, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.
- 10.4 Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu.

11 ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 11.1 Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **60 měsíců** od data řádného předání stavby objednateli.
- 11.2 Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli, s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo záruční dobu jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená jejich výrobcem nebo dodavatelem, **minimálně však 24 měsíců** ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů.
- 11.3 Zhotovitel obdobně odpovídá za jakékoliv **právní vady díla**, jimiž je dílo postiženo v době jeho předání anebo jimiž bude postiženo v době po předání díla z důvodu zavinění zhotovitele.

12 SMLUVNÍ POKUTA

- 12.1 V případě **prodlení** s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 500,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 12.2 V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši **0,1%** z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení.
- 12.3 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a **vyčištění staveniště** (odst. 6.8.) zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 12.4 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k **odstranění vady** uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1 500,- Kč** za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 12.5 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k **odstranění vady** uplatněné objednatelem **v záruční době**, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 12.6 Za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z čl. 7.8, 7.9, 7.12 a 7.13 má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **50 000,- Kč** za každé jednotlivé porušení.
- 12.7 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže po podpisu smlouvy neinformuje objednatele o poddodavatelích předložením jejich identifikačních údajů objednateli, nebo objednatele neprodleně neinformuje o změně v poddodavatelském systému dle této smlouvy ve výši **3 000,- Kč** za každý jednotlivý případ.
- 12.8 Zhotovitel se zavazuje, že v případě **porušení jakéhokoli jiného svého závazku** plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,-Kč** za každé porušení svých závazků či povinností.

- 12.9 V případě, že závazek provést dílo **zanikne před řádným ukončením** díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu.
- 12.10 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevyklučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.
- 12.11 Smluvní pokuty je objednatel **oprávněn započíst** proti jakékoli pohledávce zhotovitele.
- 12.12 Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena přímo na účet správce daně v režimu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.
- 12.13 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem (viz § 106a zákona č. 235/2004 Sb.), tuto skutečnost městu Hodonín nahlásí nejpozději následující den po dni kdy rozhodnutí, na základě, kterého se stal nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit veškerou škodu, kterou tímto městu Hodonín způsobil a smluvní pokutu ve výši **50 000,- Kč**.

13 JINÁ UJEDNÁNÍ

- 13.1 Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou **písemný dodatek** smlouvy. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě ani dodatku sjednány, platí, že je provádí **na svůj náklad**.
- 13.2 Podstatné náležitosti smlouvy mohou být měněny pouze **písemnými dodatky**, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
- 13.3 Smlouva je uzavřena podpisem druhé smluvní strany a **nabývá účinnosti** dnem zveřejněním v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra. Smlouva je vyhotovena ve **4 výtiscích** s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
- 13.4 Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.
- 13.5 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 13.6 Smlouva bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

14 PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Hodonín (www.hodonin.eu). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených ve smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Hodonín má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat

osobní údaje v této smlouvě obsažené.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

- Příloha č. 1** **Položkový rozpočet** vypracovaný na základě soupisu prací VZ
s **Grafickou přílohou** rozsahu prací
- Příloha č. 2** **Změnový list** (vzor)


V Hodoníně dne *12. 8. 2021*

V Hodoníně dne *9. 8. 2021*

Objednatel:



..
L
st




Ing. Tomáš Hrabina - ředitel/oblasti Hodonín
Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický ředitel
oba na základě plné moci

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE OD POLNÍ CESTY OČOV PO ULICI PERUNSKÁ

Investor: Město Hodonín

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
11 Přípravné práce					
1	113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase <i>90,00*3,60</i>	324,00	m2		
2	997006512 Vodorovně doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	41,47	t		
3	997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km <i>41,47*4</i>	165,88	t		
4	997013645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	41,47	t		
Přípravné práce Celkem :					41 342,43
5 Komunikace					
5	573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 <i>90,00*3,60</i>	324,00	m2		
6	577134121 Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	324,00	m2		
7	572141111 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 30 mm	324,00	m2		
Komunikace Celkem :					143 370,00
9 Ostatní konstrukce a práce					
8	938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	324,00	m2		
9	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	45,88	t		
Ostatní konstrukce a práce Celkem :					3 234,38
STAVBA CELKEM					187 946,81
Sazba DPH					21,00
DPH celkem					39 468,84
Odbytová cena bez DPH:					187 946,81
Odbytová cena s DPH:					227 415,65

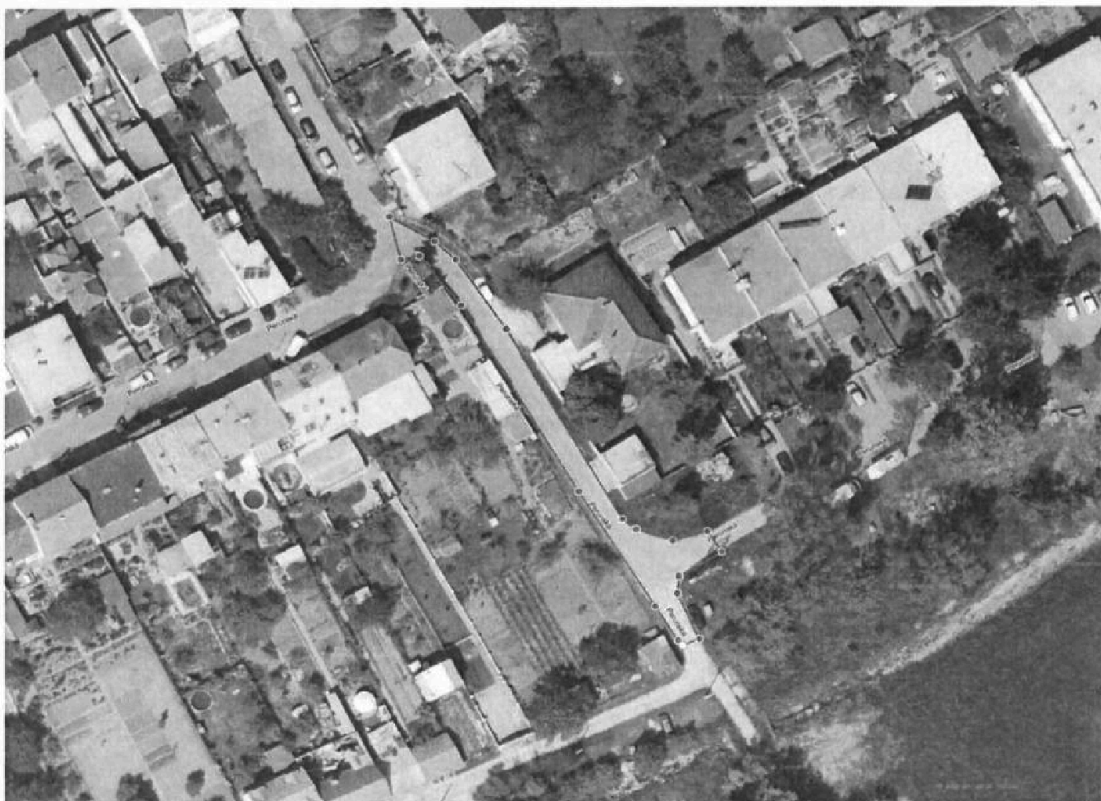

Název akce:
doplnit název

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: **ZL č. XX**
„(doplnit název změnového listu)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.:

1. **Oddíl stavby:** *(Stavební objekt, Provozní soubor)*
2. **Zpracovatel změnového listu:** *(zhotovitel stavby)*
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1 stavební deník: *(SD č xx, strana č xx, datum xx.xx.xxxx)*
 - 3.2 kontrolní den: *(KD č xx, ze dne xx.xx.xxxx)*
 - 3.3 jiné související dokumenty: *(dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele apod.)*
4. **Zdůvodnění a příčina změny:**
(Podrobný popis příčiny změny.)
5. **Návrh technického řešení a rozsah změny**
(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)
6. **Finanční náklady změny**
(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	0,00	0,00
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	0,00	0,00

V dne

.....
(jméno, podpis zhotovitele)

7. **Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)**
*(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení **kontroly výkazu výměř** a nacenění víceprací dle podmínek SOD*

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ
- Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v soudu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně díla)
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd)

- *stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím*
- *stanovisky dotčených orgánů*
- *podmínkami dotačního programu*

Návrh dalšího postupu (popis úkonůvyvolaných změn) např.:

- *Úprava harmonogramu stavby*
- *Dodatek IZ*
- *Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)*
- *Dodatek Smlouvy o dílo*
- *Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)*

Doporučení

TDS (ne)doporučuje ZL č. XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumu a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) (ne)doporučuje ZL. XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).

- V případě že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.*
- Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

FI:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150:

Dotace EU/SR:

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V dne

.....
(jméno, podpis)**VEDOUCÍ ODBORU :**

V dne

.....
(jméno, podpis)**GARANT ODBORU:**

V dne

.....
(jméno, podpis)**10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce**

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská
 Smlouva/objednávka: SD/2018/0186/150 ve znění dodatků č. xx

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka		
3	ZL č. 3			
Rozpis částky na roky:	2020	xxxxx		
Finanční profil:				
ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2020	150	xxxx		xxxxx

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

příkazce operace:	datum:	jméno: Ing. Milan HUDEC	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis:

11. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet
 Příloha č. 2 fotodokumentace
 Příloha č. xxx další přílohy dle odst. 3.3.

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.
