

Číslo smlouvy CETIN: HK 2021 0058  
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030002558  
Registr smluv: ANO

---

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY  
SÍŤE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
č. HK 2021 0058**

---

mezi

**CETIN a.s.**

a

**Pardubický kraj**

Číslo smlouvy CETIN: HK 2021 0058  
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030002558  
Registr smluv: ANO

**CETIN a.s.**

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9  
IČO: 04084063  
DIČ: CZ04084063  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623  
zastoupená dle pověření [REDACTED] manažerem, Výstavba pevné přístupové  
bankovní spojení: PPF banka a.s.  
číslo účtu: 2019160003/6000  
(dále jen „**CETIN**“)

a

**Pardubický kraj**

se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, 530 02 Pardubice 2  
IČO: 70892822  
DIČ: CZ70892822  
zastoupená Ing. Miroslavem Vohlídalem  
(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací  
(dále jen „**Smlouva**“)

**DEFINICE**

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

**CTN** je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

**Překládka** je stavba v k.ú. Gerhartice; Kerhartice nad Orlicí; Ústí nad Orlicí spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

**Projekt** je realizační projektová dokumentace Překládky;

**Příprava Překládky** jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

**Předpoklady pro realizaci Překládky** mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

**SEK** je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými VPIC Kerhartice(UO),Mod sil. II\_315

Projekt Stavebníka „Modernizace silnice II/315 Hrádek – Ústí nad Orlicí“

Číslo smlouvy CETIN: HK 2021 0058  
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030002558  
Registr smluv: ANO

elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

**Vyjádření o existenci SEK** je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*“ ze dne 14.7.2016 vydané pod čj. 658583/16 jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Kerhartice(UO),Mod sil. II\_315**“. Název projektu Stavebníka „**Modernizace silnice II/315 Hrádek – Ústí nad Orlicí**“

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

## 3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
  - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
  - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

Číslo smlouvy CETIN: HK 2021 0058  
 Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030002558  
 Registr smluv: ANO

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

#### 4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektu,
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (ii) zajistit geodetické vytyčení hranic pozemků související s Překládkou;
- (iii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však pět (5) měsíců od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník se zavazuje, nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, jejíž vzor je uveden v Příloze č. 2 Smlouvy a převést na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky. Ve lhůtě dle předchozího odstavce je Stavebník povinen předat společnosti CETIN územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
- (c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 bodu (i) a (ii) Smlouvy;
- (d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření

Číslo smlouvy CETIN: HK 2021 0058  
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030002558  
Registr smluv: ANO

smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

## 5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **799.736,- Kč** (slovy: sedm set devadesát devět tisíc sedm set třicet šest korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do čtyř (4) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou

Číslo smlouvy CETIN: HK 2021 0058  
 Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030002558  
 Registr smluv: ANO

- dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
  - (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
  - (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
  - (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
  - (f) náklady na identifikaci parcel,
  - (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
  - (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
  - (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
  - (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
  - (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
  - (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
  - (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

## 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:

- (a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši **72.459,- Kč** (slovy: sedmdesát dva tisíc čtyři sta padesát devět korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy,
- (b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.

6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.

Číslo smlouvy CETIN: HK 2021 0058  
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030002558  
Registr smluv: ANO

- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

## 7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

## 8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

### 8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: [REDACTED]  
funkce: specialista pro výstavbu sítě - překládky SEK  
e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]  
funkce: specialista pro výstavbu sítě  
e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

### 8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Vohlídal  
funkce: vedoucí odboru majetkového, stavebního řádu a investic  
e-mail: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

ve věcech technických: Bc. Dita Svobodová Koldrová  
funkce: vedoucí úseku dopravních staveb  
e-mail: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

## 9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.

Číslo smlouvy CETIN: HK 2021 0058  
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030002558  
Registr smluv: ANO

- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle Čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.
- 9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

## 10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

## 11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů,



Číslo smlouvy CETIN: HK 2021 0058  
 Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030002558  
 Registr smluv: ANO

kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přijímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přijímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přijímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přijímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přijímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přijímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

## 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- (a) v listinné podobě;

Číslo smlouvy CETIN: HK 2021 0058  
 Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030002558  
 Registr smluv: ANO

- (b) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zaručený elektronický podpis**“);
- (c) e-mailovou zprávou opatřenou Zaručeným elektronickým podpisem;
- (d) e-mailovou zprávou zaslou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy, věta první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem (c) a (d).

- 12.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.
- 12.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
- 12.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
  - § 1767 odst. 2;
  - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
  - § 1743.
- 12.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.10 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoliv svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

12.11 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě

VPIC Kerhartice(UO),Mod sil. II\_315

Projekt Stavebníka „Modernizace silnice II/315 Hrádek – Ústí nad Orlicí“

Číslo smlouvy CETIN: HK 2021 0058  
 Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030002558  
 Registr smluv: ANO

ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

12.12 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

12.13 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoliv souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.14 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.

12.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby – vzor

Příloha č. 3 - Povinnosti zhotovitele stavby EU14

CETIN:

Stavebník:

V Praze

V Pardubicích

**CETIN a.s.**

manažer, Výstavba pevné přístupové sítě

**Pardubický kraj**

Ing. Miroslav Vohlídal  
 vedoucí odboru majetkového, stavebního  
 řádu a investic

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

## VPIC Kerhartice(UO),Mod sil. II\_315 70490/21/0022

### 1.1 Stávající stav

Vnějšími vlivy, především činností vodního toku Tichá Orlice, došlo k zásahům v území, které úzce přiléhá k silnici II\_315 v kú Kerhartice nad Orlicí. Touto činností byl zastaven provoz na této silnici. Aby mohlo dojít k plnohodnotnému zprovoznění, přistoupil investor stavby k modernizace silnice II\_315 ke zpracování projektové dokumentace protierozních opatření na Tiché Orlicí. Tato modernizace vyvolává požadavek na úpravu tras stávajících komunikačních vedení společnosti CETIN a.s. Aby bylo možné provést navržená protierozní opatření, je nutné přeložit stávající komunikační vedení společnosti CETIN a.s.. S ohledem na min. prostorové možnosti a především na rozsah prováděných opatření bude přeložka realizována ve dvou etapách:

- dočasné přeložení (přeložení komunikačních vedení mimo prostor vlastní stavby)
- konečné přeložení (přeložení dočasně vymístěného zařízení po dokončení hrubých stavebních prací)

Vlastní překládka komunikačních vedení byla pracovně rozdělena na 2 oblasti činnosti:

- činnost č.1 - přemístění metalických komunikačních kabelů a HDPE trubek
- činnost č. 2 - přemístění optického komunikačního kabelu

### 1.2 Zemní práce:

Dočasné přeložení:

Cílem dočasného přeložení komunikačních vedení je tato vedení vymístit z místa stavby a přitom zachovat komunikační provoz na těchto vedeních. Protože v místě dočasného umístění bude v poslední fázi stavby prováděn násyp zeminy ve výšce několika metrů, není možné komunikační vedení v tomto místě ponechat. Komunikační vedení tak budou dočasně vymístěna mimo ohraničený prostor stavby s výjimkou vjezdů a výjezdů ze staveniště. Proto bude možné tato vedení, umístěná s ohledem na mechanickou ochranu v ochranných trubkách, volně uložit na povrch a ukotvit k terénu. Pouze v případě výše uvedených vjezdů a výjezdů ze staveniště bude komunikační vedení uloženo do země s hodnotou krytí 1,-m.

Konečné přeložení:

V čase, kdy budou provedeny hrubé stavební práce- budou provedeny kamenné konstrukce a kamenný zához, odpovídající krytí komunikačních vedení-dojde k provedení konečné překládky komunikačních vedení. Volně na terén, ve vzdálenosti cca 2m od základu kamenného valu, budou přeložena dočasně přeložená komunikační vedení. Ta budou v celé

délce trasy uložena v ochranných trubkách tlakového charakteru.

### 1.3 Montážní práce

- činnost č. 1\_MET+ HDPE trubky: do nově připravené chráničky VR125 bude umístěna dvojice nových optických HDPE trubek. Zároveň bude do nově připravené chráničky VR125 umístěna dvojice metalických kabelů.  
Metalické komunikační kabely budou přepojeny v kabelových spojkách XAGA. Optické HDPE trubky budou přepojeny v mechanických spojkách PLASSON 40. Místa přepojení budou doplněna identifikačními markery. V případě konečné překládky se bude tato činnost opakovat.
- činnost č. 2\_optický komunikační kabel: stávající optická HDPE trubka 40/33 mm OR je obsazena DKO 549RAI. V rámci předchozí investiční činnosti byla v blízké KK PVS 1730 u RVDSL USTO77 (Kerhartice) umístěna optická kabelová spojka 02/1, u které byla ponechána manipulační rezerva v délce 41 m. Tato rezerva bude nyní využita. Z místa ponechané rezervy bude po počáteční bod překládky komunikačních vedení vyfouknut OK 549RAI s tím, že bude následně a zafouknut zpět prostřednictvím nově uložené HDPE trubky, umístěné do nové trasy. Původní rezerva OK v délce 41 m bude navýšením délky nové, dočasné trasy snížena na 28 m. Při realizaci konečné překládky se bude tato činnost opakovat s tím, že konečná trasa je kratší a tedy rezerva OK 549RAI se u OS 02/1 opět prodlouží.

### 1.4 Kabely, kabelové soubory, HDPE trubky, TS

MK: PPFLE 400XN0,4; 50XN0,6  
Kabelové spojky XAGA.  
Mechanické spojky: PLASSON 40  
HDPE trubky 40/33 OR; OR/BB; Č  
OK: stávající OK MIDIA 24F\_D

### 1.5 Měření

Dle požadavku zadavatele:

MK: SS měření; v případě dočasné překládky budou měřeny pouze XN, vyvedené v RVDSL a SR v Kerharticích

OK: dle předpisu č 117

### 1.6 Geo zaměření


Poloha nových sítí bude geo zaměřena v souladu s požadavky provozovatele kom. zařízení. Pro vklad Vbř budou zpracovány GEO plány. V rámci stavby je předpoklad dotčení pozemků: PP 164/2, 164/3,166/2, 166/3, 166/4, kú Kerhartice nad Orlicí; PP 2262/1 kú Ústí nad Orlicí. Je předpoklad uzavírání 3 ks SoVbř (město ústí nad Orlicí, LESY ČR s.p., SPU


ČR).

### **1.5 Zvláštní ujednání**

Dané CTN nepředstavuje projektovou dokumentaci prováděcího stupně, nýbrž dokumentaci jako podklad pro zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR. Na podkladě ukončeného územního projednání bude provedena prováděcí dokumentace ve stupni prováděcím.

06/2021

 autorizovaný inženýr pro  
technologická zařízení staveb

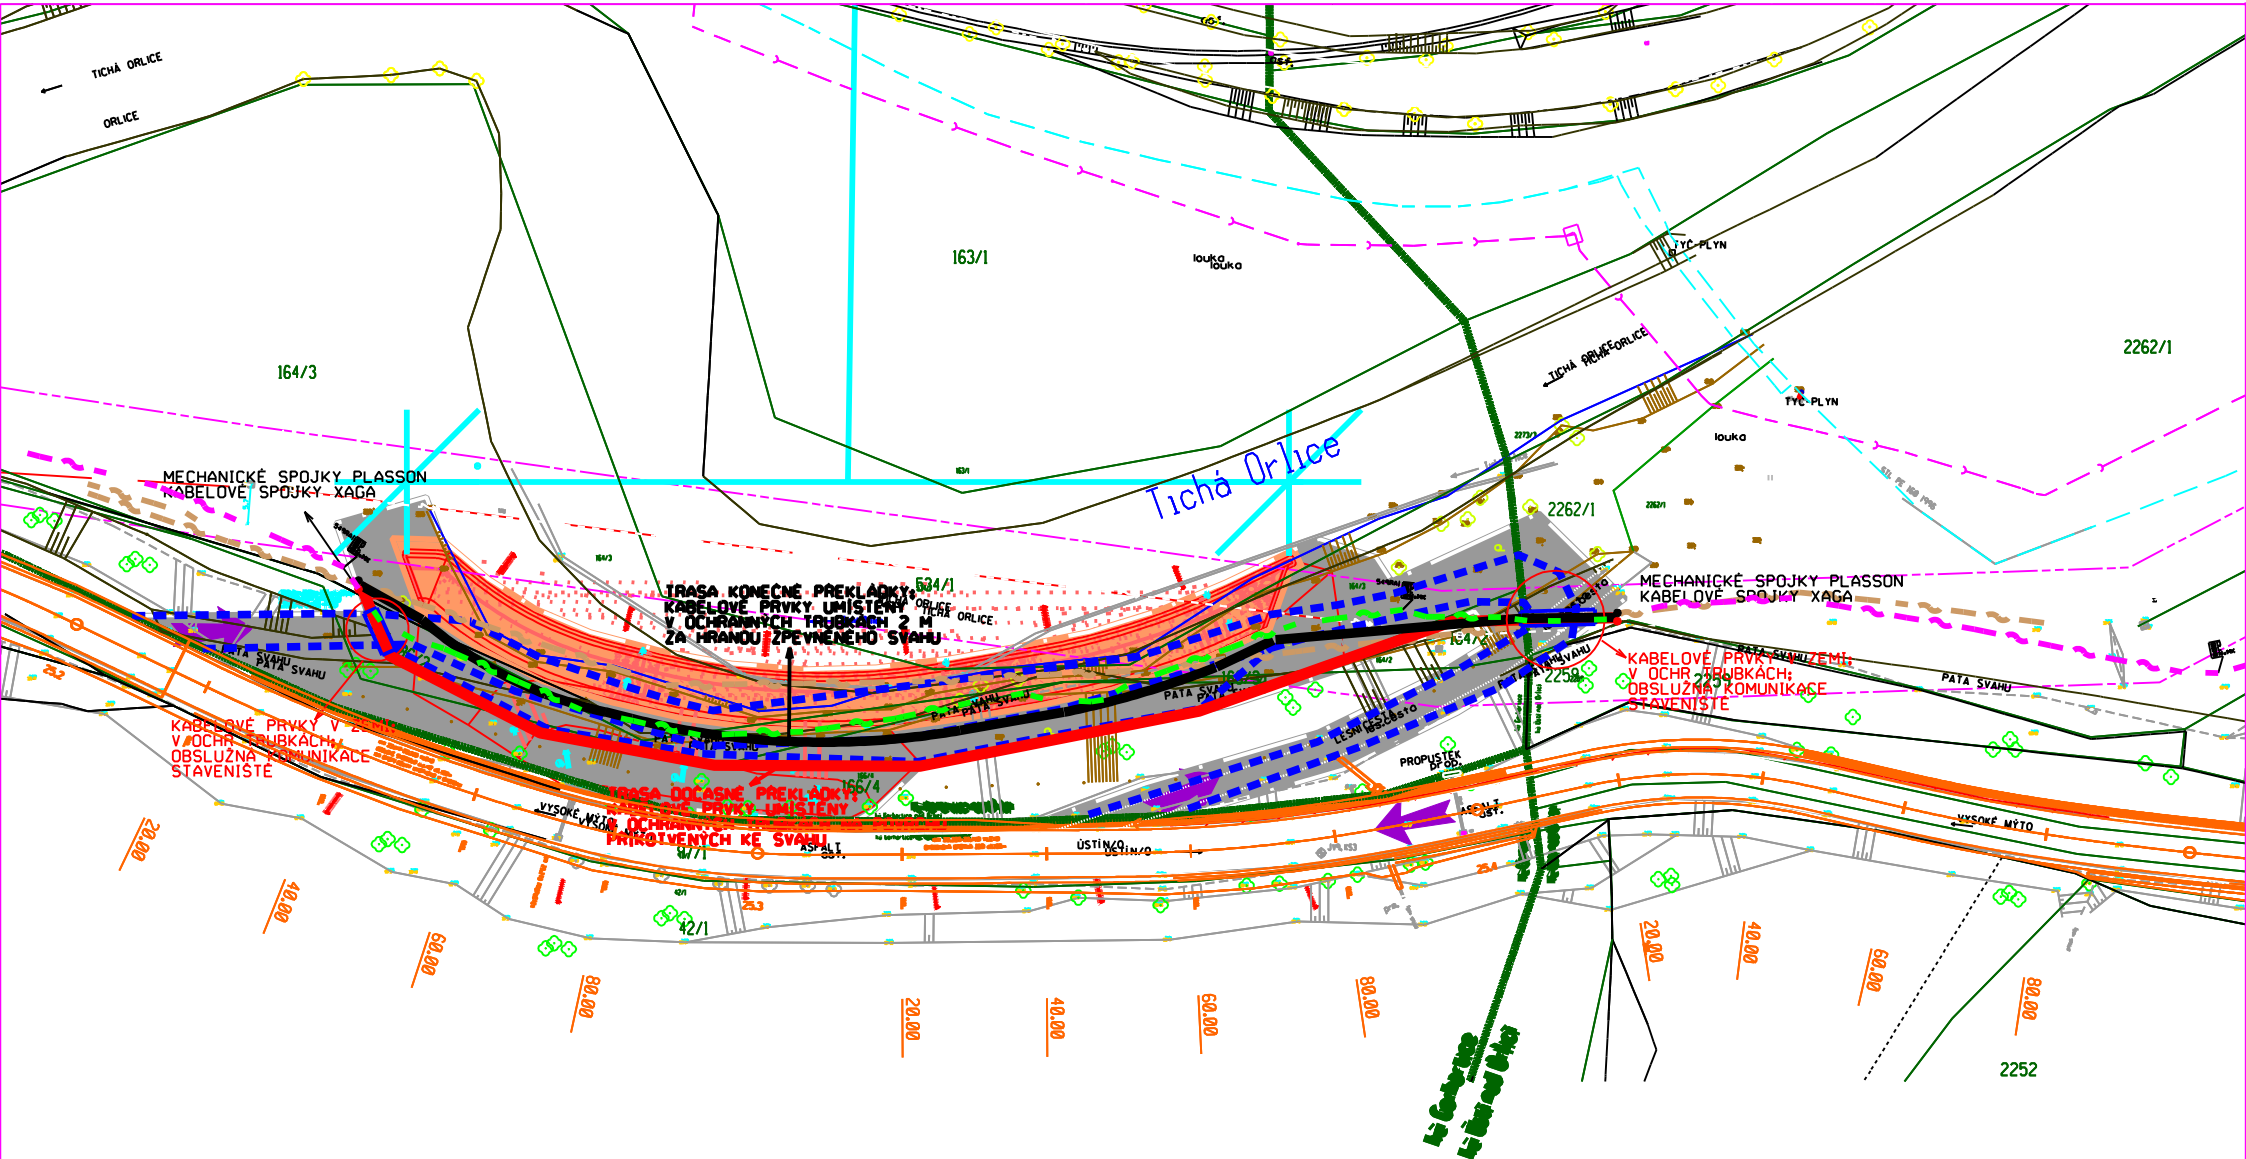

25.3

- CETIN-DOČASNĚ PŘELOŽENÁ TRASA
- CETIN-KONEČNÁ PŘEKLÁDKA
- CETIN-STÁVAJÍCÍ TRASA
- CETIN-RUŠENÁ TRASA
- CETIN-NEVYUŽÍVANÉ VEDENÍ (NENÍ PŘEDMĚTEM PŘEKLÁDKY)
- PROSTOR NÁJEZDU TĚŽKÉ TECHNIKY

Projekt: VPIC Kerhartice(UO), Mod s11 II/31570490/21/0022		[REDACTED]
Investor: CETIN a.s.		Datum: 06/2021
Projektant [REDACTED]	Vypracoval [REDACTED]	Měřítko: 1:750
SITUACE MK+HDPE		Stupeň: CTN
Výkres č.: S 01		Formát: A3

RVDSL UST077  
A OS 02/1


v rámci dočasného přeložení  
propojit z 400XN pouze  
150XN pod provozem

SPOJKA  
PLASSON-2 KS  
SPOJKA  
XAGA 500-125/30-460-2 KS  
XAGA 500-55/12-300-2 KS

v rámci dočasného přeložení  
propojit z 400XN pouze  
150XN pod provozem

KONEC VÝFUKU  
OK OD RVDSL UST077

SPOJKA  
PLASSON-2 KS  
SPOJKA  
XAGA 500-125/30-460-2 KS  
XAGA 500-55/12-300-2 KS

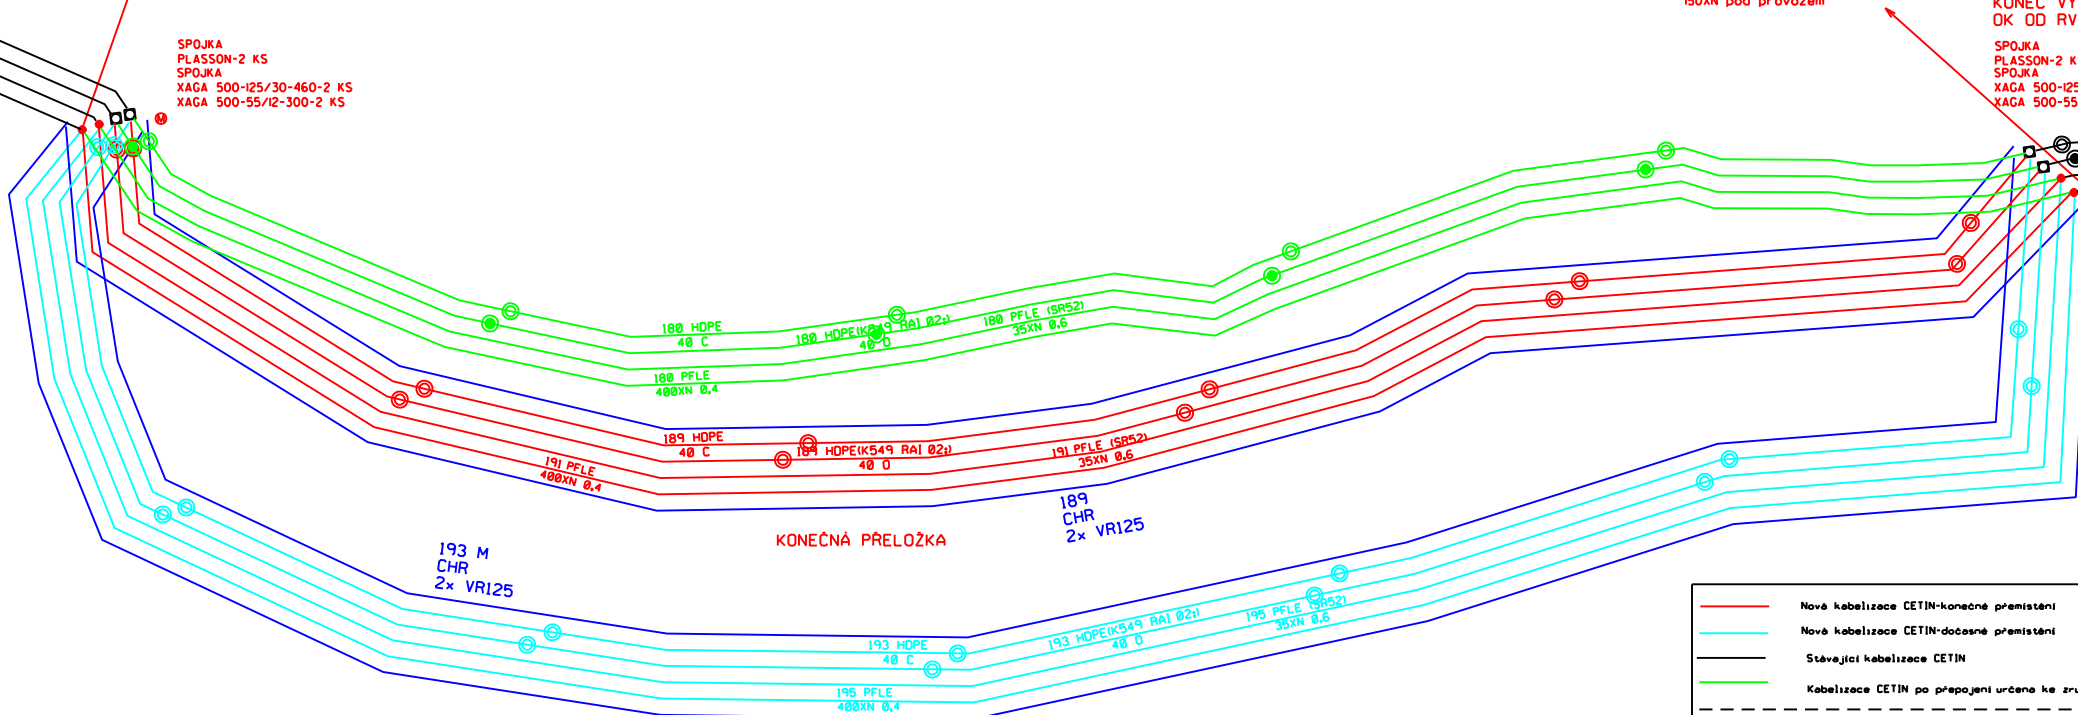

193 M  
CHR  
2x VR125

KONEČNÁ PŘELOŽKA

189  
CHR  
2x VR125

DOČASNÁ PŘELOŽKA



	Nová kabelizace CETIN-konečné přemístění
	Nová kabelizace CETIN-dočasné přemístění
	Stávající kabelizace CETIN
	Kabelizace CETIN po přepojení určeno ke zrušení
	HDPE tr. obsezené DKD
	HDPE tr. neobsezené
	HDPE tr. obsezené TS
	Kabelové spojka dělicí
	Kabelové spojka rovné
	Koncový kabelový kryt SKH
	Koncový trubkový kryt
	Marker
	Síťový rozvedec
	Účastnický rozvedec rozvedec zesahový, samostat. objekt, stěžerový

Projekt: VPIC Kerhartice(UO), Mod síl II/31570490/21/0022		
Investor: CETIN a.s.		Datum: 10/2020
Projektant 	Vypracoval 	Měřítko: 1:500
Schema MK+HDPE		Stupeň: Břídjekt
Výkres č.: S 01	Formát: A3	



Kabel: 549 RAI - OK RSU ÚSTÍN.ORLICÍ - UST079 (ON:22.10.2019 13:34:31)

(UST0:BS:I - UST0:BS:29) Stránka: [K] Provozní

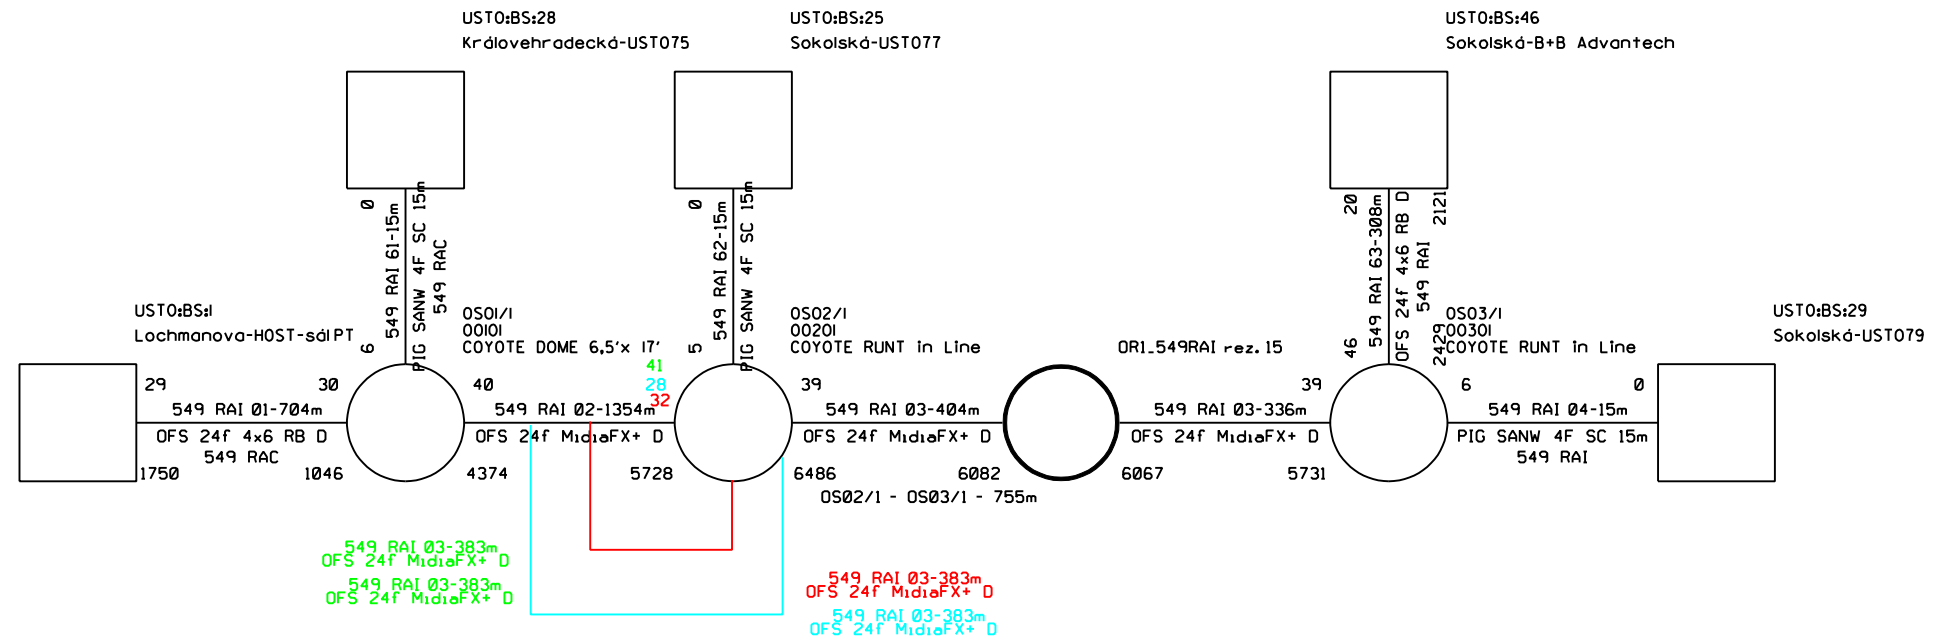

———— KONEČNÁ PŘEKLÁDKA

———— DOČASNÁ PŘEKLÁDKA

**Specifikace nákladů\_VPIC Kerhartice(UO),Mod sil. II\_315 70490/21/0022**

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Východ 2018-TEM - FTTH - 2021.07

Položková 2021.07

Název stavby: **VPIC Kerhartice(UO),Mod sil. II\_315 70490/21/0022**  
Číslo SPP prvku: CTN  
Zhotovitel PD: TEMO Telekomunikace a.s. [REDACTED]  
KPO: Pardubicko  
HOST: Ústí nad Orlicí  
VUJ:

## Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	63 572,18 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	83 958,13 Kč
MONTÁŽ	281 384,91 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	7 219,05 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	12 635,39 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	8 886,96 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	54 685,04 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	565,24 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazc	286 829,40 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevyk:	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

**Celkové náklady: 799 736,30 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST 665 373,07 Kč  
NESTAVEBNÍ ČINNOST 134 363,23 Kč

## Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
<b>PŘÍPRAVA</b>				
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks	12 362,66 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	1.00 ks	20 672,04 Kč
		trasa 0.101 - 0,400 km		
953635		Projekt tlkm liniové optické sítě	1.00 ks	30 537,48 Kč
		trasa 1,301 - 1,600 km		
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	764.00 m	14 294,44 Kč
956266 S		Převzetí a zához pod fólii bez zřízení kabel	164.00 m	10 228,68 Kč
956267 S		Převzetí a zához pod fólii se zřízením kabe	127.00 m	12 672,06 Kč
952355 S		Rýha v trávě 50/110	91.00 m	41 995,59 Kč
955054 S		Vytyčení trasy podél silnice,železnice	382.00 m	4 767,36 Kč
<b>MONTÁŽ</b>				
955077 S		Demontáž spojky, redukce mechan. rozeb	4.00 ks	171,12 Kč
955010 S		Demontáž úložné trubky	386.00 m	4 091,60 Kč

955030 S	Demontáž úložných kabelů do 50 XN	195.00 m	5 105,10 Kč	
955032 S	Demontáž úložných kabelů nad 300 XN	195.00 m	10 494,90 Kč	
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavb	386.00 m	1 443,64 Kč	
958312 S	Měření oboustranné OTDR (1625 nm) - st:	26.00 ks	6 946,16 Kč	
958314 S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm)	26.00 ks	1 984,58 Kč	
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- prvn	8.00 ks	1 512,64 Kč	
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - dalš	612.00 ks	26 707,68 Kč	
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	1240.00 ks	45 098,80 Kč	
955282 S	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	4.00 ks	8 144,84 Kč	
955281 S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	4.00 ks	5 526,84 Kč	
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozel	8.00 ks	387,20 Kč	
952602 S	Montáž trubky úložné	772.00 m	12 429,20 Kč	
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	390.00 m	11 914,50 Kč	
954993 S	Montáž úložných kabelů nad 300 XN	390.00 m	23 829,00 Kč	
958593 S	Provádění PEW o víkendu	2.00 ks	24 446,30 Kč	
958557 S	Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks	16 284,23 Kč	
958331 S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní	26.00 ks	9 923,16 Kč	
955306 S	Úprava spojky	2.00 ks	3 122,88 Kč	
958469 S	Uvedení stavby do provozu	5356.80 JV	5 356,80 Kč	
Uvedení stavby do provozu				
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	2.00 ks	2 594,72 Kč	
958336 S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do H	1532.00 m	37 962,96 Kč	
958558 S	Zkouška trhací	2.00 ks	3 053,28 Kč	
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	3.00 ks	8 082,24 Kč	
955066 S	Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř.	2.00 ks	1 919,86 Kč	
955067 S	Zrušení spojky smrštitelné nad 50 čtyř	2.00 ks	2 850,68 Kč	
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA				
956278	Předměření trasy do 100 m	1.00 ks	5 554,35 Kč	
956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km	93.00 m	1 664,70 Kč	
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE				
956281 S	Doměření trasy do 100 m	1.00 ks	5 554,35 Kč	
956283 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km	89.00 m	1 593,10 Kč	
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100r	2.00 ks	5 487,94 Kč	
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	3.00 ks	8 886,96 Kč	
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného bř	38600.00 JV	38 600,00 Kč	
Náhrady Vbř - odhadovaná				
Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.				
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	3.00 ks	6 735,21 Kč	
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene	3.00 ks	9 349,83 Kč	
L i m i t k a m a t e r i á l u				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL VYŘAZENÝ				
303003 S		Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	4.00 ks	565,24 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303955 S		Deska krycí plast. 200x1000 mm	10.00 ks	229,00 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	200.00 m	852,00 Kč

303777 S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	30.00 m	66,00 Kč
300113 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 400x4x0,4	195.00 m	160 906,20 Kč
300121 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6	195.00 m	45 314,10 Kč
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball	2.00 ks	392,52 Kč
312417 S	Modul konektor. 4000-25P	88.00 ks	4 091,12 Kč
312425 S	Modul konektor. 9700-10P	28.00 ks	622,16 Kč
323050 S	Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm	26.00 ks	136,24 Kč
312881 S	Spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FL	4.00 ks	2 805,12 Kč
316166 S	Spojka plastová 125/107mm	12.00 ks	452,28 Kč
320301 S	Spojka smršťovací XAGA 550 122/30-500	4.00 ks	5 016,76 Kč
300023 S	Trubka HDPE 40/33 černá	193.00 m	4 483,39 Kč
300030 S	Trubka HDPE 40/33 oranžová	193.00 m	4 483,39 Kč
302441 S	Trubka vrapovaná 125/107 s lankem	764.00 m	56 979,12 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
301685 S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	1.00 ks	0,00 Kč

Příloha č.2

## DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

### CETIN a.s.

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623  
IČO: 04084063  
DIČ: CZ04084063  
zastoupená [•], na základě pověření  
(dále jen „**Nabyvatel**“)

a

[•]

se sídlem [•]  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u [•]  
IČO: [•]  
DIČ: [•]  
zastoupena [•]  
(dále jen „**Převodce**“)

Nabyvatel a Převodce dále společně jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

dne, měsíce a roku níže uvedeného, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“) uzavírají tuto

## DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

(dále jen „**Dohoda**“)

### 1. PŘEDMĚT DOHODY

- 1.1 Převodce je na základě rozhodnutí o umístění stavby „[•]“, které bylo vydáno dne [•], [KÝM] pod čj. [•] a nabylo právní moci dne [•] (dále jen „**Rozhodnutí o umístění stavby**“) oprávněn k umístění [•] (dále jen „**Stavba**“). Rozhodnutí o umístění stavby je Přílohou č. 1 Dohody.
- 1.2 Předmětem převodu jsou některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to právo k umístění Stavby za podmínek v citovaném rozhodnutí stanovených, a dále s ním související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, tak jak jsou stanoveny v Rozhodnutí o umístění stavby.

### 2. PŘEVOD PRÁV

- 2.1 Převodce uzavřením Dohody, s účinností ke dni uzavření Dohody, převádí na Nabyvatele některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to toliko právo k umístění Stavby za podmínek v Rozhodnutí o umístění stavby stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Rozhodnutí o umístění stavby stanoveny.
- 2.2 Převodce se zavazuje postoupení písemně oznámit Správnímu orgánu nejpozději do

## Příloha č.2

třiceti (30) pracovních dnů ode dne uzavření Dohody.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Dohoda, a práva a povinnosti Smluvních stran z Dohody vyplývající, se řídí právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem, a případné spory budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
- 3.2 Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani projev učiněný po uzavření Dohody, jež není v Dohodě uveden, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek ani jedné ze Smluvních stran.
- 3.3 Dohoda může být měněna nebo zrušena pouze písemně; změna jinou formou je vyloučena. Pojmem „písemně“ se pro účely Dohody rozumí předání zpráv v listinné podobě anebo prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zaručený elektronický podpis**“). Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv než výše uvedených.
- 3.4 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Dohody byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Dohody, ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 3.5 Dohoda nabývá platnosti a účinnosti v den jejího uzavření.
- 3.6 Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.
- 3.7 Smluvní strany ujednaly, že Dohodu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Dohoda je uzavřena doručením Dohody opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.
- 3.8 Následující Přílohy jsou nedílnou součástí Dohody:  
Příloha č. 1 – Rozhodnutí o umístění stavby

Nabyvatel:

V \_\_\_\_\_

Převodce:

V \_\_\_\_\_

---

CETIN a.s.

[•]

---

[•]

## Příloha č. 3 ke smlouvě č. HK 2021 0058

## Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu

**Název projektu:** Modernizace silnice II/315 Hrádek – Ústí nad Orlicí

**Registrační číslo projektu:** bude doplněno

**Název operačního programu:** Integrovaný regionální operační program (dále jen „IROP“)

**Číslo a název výzvy:**

**Řídící orgán:** Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

- 1) Na každé faktuře bude uveden název projektu a registrační číslo projektu. Faktury musí obsahovat účel fakturovaných částek podle uzavřené realizační smlouvy a budou přesně specifikovat jednotlivé způsobilé a nezpůsobilé výdaje, vše v souladu se zadávací dokumentací nebo dle požadavků manažera projektu.
- 2) Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2, písm. e), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly a to v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván.
- 3) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření vedoucí k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.
- 4) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Centrem pro regionální rozvoj ČR, popř. jiným poskytovatelem dotace či zprostředkujícím subjektem, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební dohled).
- 5) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.
- 6) Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednavatelem při zpracování monitorovacích zpráv o realizaci projektu (průběžných nebo závěrečných), žádostí o platbu, žádostí o změnu projektu, zpráv o udržitelnosti projektu a závěrečné zprávy o udržitelnosti projektu.
- 7) Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího

kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- 8) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.
- 9) Další povinnosti zhotovitele vyplývají také z Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, včetně příloh a dalších dokumentů dostupných pro patřičnou výzvu.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**
