

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

Číslo související rámcové dohody: S-2238/00066001/2020

mezi

1. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Prah 5

zastoupeným: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitel

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Společnost je BIM SAS4S

zastoupená Společníkem 1 **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555

DIČ: CZ04598555

zápis v obchodním rejstříku: Sp. zn. C 250116 vedená u Městského soudu v Praze

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen: Ing. Jiřím Čurdou a Ladislavem Beranem, jednateli

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pelech, obchodní a provozní ředitel

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Vít Hoznour

e-mail:

tel:

společník 2 **AFRY CZ s.r.o.**

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605

DIČ: CZ45306605

zápis v obchodním rejstříku: Sp. zn. C 8073 vedená u Městského soudu v Praze

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

Ing. Petrem Košanem, jednatelem

společník 3 SATRA, spol.s r.o.

se sídlem:

Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9

IČO:

18584209

DIČ:

CZ18584209

zápis v obchodním rejstříku:

Sp. zn. C 3014 vedená u Městského soudu v Praze

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem

společník 4 4roads s.r.o.

se sídlem:

Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6

IČO:

06327354

DIČ:

CZ06327354

zápis v obchodním rejstříku:

Sp. zn. C 280328 vedená u Městského soudu v Praze

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

Ing. Janem Semerádem, jednatelem

společník 5 SHB, akciová společnost

se sídlem:

Masná 1493/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO:

25324365

DIČ:

CZ25324365

zápis v obchodním rejstříku:

Sp. zn. B 4477 vedená u Krajským soudem v Ostravě

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

Prof Ing. Jiřím Stráským, DSc., předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)
(č. smlouvy S-2143/00066001/2021, č. smlouvy zhotovitele: 121 090)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí, odpovědnost a bez zbytečných prodlení dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“) na minitendr s názvem:

III/1025 Čisovice-Bojov, havarijní stav silnice-PD

dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- a) Dokumentace DUSP včetně všech souvisejících průzkumů (akt. zaměření, apod.)
- b) Výkon autorského dozoru (AD)
- c) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů
Soupis prací s výkazem výměr bude zpracován ve formátu .XC4.
- d) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové dohody

Předmět plnění bude zpracován v souladu s platnou legislativou, vyhláškami a TP. Rozpočet bude reflektovat zařídění dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.

Součástí prací není zpracování modelu BIM.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou.
4. Výsledky poskytnutých služeb:

Průzkumy a zaměření	1x v listinné podobě a 1x digitálně na flash disku
nebo k žádosti o stavební povolení (DUSP)	1x (potvrzená stavebním úřadem)
Dokumentace pro provedení stavby (PDPS)	4x v listinné podobě a 1x digitálně na flash disku, přičemž 1 x oceněná
Dokladová část	1x v tištěné podobě a 1x digitálně na flash disku
Originál pravomocného územního rozhodnutí včetně dokladové části a stavebního povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně dokladové části a ověřené projektové dokumentace.	1x v tištěné podobě (+ 1x kopie na flash disku).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj.:

- a) Dokumentace DUSP
bez DPH: 2 640 000,- Kč
DPH: 554 400,- Kč
včetně DPH: 3 194 400,- Kč
- b) Projektová dokumentace pro provedení stavby
bez DPH: 550 000,- Kč
DPH: 115 500,- Kč
včetně DPH: 665 500,- Kč
- c) Výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení stavby
bez DPH: 990 000,- Kč
DPH: 207 900,- Kč
včetně DPH: 1 197 900,- Kč
- d) Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy
bez DPH: 1000,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
DPH: 210,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
včetně DPH: 1 210,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

Cena celkem:

bez DPH: 4 332 000,- Kč
DPH: 909 720,- Kč
včetně DPH: 5 241 720,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, mobil: _____, e-mail: _____

Pavel Špaček, silniční technik, oblast Kladno, mobil: _____, e-mail: _____

Ivana Jurčíková, správní cestmistr CMS Zbraslav, mobil: _____

e-mail: _____

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
2. Zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti Prováděcí smlouvy

- Dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUSP) - koncept

Nejpozději do 6 měsíců od podpisu Smlouvy

- Dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUSP) - čistopis

Nejpozději do 4 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro společné územní a stavební řízení od Objednatele

Prověří možnost využití oznámení o provedení údržby (pro I. a III. etapu) popř. ohlášení stavby, jinak podání žádosti o vydání společného ÚR a SP (pro II. etapu) - rozdělit dle náročnosti opravy silnice a zpracování PD na tři etapy.

- Podání žádosti o vydání společného ÚR a SP (pro II. etapu)

Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné, do 1 měsíce od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,

Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné, do 1 měsíce od schválení příslušných smluv

- PDPS – rozdělit pro každou etapu zvlášť,

Do 1 měsíce od vydání souhlasu příslušného SÚ s udržovacími pracemi pro danou etapu (I. a III. etapa)

Do 1 měsíce od vydání pravomocného společného ÚR a SP (II. etapa)

- Výkon autorského dozoru

Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: sídlo zhotovitele, autorský dozor bude prováděn na stavbě.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

Technickou specifikaci předmětu díla.

Fotodokumentaci
3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy

Článek V.

Další ustanovení

Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly této smlouvy. Zhotovitel souhlasí se vstupem všech kontrolních orgánů (objednatel, Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, orgánů strukturálních fondů EU, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančních úřadů apod.) do svých objektů, ve kterých se realizuje předmět této smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu této smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let ode dne poskytnutí služeb dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související s touto smlouvou. V případě, že část předmětu této smlouvy zhotovitel plní prostřednictvím jiných subjektů, je povinen smluvně zajistit, aby i tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto článku smlouvy, pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část této Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
4. Přílohy této smlouvy tvoří:
 - Příloha č. 1: Podrobná specifikace předmětu plnění,
 - Příloha č. 2: Podrobná specifikace ceny,
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Říčanech dne

V Praze dne

PODEPSÁN

PODEPSÁN

za objednatele: **Krajská správa a údržba
silnic Středočeského kraje, p.o.**

za zhotovitele: **BIM SAS4S**

.....
Ing. Jan Lichtneger
ředitel

.....
Ing. Jiří Čurda, Ladislav Beran, jednatelé
SAGASTA s.r.o.

Technická specifikace

Název akce: „III/1025 Čisovice - Bojov, havarijní stav silnice - PD“

Místo realizace akce:

- silnice III/1025 v km 3,420 – 7,974 ve stávající šíři o celkové délce 4,554 km, uzlové body 1243A125 1242A194

oblast Kladno, okr. Praha-západ, cestmistrovství Zbraslav



Základní popis akce:

Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):

Jedná se o zpracování PD na rekonstrukci silnice pro společné územní a stavební řízení (DUSP), zajištění pravomocného společného územního a stavebního povolení, vyřešení majetkoprávních vztahů, vypracování dokumentace pro zadání stavby (PDPS), a výkon autorského dozoru (AD) při dodržení platných norem (např. ČSN 736201, 736101) TKP a TP.

Technický popis stávajících objektů:

Rekonstrukce silnice III/1025 od km 3,420 do km 7,974, o celkové délce 4,554 km, začínající v obci Čisovice s napojením na již opravenou část silnice. Průměrná šíře silnice je proměnná, cca 4,5 - 5,2 m. Těleso komunikace v požadovaném úseku vykazuje značné podélné a příčné trhliny, propadlé a vymleté krajnice a výtluky. V celé délce opravy dochází k rozpadu asfaltového krytu. Dále je nutno řešit odvodnění silnice, rekonstrukci a čištění propustků v celé

trase, opravu opěrných zdí, úpravu krajnic a čištění příkopů. Budou řešeny bezpečnostní prvky na silnici (např. svodidla) a VDZ v celém úseku opravy.

Rekonstrukce silnice III/1025 bude rozdělena dle náročnosti opravy a zpracování PD na tři etapy:

I. etapa - v km 3,420 – cca 5,415 Silnice vykazuje rozpad asfaltového krytu a značné množství poruch (podélné a příčné trhliny). Nutno řešit opravu silnice včetně odvodnění, vyčištění a rekonstrukce propustků. V této etapě se předpokládá oprava komunikace spadající do souvislé údržby.

II. etapa – v cca km 5,415 – 6,600 v průtahu obcí Bojov. Silnice zde také vykazuje plošný rozpad živичného krytu a značné množství podélných a příčných trhlin. V celém úseku je nutno řešit odvodnění silnice – předpokládá se vybudování nové dešťové kanalizace, budou řešeny bezpečnostní prvky na silnici (např. svodidla). Ve směru staničení v km cca 5,750 po pravé straně je třeba opravit opěrné zdi. Projekční příprava bude koordinována s již projekčně započatou akcí „III-1025 Čisovice-Bojov, úprava odvodnění“. Předpokládá se, že bude vyžadováno povolení příslušného stavebního úřadu.

III. etapa - v km cca 6,600 - 7,974 - mezi obcí Bojov až konec požadovaného úseku Zde navazuje na již připravovanou stavbu „III-1025 Bojov - Klínek, rekonstrukce silnice“, se kterou je nutné tuto akci koordinovat. Předpokládá se oprava komunikace spadající do souvislé údržby. Je nutné řešit opravu silnice včetně odvodnění, vyčištění a rekonstrukce propustků, (je zde již opravený úsek silnice po povodních v roce 2013 a to v úseku 6,760 - 6,847 v délce 0,087 km a 7,141-7,930 v délce 0,789 km). V rámci opravy budou řešeny bezpečnostní prvky na silnici (např. svodidla), úprava a obnova krajnic a silničních příkopů.

V rámci projektové přípravy je nutná koordinace s obcí Čisovice, tj. s jejich stavbami (např. splašková kanalizace v průtahu obcí Bojov).

Návrh řešení:

- na základě výsledků diagnostiky, zjištění obsahu PAU a jeho zatřídění, provedení kompletní rekonstrukce stávající silnice
- rekonstrukci silnice rozdělit, dle náročnosti zpracování PD a provedení rekonstrukce na tři etapy, části opravy v režimu souvislé údržby a etapy vyžadující náročnější zpracování PD (DUSP) a následné povolení příslušného stavebního úřadu
- vyčištění a rekonstrukce propustků, případně vybudování nových propustků
- V zastavěném území obce Bojov kompletně řešit odvodnění silnice – předpoklad vybudování nové dešťové kanalizace.
- řešení bezpečnostních prvků v intravilánu a v průtahu obcí, po dohodě s obcemi
- koordinace se stavbou „III-1025 Čisovice-Bojov, úprava odvodnění“
- koordinace se stavbou „III-1025 Bojov - Klínek, rekonstrukce silnice“
- koordinace s investičními akcemi obce Čisovice.
- Zpracování návrhu DIO
- BOZP

V rámci PD bude proveden geotechnický průzkum, dendrologický průzkum, hydrotechnické posouzení Q100 a geodetické zaměření.

Termíny realizace:

Koncept DUSP s rozdělením do tří etap – do 6 měsíců od podpisu smlouvy

Čistopis DUSP rozdělen na tři etapy – do 1 měsíce od schválení konceptu DUSP objednatelem

Podání žádosti o vydání společného ÚR a SP (pro II. etapu)

- Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné, do 1 měsíce od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,

- Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné, do 1 měsíce od schválení příslušných smluv

PDPS – rozdělit pro každou etapu zvlášť,

Do 1 měsíce od vydání souhlasu příslušného SÚ s udržovacími pracemi pro danou etapu (pro I. a III. etapu)

Do 1 měsíce od vydání pravomocného společného ÚR a SP (pro II. etapu)

Technická pomoc – výkon AD – čerpání v průběhu realizace stavby

Kontakty:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ 00066001

Oblast Kladno

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, mobil _____, e-mai _____


Pavel Špaček, silniční technik, oblast Kladno, mobil _____, e-mail: _____

Ivana Jurčíková, správní cestmistr CMS Zbraslav, mobil _____
e-mail: _____

Fotodokumentace:





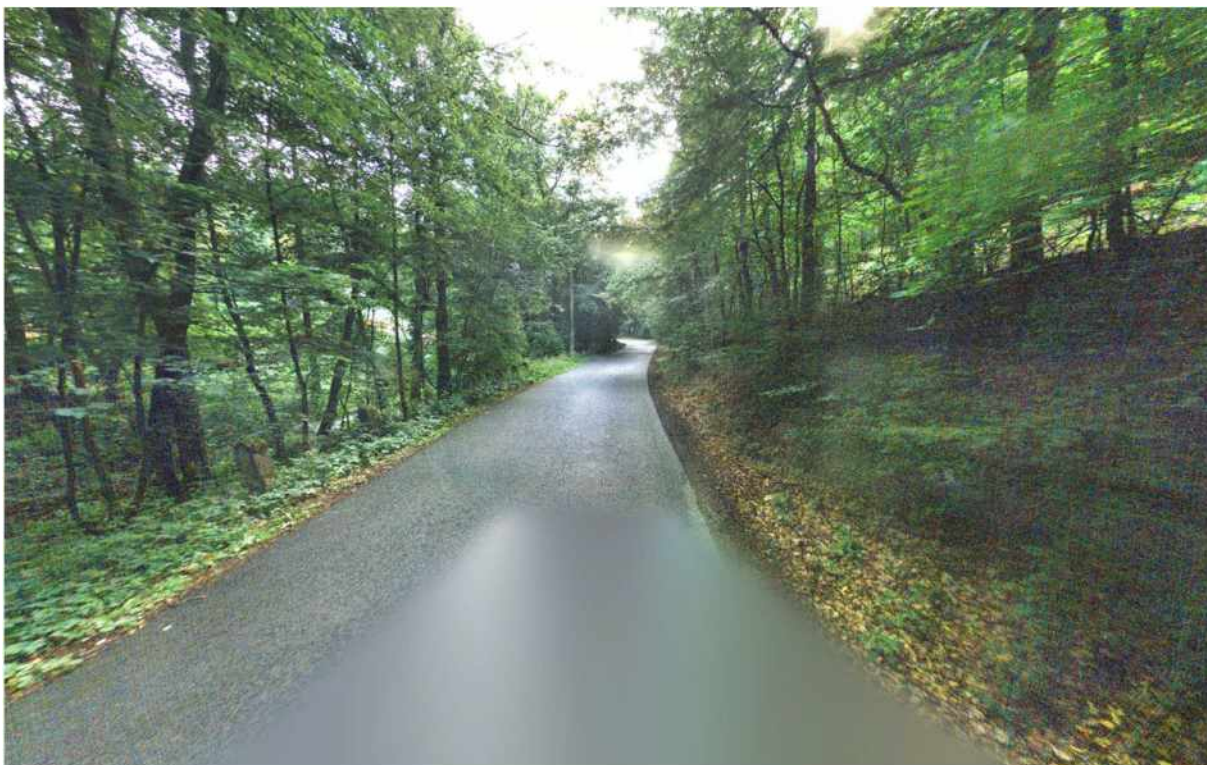

Zpracoval Pavel Špaček v březnu 2021

Podrobná specifikace ceny

AKCE

Příloha č. 2

III/1025 Čisovice - Bojov, havarijní stav silnice - PD

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DUSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k DUSP vč. majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část PDPS*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
55 000 000	4,800%	1,800%	1,000%	1 000	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	152	
	2 805 000	1 155 000	605 000	152 000	4 717 000
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***)					5 707 570,00
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	2 640 000	990 000	550 000	152 000	4 332 000
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	94,12%	85,71%	90,91%	100,00%	91,84%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

****) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2 část DUSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k DUSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

V Praze dne 20. 8. 2021

Ing. Jiří Čurda
jednatel
SAGASTA s.r.o.

III/1025 Čísovice - Bojov, havarijní stav silnice - PD

žlutě ocení uchazeč	
0 popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
Průzkumy a podklady - DUSP	
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa	80 000,00
Geotechnický průzkum, Diagnostika vozovky, průzkum dle vyhlášky 130/2019 Sb.	320 000,00
Průzkumy DUSP celkem	400 000,00
DUSP	
Průvodní zpráva	40 000,00
Souhrnné technické řešení	220 000,00
Stavební část	1 832 000,00
DIO	76 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	42 000,00
BOZP	30 000,00
DUSP celkem	2 240 000,00
DUSP celkem včetně průzkumů	2 640 000,00
IČ-zajištění vydání DUSP	
projednání dokumentace	460 000,00
majetkoprávní podklady	450 000,00
podání žádosti včetně poplatků	80 000,00
IČ celkem	990 000,00
PDPS	
Technická zpráva	40 000,00
Výkresová část	350 000,00
ZTKP	80 000,00
Soupis prací a rozpočet	80 000,00
PDPS celkem	550 000,00
celkem bez DPH	4 180 000,00

V Praze dne 20. 8. 2021

Ing. Jiří Čurda
jednatel
SAGASTA s.r.o.

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

III/1025 Čísovice - Bojov, havarijní stav silnice - PD

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	8	1 000	8 000
Cena AD celkem bez DPH	144		144 000
Celkem	152		152 000

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díličí činnosti při výkonu AD	AD
činnost	hodin
	24
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	24
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	24
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	24
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřování se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	16
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízení dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 	32
celkem hodin	144
Kč/hod	1 000
Celkem Kč bez DPH	144 000

***) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.
