



S004P01F2C29

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na **dobavku stavby** na akci:

„Hodonín – oprava živičných krytů MK 2021“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN
Adresa: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín
IČO: 002 84 891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100
Zastoupené: ve smluvních věcech Liborem Střechou - starostou města Hodonína
v technických věcech [redacted] (pověřeným vedoucím odboru
investic a údržby MěÚ)
a [redacted] (referent odboru investic a údržby MěÚ)

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Adresa: Jahodová 60, 620 00 Brno
IČO: 480 35 599
DIČ : CZ48035599
Bankovní spojení: ČSOB, a. s., č. ú.: 212269343/0300
Zastoupen: Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín a
Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel
- oba na základě plné moci

/dále jen zhotovitel/

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE

Stavba: HODONÍN – OPRAVA ŽIVIČNÝCH KRYTŮ MK 2021
Místo: Hodonín - ul. Na Výhoně – střední cesta; Hodonín - ul. Písečné

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou smlouvni cenu.
- 3.2. Předmětem zakázky „Hodonín – oprava živičných krytů MK 2021“ je rekonstrukce živičného krytu Výhon – střední cesta a MK Písečné a ošetření spár – 2000 bm v rozsahu dle grafické přílohy (Příloha č. 1).
- 3.3. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dobavky, které nejsou v zadávací dokumentaci obsaženy, ale jsou nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých by zhotovitel podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl.
- 3.4. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec výkazu výměr, které bude nutno realizovat v důsledku oprávněných požadavků a rozhodnutí dotčených orgánů v rámci

prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.

- 3.5. Součástí předmětu díla je rovněž zajištění povolení a realizace úpravy **dopravního značení**, potřebné pro zhotovení díla.

3 TERMÍNY PLNĚNÍ

- 3.1 Zhotovitel provede dílo v těchto lhůtách a termínech:

předání staveniště: do 30 dnů od podpisu smlouvy

zahájení prací: do 3 dnů od předání staveniště

ukončení prací: do 30 dní od zahájení prací

předání díla: do 7 dnů od ukončení prací

- 3.2 Plnění termínů realizace díla je podmíněno rovněž vhodnými **klimatickými podmínkami**. Změna termínu realizace díla může být provedena při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy se nový termín realizace díla posune o počet dnů, o které byla stavba přerušena z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

Počet dnů, o které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn na pokyn TDS a odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele (viz. čl. 1. SoD) záznamem do stavebního deníku a zápisem na KD.

4 CENA ZA DÍLO

- 4.1 Cena díla zahrnuje **veškeré náklady** potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle Přílohy č. 1, a je cenou nejvýše přípustnou ve výši:

2 875 537,- Kč bez DPH

603 863,- Kč DPH 21 %

3 479 400,- Kč včetně DPH

- 4.2 Cena **díla je stanovena** zhotovitelem na základě **položkového rozpočtu** (Příloha č. 1), který je součástí jeho nabídky.

Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

- 4.3 Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění **smluvních pokut**.

- 4.4 Cena díla podle odst. 4.1 je cenou **nejvýše přípustnou** a může být změněna jen dodatkem smlouvy.

5 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel **neposkytuje zálohy**.

- 5.1 Faktura bude vystavována po ukončení díla dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb. **Přílohou faktury musí být** odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb, předávací protokol a protokol o odstranění vad a nedodělků, potvrzené objednatelem.

- 5.2 Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného **doručení do sídla objednatele**. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.

6 ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí v souladu s ustanoveními § 2604 a násl. občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s **jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb. a zákonem 13/1997 Sb.** ve znění změn a platných doplňků, příslušných podzákoných norem nebo ČSN včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků. Aplikace ust. § 2605 odst. 1 a 2 občanského zákoníku se vylučuje.
- 6.2 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích které provádí **stavební deník** v souladu s Vyhl.č.499/2006.
- 6.3 Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude jménem zhotovitele odborně řídit provádění stavby - **stavbyvedoucí** v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce. V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže jejich **odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost**, požadovanou v zadávací dokumentaci VZ. **Změna osoby stavbyvedoucího** musí být bezodkladně písemně oznámena objednateli.
- 6.4 **TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni** vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, je ohrožena bezpečnost stavby, hrozí zhoršení požadované kvality celku i
- 6.5 Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 6.6 Zhotovitel je povinen předat objednateli **do 5 dnů** od zahájení prací písemný **seznam poddodavatelů**, kteří se budou podílet na realizaci díla v objemu prací vyšším než **20 %** celkového rozsahu díla (v poměru k celkovým nákladům díla).
- 6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do **7 dnů** po ukončení díla **vyklidit staveniště** a veškeré dotčené okolní plochy a objekty uvést do původního stavu.
- 6.8 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla, uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc).
- Minimální pojistné plnění související s výkonem podnikatelské činnosti je 5 000 000,-Kč. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu provádění díla.
- 6.9 Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit informační tabuli s identifikačními údaji stavby (*Příloha č.5*), (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora a koordinátorovi BOZP) dle vzoru předaného objednatel. Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady. Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění předem projednat s objednatel. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo výměnu tabule. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.
- 6.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami apod.), zákona č. 435/2004 Sb.,

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), vůči všem osobám, které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to, zda jsou práce předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jeho zaměstnanci i osobami vykonávající práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně spravedlivého a rovného odměňování v práci a vyloučení diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

- 6.11 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění stavebních prací učiní opatření, která jsou nezbytná k ochraně životního prostředí. Zhotovitel se tedy zavazuje zejména zabránit nadměrnému znečišťování ovzduší a půdy imisemi pocházejícími z výstavby; není-li možné imisím zabránit, Zhotovitel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k jejich eliminaci. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

7 ZMĚNY DÍLA

- 7.1 **Veškeré** změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- 7.2 **Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:

- 7.2.1 **neprovedení dohodnutých stavebních prací**, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
7.2.2 **provedení dodatečných stavebních prací**, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
7.2.3 **požadavků správců** technické infrastruktury,
7.2.4 **zlepšení efektivity**, hospodárnosti a účelnosti **budoucího provozu** díla.

- 7.3 **Pokud** objednatel právo na změnu díla uplatní, **je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit** a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity stanovené zejména v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak.

- 7.4 **Pokud** objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 3. (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně **návrh Změnového listu** nejpozději na nejbližším KD k projednání.

7.5 Změnový list (Příloha č. 3).

- 7.5.1 **Před vlastním provedením** musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována v návrhu Změnového listu a ten **odsouhlasen** technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem projektanta.
7.5.2 **Návrh** změnového listu bude **zpracován dle vzoru** předaného zhotoviteli (Příloha č. 3). Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla **odpovídá zhotovitel**.
7.5.3 Změnové listy budou **odsouhlaseny** objednatel **formou schválení dodatku ke smlouvě**. Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení objednatel.

- 7.5.4 **Ocenění** víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno **s použitím položkových cen** položkových rozpočtů (*Příloha č. 1*).
- 7.5.5 **Soupis** prací **jednoho** stavebního nebo inženýrského **objektu**, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat **pouze na jednu cenovou soustavu** pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci.
- 7.5.6 Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta **individuální kalkulace**.
- 7.5.7 K hlavním rozpočtovým nákladům **není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku** na podíl vedlejších rozpočtových nákladů VRN, koordinační činnost a jiné přírážky. K celkovým nákladům pak bude dopočtena **DPH** podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění

8 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.1 Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o **předání díla zápis**, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
- 8.2 Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné **vady a nedodělky**, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách.
- 8.3 Převzetím díla přechází na objednatele **vlastnické právo** k dílu.

9 REKLAMACE

9.1 Postup při reklamaci:

- 9.2 Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje **do 7 dnů** od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.
- Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky
 - datum zjištění vady
 - rozsah vady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách“, které **nemají podstatný** vliv na funkci dokončeného díla, **zahájí do 15 dnů** od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady **odstraní do 30 dnů** od obdržení písemného oznámení reklamace. U reklamace, která **má „podstatný vliv“** na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady **odstraní do 15 dnů** od obdržení písemného oznámení reklamace. Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

- 9.3 I když, **reklamace nebude oprávněná**, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena

za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.

- 9.4 Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu.

10 ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 10.1 Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **60 měsíců** od data řádného předání stavby objednateli.
- 10.2 Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli, s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo záruční dobu jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená jejich výrobcem nebo dodavatelem, **minimálně však 24 měsíců** ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů.
- 10.3 Zhotovitel obdobně odpovídá za jakékoliv **právní vady díla**, jimiž je dílo postiženo v době jeho předání anebo jimiž bude postiženo v době po předání díla z důvodu zavinění zhotovitele.

11 SMLUVNÍ POKUTA

- 11.1 V případě **prodlení** s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 11.2 V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši **0,1%** z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.3 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a **vyčištění staveniště** (odst. 6.8.) zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 11.4 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k **odstranění vady** uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 11.5 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k **odstranění vady** uplatněné objednatel v **záruční době**, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 11.6 Za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z čl. 6.6, 6.7, 6.10 a 6.11 má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **50 000,- Kč** za každé jednotlivé porušení.
- 11.7 Zhotovitel se zavazuje, že v případě **porušení jakéhokoli jiného svého závazku** plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,-Kč** za každé porušení svých závazků či povinností.
- 11.8 V případě, že závazek provést dílo **zanikne před řádným ukončením** díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu.
- 11.9 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevyklučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.

- 11.10 Smluvní pokuty je objednatel **oprávněn započíst** proti jakékoli pohledávce zhotovitele.
- 11.11 Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena přímo na účet správce daně v režimu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.
- 11.12 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem (viz § 106a zákona č. 235/2004 Sb.), tuto skutečnost městu Hodonín nahlásí nejpozději následující den po dni kdy rozhodnutí, na základě, kterého se stal nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit veškerou škodu, kterou tímto městu Hodonín způsobil a smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

12 JINÁ UJEDNÁNÍ

- 12.1 Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou **písemný dodatek** smlouvy. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě ani dodatku sjednány, platí, že je provádí **na svůj náklad**.
- 12.2 Podstatné náležitosti smlouvy mohou být měněny pouze **písemnými dodatky**, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
- 12.3 Smlouva je uzavřena podpisem druhé smluvní strany a **nabývá účinnosti** dnem zveřejněním v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra. Smlouva je vyhotovena ve **4 výtiscích** s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
- 12.4 Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.
- 12.5 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.6 Smlouva bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

13 PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Hodonín (www.hodonin.eu). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených ve smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Hodonín má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

- Příloha č. 1** Položkový rozpočet stavebních prací vypracovaný na základě soupisu prací VZ
Příloha č. 2 Časový harmonogram postupu stavebních prací
Příloha č. 3 Změnový list (vzor)
Příloha č. 4 Informační tabule (vzor)

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města:

Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení:

21.8.2021, č. 0. 4599

V Hodoníně dne: 13. 9. 2021

Ob

...
Lit

V Hodoníně. dne 7. 9. 2021 .

Zhotovitel:


Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín a
Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel
- oba na základě plné moci

„Hodonín – opravy asfaltových vrstev MK 2021“
Rekapitulace stavebních objektů

Název objektu

Cena za objekt bez DPH v Kč

Hodonín, rekonstrukce asfaltových vrstev MK Výhon - střední cesta	565 005 Kč
Hodonín, rekonstrukce asfaltových vrstev MK Písečné	1 898 723 Kč
Ošetření spár - 2000 bm	339 800 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	72 010 Kč
Cena celkem bez DPH:	2 875 537 Kč
DPH 21%:	603 863 Kč
Cena celkem vč. DPH 21%:	3 479 400 Kč



Hodonín, rekonstrukce asfaltových vrstev MK Výhon - střední cesta

Investor: Město Hodonín

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem	
1 Zemní práce						
1	113154254	Frézování živičného krytu tl 80 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	415,00	M2		
					Zemní práce Celkem :	26 145,00
5 Komunikace						
2	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	830,00	M2		
3	572131311	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů živičnou směsí pro asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) tl do 20 r	1 015,00	M2		
4	576115123	Asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) tl 25 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	1 015,00	M2		
5	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO I1 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	415,00	M2		
6	577123121	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 30 mm	415,00	M2		
7	58920	Vyplnění spár živičnou záplivkou	38,00	M		
					Komunikace Celkem :	418 464,20
9 Ostatní konstrukce a práce						
8	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnici záplivku v živičném krytu	38,00	M		
9	938909331	Čištění vozovek metením podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	415,00	M2		
10	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	78,35	T		
11	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	235,06	T		
12	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce	78,35	T		
13	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	186,15	T		
14	MTŽ	Výšková úprava UV a poklopů vstupu a armatur	18,00	ks		
15	VRN	Přechodné dopravní značení	1,00	kpl		
					Ostatní konstrukce a práce Celkem :	120 395,47

STAVBA CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Celková cena bez DPH:	565 005 Kč
	21,00	118 651 Kč	Celková cena s DPH:	683 656 Kč



Hodonín, rekonstrukce asfaltových vrstev MK Písečné

Investor: Město Hodonín

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1 Zemní práce					
1	113154254 Frézování živiceho krytu tl 80 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	3 280,00	M2		
				Zemní práce Celkem :	206 640,00
5 Komunikace					
4	573231111 Postřik živiceho spojovací ze silnicni emulze v mnozství do 0,7 kg/m2	6 560,00	M2		
5	577144121 Asfaltovy beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	3 280,00	M2		
4	577123121 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 30 mm	3 280,00	M2		
7	58920 Vyplnění spár živiceho zálivkou	42,00	M		
				Komunikace Celkem :	1 457 697,80
9 Ostatní konstrukce a práce					
8	919112223 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnici zálivkou v živiceho krytu	42,00	M		
10	938909331 Čištění vozovek metením podkladu nebo krytu betonového nebo živiceho	3 280,00	M2		
11	997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	619,26	T		
12	997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	1 857,79	T		
13	997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce	619,26	T		
14	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiceho	619,26	T		
18	VRN Přechodné dopravní značení	1,00	kpl		
				Ostatní konstrukce a práce Celkem :	234 384,74

STAVBA CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Celková cena bez DPH:	1 898 723 Kč
	21,00	398 732 Kč	Celková cena s DPH:	2 297 454 Kč



Ošetření spár - 2000 bm

Investor: Město Hodonín

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem		
5	Komunikace (aspe)						
1	58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	2 000,00	M				
					Komunika		
9	Ostatní konstrukce a práce (aspe)						
2	919112223 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	2 000,00	M				
					Ostatní konstrukce a pr		
STAVBA CELKEM				Sazba DPH	DPH celkem	Celková cena bez DPH:	339 800 Kč
				21,00	71 358 Kč	Celková cena s DPH:	411 158 Kč

Vedlejší a ostatní náklady

Investor: Město Hodonín

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
Vedlejší náklady					
1	Zařízení staveniště	1,00	soubor		
2	Koordinanční činnost	1,00	soubor		
3	Zajištění BOZP na staveništi	1,00	soubor		
Ostatní náklady					
4	Průzkumné práce	1,00	soubor		
5	Zajištění zkoušek	1,00	soubor		
6	Zeměměřičské práce při výstavbě - nivelace	1,00	soubor		
VN a ON Celkem :					72 010,00

STAVBA CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Celková cena bez DPH:	72 010 Kč
	21,00	15 122 Kč	Celková cena s DPH:	87 132 Kč

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Hodonín – opravy živičných krytů MK 2021“

Délka realizace stavebních prací: 30 kal. dnů

Popis prací	1. měsíc							
	1. týden		2. týden		3. týden		4. týden	
MK Výhon - střední cesta	■	■	■					
MK Písečné				■	■	■	■	
Ošetření spár								■
VON - Vedlejší a ostatní náklady	■	■	■	■	■	■	■	■

V Hodoníně, dne 10. 8. 2021

.....
Ing. Tomáš Hrabina
ředitel oblasti Hodonín

.....
Ing. Jiří Stukavec
výrobně-technický ředitel

Název akce:
„Hodonín – opravy živičných krytů MK 2021“

Z M Ě Ň O V Ý L I S T

číslo: **ZL č. XX**
„(doplnit název změnového listu)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.:

1. **Oddíl stavby:** *(Stavební objekt, Provozní soubor)*

2. **Zpracovatel změnového listu:** *(zhotovitel stavby)*

3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1 stavební deník: *(SD č. xx, strana č. xx, datum xx.xx.xxxx)*
 - 3.2 kontrolní den: *(KD č. xx, ze dne xx.xx.xxxx)*
 - 3.3 jiné související dokumenty: *(dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele apod.)*

4. **Zdůvodnění a příčina změny:**
(Podrobný popis příčiny změny.)

5. **Návrh technického řešení a rozsah změny**
(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)

6. **Finanční náklady změny**
(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	0,00	0,00
MĚNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	0,00	0,00

V dne

.....
(jméno, podpis zhotovitele)

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení **kontroly výkazu výměr** a nacenění víceprací dle podmínek SOD

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ
- Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd)
- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím
- stanovisky dotčených orgánů
- podmínkami dotačního programu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- Úprava harmonogramu stavby
- Dodatek IZ
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
- Dodatek Smlouvy o dílo
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS (ne)doporučuje ZL č. XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) (ne)doporučuje ZL.XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).

- a) V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.
- b) Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

FI:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150:

Dotace EU/SR:

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V dne

.....
(jméno, podpis)

VEDOUcí ODBORU :

V dne

.....
(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

V dne

.....
(jméno, podpis)

10. Přílohy ke změnovému listu:

- | | |
|--------------|--|
| Příloha č. 1 | Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce |
| Příloha č. 2 | položkový rozpočet |
| Příloha č. 3 | fotodokumentace |
| Příloha č. | xxx další přílohy dle odst. 3.3. |

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka:

Změnový list č.	Název Změnového listu	celková částka
Rozpis částky na roky:	2016	
	2017	
	2018	

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

příkazce operace:	datum:	jméno:	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis:

TABULE PRO OZNAČENÍ STAVEB

SPECIFIKACE BANNERU

Banner (autoplachta) velikosti 3x2 m se zahnutím.
Pokud není možno umístit banner této velikosti,
rozměr konzultujte s odpovědnou osobou.
Umístění ok na banneru po 1 m nebo po 50 cm,
Oka jsou naznačena žlutou barvou.

V případě, že by označení stavby mělo být umístěno
v interiéru, nahraďte banner komatexovou deskou 5 mm.



BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Logo vycentrováno na střed

Písmo zarovnáno k druhé
nožičce písmene „H“

Velikost písma 230 b
Helvetica Neue Light
zarovnáno s písmenem „H“

H MĚSTO
HODONÍN

Místo, kde chceme žít...

Text vycentrován
na střed daného
prostoru s fotografií
nebo jen s textovým
polem

Velikost písma 130 b
Helvetica Neue
černé písmo Light
barevné písmo Bold

Stavba: **REVITALIZACE panelového sídliště Hodonín,
Vančurova, 2. část, III. etapa**
Termín výstavby: **03/2019 – 07/2019**
Investor: **Město Hodonín**
Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s., Praha**
Náklady: **17 000 000 Kč**
Projektant: **PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín**
Technický dozor: **[REDAKOVANÉ]**

1020 mm

Velikost písma 160 b
Helvetica Neue
kombinace Light / Bold
webová stránka vycentrována na
střed prostoru pod čarou

www.hodonin.eu

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Logo vycentrováno na střed

Písmo zarovnáno k druhé
nožičce písmene „H“

Velikost písma 230 b
Helvetica Neue Light
zarovnáno s písmenem „H“

MĚSTO
HODONÍN

Místo, kde chceme žít...

Obrázky dle zaslaných podkladů
a důležitosti k danému projektu.
Doporučeno 2 - 5 fotografií
dle dodaných materiálů.
Rozlišení 300 dpi.

Text vycentrován
na střed daného
prostoru s fotografií
nebo jen s textovým
polem

Velikost písma 130 b
Helvetica Neue
černé písmo Light
barevné písmo Bold

Stavba:	PROVOZNÍ BUDOVA ZOO
Termín výstavby:	04/2019 – 05/2020
Investor:	Město Hodonín
Zhotovitel:	MSO servis, s.r.o., Kyjov
Náklady:	28 800 000 Kč
Projektant:	PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín
Technický dozor:	██████████

Velikost písma 160 b
Helvetica Neue
kombinace Light / Bold
webová stránka vycentrována na
střed prostoru pod čarou


www.hodonin.eu

440 mm

580 mm

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 2 fotografií

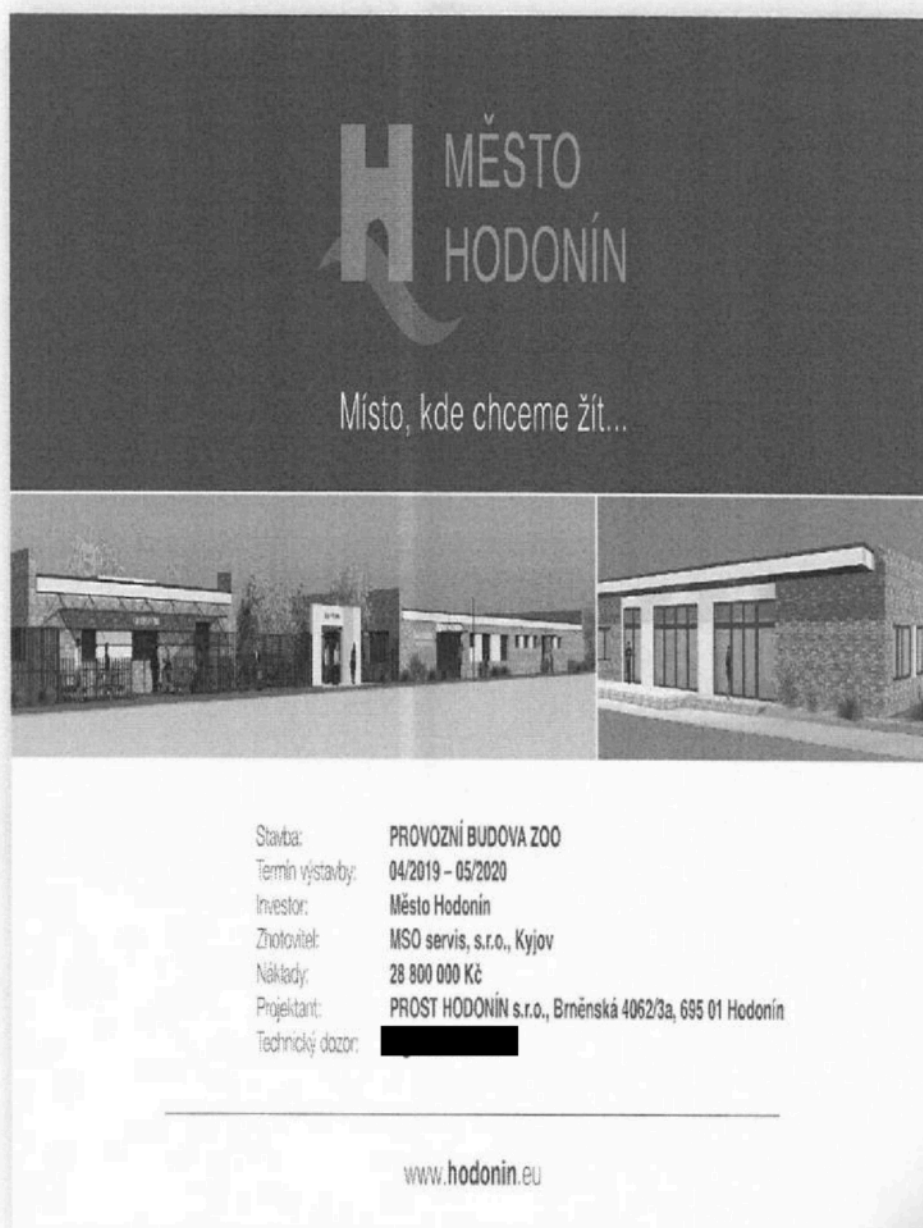

H MĚSTO
HODONÍN

Místo, kde chceme žít...

Stavba: PROVOZNÍ BUDOVA ZOO
Termín výstavby: 04/2019 – 05/2020
Investor: Město Hodonín
Zhotovitel: MSO servis, s.r.o., Kyjov
Náklady: 28 800 000 Kč
Projektant: PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín
Technický dozor: [REDACTED]

www.hodonin.eu

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 3 fotografií

H MĚSTO
HODONÍN

Místo, kde chceme žít...




Stavba:	PROVOZNÍ BUDOVA ZOO
Termín výstavby:	04/2019 – 05/2020
Investor:	Město Hodonín
Zhotovitel:	MSO servis, s.r.o., Kyjov
Náklady:	28 800 000 Kč
Projektant:	PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín
Technický dozor:	██████████

www.hodonin.eu

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 5 fotografií

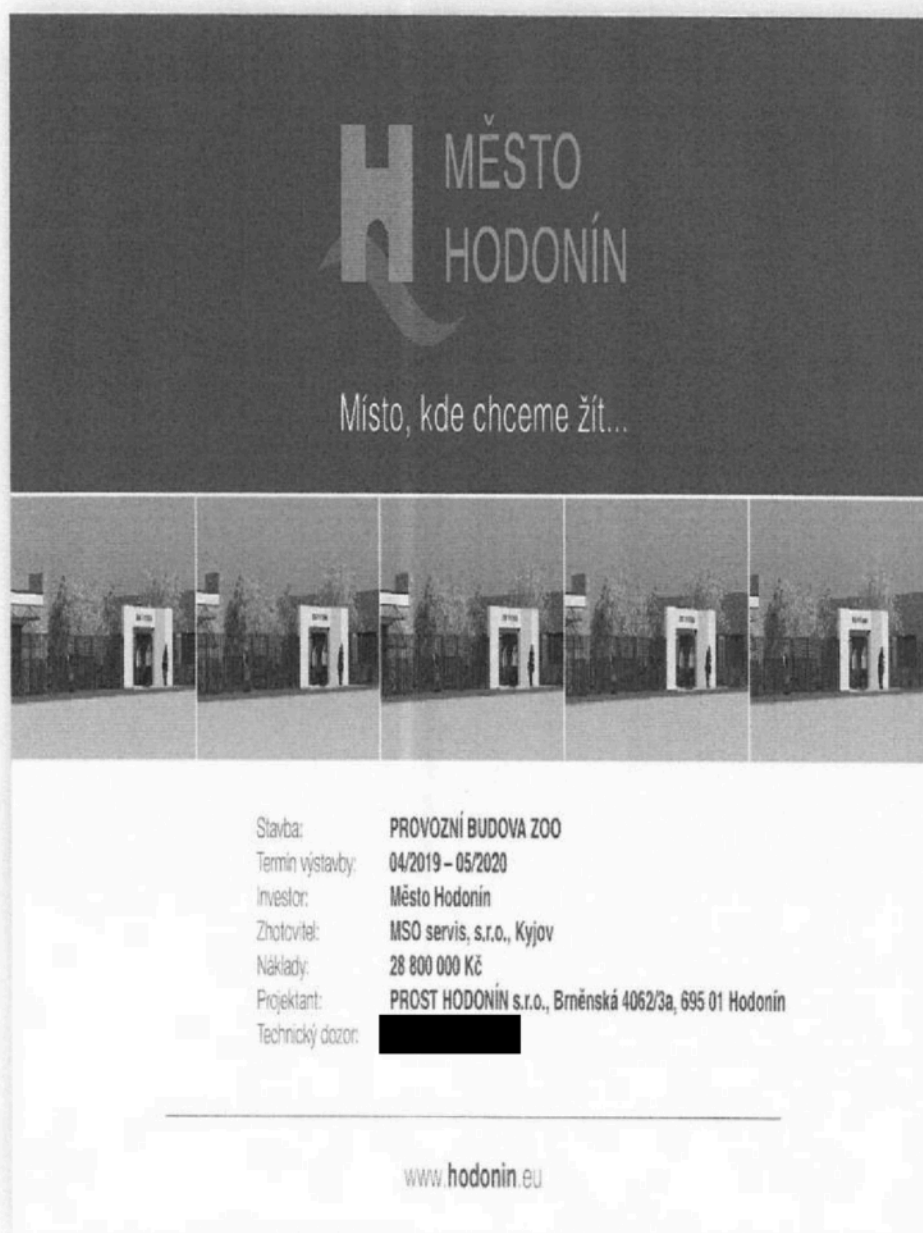

H MĚSTO
HODONÍN

Místo, kde chceme žít...

Stavba: PROVOZNÍ BUDOVA ZOO
Termín výstavby: 04/2019 – 05/2020
Investor: Město Hodonín
Zhotovitel: MSO servis, s.r.o., Kyjov
Náklady: 28 800 000 Kč
Projektant: PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín
Technický dozor: [REDACTED]

www.hodonin.eu
