
**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. PN 2021_0054**

mezi

CETIN a.s.

a

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková
organizace**

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

ID DS: qa7425t

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená Jiřím Valešem, supervizorem, Výstavba PPS Čechy

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „**CETIN**“)

a

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

IČO: 72053119

DIČ: CZ72053119

ID DS: qbep485

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp.zn. Pr 737

zastoupená Ing. Miroslavem Doležalem, generálním ředitelem

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

Překládka je stavba v k.ú. Vejprnice spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v Projektu;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování Projektu, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě

spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 14.09.2021 vydané pod čj. 767077/21, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Vejprnice_ Plzeňská SO 401**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v Projektu.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky,
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá

společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

(i) zajistit zpracování Projektu;

(b) po realizaci Překládky:

(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;

(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem a předat tento geometrický plán Stavebníkovi.

4.2 Stavebník se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

(i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;

(ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však tři (3) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

(iii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy a tyto smlouvy předat před zahájením prací společnosti CETIN.

(b) po realizaci Překládky:

(i) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí a předání dokladu o vkladu do katastru nemovitostí společnosti CETIN.

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti z rozhodnutí Městského úřadu Nýřany - o schválení stavebního záměru stavby Vejprnice, dopravní ostrůvek na silnici II/203 a chodník do obce Vejprnice Brůdek, č.j. OD-Fro/6855/2020 – R ze dne 15.4.2021, které nabylo právní moci dne 26.5.2021 (dále jen „Stavební záměr“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek ve Stavebním záměru stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou ve Stavebním záměru výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Stavební záměr je Přílohou č. 2 Smlouvy.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do pěti (5) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;

(b) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy;

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených

nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu činí ke dni uzavření Smlouvy **420 153,00 Kč**, (slovy: čtyři sta dvacet tisíc jedno sto padesát tři korun českých) (dále jen „**Náklady překládky stanovené na základě Projektu**“). Specifikace těchto nákladů je uvedena v Projektu.
- 5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení

- vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
 - (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
 - (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
 - (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
 - (f) náklady na identifikaci parcel,
 - (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
 - (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
 - (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
 - (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
 - (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
 - (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
 - (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě daňového dokladu (dále jen „**Faktura**“). Faktura bude společností CETIN vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.
- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.

6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

funkce: specialista pro výstavbu sítě

tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

funkce: specialista pro výstavbu sítě

tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

funkce: Vedoucí technik přípravy a realizace staveb PS

tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických [REDACTED]

funkce: Vedoucí technik přípravy a realizace staveb PS

tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.

9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.

9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.

- 9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marré uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společností CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- (a) v listinné podobě;
- (b) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zaručený elektronický podpis**“);
- (c) e-mailovou zprávou opatřenou Zaručeným elektronickým podpisem;
- (d) e-mailovou zprávou zaslou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.7, věty první Smlouvy a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmeny (c) a (d).

12.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.

12.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů.

Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

- 12.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
- 12.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.10 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoliv svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.11 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.12 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.13 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).
- Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho

prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.14 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.

12.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - Projekt

Příloha č. 2 - Rozhodnutí Městského úřadu Nýřany - o schválení stavebního záměru stavby č.j. OD-Fro/6855/2020 – R ze dne 15.4.2021

CETIN


Stavebník

V Praze dne

V Plzni dne

CETIN a.s.
Jiří Valeš
supervizor, Výstavba PPS Čechy

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel

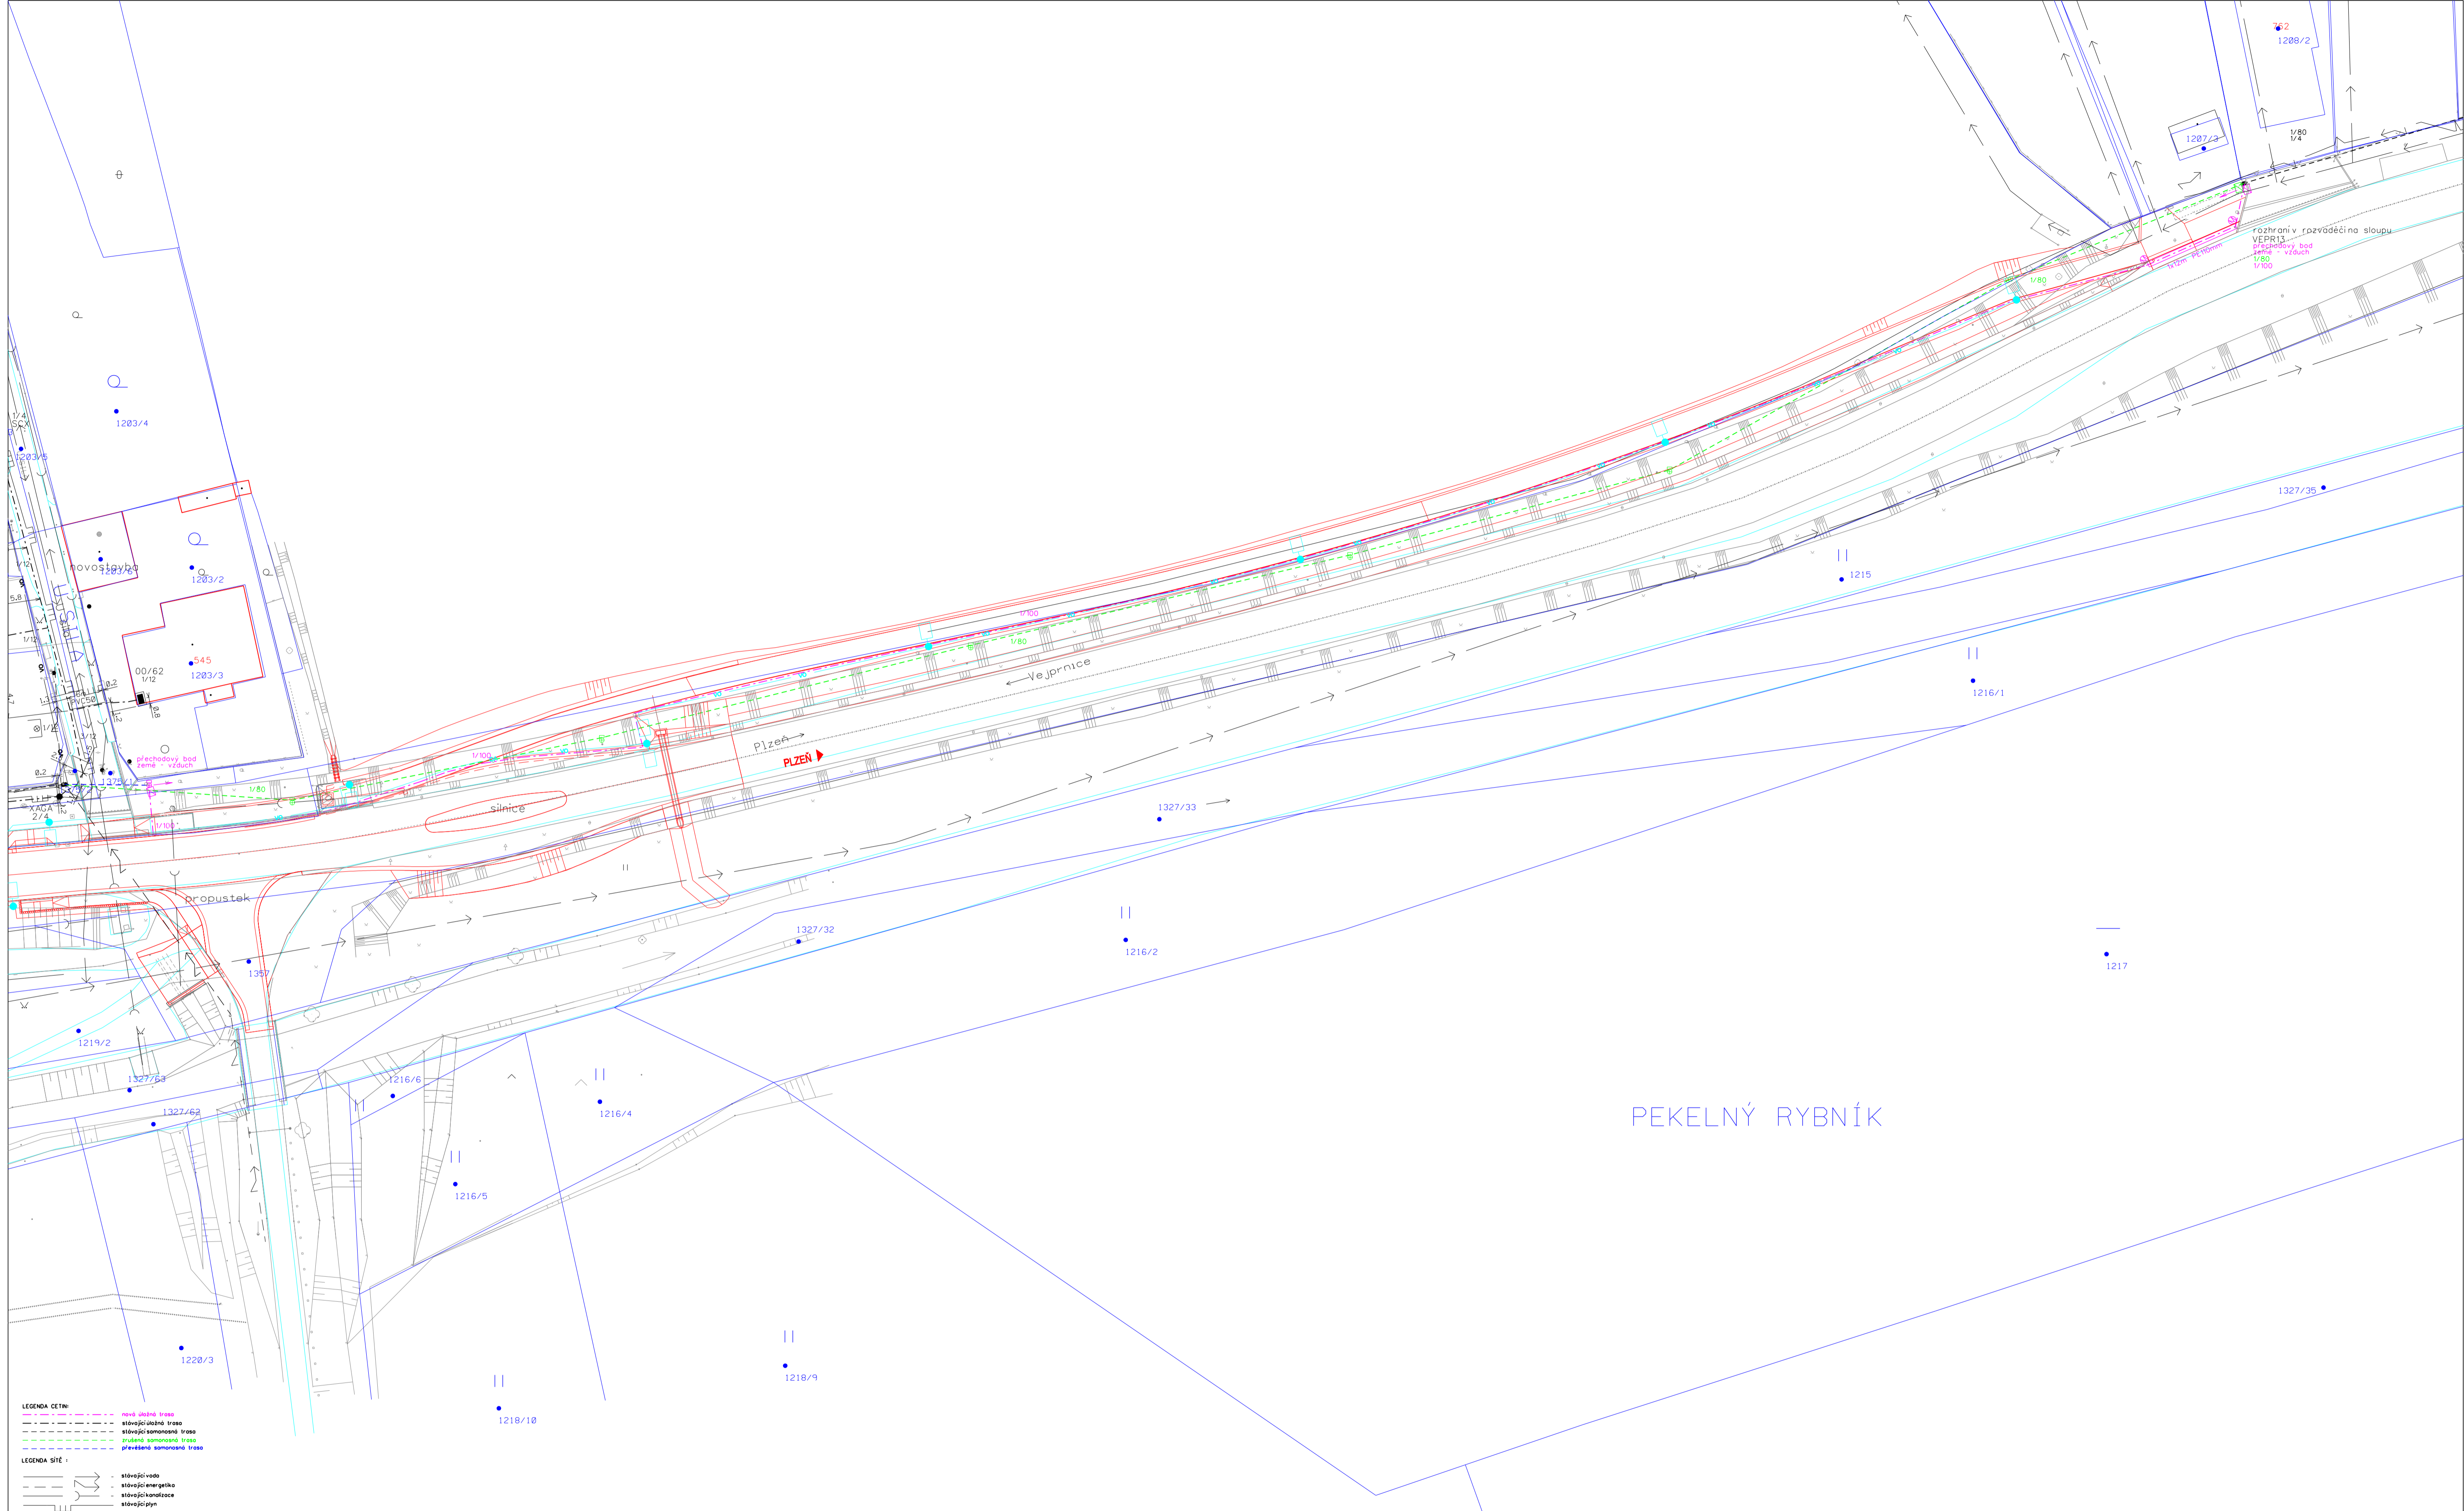


- LEGENDA ČETNÍ**
- nová sdělovací trasa
 - stávající sdělovací trasa
 - stávající samonosná trasa
 - zrušená samonosná trasa
 - přestavěná samonosná trasa
- LEGENDA SÍTĚ**
- stávající voda
 - stávající energetika
 - stávající kanalizace
 - stávající
 - nová trasa VO


Souřadný systém S-JTSK
Výškový systém B.p.v.

Generální projektant: Woring s.r.o. Na Roudné 1604/93 301 00 Plzeň tel.: +420 371 141 150 e-mail: info@woring.cz	Hlavní inženýr projektu: Ing. J. Biřary
--	---

VYPRACOVAL A. Procházka	PROJEKTANT A. Procházka	KONTROLOVAL Ing. L. Bláha	Watcom s.r.o. Pod Žalovkem 279/11 152 00 Praha 5 IČ: 27206175 DIČ: CZ02700175 tel: +420 731194527 enprochazka@watcom.cz
OBEC, KRAJ: Vejprnice, Plzeňský kraj			STUPEŇ PD DUR, DSP
OBJEDNATEL: OÚ Vejprnice, Mírová 17, Vejprnice			DATUM 08.2018
AKCE: VEJPRNICE, CHODNÍK DO OBCE VEJPRNICE - BRÚDEK			ČÍSLO ZAKÁZKY 18W22 015
OBSAH: SO 401 Přeložka sdělovacích kabelů Polohopisný výkres			MĚŘÍTKO 1:400
			ČÍSLO PŘÍLOHY PARE ČÍSLO
			1

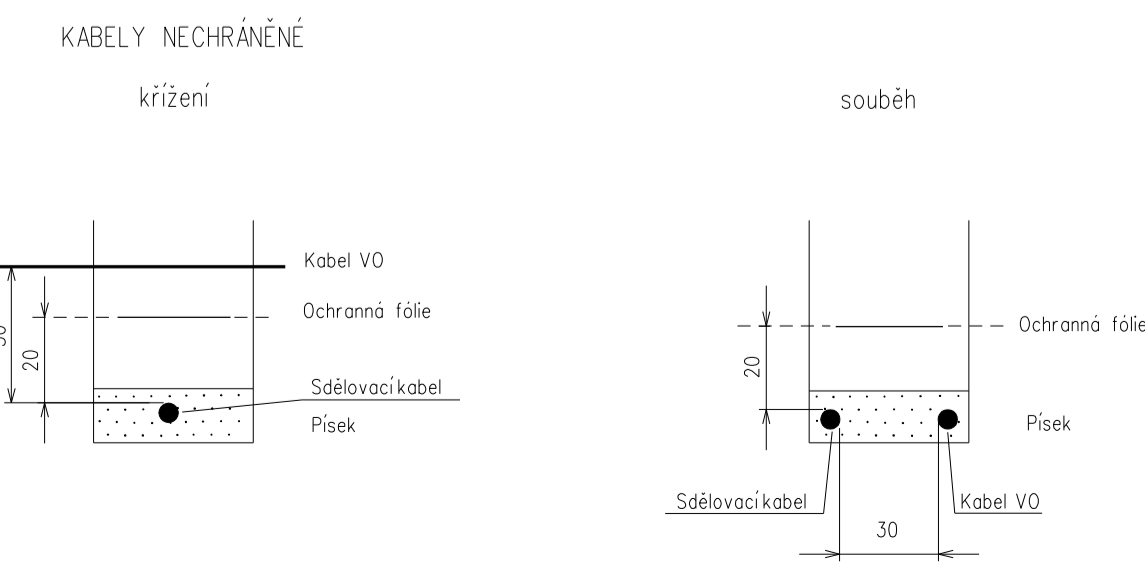

Přechodový bod
 země - vzduch
 zprůměrně v rozvaděči na sloupě
 VEPRNICE
 výška nad m. n. m. 2001
 246,16 m
 původní stav
 vzhledem k výškovým
 rozdílům 1:1 kř. VEPRNICE na stavě
 výškové

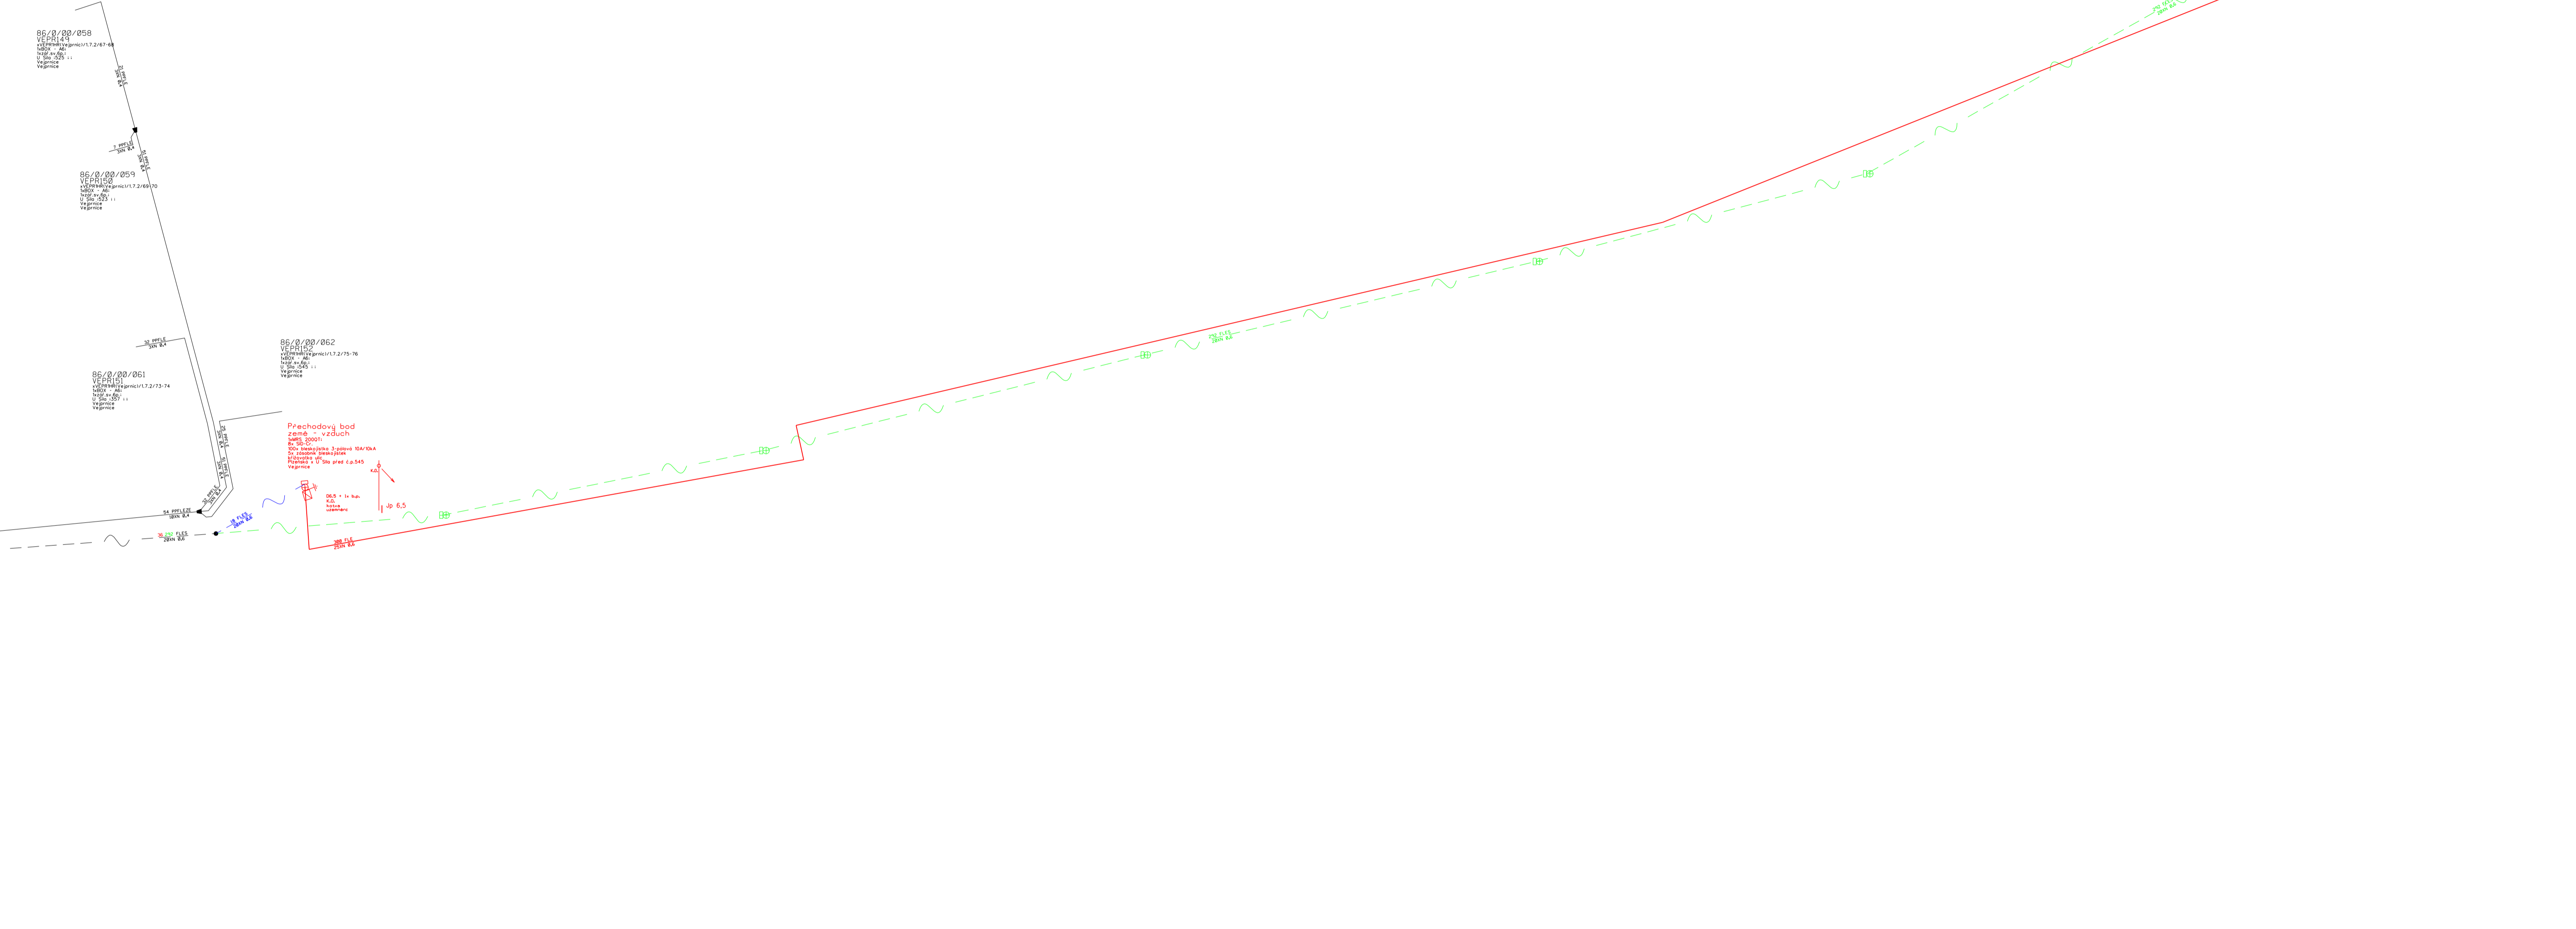

LEGENDA:
 ————— nová kabelná trasa
 ————— stávající kabelná trasa
 - - - - - zrušené trasy s odpovídajícími šestičárkami
 ————— stávající šestičárky

Souřadný systém S-JTSK
 Výškový systém B.p.v.

Generální projektant: **Woring**
 Na Roudné 1604/53
 301 00 Pízeň
 tel.: +420 371 141 150
 e-mail: info@woring.cz

Hlavní inženýr projektu:
 Ing. J. Bihary

VYPRACOVAL	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	Watecom s.r.o. Pod Žvahovem 279/11 152 00 Praha 5 IČO: 27200175 DIČ: CZ27200175 Tel: +420 73194527 antprochacka@seznam.cz	
A. Procházka	A. Procházka	Ing. L. Bláha		
OBEC, KRAJ: Vejprnice, Plzeňský kraj			STUPEŇ PD	DUR, DSP
OBJEDNATEL: OÚ Vojmice, Mírová 17, Vojmice			DATUM	08.2018
AKCE: VEJPRNICE, CHODNÍK DO OBCE VEJPRNICE - BRŮDEK			ČÍSLO ZAKÁZKY	18W22 015
OBSAH: SO 401 Přeložka sdělovacích kabelů Schematický výkres			MĚŘÍTKO	
			ČÍSLO PŘÍLOHY	PARÉ ČÍSLO
			2	

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-STAND. - 2021.08

Položková d: 2021.08

Název stavby: VPIC Vejprnice, Plzeňská SO 401
 Číslo SPP prvku:
 Zhotovitel PD: Watecom s.r.o.
 KPO:
 HOST:
 VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.300	KMP:	15.000	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.300	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	49 760,46 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	140 589,76 Kč
MONTÁŽ	83 368,51 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	11 164,81 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	21 345,49 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	113 924,04 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: **420 153 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST	359 227,80 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	60 925,27 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
953646		Autorský dozor pro výstavbu, opravy sítě	9920.00 JV	9 920,00 Kč
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks	12 560,46 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	27280.00 JV	27 280,00 Kč
	projekt			
ZEMNÍ PRÁCE				

954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	312.00 m	5 890,56 Kč	
952265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové výkop spojkošť	24800.00 JV	24 800,00 Kč	
951549 S	Přesun lávky přechodové z ocelové desky	1.00 ks	37,77 Kč	
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100	300.00 m	105 777,00 Kč	
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	350.00 m	3 958,50 Kč	
951349 S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	1.00 ks	125,93 Kč	
MONTÁŽ				
955018 S	Demontáž jednod.patkov.stož.se vzpěrou	1.00 ks	2 542,67 Kč	
955017 S	Demontáž jednoduch. patkovaného stožáru	5.00 ks	9 971,25 Kč	
955016 S	Demontáž samonos. kabelů nad 5 XN	286.00 m	10 436,14 Kč	
955078 S	Demontáž spojky hrncové	1.00 ks	390,37 Kč	
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	5.00 ks	818,50 Kč	
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	38.00 ks	1 435,26 Kč	
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	38.00 ks	956,84 Kč	
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	5.00 ks	440,70 Kč	
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	5.00 ks	818,50 Kč	
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	25.00 ks	787,00 Kč	
954984 S	Montáž kotvy na stávající stožár	1.00 ks	952,29 Kč	
955296 S	Montáž rozvaděče sloupového	2.00 ks	2 171,06 Kč	
955281 S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	1.00 ks	1 196,30 Kč	
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	300.00 m	7 941,00 Kč	
955303 S	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	2.00 ks	2 296,98 Kč	
953167 S	Pronájem stavebního stroje - použití mechanizace-Montá:	16.00 hod.	11 533,92 Kč	
953167 S	Pronájem stavebního stroje - použití mechanizace-Náklad	16.00 hod.	12 099,04 Kč	
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	81.00 ks	2 039,58 Kč	
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	5.00 ks	1 825,90 Kč	
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV	3 720,00 Kč	
954987 S	Vystrojení jednod.patkov.stož.s kotvou	2.00 ks	6 219,70 Kč	
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 775,51 Kč	
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA				
956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km	300.00 m	5 511,00 Kč	
956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	5 653,81 Kč	
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE				
955199 S	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	3.00 ks	8 056,68 Kč	
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	300.00 m	7 635,00 Kč	
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	5 653,81 Kč	
Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
306577 S	Bleskojistka třípólová 230V 10A/10kA		200.00 ks	9 470,00 Kč
305463 S	Deska kotevní 40x25x5 cm s otvorem		3.00 ks	753,57 Kč
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		300.00 ks	11 406,00 Kč
305745 S	Drát ocelový pozink. D 1,8 mm		1.00 kg	63,82 Kč
305833 S	Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m		10.00 kg	583,90 Kč
305789 S	Drát ocelový pozink. D 4,0 mm		0.60 kg	38,29 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		300.00 m	1 326,00 Kč
303777 S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá		700.00 m	1 603,00 Kč
300120 S	Kabel plastový TCEPKPFL 25x4x0,6		300.00 m	37 911,00 Kč
307657 S	Kryt plechový 2000 mm typ B		2.00 ks	309,58 Kč
306358 S	Lano ocelové 42x1 mm Zn130 1kg=3,23m		6.70 kg	1 118,97 Kč
306610 S	Matice napínače M 16 ČSN 021682		3.00 ks	156,84 Kč
302532 S	Mini Marker 1255 80-6102-2191-5		1.00 ks	230,82 Kč
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball		2.00 ks	407,32 Kč

312425 S	Modul konektor. 9700-10P	5.00 ks	115,30 Kč
306745 S	Napínač šroubový oko-oko M 16	2.00 ks	213,18 Kč
307247 S	Objímka kotevní D 140 mm	2.00 ks	184,66 Kč
309698 S	Očnice kovová FeZn pro lano 10mm	5.00 ks	339,45 Kč
309931 S	Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m	50.00 kg	2 648,00 Kč
305506 S	Patka stožárová EZP 16x20x290 cm	1.00 ks	1 642,86 Kč
308707 S	Sběrnice zemnicí 6-ti pólová	2.00 ks	80,76 Kč
306364 S	Skříň rozváděče MRS 200-QT 200p-na sloup	2.00 ks	27 347,40 Kč
301331 S	Sloup dřevěný 6,5m-impregnace Korasit CK	1.00 ks	1 538,31 Kč
407578 S	Souprava čistící 4413L	1.00 ks	638,68 Kč
312863 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLE CZ	1.00 ks	516,23 Kč
303501 S	Spojka plastová 110/94 mm	1.00 ks	36,66 Kč
303527 S	Spojka plastová 50/40 mm	6.00 ks	130,38 Kč
307033 S	Svorka lanová D 9-12 mm	16.00 ks	259,84 Kč
309974 S	Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm	2.00 ks	76,04 Kč
310020 S	Svorka zemnicí ZS 16 A	2.00 ks	61,10 Kč
309380 S	Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400	17.00 ks	2 041,70 Kč
306789 S	Svorník M 16x1520x85x85 FeZn	3.00 ks	468,42 Kč
306843 S	Svorník M 20x410x90x25	4.00 ks	195,52 Kč
306457 S	Šroub s okem M 16 x 140 ČSN021371	3.00 ks	122,22 Kč
302672 S	Trubka PE 110/6,3/6000mm	2.00 ks	1 564,12 Kč
302361 S	Trubka vrapovaná 50/40 s lankem	300.00 m	5 256,00 Kč
302885 S	Vodič propoj.autokonektor C4 10114-C4L50	2.00 ks	199,82 Kč
316266 S	Zámek skříňe 1370 L2 Jih-24313	2.00 ks	222,68 Kč
302289 S	Zásobník blesk. SID-C 3 pól. 79126-51000	10.00 ks	2 645,60 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
401646 S	Matice šestihřanná M 16,0 ČSN 021601	7.00 ks	0,00 Kč
401706 S	Matice šestihřanná M 20,0 ČSN 021601	8.00 ks	0,00 Kč
304267 S	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	4.00 ks	0,00 Kč
403175 S	Pěna montážní Soudal 300ml	2.00 ks	0,00 Kč
404063 S	Podložka D 17 mm ČSN 021702	7.00 ks	0,00 Kč
404231 S	Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M20	10.00 ks	0,00 Kč
408348 S	Šroub s šestihř.hl. M16x45 ČSN021301	4.00 ks	0,00 Kč
314473 S	Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY)	4.00 m	0,00 Kč
402871 S	Vrut s šestihř.hl. 10x80 mm ČSN021810	11.00 ks	0,00 Kč

Městský úřad Nýřany
pracoviště Plzeň, Klatovská 200a Plzeň
adresa pro doručování: Americká 39, 304 66 Plzeň
ODBOR DOPRAVY

VÁŠ DOPIS ZN.: -
ZE DNE: 21.2.2020
VYŘIZUJE: [REDAKCE]
TEL.: [REDAKCE]
FAX: [REDAKCE]
E-MAIL: [REDAKCE]
PODEPISUJE:
FUNKCE:
NAŠE ČJ.: OD-Fro/6855/2020 - R
DATUM: 15.4.2021
POČET LISTŮ/PŘÍLOH:

Obec Vejprnice, IČ: 00258474
Mírová 17, 330 27 VEJPRNICE
a
Plzeňský kraj, prostřednictvím:
Správa a údržba silnic Plzeň. kraje, p.o., IČ: 72053119
Koterovská 462/162, okres Plzeň-sever
326 00 PLZEŇ

**SOUHLASÍ
ORIGINÁLEM**



26.5.2021

ROZHODNUTÍ

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne

Toto rozhodnutí je vykonatelné dne

O SPOLEČNÉM ÚZEMNÍM A STAVEBNÍM ŘÍZENÍ

Městský úřad Nýřany
Odbor dopravy

dne 15.6.2021 podpis [REDAKCE]

Městský úřad Nýřany, odbor dopravy jako silniční správní úřad (*orgán, SSÚ, SSO*) a speciální stavební úřad příslušný podle ust. § 40 odst. 1 a odst. 4 písm. a), ust. § 16 odst. 1 zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění (*PK, ZPK*), a ust. § 15 odst. 1 a § 94j odst.1 zák. č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (*stavební zákon, SZ*), v řízení o žádosti ze dne 21.2.2020 (*doplnění k 03/2021*) **stavebníka** (*investor, žadatel*):

Obec Vejprnice, IČ: 00258474, Mírová 17, 330 27, v zastoupení právnickou osobou (*PO*): **INGEM a.s.**, IČ: 63504006, Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň

a
Plzeňský kraj, prostřednictvím příspěvkové organizace (*p.o.*): **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**, (*SÚSPK p.o.*) IČ: 72053119, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň, okres Plzeň-sever (*P-S*),

podle ust. §§ 94j a násl. SZ, o **vydání společného povolení (SP) stavebního záměru** podle projektové dokumentace (*PD*) ze souboru stavebních objektů (*SO*) **stavby** (*druh, účel, prostorové řešení, rozsah, umístění*):

„Vejprnice, dopravní ostrůvek na silnici II/203 a chodník do obce Vejprnice Brůdek“,
v úseku v celkové délce úprav cca 447 m, takto:

- úpravy na silnici II/203 v dl. cca 169 m: povrch+krajnice cca 65 m (*stanič. v PD 64,4292 m*) a přechod pro chodce (*PPCH*)+ostrůvek cca 104 m (*stanič. v PD 103,92 m*) - motoristická PK f. sk. C s odděleným provozem pěších chodníkem (*nemotoristická PK f. sk. D, podsk. D 2*)
- úpravy a propojení chodníku z obce Vejprnice k obci Vejprnice Brůdek v dl. cca 278 m (*stanič. v PD 278,03 m*), nemotoristická PK f.sk. D podsk. D2

členěné na SO:

- SO 101 Komunikace
- SO 130 Chodníky a místní komunikace (*MK*)
- SO 301 Propustek pod silnicí II/203
- SO 401 Přeložka sdělovacích kabelů
- SO 430 Veřejné osvětlení (*VO*),

umístěné podle PD-DÚR+DSP 08/2018 Ing. Pavel Marek ČKAIT č. 0201690, Ing. Jan Bihary ČKAIT č. 0202301, Ing. Jiří Vavříčka ČKAIT č. 0202300, souhlasu odboru územního plánování (OÚP) a KN, v k.ú. **Vejprnice** na p.p.č.:

LV 565- 1204 orná půda-ZPF, LV 249- 1329/1 ost. plocha/silnice, LV 412- 1327/33 vodní plocha/koryto vodního toku přirozené, LV 673- 1327/63 vodní plocha/koryto vodního toku přirozené, LV 744 /pův. LV 10002/ - 1375/1 ost. plocha/ost. komunikace, LV 10001- 1329/16 ost. plocha/ost. komunikace, **1215** trvalý travní porost-ZPF, **1375/2** ost. plocha/ost. komunikace, **1357** ost. plocha/silnice,

kde dalšími účastníky společného územního a stavebního řízení jsou podle ust. § 94k stavebního zákona vedle stavebníka a obce, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sama stavebníkem, i níže uvedení vlastníci staveb a pozemků, na kterých má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, a ti, kdož mají k těmto pozemkům a stavbám jiné věcné právo – účastníci podle ust. § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., SŘ, a dále vlastníci sousedních staveb nebo pozemků a staveb na nich, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo může být společným povolením přímo dotčeno (*sousední p.p.č. zejm.: 1219/65, 1219/3, 1219/2, 1377/3, 810, 812/1, 813/1, 819/1, 821, 1203/2, 1206/2, 1207/1, 1208/1, 1327/35, k.ú. Vejprnice*),

po posouzení v souladu ust. §§ 94j – 94p stavebního zákona a se souhlasem příslušného správního orgánu ve smyslu ust. § 15 odst. 2 SZ resp. orgánu územního plánování podle ust. § 4 stavebního zákona, a souhlasem příslušného vodoprávního úřadu podle ust. § 17 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění (*vodní zákon*),

rozhodl takto:

Podle ust. § 94p stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejm. ust. § 13a vyhl. č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, vydává společné povolení, kterým se

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r .

Stavba obsahuje:

soubor SO s úpravami veřejného prostoru PK, se všemi součástmi a příslušenstvím, vč. souvrství, konstrukce, stabilizace, opěry, odvodnění, osvětlení vybraných prvků PK, dopravního značení a zařízení (DZZ) vč. dopravního dělicího ostrůvku na silnici II/203 na vjezdu do obce, sadových úprav, dále vč. vstupů, vjezdů/sjezdů, křížení i propojení PK vč. pěších tras, úpravy bezbariérové, úpravy umožňující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (OOSPO), a dále vč. nezbytných úprav stavbou narušených ploch nebo staveb po celém úseku stavby/staveniště, v návaznosti na ostatní PK i sousední stavby, pozemky.

Společné podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba, včetně souvisejících, přípravných, bouracích, odstraňovacích, sanačních apod. prací, bude provedena podle upravené PD (*PD k realizaci, provedení stavby, RDS/PDPS*), ověřené ve stavebním řízení, která je součástí tohoto rozhodnutí, zpracovaná projektovou a inženýrskou kanceláří autorizovaného

projektanta, autorizovanou osobou (AO) pro dopravní stavby (DS): [REDACTED]

Bude realizována návazně, resp. následně a současně v koordinaci se sousedními veřejnými stavbami i zařízeními, veřejnou infrastrukturou v místě vč. komunikací a připojení na ně, i odtokových poměrů, v homogenním provedení jednotlivých objektů podle určeného účelu a funkce v uspořádání uličního veřejného prostoru PK, s tím, že nedojde ke zhoršení současných podmínek a to i z hlediska bezpečnosti všech uživatelů předmětné stavby.

Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Před započítáním stavby musí být rovněž vyřešena majetkoprávní podstata stavby (*staveniště*). V případě každého dotčeného cizího pozemku předmětnou stavbou je stavebník povinen zajistit předem včas pro celou dobu výstavby platné oprávnění k provedení každé potřebné části stavby tak, aby nevznikla překážka pro realizaci ani následně bezpečné trvalé užívání žádného stavebního objektu nebo součásti ze souboru povolovaných staveb.
3. Stavba bude realizována v souladu s ust. §§ 94o, 94p SZ, s platnými technickými i zvláštními předpisy vč. jejich změn, zejm. ČSN 736005, 736110, 736102, 736101, TP 65, 133, 145, TKP 15, SZ, ZPK, zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na PK a o změnách některých zákonů, v platném znění (*ZPPK*), a jejich prováděcími předpisy, vč. vyhl. č. 398/2009 Sb., vyhl. č.104/1997 Sb., vyhl. č.294/2015 Sb., tak, aby stavba nebo její část uváděná do provozu byla samostatně schopná bezpečného trvalého užívání k určenému účelu bez závad.
4. Umístění vpustí vždy mimo pěší trasy vč. hmatných prvků. Ochranná zařízení, sloupy VO a rovněž i pilíře technické infrastruktury apod. budou umístěny v potřebném, nezbytném úseku, mimo dopravní prostor (*DP*) a tak, aby netvořily překážku v provozu, v rozhledech ani ve vjezdech a křižovatkách a současně tak, aby byly odpovídajícím způsobem osvětleny vybrané prvky na PK (*u PPCH osvětlení se zvláštní intenzitou světla*) vč. *DZZ*.

Vjezdy v místech dlážděných chodníkových tras budou zajištěny/zachovány v homogenním provedení chodníkovým přejezdem se zesílenou dlažbou, s protismykovými vlastnostmi, s varovným pásem u snížené silniční obruby vozovky, v parametrech a sklonech odpovídajících podmínkám bezpečného užívání podle skutečného stavu-dopravní obslužnosti konkrétní nemovitosti; v místech, kde to umožní místní a technické podmínky, lze vedle sjezdu resp. na plochách mimo chodníkové trasy užívané osobami s OSPO a mimo dopravní prostor (*DP*) PK zřídit plochu pro parkování osobního vozidla.

Vrata přílehlých sousedních nemovitostí nebudou otevíraná-umístěná do dopravního prostoru PK.

Zeleň-zejména vzrostlá, stromová, keřová, bude zregulována tak, aby nezasahovala do DP PK ani rozhledových trojúhelníků a nezakrývala dopravní značení.

Likvidace dešťových nebo jiných odpadních vod, zejména z okolních nemovitostí, střech, zpevněných nebo jiných ploch, bude zajištěna na pozemku vlastní dotčené nemovitosti nebo svedena-zaústěna do kanalizačního sběrače/systému, tak, aby nevytékala nebo nepodmáčela těleso PK.

5. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby (§152 SZ) se zřetelem na ochranu života a zdraví, životního prostředí, majetku, i šetrnost k sousedství. Práce, příprava, výstavba, dokončování apod. budou prováděny tak, aby nenarušily a nepoškodily sousední objekty a pozemky. Veškeré plochy, konstrukce a stavby, narušené v důsledku provádění prací je stavebník povinen neprodleně uvést na vlastní náklady do původního/předchozího stavu.
6. Etapizace výstavby, resp. postup prací bude předem koordinován – POV/plán organizace výstavby, PKP/ plán kontrolních prohlídek, časový HMG/harmonogram prací, a evidován např. zápisem do stavebního deníku nebo obdobným vhodným způsobem vedeným na místě stavby-staveniště; stavební deník vede zhotovitel, resp. stavbyvedoucí v souladu s ust. § 153, resp. s §157 SZ. Vyhotovení podrobného plánu KP zajistí stavebník předem v dostatečném předstihu před započítáním prací ve spolupráci nebo prostřednictvím vybraného zhotovitele stavby a rovněž tak bezodkladně zaslání jeho stejnopisu, popř. aktualizace zdejšímu správnímu orgánu.
7. Stavebník zajistí vytyčení prostorové plochy/stavby včetně všech sítí technické infrastruktury podle PD. Staveniště bude zřizováno a vymezeno v nezbytném rozsahu, hospodárně, s ohledem na bezpečnost pracovníků, okolního provozu, i životní prostředí.

8. Při provádění stavby, vč. přípravy, odstraňování, výstavby, dokončovacích a jiných souvisejících činnostech, pracích a úpravách, bude zajištěno dodržování ustanovení o obecně technických požadavcích na výstavbu, příslušné vztahující se platné technické normy a zásady, bude zabezpečeno dodržování předpisů z hlediska bezpečnosti práce, ochrany zdraví, osob i majetku.
9. Při provádění stavby budou dodržena platná ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a předpisy týkající se bezpečnosti práce a zařízení včetně nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) na staveništi.
10. Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby, stavebník/investor povinen určit potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla, ve smyslu platného ustanovení § 14 zákona č. 309/2006 Sb. Budou-li při realizaci stavby překročeny limity pro celkovou předpokládanou dobu trvání nebo objem prací a činností, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací na předepsaném formuláři oblastnímu inspektorátu práce v Plzni podle ust. § 15 uvedeného zákona.
11. Pro provedení stavby budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které splňují ust. SZ- §§ 156 SZ Požadavky na stavby, § 160 Provádění staveb, § 169 Obecné požadavky na výstavbu, a dále i technické požadavky nařízení vlády ČR č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, č.163/2002 Sb. vč. NV č. 215/2016 Sb. ,v účinném znění, č.190/2002 Sb. technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění.
12. Pro zajištění podmínek bezpečnosti budou plněny základní požadavky bezpečnosti práce a technických zařízení podle vyhl. č. 48/1982 Sb. a vyhl. č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění - v dohodě zajišťuje stavebník a stavbyvedoucí.
13. Po dobu výstavby i ostatních prací bude umožněn přístup na přilehlé a sousední pozemky nacházející se v blízkosti staveniště; příjezd na sousední pozemky nebo parkování OA vlastníků těchto nemovitostí bude umožněn vždy individuálně v dohodě se zhotovitelem stavby v závislosti na postupu prací. Pro stavbu, resp. staveniště a jeho zařízení bude vždy zajištěn staveništní příjezd, rovněž tak i pro vozidla IZS.
14. Zásobování stavby musí být prováděno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (ZPPK), s důrazem na bezpečnost pěších i ostatních účastníků provozu na PK.
15. Při provádění stavby, pomocných pracích i při odstraňování odpadů musí být provedena taková opatření, aby nedocházelo ke znečištění komunikací přilehlých ani okolních, zejm. MK, ÚK, II/203.
16. Likvidace odpadů bude prováděna řádně v souladu s ustanovením zák. č.185/2001 Sb., v platném znění a na něj navazujícími předpisy, zejména vyhl. MŽP č.381/2001 Sb.- Katalog odpadů. Pro likvidaci odpadů musí být užito určených řízených skládek pro zvláštní, tříděný odpad, např. skládka Chotíkov, popříp. v dohodě - stavební dvůr, areál investora, obce apod., vždy vyjma nebezpečného odpadu.
17. Práce nebudou obtěžovat okolí nad přípustnou hladinu hluku, vibrací a prachu; individuálně v dohodě se zhotovitelem, v závislosti na postupu prací a v souladu se zákonem č.262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění, bude upravena pracovní činnost v okolí míst trvalého bydlení, resp. obytné zástavby - z hlediska dodržování nočního klidu a klidu i v době ve dnech pracovního klidu a volna, tzn. soboty, neděle, svátky.
18. Na viditelném místě u vstupu na staveniště bude umístěna informační tabule s uvedením názvu stavby, jména/označení stavebníka, projektanta, zhotovitele stavby a odpovědného stavbyvedoucího, včetně štítku „Stavba povolena“.
19. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a musí být ponechán na místě až do kolaudace stavby.
20. Před zahájením stavby, cca 2 týdny před započítáním prací, nutno ohlásit stavbu organizaci záchranných archeologických výzkumů např. Západočeské muzeum v Plzni, oddělení záchranných archeologických výzkumů, Zborovská 40, tel.: 378370330. Při případných archeologických nálezích při realizaci stavby bude postupováno v souladu se zákonem č.20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, a to zejména ust. § 23-nálezce je povinen učinit oznámení nejpozději do druhého dne.

21. Před zahájením stavby budou znovu ověřeny a vytýčeny všechny inženýrské sítě; v průběhu projektové přípravy a oznámení zdejšího úřadu o zahájení této stavby byla v místě nebo v blízkosti ověřena/potvrzena existence sítí: plynovodní, telekomunikační, energetické, vodohospodářské.
22. Budou dodrženy podmínky/stanoviska/souhlasy apod. o ochraně sítí na stavbě a v její blízkosti, vlastníků, správců, provozovatelů těchto stavbou dotčených sítí a zařízení, v rozsahu PD stavby, zejména:
 - GridServices, s.r.o., IČ: 27935311, Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno, ze dne 14.12.2018 zn.: 5001838672
 - CETIN/Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, ze dne 25.10.2018, zn.: POS-PD819-18, ze dne 2.1.2019 čj.: 809825/18
 - ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, ze dne 23.10.2018 zn.: 1100928432
 - ČEZ Energetické služby, s.r.o., IČ: 27804721, Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava –Vítkovice, ze dne 4.12.2018
 - VODÁRNA PLZEŇ a.s., IČ: 25205625, Malostranská 2, 317 68 Plzeň, ze dne 17.10.2018 zn.: 2018/05642.
23. Budou respektovány podmínky/stanoviska/závazná stanoviska/souhlasy apod. dalších účastníků, dotčených orgánů, subjektů, z hlediska ochrany oprávněných, právem chráněných, resp. veřejných zájmů, v rozsahu PD, a to zejména (*originály u stavebníka, žadatele*):
 - odbor ÚP MÚ Nýřany, ze dne 14.1.2019 čj.: OÚP-Vac/28755/2018 - KZS
 - odbor ŽP MÚ Nýřany, ze dne 29.10.2018 čj.: OŽP-PRO/29060/2018, ze dne 17.12.2019 čj.: OŽP-Čel/37603/2019, ze dne 4.2.2020 čj.: OŽP-UIč/4187/2020, z hlediska ochrany životního prostředí tj. přírody a krajiny, o vodách, půdě ZPF, lesích, ovzduší, o odpadovém hospodářství
 - ČR - Státní pozemkový úřad, IČ: 01312774, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 / Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň, Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň, ze dne 21.1.2019 zn.: SPU 480227/2018/Su
 - ČR- Povodí Vltavy, s.p., IČ: 70889953, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 - závod Berounka, Denisovo nábř. 14, 304 20 Plzeň, ze dne 8.11.2018 zn.: 60073/2018-342/Br SP-2018/14412, ze dne 7.2.2019 zn.: 8187/2019-342/Br SP-2018/14412
 - Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IČ: 00025844, Hřímálého 11, 301 00 Plzeň, ze dne 24.10.2018 zn.: SBS 32731/2018/OBÚ-06/1
 - HZS Plzeň. kraje, Kaplířova 9, P.O.BOX 18, 320 68 Plzeň, ze dne 25.10.2018 čj.: HSPM -3980-2/2018 ÚPP - souhlasné ZS, bez připomínek
 - KHS Plzeň. kraje, Skrétova 15, 303 22 Plzeň, ze dne 22.10.2018 čj.: KHSPL/29530/21/2018 – souhlasné ZS, bez připomínek
 - Policie ČR DI Plzeň-venkov, ze dne 29.10.2018 čj.: KRPP-157638-2/ČJ-2018-031106-47
 - Plzeňský kraj, prostř.: SÚSPK p.o., IČ: 72053119, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň, okres Plzeň-sever, ze dne 29.10.2018 zn.: 1112/18/SÚSPK-PSP-Ha.
24. Po dokončení stavby požádá investor o povolení užívání stavby podle platného stavebního zákona (§122, *kolaudační souhlas*). Ke kolaudaci / k závěrečné prohlídce stavby, musí být předloženy všechny související doklady, zejména zápisy o provedených zkouškách, revizní zprávy, vyhovující výsledky laboratorních zkoušek, certifikáty použitých materiálů a výrobků, protokoly o odevzdání a převzetí dokončených objektů stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, geodetické zaměření skutečného stavu a geometrický plán pro oddělení-rozdělení nebo změnu pozemků a jejich vlastníků, změna využití nebo druhu pozemku, zápis Katastrálním úřadem PK Plzeň - sever, vklad do katastru, tj. majetkoprávní vypořádání dotčených stran.
25. Místní úpravu provozu (*MÚP*) na dotčených PK dopravním značením a zařízením (*DZZ*) jako nedílnou součást, resp. příslušenství stavby, stanoví zdejší silniční správní orgán v souladu s ust. § 77 cit. ZPPK, na základě předem podané žádosti stavebníkem, investorem nebo zhotovitelem stavby, spolu s předložením upraveného kompletního návrhu zpracovaného v souladu s platnými technickými i zvláštními předpisy, zejm. ČSN 018020 vč. změn, ČSN EN 12899-1-5, 1436 vč. změn, TP 65, 133 a vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na PK a úprava a řízení provozu na PK, v platném znění, po

předchozím projednání s dotčeným orgánem PČR DI Plzeň-venkov, a to nejpozději před dokončením stavby.

26. DZZ pro realizaci stavby, resp. přechodnou úpravu provozu (*PÚP*) na dotčených PK stanoví zdejší SSO v souladu s ust. § 77 cit. ZPPK na žádost vybraného zhotovitele stavby, který je držitelem oprávnění k požadované činnosti, podanou předem před započítím stavby, nejdříve však po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, spolu s přílohou kompletního návrhu DIO, po předchozím projednání s uvedeným dotčeným orgánem Policie ČR.
27. Stavbu bude provádět oprávněná odborně způsobilá osoba – zhotovitel, stavební podnikatel v souladu s ustanovením §160 stavebního zákona, na základě výběru investora, stavebníka. Název zhotovitele včetně dokladů o jeho odborné způsobilosti a termín zahájení stavby oznámí písemně stavebník zdejšímu odboru včas předem před zahájením stavby.
28. Stavba se všemi součástmi a příslušenstvím bude dokončena do 24 měsíců od nabytí právní moci tohoto povolení.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 21.2.2020 podal stavebník žádost o vydání společného povolení předmětné stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení. Žádost byla v součinnosti a v souladu s ust. § 94l stavebníkem doplněna k 03/2021, kdy bez zbytečného odkladu stavební úřad následně rozhodl.

Stavební úřad oznámil v souladu s ust. § 94m stavebního zákona zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ust. § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru/navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění.

Podle ust. § 94m stavebního zákona upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska a námítky mohou uplatnit ve stanovené lhůtě - nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení písemnosti, jinak se k nim nepřihlíží.

Účastník řízení podle ust. 94k písm.c) až e) mohl uplatnit své odůvodněné námítky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, popřípadě důkazy, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě; obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námítky k ochraně zájmu obce.

Ve stanovené lhůtě a v průběhu řízení nebyly uplatněny žádné námítky ani připomínky účastníků řízení, ani stanoviska dotčených orgánů.

Podle ust. § 94o je stavební záměr v souladu s požadavky

- stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů
- na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem
- zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky/rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů resp. stavebního zákona.

Umístění stavebního záměru vyhovuje obecným požadavkům na využívání území, na výstavbu, v území vymezeném v souladu s platným územním plánem obce a s podmínkami odboru územního plánování.

Projektová dokumentace stavebního záměru-stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby; je zpracována autorizovanou osobou, projektantem v oboru dopravních staveb- za PD stavby jako celku,

správnost, celistvost, úplnost, bezpečnost, proveditelnost a technickou a ekonomickou úroveň (*projektu*) stavby, vč. vlivů na životní prostředí, s cílem trvalého užívání k určenému účelu bez závad odpovídá její projektant (*autorizovaný v oboru*).

V průběhu stavebního řízení, na základě předložené žádosti, dokumentace a uvedených doložených podkladů stavební úřad posoudil soulad záměru žadatele v provedeném společném řízení s požadavky-z hledisek uvedených v ust. §§ 94o a okolí stavebního zákona, zejména splnění podmínek ochrany veřejných zájmů, ochrany zdraví, života a životního prostředí, z hlediska obecných, technických požadavků na výstavbu, základní i vybrané stavební výrobky a z hlediska vyhlášky č. 398/2009 Sb. o OTP na zabezpečení užívání staveb osobami s OSPO, v platném znění, dále z hlediska komplexnosti, plynulosti a koordinace výstavby včetně zajištění jejího odborného provedení i vedení oprávněnou osobou.

Řádné provedení stavby je zajištěno v ověřené PD (*RDS, PDPS*), resp. v podmínkách tohoto povolení.

V řízení bylo dále zkoumáno, zda mohou být prováděním stavby přímo dotčena vlastnická nebo jiná, smlouvou založená, práva vlastníků těchto pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich.

Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení v souladu ust. §§ 94k , 94m SZ resp. § 27 zák. č. 500/2004 Sb., Správní řád/SŘ, v platném znění - viz rozdělovník.

Stavební úřad, vázán záměry územního plánování v obci, souhlasem odboru územního plánování, stejně jako i zajištěním souladu se zvláštními právními předpisy, při svém rozhodování vycházel ze znalosti místních poměrů a rozsahu PD přizpůsobené těmto poměrům.

Současně zajistil soulad a koordinaci předložených uvedených stanovisek dotčených orgánů a ostatních subjektů, se zaměřením na věcnou stránku výstavby a na její účinky na okolí tak, aby bylo současně hospodárné vedení správního řízení i vlastní realizace stavby v uvedeném dohodnutém termínu, a zahrnul je do podmínek tohoto rozhodnutí;

stanoviska sdělili/bvlo doloženo:

- GridServices, s.r.o., IČ: 27935311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, ze dne 14.12.2018 zn.: 5001838672
- CETIN/Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, ze dne 25.10.2018, zn.: POS-PD819-18, ze dne 2.1.2019 čj.: 809825/18
- ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, ze dne 23.10.2018 zn.: 1100928432
- ČEZ Energetické služby, s.r.o., IČ: 27804721, Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava –Vítkovice, ze dne 4.12.2018
- VODÁRNA PLZEŇ a.s., IČ: 25205625, Malostranská 2, 317 68 Plzeň, ze dne 17.10.2018 zn.: 2018/05642
- odbor ÚP MÚ Nýřany, ze dne 14.1.2019 čj.: OÚP-Vac/28755/2018 - KZS
- odbor ŽP MÚ Nýřany, ze dne 29.10.2018 čj.: OŽP-PRO/29060/2018, ze dne 17.12.2019 čj.: OŽP-Čel/37603/2019, ze dne 4.2.2020 čj.: OŽP-UIč/4187/2020, z hlediska ochrany životního prostředí tj. přírody a krajiny, o vodách, půdě ZPF, lesích, ovzduší, o odpadovém hospodářství
- ČR - Státní pozemkový úřad, IČ: 01312774, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 / Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň, Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň, ze dne 21.1.2019 zn.: SPU 480227/2018/Su
- ČR- Povodí Vltavy, s.p., IČ: 70889953, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 - závod Berounka, Denisovo nábř. 14, 304 20 Plzeň, ze dne 8.11.2018 zn.: 60073/2018-342/Br SP-2018/14412, ze dne 7.2.2019 zn.: 8187/2019-342/Br SP-2018/14412
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IČ: 00025844, Hřímálého 11, 301 00 Plzeň, ze dne 24.10.2018 zn.: SBS 32731/2018/OBÚ-06/1

- HZS Plzeň. kraje, Kaplířova 9, P.O.BOX 18, 320 68 Plzeň, ze dne 25.10.2018 čj: HSPM -3980-2/2018 ÚPP - souhlasné ZS, bez připomínek
- KHS Plzeň. kraje, Skrétova 15, 303 22 Plzeň, ze dne 22.10.2018 č.j.: KHSPL/29530/21/2018 – souhlasné ZS, bez připomínek
- Policie ČR DI Plzeň-venkov, ze dne 29.10.2018 č.j.: KRPP-157638-2/ČJ-2018-031106-47
- Plzeňský kraj, prostř.: SÚSPK p.o., IČ: 72053119, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň, okres Plzeň-sever, ze dne 29.10.2018 zn.: 1112/18/SÚSPK-PSP-Ha
- NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IČ: 27163059, Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava, středisko Plzeň, Nám. Republiky 28, 301 00, ze dne 15.10.2018 zn.: 111180083.

Stavební úřad dále zjistil, že uskutečněním ani užíváním stavby nejsou ohroženy obecné zájmy ani nepřiměřeně omezena a ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení a konstatuje, že byly splněny i ostatní zákonné podmínky pro vydání stavebního povolení ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném znění, a že dále neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení předmětné stavby, a vydal rozhodnutí za použití ustanovení právních předpisů v něm uvedených.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů (§81 odst.1, §83 odst.1 zák. č.500/2004 Sb., správní řád, dále i „správní řád“) ode dne jeho oznámení doručením (§72 odst.1 správního řádu), ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje v Plzni prostřednictvím zdejšího odboru dopravy (§86 odst.1 správního řádu).

Lhůta pro podání odvolání počíná dnem následujícím (§40 odst.1 správního řádu).

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení; odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné (§82 odst.1 správního řádu).

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v §37 odst.2 správního řádu; podává se s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis; nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady tohoto účastníka (§82 odst.2 správního řádu).

Účastník si může zvolit jednoho zmocněnce; zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí (§33 odst.1 správního řádu).

Případné včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek (§85 odst.1 správního řádu).

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci (§73 správního řádu).

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena (§94p stavebního zákona).

Dobu platnosti společného povolení lze prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.

Podle ust. § 94p po dni nabytí právní moci společného povolení stavební úřad zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, a štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru



silniční správní orgán MÚ Nýřany

Obdrží: viz rozdělovník

ROZDĚLOVNÍK:

Účastníci řízení (do vlastních rukou):

(stavebník; vlastníci pozemků, staveb, jiný oprávněný)

- Obec Vejprnice, IČ: 00258474, Mírová 17, 330 27 (LV 10001) - v zast.: INGEM a.s., IČ: 63504006, Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň
- Plzeňský kraj, prostř.: SÚSPK p.o., IČ: 72053119, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň, okres Plzeň-sever (LV 249)
- ČR-Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, IČ: 000126918, Třanovského 622/11, Řepy, 163 00 Praha 6 (LV744)
- ČR- Povodí Vltavy, s.p., IČ: 70889953, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 - závod Berounka, Denisovo nábř. 14, 304 20 Plzeň (LV 673)
- Římskokatolická farnost Plzeň – Západ, Křimická 670/73, 318 00 Plzeň (LV 565)
- [redacted]

(vlastníci technické infrastruktury)

- ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, Podmokly, 405 02 Děčín 4
- ČEZ Energetické služby, s.r.o., IČ: 27804721, Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava -Vítkovice
- CETIN /Česká telekomunikační infrastruktura/ a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- GridServices, s.r.o., IČ: 27935311, Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno
- Vodárenská a kanalizační a.s., IČ: 49786709, Nerudova 982/25, 301 00 Plzeň (a k LV 1226)

(vlastníci sousedních pozemků, staveb, jiný oprávněný, p.p.č. zejm.: 1219/65, 1219/3, 1219/2, 1377/3, 810, 812/1, 813/1, 819/1, 821, 1203/2, 1206/2, 1207/1, 1208/1, 1327/35, k.ú. Vejprnice)

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

Dotčené orgány:

PČR KŘP Plzeň. kraje, ÚO Plzeň-venkov, DI, Anglické nábř.7, 301 00 Plzeň
 MÚ Nýřany, prac. Plzeň, OŽP, Americká 39, 304 66
 MÚ Nýřany, prac. Plzeň, OÚP, Americká 39, 304 66
 HZS Plzeň. kraje, IČ: 70883378, Kaplířova 9, P.O.BOX 18, 320 68 Plzeň
 KHS Plzeň. kraje, IČ: 71009299, Skrětova 15, 303 22 Plzeň
 Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IČ: 00025844, Hřímálého 11, 301 00 Plzeň

Na vědomí:

VODÁRNA PLZEŇ a.s., IČ: 25205625, Malostranská 143/2, 317 68 Plzeň
 NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IČ: 27163059, Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava, středisko Plzeň, Nám. Republiky 28, 301 00

Za vydání stavebního povolení se správní poplatek podle položky 18 odst.1.písm.f) sazebníku zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném znění, nevyměřuje/nevybírá.

Příloha (stavebník): 1 x ověřená PD+štítek „Stavba povolena“ po NPM tohoto rozhodnutí, včetně stejnopisu s doložkou PM

STAVBA POVOLENA

(podle ust. § 94p odst.4 zák.č. 183/2006 Sb. a § 18d vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územ. řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění)

rozhodnutím odboru dopravy Městského úřadu Nýřany, pracoviště Plzeň

ze dne: 15.4.2021

č.j.: OD-Fro/6855/2020 - R

nabytí právní moci dne: 26.5.2021

Označení stavby, účel stavby: „**Vejprnice, dopravní ostrůvek na silnici II/203 a chodník do obce Vejprnice Brůdek**“

Označení stavebníka: **Obec Vejprnice, IČ: 00258474, Mírová 17, 330 27 a Plzeňský kraj, prostřednictvím příspěvkové organizace (p.o.): SÚSPK p.o. IČ: 72053119, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň, okres P-S**

Označení stavebního podnikatele:

stavebník zde uvede údaje o vybraném stavebním podnikateli, kterého před zahájením realizace stavby oznámí stavebnímu úřadu

Stanovený termín dokončení stavby: **do 26.5.2023**



otisk úředního razítka



silniční správní orgán MÚ Nýřany
