
**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. UL 2021_0022_1**

mezi

CETIN a.s.

a

Liberecký kraj

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
ID DS: qa7425t
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená [redacted] manažerem, Výstavba pevné přístupové sítě
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
(dále jen „**CETIN**“)

a

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec
IČO: 70891508
DIČ: CZ70891508
ID DS: c5kbvkw
zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem
(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Semily spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní,

kteřé umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 13.12.2020 vydané pod čj. 843714/20, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPI Benešov u SM_Sociální péče TEREZA**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickým) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného společného povolení stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného společného povolení stavby Překládky, včetně jeho dokladové části,
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastněním takového práva.(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací

Překládka a/nebo jednotlivými úkony Překládka pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektu,
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit společné povolení stavby Překládky,
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však čtyři (4) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník se zavazuje, nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci společného povolení stavby Překládky uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, jejíž vzor je uveden v Příloze č. 2 Smlouvy a převést na společnost CETIN práva a povinnosti ze společného povolení stavby Překládky. Ve lhůtě dle předchozího odstavce je Stavebník povinen předat společnosti CETIN společného povolení stavby Překládky.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do šesti (6) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
- (c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy;
- (d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti ze společného povolení stavby (Překládky).

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17

Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **676 457,00 Kč** (slovy: šest set sedmdesát šest tisíc čtyři sta padesát sedm korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do čtyř (4) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vážnoucí

- na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
 - (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
 - (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
 - (f) náklady na identifikaci parcel,
 - (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
 - (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v účinném znění,
 - (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
 - (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
 - (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
 - (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
 - (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společnostmi CETIN vystaveny takto:
- (a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši **35 237,00 Kč** (slovy: třicet pět tisíc dvě stě třicet sedm korun českých) bude společnostmi CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy,
 - (b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.
- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společnostmi CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společnostmi CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.

- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

funkce: [REDACTED]

tel. [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

funkce: [REDACTED]

tel. [REDACTED]

- 8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

funkce: [REDACTED]

tel. [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

funkce: [REDACTED]

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.

- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN od smlouvy dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.
- 9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marré uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné

osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- (a) v listinné podobě;
 - (b) e-mailovou zprávou opatřenou Zaručeným elektronickým podpisem;
 - (c) e-mailovou zprávou zaslou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány

v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6, věty první Smlouvy a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmeny (b) a (c).

- 12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance

- <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoliv souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Smluvní strana „CETIN“ obdrží jedno (1) vyhotovení. Smluvní strana „Stavebník“ obdrží tři (3) vyhotovení.

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby – vzor

Doložka

Smlouva byla schválena Radou Libereckého kraje usnesením č. 1477/21/RK dne 7. 9. 2021.


CETIN
V Praze dne

Stavebník
V Liberci dne

CETIN a.s.



Liberecký kraj
Martin Půta
hejtman

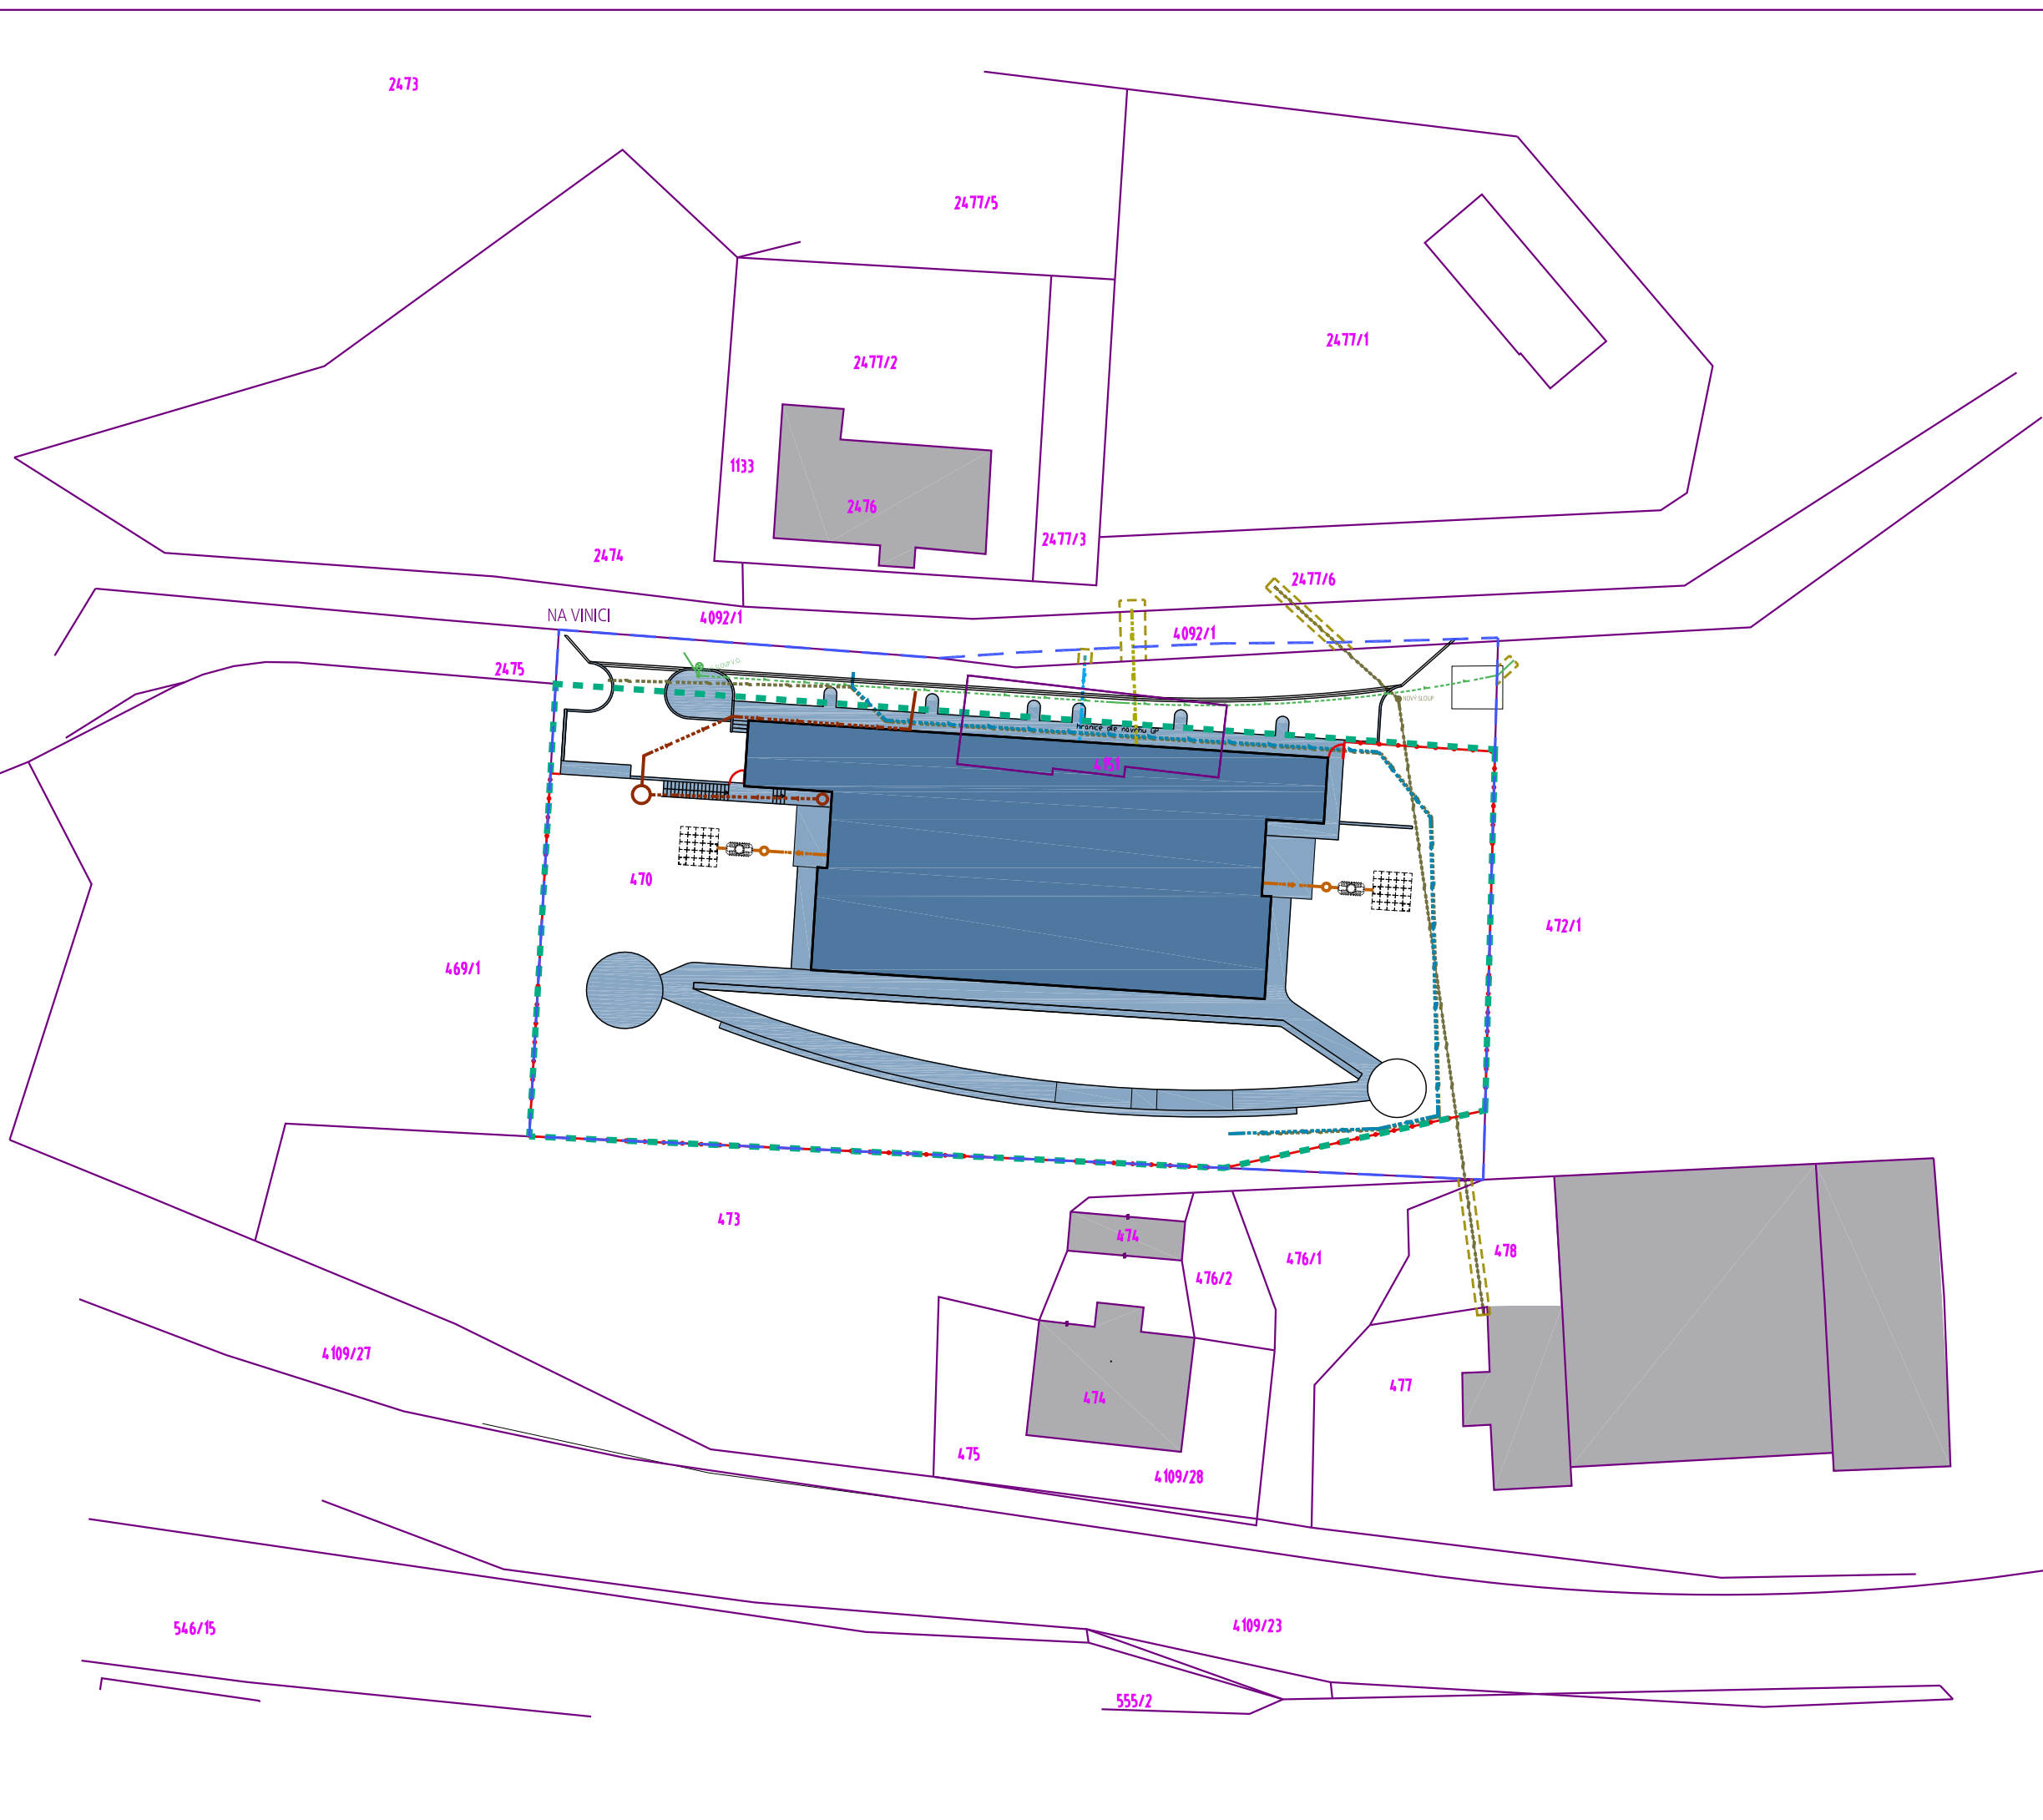


| | |
|--|--|
| | hranice řešeného území |
| | hranice parcel dle geom. plánu pro odkoupení pozemku |
| | záběr dočasný |
| | oplocení pozemku |


| LEGENDA NAVRHOVANÝCH SÍTÍ - PŘELOŽKY 1.FÁZE | |
|---|---------------------------|
| | elektro NN/CETIN |
| | elektro NN |
| | sdělovací vedení podzemní |
| | sdělovací vedení nadzemní |


| LEGENDA NAVRHOVANÝCH SÍTÍ - PŘELOŽKY 2.FÁZE | |
|---|---------------------------|
| | elektro NN/CETIN |
| | elektro NN |
| | sdělovací vedení podzemní |

| LEGENDA NAVRHOVANÝCH SÍTÍ - PŘÍPOJKY | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| | kanalizace splašková |
| | kanalizace dešťová |
| | přípojka vodovodu |
| | STL plynovodní přípojka |
| | přípojka NN |
| | přípojka telekomunikací |

| | |
|---------------------------------|---|
| projekt project | Sociální péče TEREZA |
| investor client | Liberecký kraj U Jezu 642/2a , Liberec |
| návrh architectural part | |
| hlavní projektant consultant | SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec U Besedy 8/414, CZ 46007 Liberec |
| část projektu project part | C. situační výkresy |



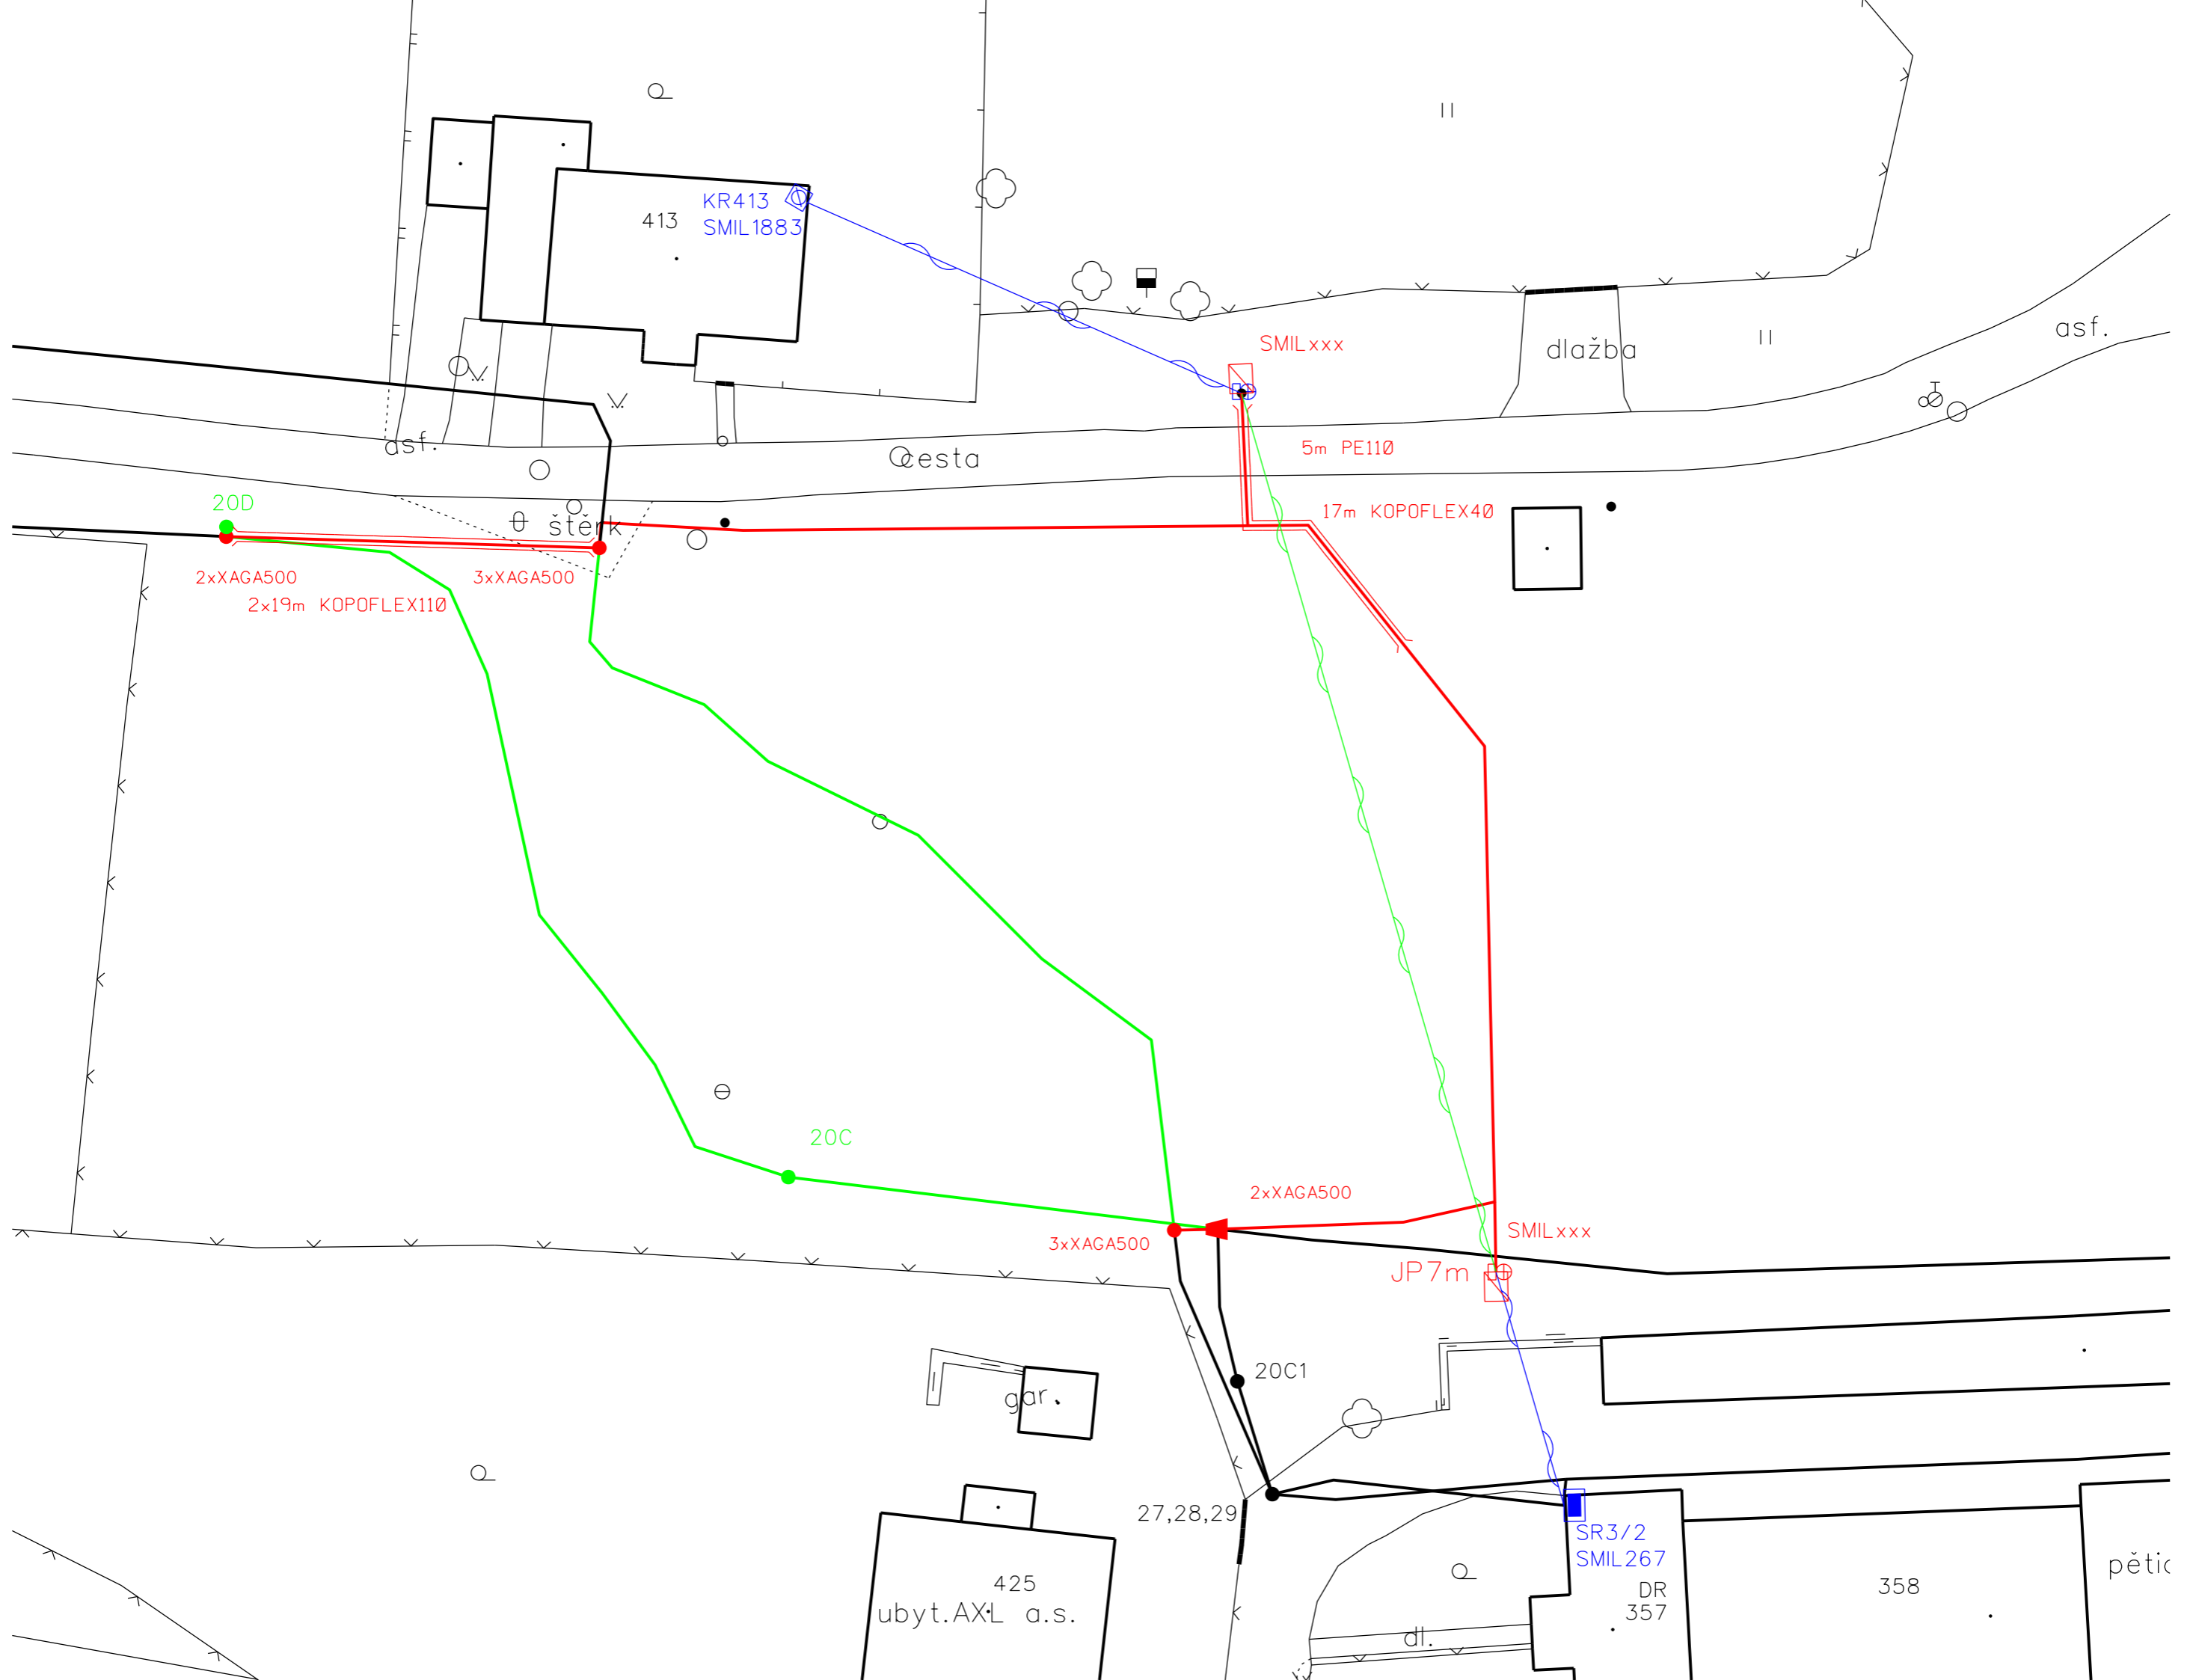

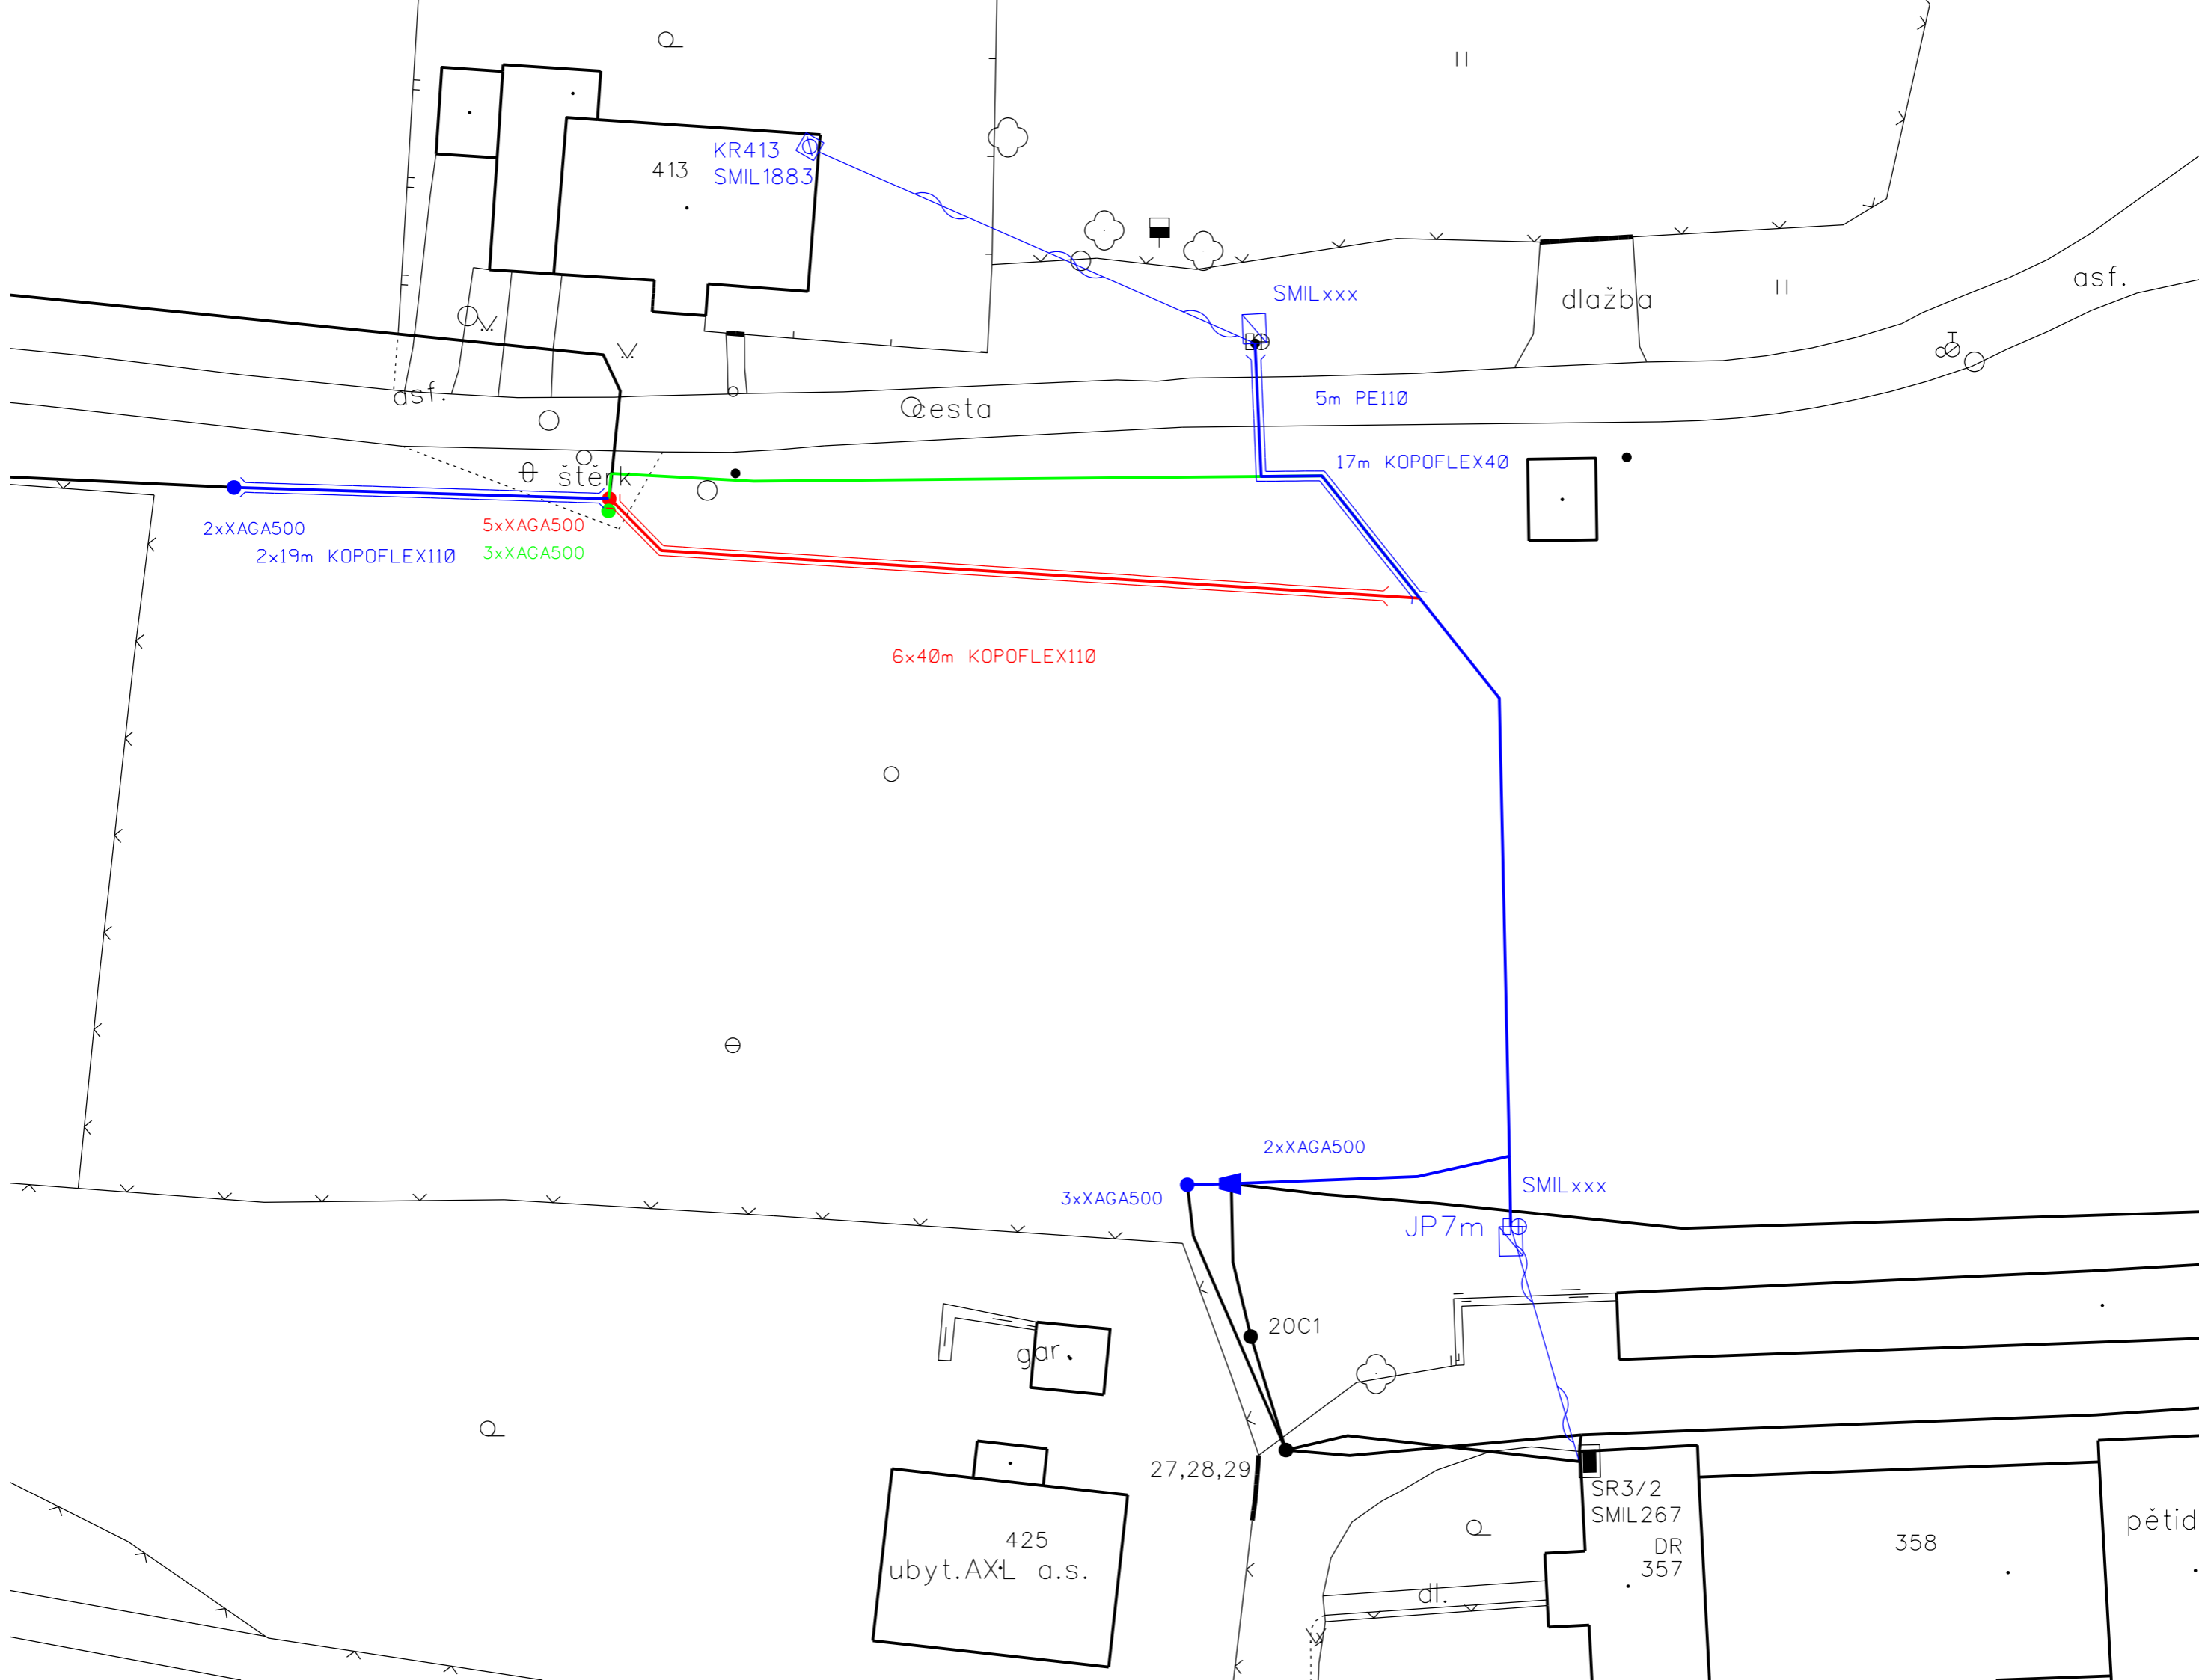

KR413
SMIL1883
2SMIL267/1.formy.2/1-2 2SMILxxx/1.formy.1/1-2
1xUNIV 6480-10;
2xkab.forma 1p.;
Na Vinici:413 ;;
Semily
Semily


Přechodová 2
SMILxxx
2SMILxxx/1.1/1-6
1xMRS 10/20 - OT;
1xSID-C roz.modul;
Na Vinici: u č.p.413::
Semily
Semily

Přechodová 1
SMILxxx
2SMIL267/1.formy.2/1-2
1xMRS 10/20 - OT;
1xSID-C roz.modul;
3.května: za č.p.357::
Semily
Semily

KR425
SMIL2954
xSMIL267/1.formy.3/1-2
1xMRK 2;
1xzar.sv.2p.;
3.května :425 ;;
Semily
Semily

SR3/2
SMIL267
xSMIL49/1.4.2/16-20
1xVZ 10;
1xVZ-10:15xkab.forma 1p.;
3.května :357 ;;
Semily
Semily

č.p.358
SMIL2785
xSMIL267/1.vnitřní.1/1-2:1.vnitřní.3/1-5
1xBOX I.;
1xvod.f.LSA 10x1:2xkab.forma 1p.:2xkab.forma 1p.;
3.května :358 ;;
Semily
Semily

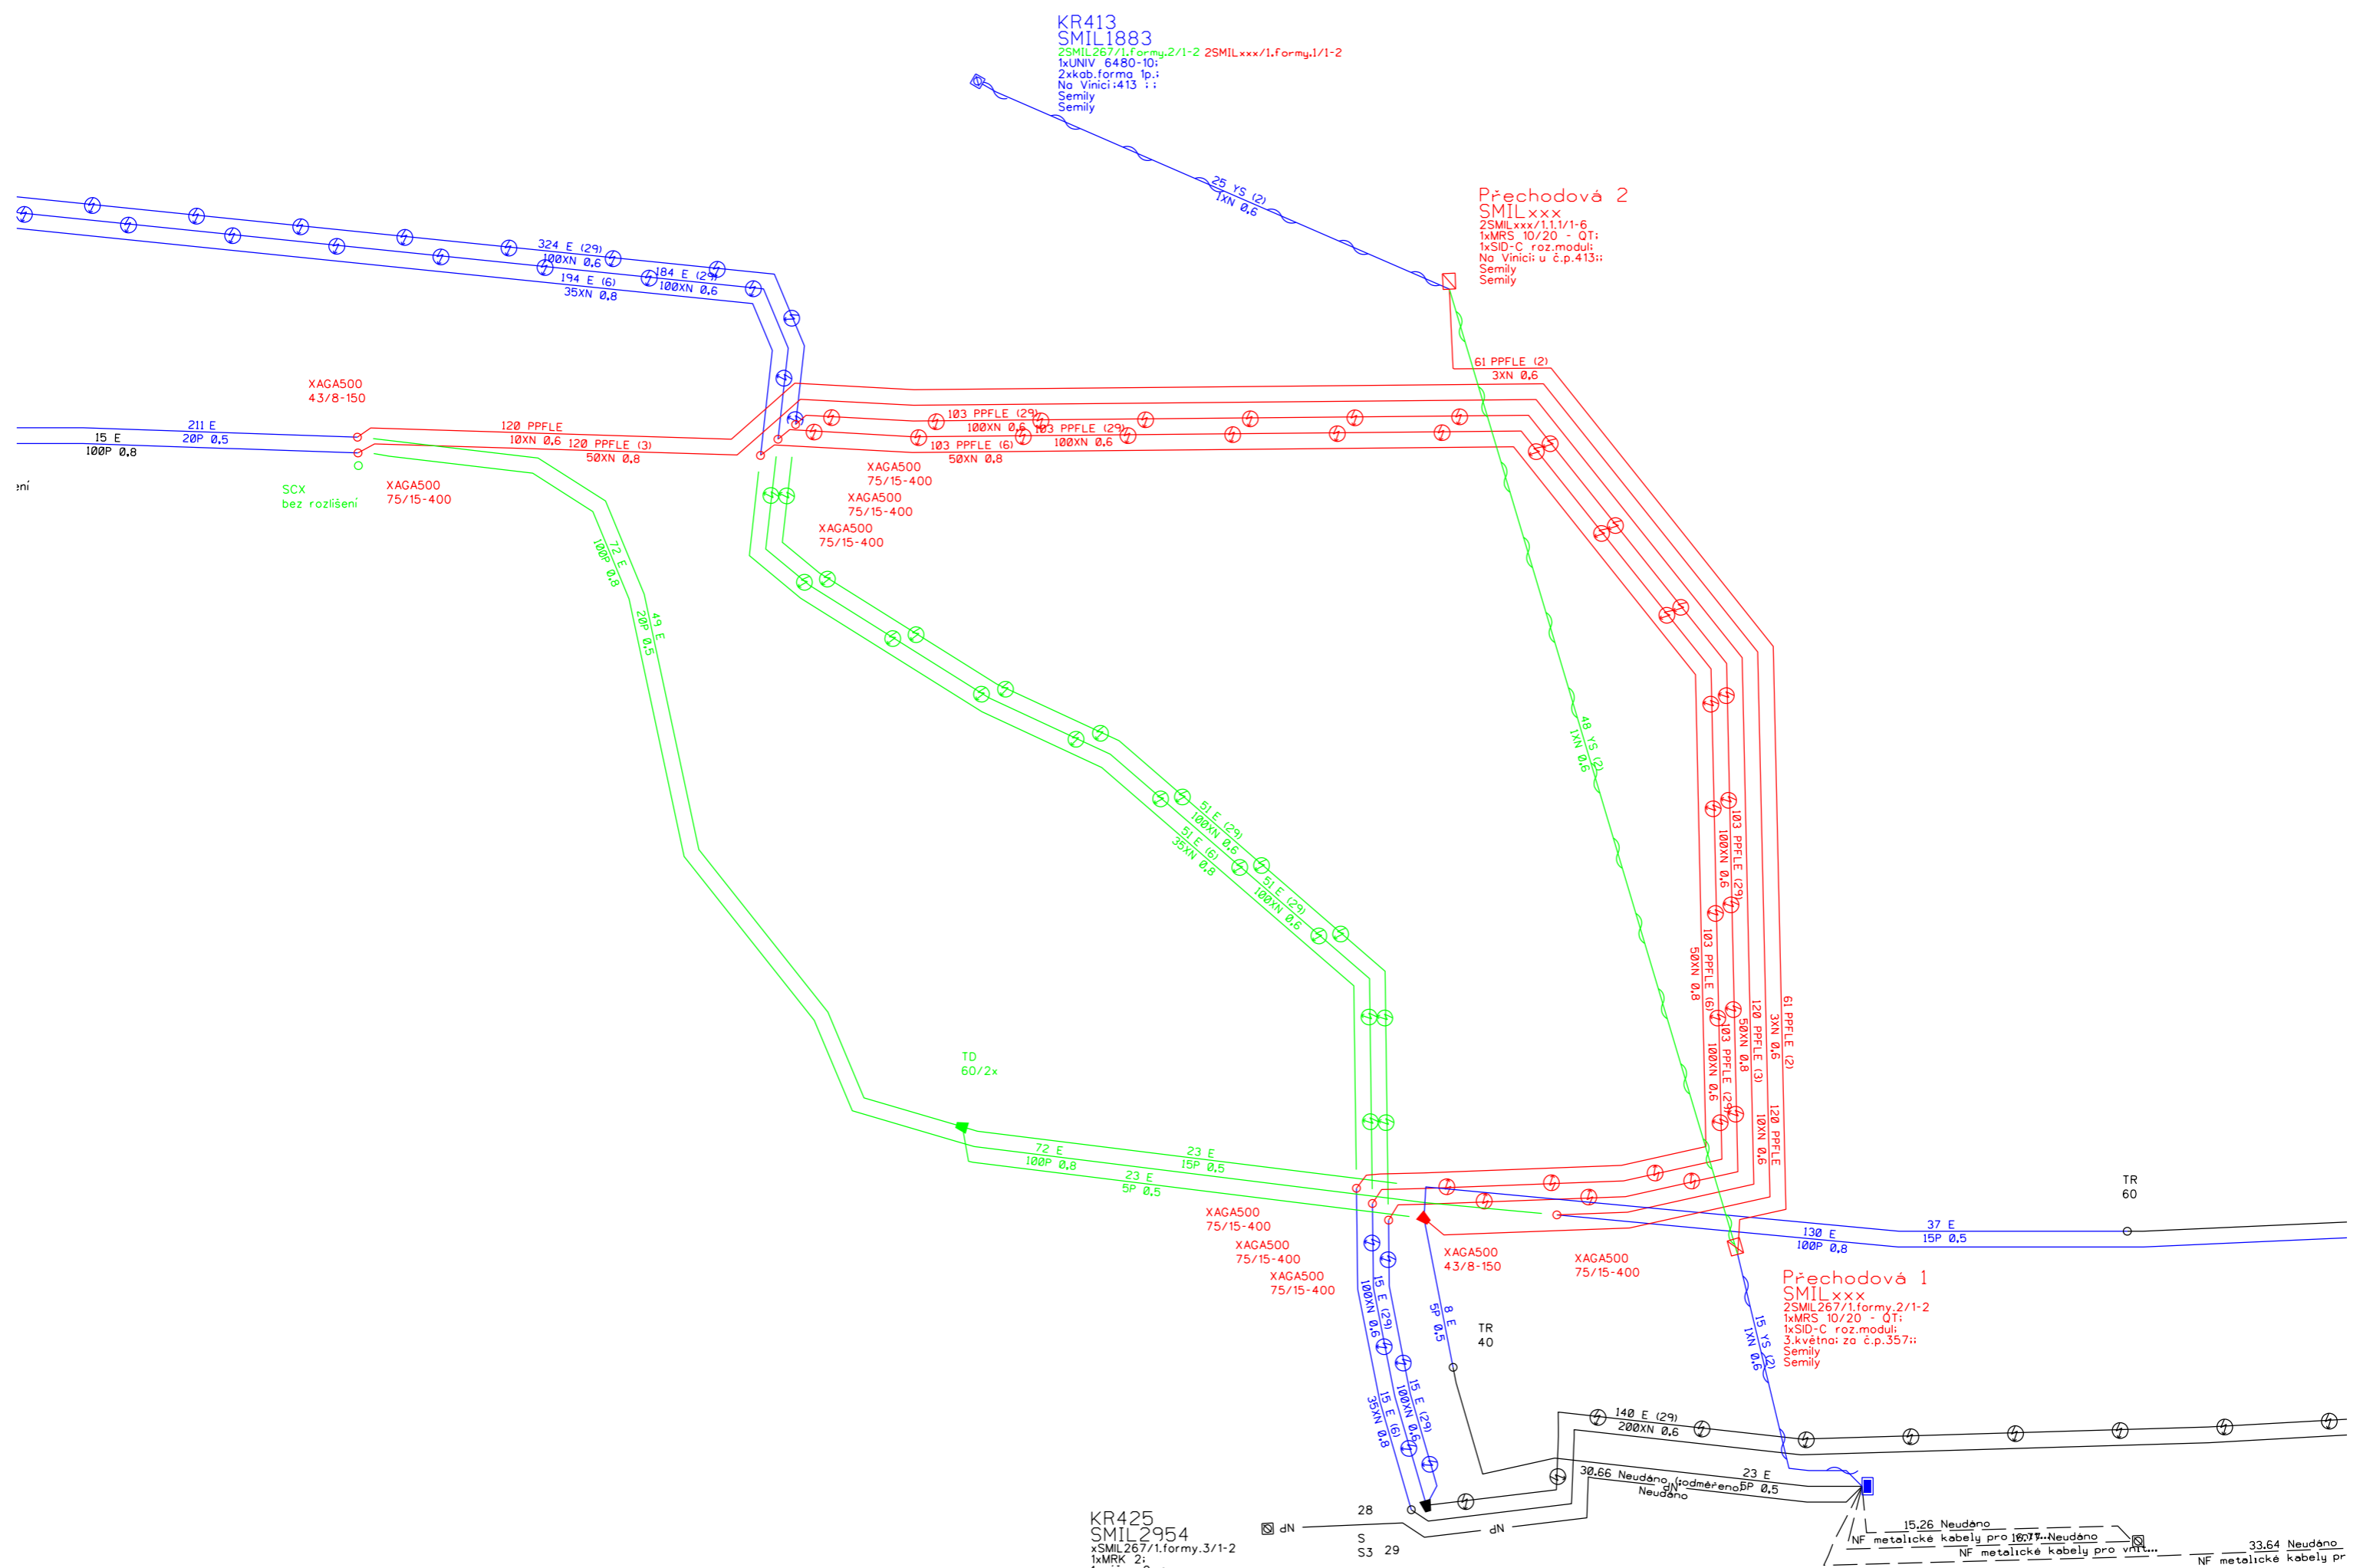

zni

dN

S

S3

28

29

S

S3

15,26 Neudáno

NF metalické kabely pro 1807


NF metalické kabely pro vnitř...

33,64 Neudáno

NF metalické kabely pr

KR413
SMIL1883
2SMILxxx/1.formy.1/1-2
1xUNIV 6480-10:
2xkab.forma 1p.:
Na Vinici:413 ::
Semily
Semily

Přechodová 2
SMILxxx
2SMILxxx/1.1/1-6
1xMRS 10/20 - 0T:
1xSID-C roz.modul:
Na Vinici: u č.p.413::
Semily
Semily

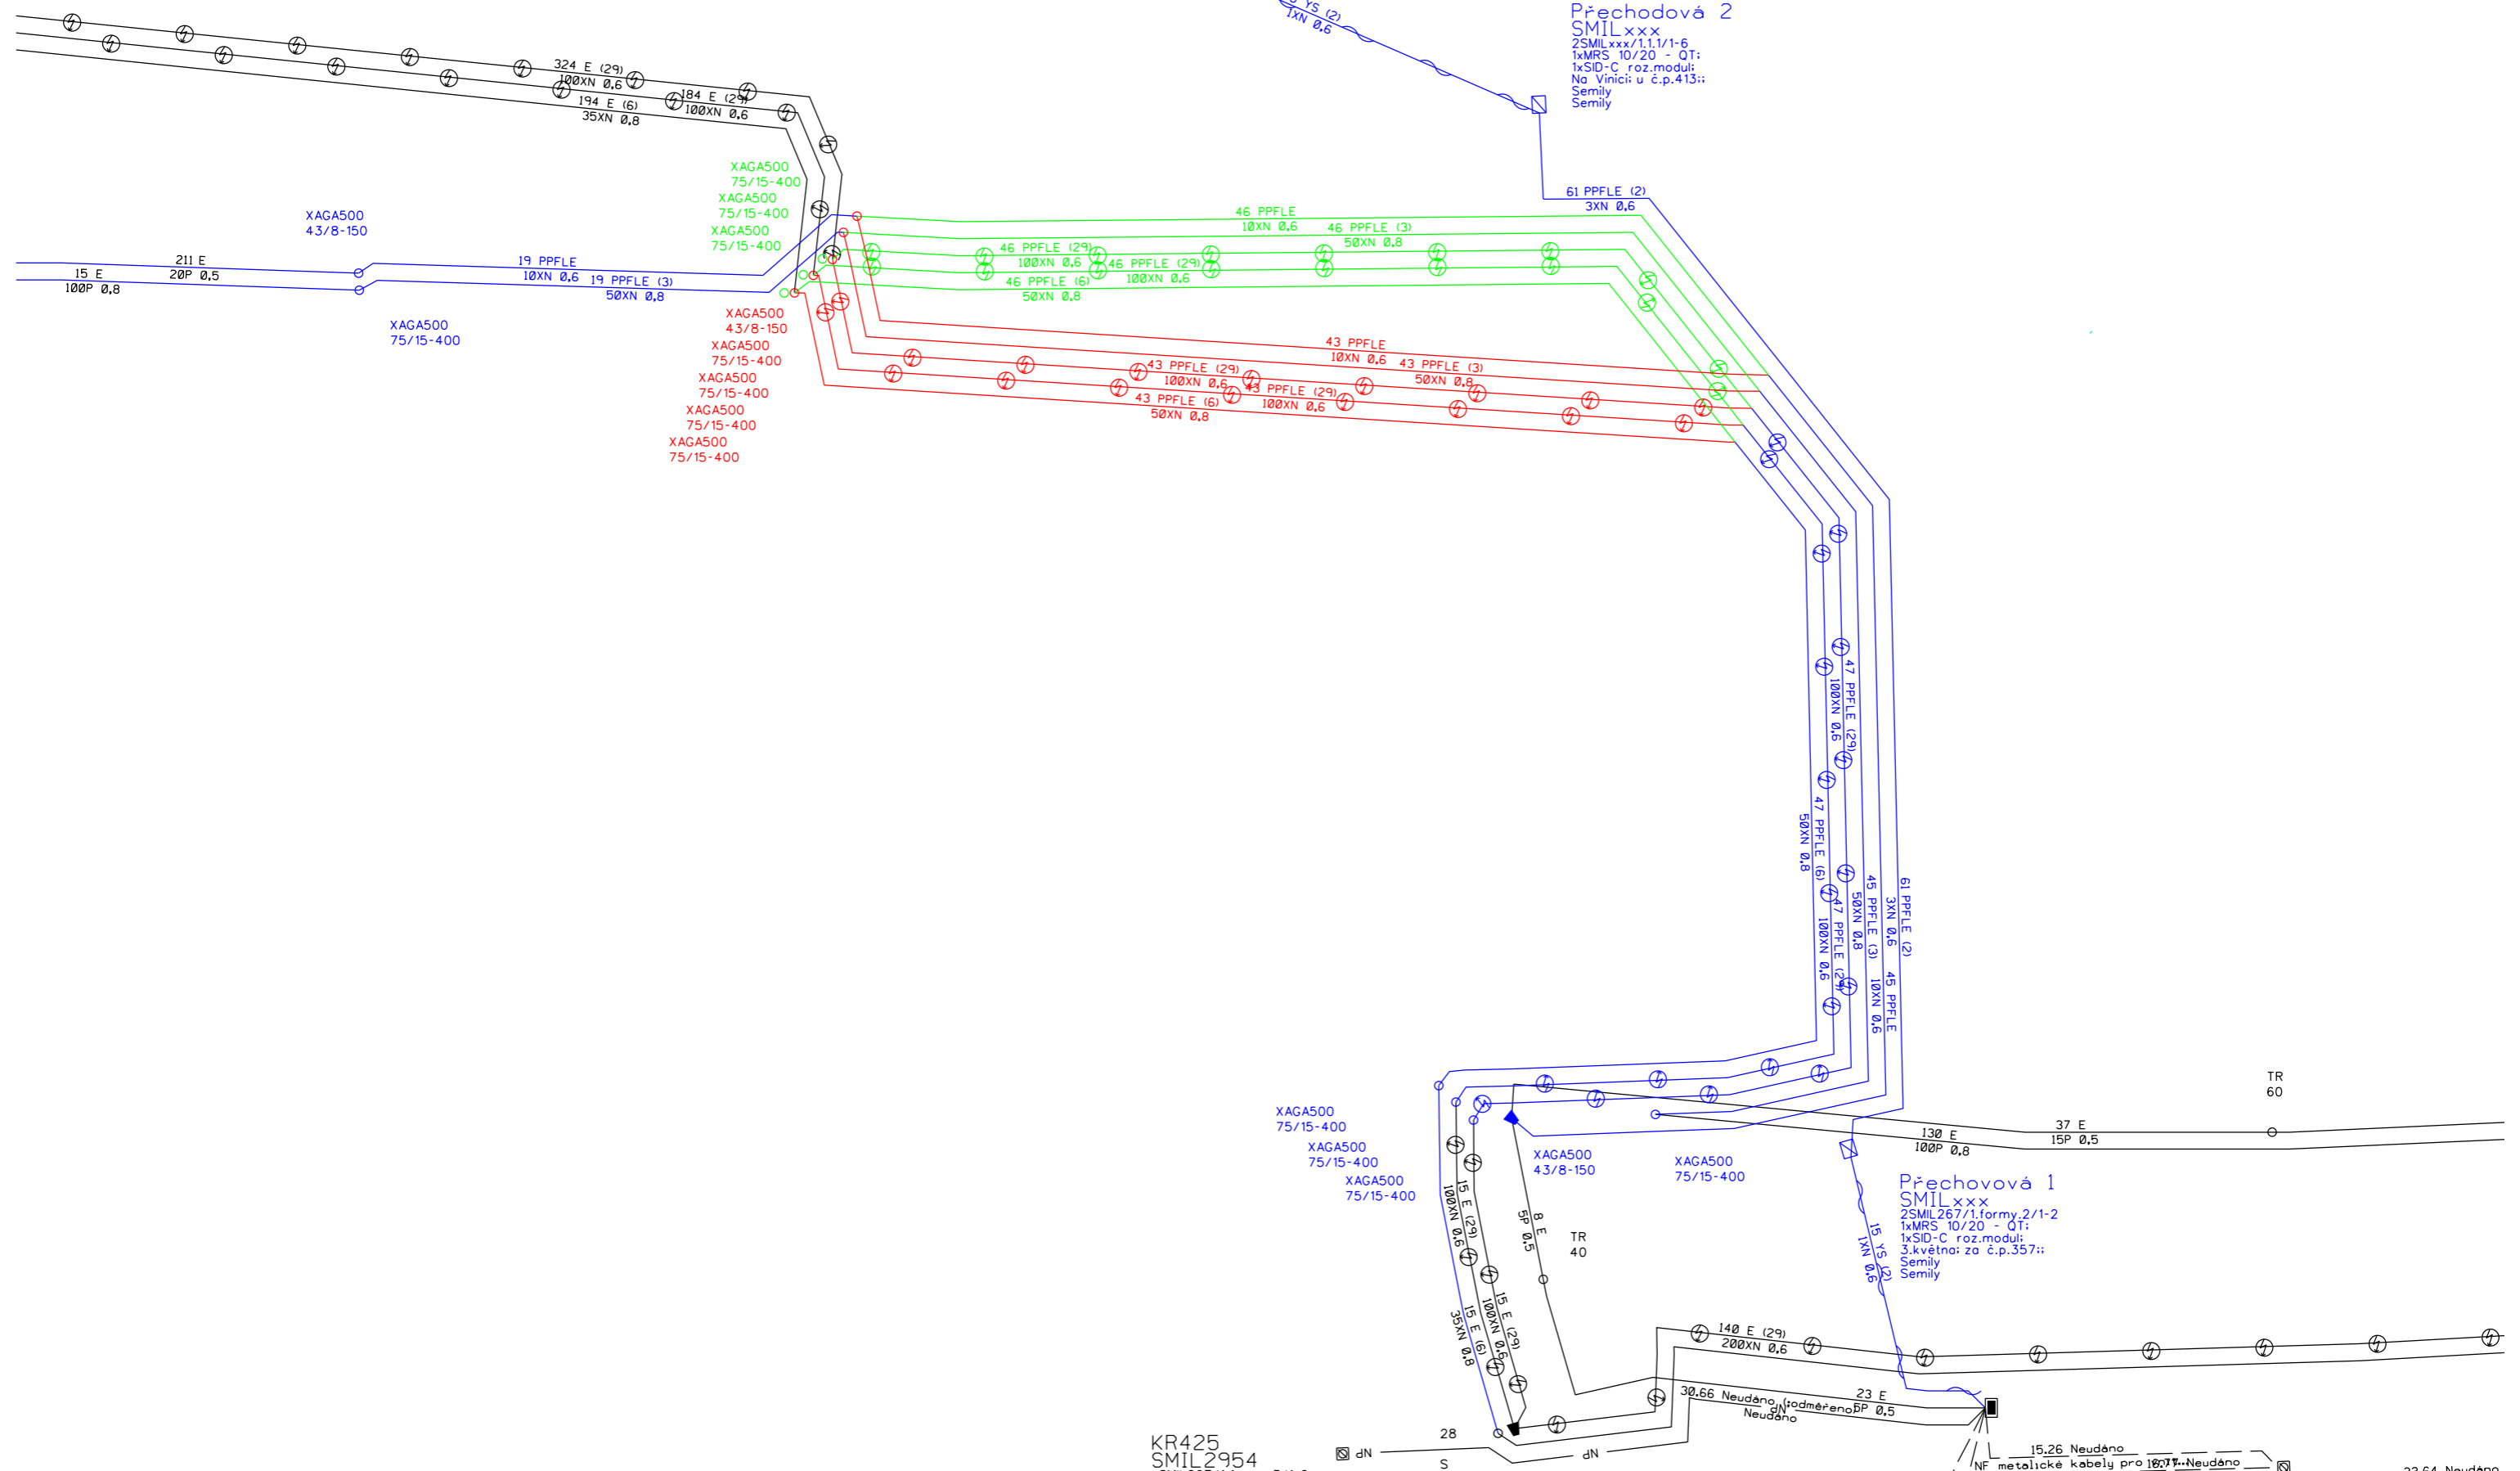

XAGA500
75/15-400
XAGA500
75/15-400
XAGA500
75/15-400
XAGA500
43/8-150
XAGA500
75/15-400
XAGA500
75/15-400
XAGA500
75/15-400
XAGA500
75/15-400

XAGA500
43/8-150
XAGA500
75/15-400
XAGA500
75/15-400
XAGA500
75/15-400
XAGA500
75/15-400

XAGA500
75/15-400
XAGA500
75/15-400
XAGA500
75/15-400
XAGA500
75/15-400

Přechodová 1
SMILxxx
2SMIL267/1.formy.2/1-2
1xMRS 10/20 - 0T:
1xSID-C roz.modul:
3.května: za č.p.357::
Semily
Semily

KR425
SMIL2954
xSMIL267/1.formy.3/1-2
1xMRK 2:
1xžór.sv.2p.:
3.května :425 ::
Semily
Semily

SR3/2
SMIL267
xSMIL49/1.4.2/16-20
1xVZ 10:
1xVZ-10:15xkab.forma 1p.:
3.května :357 ::
Semily
Semily

č.p.358
SMIL2785
xSMIL267/1.vnitřní.1/1-2:1.vnitřní.3/1-5
1xBOX 1.:
1xvod.f.LSA 10x1:2xkab.forma 1p.:2xkab.forma 1p.:
3.května :358 ::
Semily
Semily

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP- STAND. - 2021.08

Položková d: 2021.08

Název stavby: PPD CTN - Benešov u SM,Soc.péče TEREZA - změna

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

| | | | | | |
|-------------|-------|--------|--------|---------------|---|
| KMVYK: | 0.336 | KMP: | 66.266 | bytových HTS: | 0 |
| KMVYK: voz. | 0.004 | KMMK: | 0.610 | podnik. HTS: | 0 |
| km otvorů: | 0.000 | KMNT: | 0.000 | rekreač. HTS: | 0 |
| | | KMTRU: | 0.000 | PP HR: | 0 |
| | | KMOK: | 0.000 | PP UR: | 0 |
| | | KMVL: | 0.000 | | |
| | | KMTRK: | 0.000 | | |

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km

Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| PŘÍPRAVA | 38 112,88 Kč |
| ZEMNÍ PRÁCE | 158 090,18 Kč |
| MONTÁŽ | 144 425,21 Kč |
| GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA | 0,00 Kč |
| GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE | 14 367,13 Kč |
| VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA | 2 120,18 Kč |
| VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE | 45 730,41 Kč |
| PROVOZNÍ PRÁCE | 2 492,82 Kč |
| MATERIÁL DOD. CETIN | 0,00 Kč |
| MATERIÁL VYŘAZENÝ | 0,00 Kč |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný | 256 118,16 Kč |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný | 0,00 Kč |
| POPLATKY | 15 000,00 Kč |

Celkové náklady: **676 457 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST 575 493,49 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 100 963,47 Kč

Seznam položek

| Číslo SAP | Stavební činnost | Název položky | Množství | Celková cena |
|-----------|------------------|---|-------------|--------------|
| PŘÍPRAVA | | | | |
| 958210 | | Návrh cenový a technický bez projednání | 2.00 ks | 11 821,62 Kč |
| 954640 | | Projekt dopravně inženýrského opatření | 4960.00 JV | 4 960,00 Kč |
| 953634 | | Projekt tlkm liniové metalické sítě | 20174.80 JV | 20 174,80 Kč |
| 957746 | | Šetření technické rozšíření | 1.00 ks | 1 156,46 Kč |

ZEMNÍ PRÁCE

| | | | |
|----------|--|----------|--------------|
| 954970 S | Pokládka PE nebo vrapované chráničky | 300.00 m | 5 664,00 Kč |
| 954978 S | Povrchy nad rámeč litý asfalt podk.beton | 4.00 m2 | 4 155,60 Kč |
| 952345 S | Rýha v trávě 35/70-100 | 131.00 m | 46 189,29 Kč |
| 952355 S | Rýha v trávě 50/110 | 201.00 m | 93 651,93 Kč |
| 954952 S | Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130 | 4.00 m | 6 746,00 Kč |
| 955052 S | Vytyčení trasy ve volném terénu | 336.00 m | 1 683,36 Kč |

MONTÁŽ

| | | | |
|----------|---|------------|--------------|
| 955015 S | Demontáž samonos. kabelů do 5 XN | 40.00 m | 1 110,00 Kč |
| 955031 S | Demontáž úložných kabelů do 300 XN | 92.00 m | 3 014,84 Kč |
| 955030 S | Demontáž úložných kabelů do 50 XN | 92.00 m | 2 080,12 Kč |
| 955029 S | Demontáž úložných kabelů do15 XN | 46.00 m | 868,48 Kč |
| 952649 S | Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka | 11.00 ks | 1 800,70 Kč |
| 952650 S | Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka | 582.00 ks | 21 982,14 Kč |
| 954999 S | Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování | 885.00 ks | 22 284,30 Kč |
| 955268 S | Montáž podzemní tratě síťové metalické | 9849.20 JV | 9 849,20 Kč |

koordinace se stavbou koordinace se stavbou

| | | | |
|----------|---|------------|--------------|
| 955296 S | Montáž rozvaděče sloupového | 2.00 ks | 2 171,06 Kč |
| 954981 S | Montáž samonosných kabelů do 5 XN | 40.00 m | 1 362,00 Kč |
| 955282 S | Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek | 12.00 ks | 21 155,64 Kč |
| 955281 S | Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek | 3.00 ks | 3 588,90 Kč |
| 954990 S | Montáž úložných kabelů do 15 XN | 224.00 m | 4 804,80 Kč |
| 954992 S | Montáž úložných kabelů do 300 XN | 292.00 m | 11 028,84 Kč |
| 954991 S | Montáž úložných kabelů do 50 XN | 309.00 m | 8 179,23 Kč |
| 955303 S | Montáž uzemnění venkovního rozvaděče | 2.00 ks | 2 296,98 Kč |
| 955298 S | Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči | 8.00 ks | 201,44 Kč |
| 955259 S | Ukončení kabelu v rozvaděči | 4.00 ks | 1 460,72 Kč |
| 958469 S | Uvedení stavby do provozu | 3720.00 JV | 3 720,00 Kč |

| | | | |
|----------|---|----------|-------------|
| 955630 S | Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě | 3.00 ks | 3 369,96 Kč |
| 954985 S | Vystrojení jednoduchého patkov.stožáru | 1.00 ks | 2 355,72 Kč |
| 955028 S | Vystrojení na stávajících podpěrách - zrušení | 1.00 ks | 299,14 Kč |
| 954989 S | Vystrojení na stávajících podpěrách | 1.00 ks | 491,11 Kč |
| 958556 S | Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m | 1.00 ks | 2 775,51 Kč |
| 955022 S | Zrušení samonosných kabelů do 5 XN | 48.00 m | 1 029,60 Kč |
| 955066 S | Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř. | 3.00 ks | 2 493,30 Kč |
| 955067 S | Zrušení spojky smrštitelné nad 50 čtyř | 2.00 ks | 2 468,14 Kč |
| 955042 S | Zrušení úložných kabelů do 300 XN | 102.00 m | 2 699,94 Kč |
| 955041 S | Zrušení úložných kabelů do 50 XN | 123.00 m | 2 164,80 Kč |
| 955040 S | Zrušení úložných kabelů do15 XN | 95.00 m | 1 318,60 Kč |

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

| | | | |
|----------|---|---------|-------------|
| 955198 S | Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) | 2.00 ks | 6 219,22 Kč |
| 956286 S | Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km | 98.00 m | 2 494,10 Kč |
| 956285 S | Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka | 1.00 ks | 5 653,81 Kč |

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

| | | | |
|--------|--------------------------|---------|-------------|
| 955313 | Uzavření sml. o SB o VBŘ | 1.00 ks | 2 120,18 Kč |
|--------|--------------------------|---------|-------------|

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

| | | | |
|--------|--|-------------|--------------|
| 954830 | Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene odhad plnění Vbř | 40000.00 JV | 40 000,00 Kč |
| 955315 | Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ | 1.00 ks | 2 544,21 Kč |
| 958085 | Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN | 1.00 ks | 3 186,20 Kč |

PROVOZNÍ PRÁCE

| | | | |
|----------|--|---------|-------------|
| 957741 S | Zřízení doprav. značení malého rozsahu | 1.00 ks | 2 492,82 Kč |
|----------|--|---------|-------------|

POPLATKY

| | | | |
|--------|---|-------------|--------------|
| 955367 | Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. poplatky | 5000.00 JV | 5 000,00 Kč |
| 955369 | Poplatky k trubkám ochranným obetonování obetonování | 10000.00 JV | 10 000,00 Kč |

Limitka materiálu

| Číslo SAP | Stavební činnost | Název položky | Množství | Celková cena |
|-------------------------------------|------------------|---|-----------|--------------|
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný | | | | |
| 303918 S | | Deska krycí plast. 300x1000 mm | 332.00 ks | 12 622,64 Kč |
| 305833 S | | Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m | 4.00 kg | 233,56 Kč |
| 305789 S | | Drát ocelový pozink. D 4,0 mm | 0.30 kg | 19,15 Kč |
| 303795 S | | Fólie výstražná 220mm PE oranžová | 209.00 m | 802,56 Kč |
| 303813 S | | Fólie výstražná 330mm PE oranžová | 332.00 m | 1 467,44 Kč |
| 300122 S | | Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,6 | 206.00 m | 98 807,90 Kč |
| 300118 S | | Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,6 | 120.00 m | 6 934,80 Kč |
| 300116 S | | Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,6 | 61.00 m | 1 600,64 Kč |
| 300130 S | | Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,8 | 223.00 m | 94 402,59 Kč |
| 306430 S | | Lano uzemňovací 2 x 3 mm FeZn 1kg=8,77m | 2.00 kg | 176,52 Kč |
| 301277 S | | Lišta dřevěná 200x4,8x2,8 cm ochranná | 2.00 ks | 214,54 Kč |
| 302550 S | | Mini Marker 1401 3M Ball | 8.00 ks | 1 629,28 Kč |
| 312417 S | | Modul konektor. 4000-25P | 66.00 ks | 3 183,84 Kč |
| 312425 S | | Modul konektor. 9700-10P | 12.00 ks | 276,72 Kč |
| 306701 S | | Napínač šroubový oko-hák M 16 | 3.00 ks | 317,73 Kč |
| 303174 S | | Objímka stožár. D 140 mm rozvodná | 2.00 ks | 306,86 Kč |
| 309698 S | | Očnice kovová FeZn pro lano 10mm | 1.00 ks | 67,89 Kč |
| 309931 S | | Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m | 50.00 kg | 2 648,00 Kč |
| 305506 S | | Patka stožárová EZP 16x20x290 cm | 1.00 ks | 1 642,86 Kč |
| 310698 S | | Propojka uzem. 10114-00125 | 4.00 ks | 416,36 Kč |
| 306382 S | | Skříň rozváděče MRS 20-QT 10-20p-na sloup | 2.00 ks | 3 103,78 Kč |
| 301331 S | | Sloup dřevěný 6,5m-impregnace Korasit CK | 1.00 ks | 1 538,31 Kč |
| 320312 S | | Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15 | 1.00 ks | 146,90 Kč |
| 312845 S | | Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE | 3.00 ks | 1 236,45 Kč |
| 312889 S | | Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE | 12.00 ks | 8 634,24 Kč |
| 313998 S | | Svorka kabelová SH2 pro up. samon.kabelů | 1.00 ks | 139,85 Kč |
| 307033 S | | Svorka lanová D 9-12 mm | 2.00 ks | 32,48 Kč |
| 307015 S | | Svorka lanová D6-9 mm | 6.00 ks | 68,88 Kč |
| 316583 S | | Svorka zemnicí MRS 10,20 | 2.00 ks | 198,24 Kč |
| 309974 S | | Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm | 2.00 ks | 76,04 Kč |
| 309992 S | | Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm | 2.00 ks | 84,18 Kč |
| 309380 S | | Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400 | 2.00 ks | 240,20 Kč |
| 306843 S | | Svorník M 20x410x90x25 | 2.00 ks | 97,76 Kč |
| 302672 S | | Trubka PE 110/6,3/6000mm | 1.00 ks | 782,06 Kč |
| 302423 S | | Trubka vrapovaná 110/94 s lankem | 278.00 m | 11 361,86 Kč |
| 302343 S | | Trubka vrapovaná 40/32 s lankem | 17.00 m | 249,39 Kč |
| 309603 S | | Vana mont. SID-C 10P 14175-010 CZ | 2.00 ks | 132,98 Kč |
| 306180 S | | Zámek skříně 1370 L2 Sever-31423 | 2.00 ks | 222,68 Kč |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný | | | | |
| 401646 S | | Matice šestihřanná M 16,0 ČSN 021601 | 3.00 ks | 0,00 Kč |
| 401706 S | | Matice šestihřanná M 20,0 ČSN 021601 | 4.00 ks | 0,00 Kč |
| 304267 S | | Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá | 8.00 ks | 0,00 Kč |
| 301685 S | | Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda | 8.00 ks | 0,00 Kč |
| 404063 S | | Podložka D 17 mm ČSN 021702 | 3.00 ks | 0,00 Kč |
| 404280 S | | Podložka pérová D16,3 mm ČSN 021740 | 1.00 ks | 0,00 Kč |
| 404231 S | | Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M20 | 4.00 ks | 0,00 Kč |
| 408324 S | | Šroub s šestihř.hl. M16x180 ČSN021301 | 1.00 ks | 0,00 Kč |
| 408348 S | | Šroub s šestihř.hl. M16x45 ČSN021301 | 2.00 ks | 0,00 Kč |
| 314473 S | | Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY) | 2.00 m | 0,00 Kč |
| 402871 S | | Vrut s šestihř.hl. 10x80 mm ČSN021810 | 2.00 ks | 0,00 Kč |

Číslo Dohody:
Číslo Dohody stavebníka:

SAP: ...NE
Registr smluv: NE

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

CETIN a.s.

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
zastoupená [REDAKCE] Výstavba
PPS Čechy, na základě pověření ze dne 10.6.2020
(dále jen „**Nabyvatel**“)

a

[•]

se sídlem [•]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u [•]
IČO: [•]
DIČ: [•]
zastoupena [•]
(dále jen „**Převodce**“)

Nabyvatel a Převodce dále společně jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

dne, měsíce a roku níže uvedeného, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“) uzavírají tuto

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

(dále jen „**Dohoda**“)

1. PŘEDMĚT DOHODY

- 1.1 Převodce je na základě rozhodnutí o umístění stavby „[•]“, které bylo vydáno dne [•], [KÝM] pod čj. [•] a nabylo právní moci dne [•] (dále jen „**Rozhodnutí o umístění stavby**“) oprávněn k umístění [•] (dále jen „**Stavba**“). Rozhodnutí o umístění stavby je Přílohou č. 1 Dohody.
- 1.2 Předmětem převodu jsou některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to právo k umístění Stavby za podmínek v citovaném rozhodnutí stanovených, a dále s ním související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, tak jak jsou stanoveny v Rozhodnutí o umístění stavby.

2. PŘEVOD PRÁV

- 2.1 Převodce uzavřením Dohody, s účinností ke dni uzavření Dohody, převádí na Nabyvatele některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to toliko právo k umístění Stavby za podmínek v Rozhodnutí o umístění stavby stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Rozhodnutí o umístění stavby stanoveny.

.....

2.2 Převodce se zavazuje postoupení písemně oznámit Správnímu orgánu nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne uzavření Dohody.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Dohoda, a práva a povinnosti Smluvních stran z Dohody vyplývající, se řídí právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem, a případné spory budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

3.2 Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani projev učiněný po uzavření Dohody, jež není v Dohodě uveden, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek ani jedné ze Smluvních stran.

3.3 Dohoda může být měněna nebo zrušena pouze písemně; změna jinou formou je vyloučena. Pojmem „písemně“ se pro účely Dohody rozumí předání zpráv v listinné podobě anebo prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zaručený elektronický podpis**“). Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv než výše uvedených.

3.4 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Dohody byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Dohody, ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

3.5 Dohoda nabývá platnosti a účinnosti v den jejího uzavření.

3.6 Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.

3.7 Smluvní strany ujednaly, že Dohodu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Dohoda je uzavřena doručením Dohody opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.

3.8 Následující Přílohy jsou nedílnou součástí Dohody:

Příloha č. 1 – Rozhodnutí o umístění stavby

Nabyvatel:

Převodce:

V _____ dne _____

V _____ dne _____

CETIN a.s.
[]

[]
