
**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍŤE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. CB 2021_0047**

mezi

CETIN a.s.

a

Jihočeský kraj

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
ID DS: qa7425t
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená [REDAKCE] manažerem, dle Pověření ze dne 2.6.2021
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2019160003/6000
(dále jen „**CETIN**“)

a

Jihočeský kraj

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
ID DS: kdib3rr
zastoupený: MUDr. Martinem Kubou, hejtnanem Jihočeského kraje
(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Kaplice spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní,

kteřé umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*“ ze dne 28.2.2019 vydané pod čj. 556687 /19., jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Kaplice(CK),most ev.č.154-003-Malše**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickým) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá

společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektu,
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky,
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však čtyři (4) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí Městského úřadu Kaplice – rozhodnutí o umístění stavby Most ev. č. 154-003 přes Malši v Kaplici č.j. MěÚK/08051/2020 ze dne 16.3.2020, které nabylo právní moci dne 22.4.2020 (dále jen „**Územní rozhodnutí**“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v Územním rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Územním rozhodnutí výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Územní rozhodnutí je Přílohou č. 2 Smlouvy.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
- (c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady

vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **528 609,00 Kč** (slovy: pět set dvacet osm tisíc šest set devět korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do čtyř (4) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníků Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vážnoci na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,

- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:

- (a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši **46 961,00 Kč** (slovy: čtyřicet šest tisíc devět set šedesát jedna korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy,
- (b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.

6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.

6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.

- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: [REDACTED]
funkce: specialista pro výstavbu sítě
tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]
funkce: specialista pro výstavbu sítě
tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: MUDr. Martin Kuba
funkce: hejtman

ve věcech technických: Ivana Schwarzová
funkce: Oddělení přípravy a realizace silničních staveb
tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.

- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN od smlouvy dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.
- 9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
 - prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zaručený elektronický podpis**“);
 - e-mailovou zprávou opatřenou Zaručeným elektronickým podpisem;
 - e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou

specifikovány v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.7, věty první Smlouvy a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem (c) a d).

- 12.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.
- 12.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Ozámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
- 12.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.10 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.11 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.12 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

12.13 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoliv souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.14 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.

12.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN


Příloha č. 2 - Územní rozhodnutí Městského úřadu Kaplice – rozhodnutí o umístění stavby č.j. MěÚK/08051/2020 ze dne 16.3.2020,


Doložka

Rozhodování o uzavření této smlouvy bylo svěřeno hejtmanovi Jihočeského kraje usnesením rady kraje č. 887/2015/RK-69 ze dne 27. 8. 2015.


CETIN
V Praze

Stavebník
V Českých Budějovicích

 Digitálně podepsal

Datum: 2021.11.12
14:11:31 +01'00'

.....
CETIN a.s.

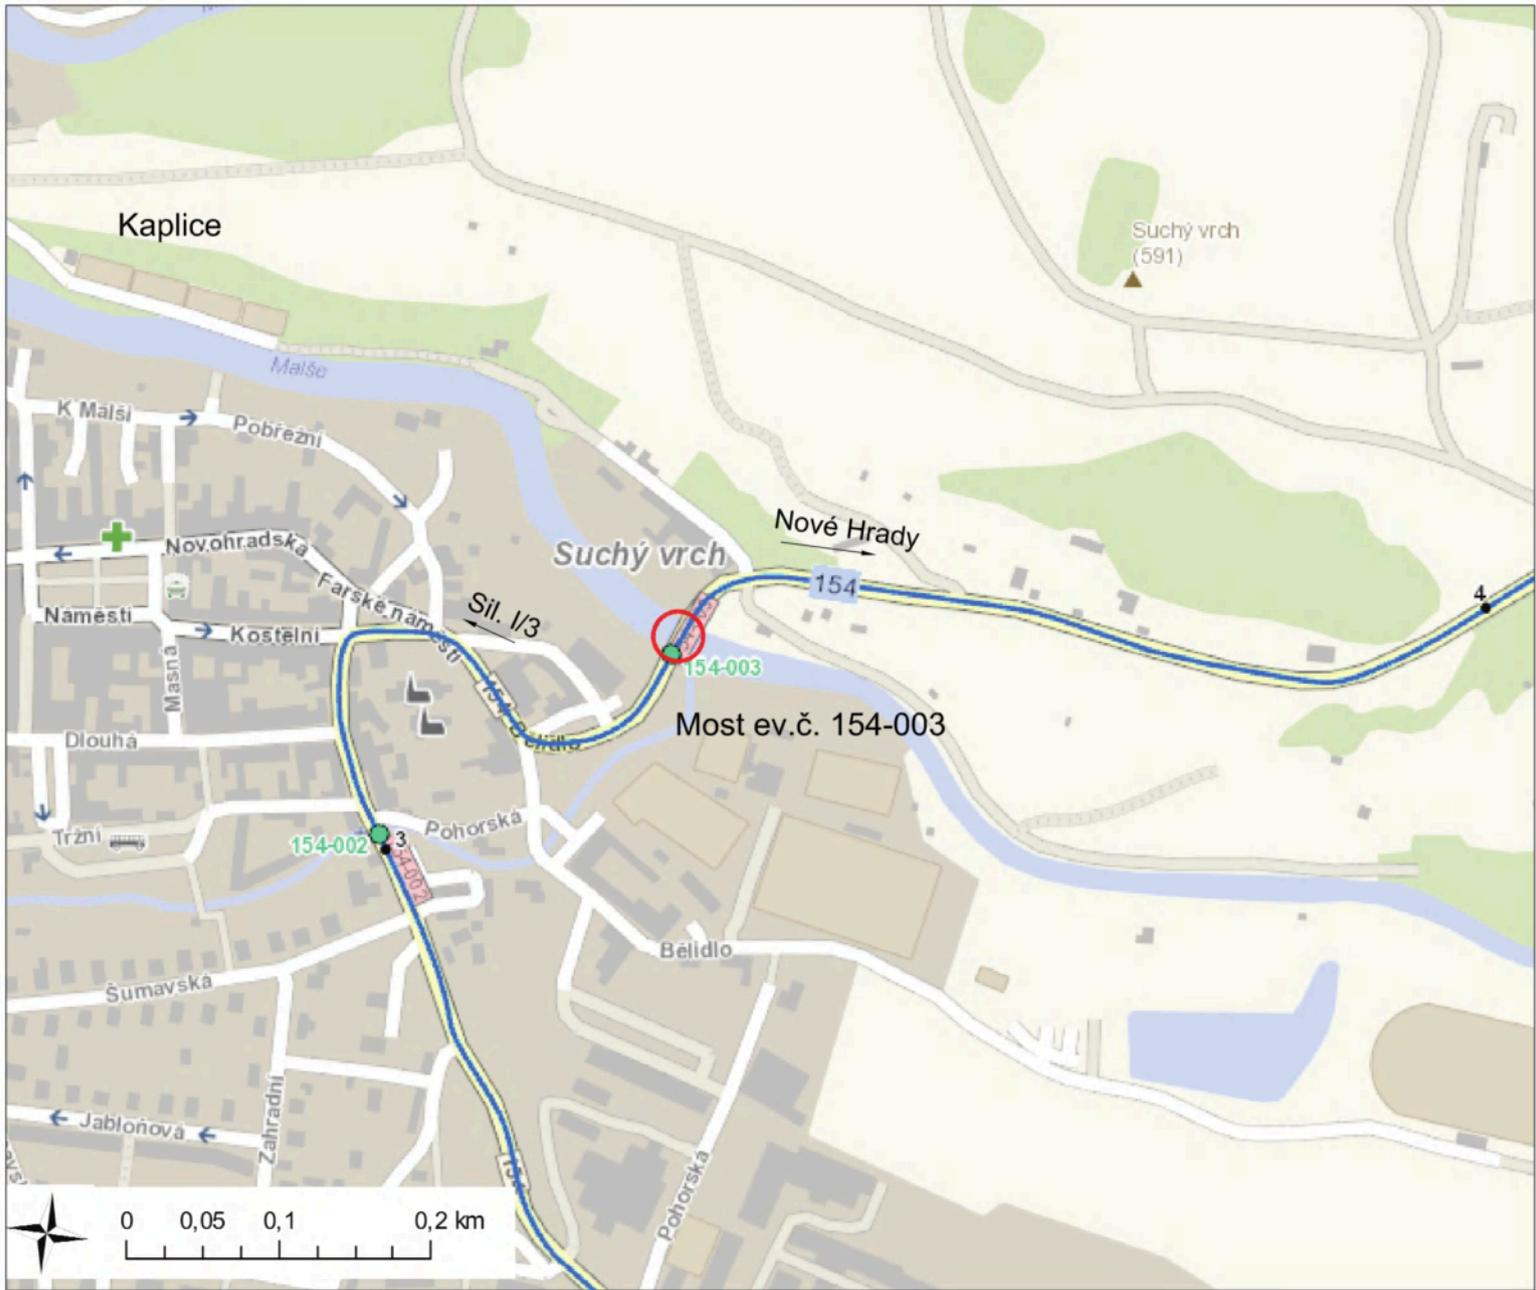manažer
(podepsáno elektronicky)

.....
Jihočeský kraj
MUDr. Martin Kuba
hejtman
(podepsáno elektronicky)



Souřadnicový systém: JTSK
 Výškový systém: Balt p.v.

Číslo zakázky:	19 703 00	HIP:	Ing. František KOŠÁN	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 244461038 stř. Č. Budějovice, Žižkova 12, 370 01
Schválil:	[REDACTED]	Zodp. projektant:	[REDACTED]	
Tech. kontrola:	[REDACTED]	Vypracoval:	[REDACTED]	

Objednatel:	Jihočeský kraj	Obec:	Kaplice	Kraj:	Jihočeský
Akce:	MOST EV. Č. 154-003 PŘES MALŠI V KAPLICI			Datum:	Stupeň
Objekt:	.			5/2019	DŮR
Příloha:	PŘEHLEDNÁ SITUACE			Souprava	Č. přílohy
					C.1

Název stavby: VPIC Kaplice(CK),most ev.č.154-003-Malše
 Číslo SPP prvku:
 Zhotovitel PD: CETIN, XXXXXXXXXX
 KPO:
 HOST:
 VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.130	KMP:	30.000	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.150	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.150	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	26 946,46 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	182 328,38 Kč
MONTÁŽ	64 175,45 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	6 683,69 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	6 628,19 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	13 330,44 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	31 844,96 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	156 671,69 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	40 000,00 Kč

Celkové náklady: 528 609 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 417 703,23 Kč
 NESTAVEBNÍ ČINNOST 110 906,03 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210	Návrh cenový a technický bez projednání		1.00 ks	6 171,50 Kč
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě		20774.96 JV	20 774,96 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954969 S	Podvrt řízený do 150 mm		40.00 m	134 454,40 Kč
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		8.00 m	191,20 Kč
952367 S	Pokládka žlabů TK1		8.00 m	645,28 Kč
955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové		1686.40 JV	1 686,40 Kč
inženýrská činnost				
955550 S	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm		30.00 m	2 502,30 Kč
955577 S	Rýha v chodníku 35/50-70		10.00 m	5 876,10 Kč
955578 S	Rýha v chodníku rozšíření o10cm		20.00 m	3 361,20 Kč
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100		80.00 m	32 042,40 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu		130.00 m	1 569,10 Kč
MONTÁŽ				
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba		150.00 m	595,50 Kč

952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	3.00 ks	533,88 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	172.00 ks	7 064,04 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	172.00 ks	4 709,36 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	3.00 ks	287,46 Kč
955001 S	Montáž jedné čtyřky za provozu	175.00 ks	19 166,00 Kč
955255 S	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	2.00 ks	78,18 Kč
955288 S	Montáž koncovky SKH	2.00 ks	109,50 Kč
955282 S	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	3.00 ks	5 749,74 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	150.00 m	2 685,00 Kč
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	150.00 m	6 160,50 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3778.28 JV	3 778,28 Kč
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	2.00 ks	2 442,38 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	5 749,37 Kč
955042 S	Zrušení úložných kabelů do 300 XN	85.00 m	2 445,45 Kč
955041 S	Zrušení úložných kabelů do 50 XN	137.00 m	2 620,81 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA			
956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km	30.00 m	573,90 Kč
956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	6 109,79 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE			
956283 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km	30.00 m	518,40 Kč
956282 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	6 109,79 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	4.00 ks	13 330,44 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
958747 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	7 899,52 Kč
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	4.00 ks	10 368,12 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z XN	4.00 ks	13 577,32 Kč
POPLATKY			
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. náhrada za VBŘ	40000.00 JV	40 000,00 Kč

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
Limitka materiálu				
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		90.00 m	397,80 Kč
300131 S	Kabel plastový TCEPKPFL 100x4x0,8		150.00 m	136 302,00 Kč
316547 S	Koncovka smršť. SKH 4 25/55 mm		2.00 ks	304,24 Kč
302788 S	Koncovka trubky 40 mm Plasson		2.00 ks	230,82 Kč
301225 S	Kostra spojky ML 400x300mm NITTO		3.00 ks	526,77 Kč
316688 S	Kryt spojky F3 300mm plast-NITTO		3.00 ks	508,95 Kč
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball		7.00 ks	1 425,62 Kč
312425 S	Modul konektor. 9700-10P		35.00 ks	807,10 Kč
408094 S	Páska PVC 38mmx10m antikorozi NITTO		3.00 ks	612,54 Kč
301311 S	Páska smršťovací E-3515 k RPBS-I		3.00 ks	1 200,93 Kč
316316 S	Plena samovulk. 57GO 150mmx10m NITTO		0.30 ks	2 055,18 Kč
305338 S	Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1		16.00 ks	792,96 Kč
303501 S	Spojka plastová 110/94 mm		1.00 ks	36,66 Kč
300030 S	Trubka HDPE 40/33 oranžová		150.00 m	3 615,00 Kč
302672 S	Trubka PE 110/6,3/6000mm		8.00 ks	6 256,48 Kč
302483 S	Vodič propoj. s V svorkou A6 10114-A6L50		4.00 ks	295,20 Kč
305195 S	Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1		8.00 ks	1 303,44 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267 S	Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá		3.00 ks	0,00 Kč



Městský úřad Kaplice

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Linecká 391, CZ – 382 41 Kaplice, tel.: 380 303 105, fax: 380 303 108
www.mestokaplice.cz, identifikátor DS: b3ib5e9, jakub.zahourek@mestokaplice.cz

Toto rozhodnutí nabylo účinnosti
dnem 22. 4. 2020



V Kaplici 16.3.2020

Vyřizuje: [REDACTED]

Čj: MěÚK/08051/2020

Spisová značka: SZ-01586/2020-ODSH [REDACTED]

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu č.p. 1952/2
370 01 České Budějovice



MUKASS02843741

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Kaplice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 15.1.2020 podal

Jihočeský kraj, IČO 70890650, U Zimního stadionu č.p. 1952/2, 370 01 České Budějovice,
který zastupuje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, Nemanická č.p. 2133/10,
370 10 České Budějovice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

„Most ev. č. 154-003 přes Malši v Kaplici“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1482 (ostatní plocha), parc. č. 1483 (trvalý travní porost), parc. č. 1484 (ostatní plocha), parc. č. 1587/1 (ostatní plocha), parc. č. 1587/2 (ostatní plocha), parc. č. 2046/2, parc. č. 2057/1 v katastrálním území Kaplice, parc. č. 376/3 (trvalý travní porost), parc. č. 381/1 (ostatní plocha), parc. č. 381/2 (ostatní plocha), parc. č. 384/1 (ostatní plocha), parc. č. 3355/2 (vodní plocha), parc. č. 3359 (ostatní plocha) v katastrálním území Blansko u Kaplice.

Druh a účel umísťované stavby:

- SO 001 - Demolice stávajícího mostu
- SO 101 - Silnice II/154
- SO 102 - Chodník pro pěši

- SO 201 - Most ev. č. 154-003
- SO 202 - Úhlová zeď
- SO 311 - Přeložka vodovodu a vodovodní přípojka
- SO 441 - Veřejné osvětlení
- SO 461 - Přeložka kabelu CETIN
- SO 901 - Provizorní most

Umístění stavby na pozemku:

- parc. č. 1482, parc. č. 1483, parc. č. 1484, parc. č. 1587/1, parc. č. 1587/2, parc. č. 2046/2, parc. č. 2057/1 v katastrálním území Kaplice, parc. č. 376/3, parc. č. 381/1, parc. č. 381/2, parc. č. 384/1, parc. č. 3355/2, parc. č. 3359 v katastrálním území Blansko u Kaplice

Určení prostorového řešení stavby:

- liniová stavba komunikací a stavba mostu na výše uvedených pozemcích.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- výše uvedené pozemky.
- vlivem realizace stavby dojde ke krátkodobému zhoršení životního prostředí v bezprostředním okolí, po dokončení nebude mít stavba negativní vliv na životní prostředí.

II. Stanoví podmínky pro umístění (SO 001, SO 101, SO 102, SO 201, SO 202, SO 901) a provedení (SO 311, SO 441, SO 461) stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 1482, parc. č. 1483, parc. č. 1484, parc. č. 1587/1, parc. č. 1587/2, parc. č. 2046/2, parc. č. 2057/1 v katastrálním území Kaplice, parc. č. 376/3, parc. č. 381/1, parc. č. 381/2, parc. č. 384/1, parc. č. 3355/2, parc. č. 3359 v katastrálním území Blansko u Kaplice v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území na podkladě katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Pro uskutečnění umísťované stavby se jako stavební pozemek vymezuje pozemek parc. č. 1482, parc. č. 1483, parc. č. 1484, parc. č. 1587/1, parc. č. 1587/2, parc. č. 2046/2, parc. č. 2057/1 v katastrálním území Kaplice, parc. č. 376/3, parc. č. 381/1, parc. č. 381/2, parc. č. 384/1, parc. č. 3355/2, parc. č. 3359 v katastrálním území Blansko u Kaplice.
3. Projektová dokumentace v dalším stupni (DSP) bude v souladu s podmínkami uvedenými v závazném stanovisku Městského úřadu Kaplice, Odboru životního prostředí, územního plánování a památkové péče ze dne 3.2.2020 č.j. MěÚK/03576/2020.:
 - a) Před započítáním realizace záměru budou na dotčeném pozemku vytýčeny hranice záboru zemědělské půdy. Stavebník se bude řídit zásadami ochrany ZPF (ust. § 4 zákona o ochraně ZPF), zejména bude co nejméně narušovat hydrologické a odtokové poměry v území, síť zemědělských účelových komunikací a organizaci zemědělského půdního fondu.
 - b) Podle bilance skrývky kulturních vrstev půdy bude skrývka kulturní vrstvy půdy z plochy trvale odňaté ze ZPF provedena dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ZPF na vlastní náklady z celé odnímané plochy o výměře 30,00m². Objem orníční vrstvy půdy z této plochy činí 15,00m³.
 - c) Skrytou kulturní vrstvu půdy je povinen zabezpečit stavebník stavby tak, aby nedošlo k jejímu zcizení, zaplevelení a znehodnocení. Skrytá kulturní vrstva půdy bude využita k zúrodnění částí pozemku dle KN parc.č. 1483 v k. ú. Kaplice, obec Kaplice.
 - d) O činnostech souvisejících s přemístěním, rozprostřením či jiným využitím a ošetřováním skryté kulturní vrstvy půdy bude veden protokol (pracovní deník), ve kterém budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení účelnosti využívání této půdy v souladu s ust. § 10 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.
 - e) Stavebník stavby učiní po dobu výstavby opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek, které by mohly poškodit zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.

- f) Při stavební činnosti nedojde k takovému zásahu, který by nepříznivě ovlivnil hydrologické a odtokové poměry v území. V případě porušení této podmínky, musí být neprodleně zjednána náprava na náklady stavebníka stavby.
 - g) Podle ust. § 11 odst. 1) zákona za trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro realizaci předmětného záměru na pozemcích dle KN parc.č. 1483 v k. ú. Kaplice, obec Kaplice, bude předepsán finanční odvod za odnětí zemědělské půdy ze ZPF po zahájení stavby.
 - h) Orientační výše odvodů za odnětí půdy ze ZPF – trvalé/ MOST EV. Č. 154-003 PŘES MALŠI V KAPLICI je stanovena na částku 1638,00Kč.
4. Před zahájením stavby (SO 311, SO 441, SO 461) zajistí stavebník vytýčení podzemních sítí. Stavebník odpovídá za to, že existující podzemní a nadzemní sítě nebudou stavbou poškozeny. Práce v blízkosti těchto sítí budou prováděny dle pokynů správců jednotlivých sítí. (viz. příslušná vyjádření/souhlasy):
- a) E.ON Distribuce, a.s., Poskytování informací k sítím, souhlas ze dne 8.3.2019 č.j. Z0980-16308580.
 - b) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření ze dne 28.2.2019 č.j. 556687/19.
 - c) ČEVAK a.s., vyjádření č.j. O19070087072 ze dne 28.2.2019, vyjádření č.j. O19070089858 ze dne 10.4.2019.
 - d) E.ON Distribuce, a.s., souhlas ze dne 9.4.2019.
5. Projektová dokumentace v dalším stupni (DSP) bude v souladu s podmínkami uvedenými v závazném stanovisku Městského úřadu Kaplice, Odbor životního prostředí, územního plánování a památkové péče ze dne 22.1.2020 č.j. MěÚK/01099/2020.:
- a) Při provádění prací a následném užívání stavby, nesmí dojít k úniku závadných látek do povrchových ani podzemních vod.
 - b) Veškeré použité materiály budou zabezpečeny před vniknutím do vodního toku, bude co možná nejvíce zabráněno zakalení toku.
 - c) Bude zabráněno zanášení koryta vodního toku během prací.
 - d) Při stavebních pracích bude zohledněna možnost vylití toku z koryta a bude postupováno podle povodňového plánu, který bude zpracován a předložen správci vodního toku a příslušnému povodňovému orgánu k odsouhlasení.
 - e) Pokud bude na stavbě zacházeno s větším množstvím závadných látek, tak bude pro stavbu vypracován havarijný plán podle ust. § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona a ust. § 6 odst. 5 vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků a předložen k odsouhlasení správci vodního toku a ke schválení vodoprávnímu úřadu.
6. Projektová dokumentace v dalším stupni (DSP) bude v souladu s podmínkami uvedenými v souhlasu vlastníka sousedního pozemku parc. č. 376/6 k.ú. Blansko u Kaplice ze dne 2.5.2019 - [REDAKCE]
- a) Zachování přístupu na naši zahradu vjezdovou bránou v době výstavby nového mostu.
7. Projektová dokumentace v dalším stupni (DSP) bude v souladu s podmínkami uvedenými v souhlasu vlastníka sousedního pozemku st. p. 111/1 k.ú. Blansko u Kaplice ze dne 12.4.2019 [REDAKCE] Jitka Kořínková.
- a) Bude zachováno napojení objektu č.p. 82 Blansko na veřejný vodovodní a kanalizační řád.
8. Projektová dokumentace v dalším stupni (DSP) bude v souladu s podmínkami uvedenými v závazném stanovisku Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, Dopravní inspektorát –ze dne 25.4.2019, č.j. KRPC-51527-1/ČJ-2019-020206.
9. Projektová dokumentace v dalším stupni (DSP) bude v souladu s podmínkami uvedenými v koordinovaném závazném stanovisku Městského úřadu Kaplice ze dne 24.5.2019 č.j. MěÚK/11440/2019.:

- a) Stavebník v průběhu stavby bude vést evidenci o předání odpadů z realizace stavby oprávněné osobě a to konkrétní množství těchto druhů odpadů, jako bylo uvedeno ve schválené projektové dokumentaci a v případě potřeby umožní stavebnímu úřadu po ukončení stavby do této evidence nahlédnout.
 - b) Nekontaminovaná zemina vytěžená během stavební činnosti bude použita ve svém přirozeném stavu pouze v místě stavby. Využití mimo místo stavby se řídí vyhláškou č. 294/2005 Sb.
 - c) Pokud bude při stavebních pracích zjištěn výskyt obojživelníků, nebo jejich vývojových stádií budou přeneseny na bezpečné místo.
 - d) V případě prací v blízkosti vzrostlých dřevin bude postupováno v souladu s ČSN 839061.
 - e) Při stavbě nedojde ke znečištění vodního toku závadnými látkami ani jiným materiálem.
 - f) Po ukončení prací budou okolní pozemky navráceny do původního stavu.
10. Projektová dokumentace v dalším stupni (DSP) bude v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádření a stanovisku Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava č.j. 47718/2019-142 ze dne 22.7.2019.:
- a) Pro provádění stavby bude vypracován povodňový a havarijný plán, který bude předložen Povodí Vltavy, státní podnik k odsouhlasení.
 - b) V případě čištění mostní konstrukce musí být stavba zajištěna tak, aby nedocházelo k padání abraziva do koryta toku.
 - c) Případné pomocné konstrukce zasahující do průtočného profilu pod mostem budou při povodňových průtocích včas odstraněny z koryta toku. V případě použití pontonů budou tyto pevně uchyceny ke břehu a v případě dosažení 1 SPA na 1mg ve stanici Kaplice (110 cm - 24,1 m³/s) budou ihned odstraněny z koryta vodního toku.
 - d) Stavbou dotčené pozemky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik budou uvedeny do původního stavu.
 - e) Provoznímu úseku Malše v Římově bude pro potřeby správce toku předáno zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení vodního toku a souběhu s vodním tokem.
 - f) Požadujeme oznámit termín zahájení a ukončení prací.
 - g) Požadujeme před zahájením řízení o povolení stavby majetkoprávní vypořádání.
11. Stavba bude prováděna tak (**SO 311, SO 441, SO 461**), aby nebyly poškozeny sousední objekty nebo porosty. Je třeba si počínat tak, aby jejím vlastníkům nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněným omezením jejich práv a právem chráněných zájmů, k nadměrnému znečištění okolí stavby, k poškozování majetku a k nepořádku na staveništi. Vzniklé škody budou nahrazeny nebo odstraněny na náklady investora.
12. Ke kolaudaci stavby (**SO 311, SO 441, SO 461**) bude mimo jiné doloženo: doklad o likvidaci odpadů vzniklých při stavbě, zaměření skutečného provedení stavby, prohlášení o shodě, vytyčovací protokol, předávací protokol, výkresy skutečného provedení stavby s případnými změnami, těsnostní a tlaková zkouška vodovodu a kanalizace, revizní zpráva elektro.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu č.p. 1952/2, 370 01 České Budějovice
Město Kaplice, Náměstí č.p. 70, 382 41 Kaplice
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Holečkova č.p. 106/8, 150 00 Praha

Odůvodnění:

Dne 15.1.2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 24.1.2020 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 5.2.2020.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Kaplice, Odbor životního prostředí, územního plánování a památkové péče ze dne 3.2.2020 č.j. MěÚK/03576/2020.
- Souhlas vlastníka pozemku [REDAKCE] parc. č. 381/1 k.ú. Blansko u Kaplice ze dne 12.12.2019.
- MO SNM, vyjádření ze dne 15.3.2019 č.j. 500/4/2015-1150-39.
- E.ON Distribuce, a.s., Poskytování informací k sítím, souhlas ze dne 8.3.2019 č.j. Z0980-16308580.
- E.ON Distribuce, a.s., Poskytování informací k sítím, vyjádření ze dne 28.2.2019 č.j. H18585-16308580.
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření ze dne 28.2.2019 č.j. 556687/19.
- Vyjádření účastníků řízení [REDAKCE] ze dne 6.3.2019.
- Město Kaplice, Odbor správy majetku a ekonomiky ze dne 6.3.2018.
- ČEVAK a.s., vyjádření č.j. O19070087072 ze dne 28.2.2019, vyjádření č.j. O19070089858 ze dne 10.4.2019.
- Městský úřad Kaplice, Odbor životního prostředí, územního plánování a památkové péče, Závazné stanovisko ze dne 8.7.2019 č.j. MěÚK/18290/2019.
- Městský úřad Kaplice, Odbor životního prostředí, územního plánování a památkové péče, Závazné stanovisko ze dne 22.1.2020 č.j. MěÚK/01099/2020.
- Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc. č. 376/6 k.ú. Blansko u Kaplice ze dne 2.5.2019 - [REDAKCE]
- Souhlas vlastníka pozemku dotčeného stavbou parc. č. 381/2 k.ú. Blansko u Kaplice ze dne 3.4.2019 [REDAKCE]
- Souhlas vlastníka sousedního pozemku st. p. 111/1 k.ú. Blansko u Kaplice ze dne 12.4.2019 [REDAKCE]
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, závazné stanovisko ze dne 30.4.2019 č.j. KHSJC 10826/2019/HOK CB-CK,
- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, závazné stanovisko č.j. HSCB-1630-2/2019 UO-CK ze dne 7.5.2019,
- Město Kaplice, sdělení ze dne 30.4.2019 č.j. MěÚK/11257/2019.
- Městský úřad Kaplice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, vyjádření ze dne 17.4.2019 č.j. MěÚK/12033/2019.
- Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, Dopravní inspektorát – stanovisko ze dne 25.4.2019, č.j. KRPC-51527-1/ČJ-2019-020206.
- NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., vyjádření ze dne 23.4.2019 č.j. 132190033.

- E.ON Distribuce, a.s., souhlas ze dne 9.4.2019.
- Městský úřad Kaplice, Koordinované závazné stanovisko ze dne 24.5.2019 č.j. MěÚK/11440/2019.
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, vyjádření a stanovisko č.j. 47718/2019-142 ze dne 22.7.2019.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Nebyly stanoveny

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.


Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje České Budějovice, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměňuje.

Příloha:

- situační výkres v měřítku 1:500

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona:

účastníci (dodejky)

1. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona:

2. Město Kaplice, Náměstí č.p. 70, 382 41 Kaplice 1

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:

3. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf

7. E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu

8. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

9. ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona:

10. TVMT s.r.o., IDDS: i888thb

11. AGRO SVOBODA s.r.o., IDDS: hz7yhs2

18. MONETA Money Bank, a.s., IDDS: 3kpd8nk

19. Efrema Business, a.s. v likvidaci, IDDS: 2gwsxqy

Na vědomí:


20. Městský úřad Kaplice, Odbor životního prostředí, územního plánování a památkové péče, Náměstí č.p. 70, 382 41 Kaplice 1

21. Městský úřad Kaplice, Odbor stavební úřad, Náměstí č.p. 70, 382 41 Kaplice 1

22. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c

23. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov - Dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73

24. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, IDDS: ph9aiu3

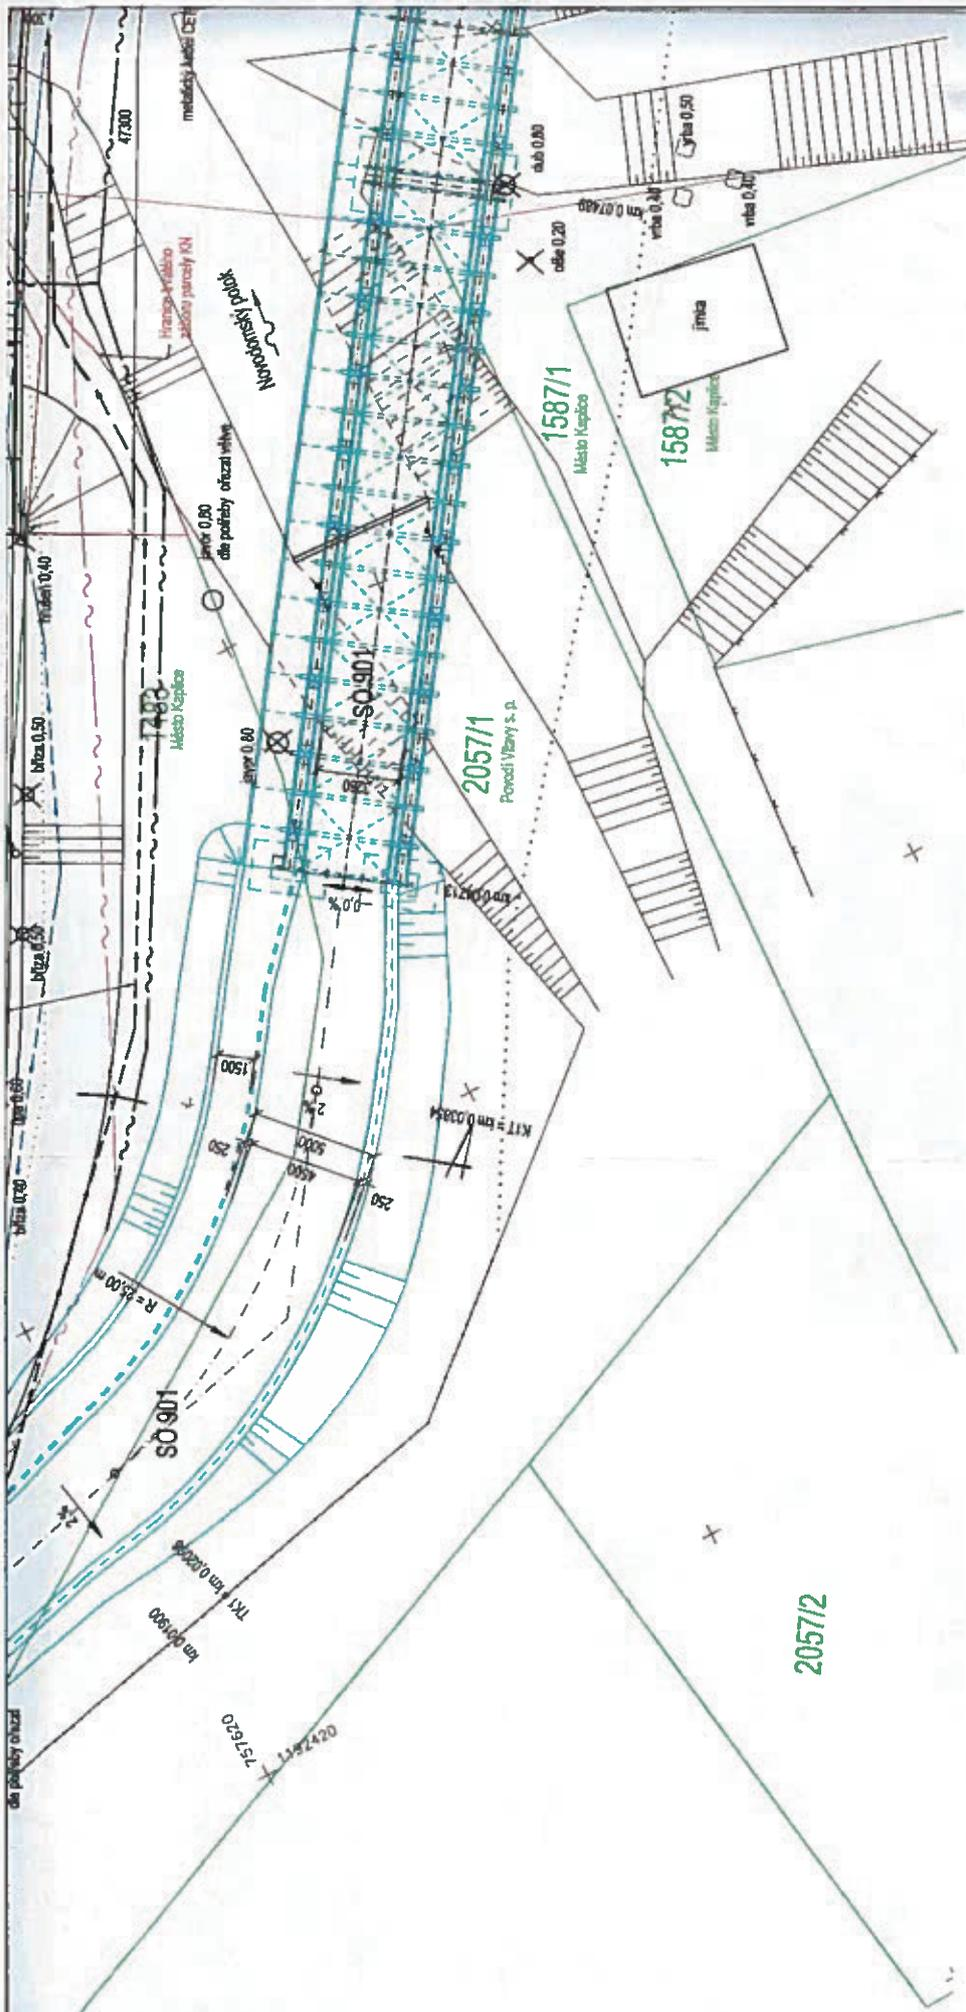


Legenda :


- Podzemní kabel AN EON
- Kanalizace
- Metalský sítěvací kabel CETIN
- Vodovod

Seznam stavebních objektů :

- SO 001 : Depolice stávajícího mostu
- SO 101 : Silnice II/101
- SO 102 : Chodník pro pěší
- SO 201 : Most ev. č. 154-003
- SO 202 : Úhlové zdi
- SO 311 : Přeložka vodovodu a vodovodní přípojky
- SO 441 : Veřejné osvětlení
- SO 461 : Přeložka kabelu CETIN
- SO 801 : Ozelenění
- SO 901 : Provizorní most

Koordináční situace stavby M 1:200

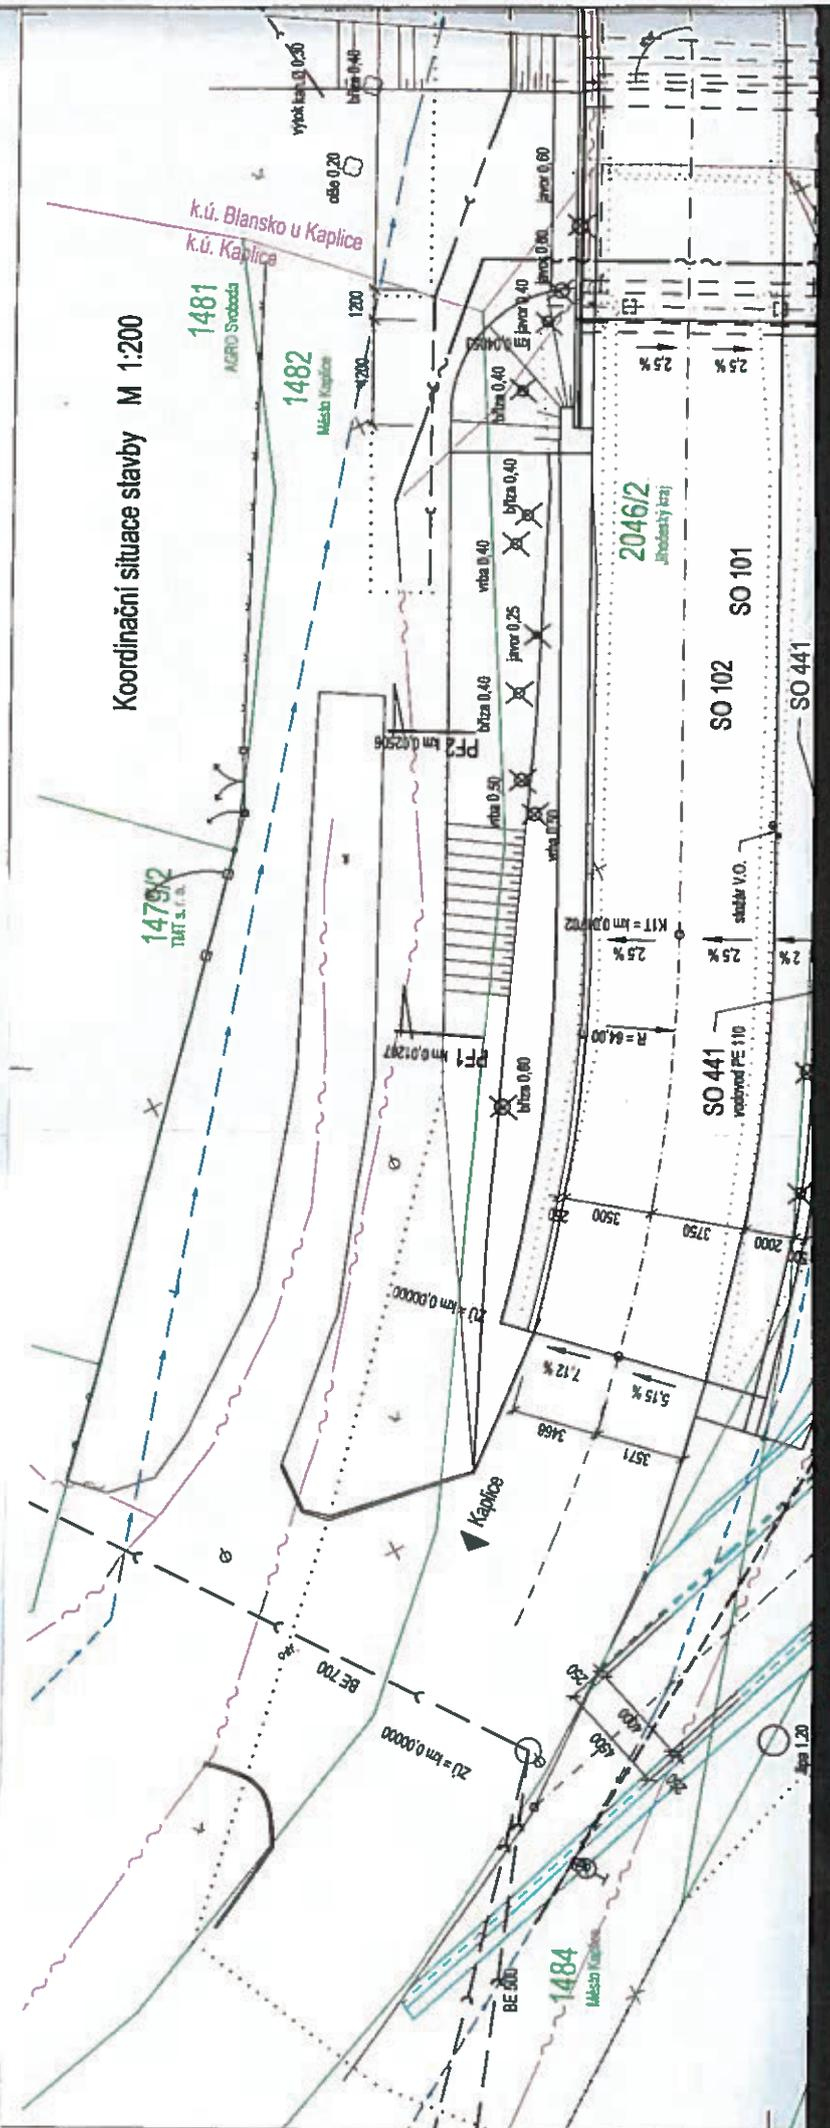

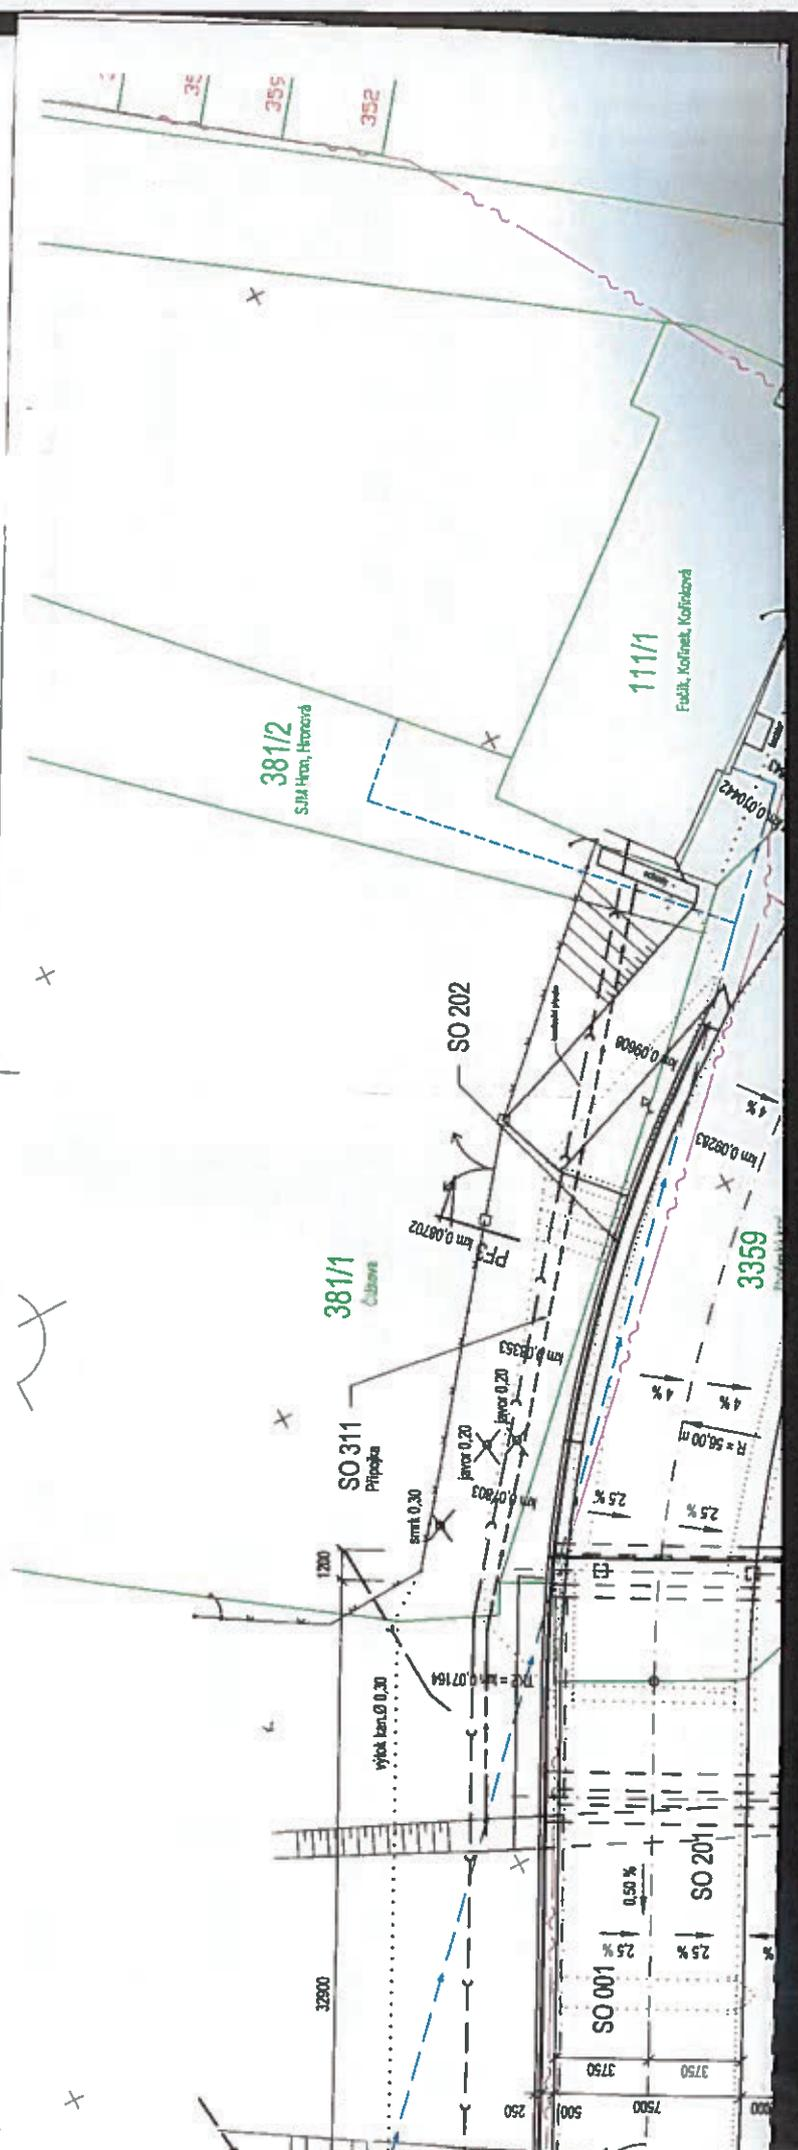



Městský úřad Kaplice

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Linecká 391, CZ – 382 41 Kaplice, tel.: 380 303 105, fax: 380 303 108

www.mestokaplice.cz, identifikátor DS: b3ib5e9

V Kaplici 22.4.2020

Vyřizuje:

Čj: MěÚK/10489/2020

Spisová značka: SZ-01586/2020-ODSH/Žah

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu č.p. 1952/2
370 01 České Budějovice



MUKASS02859051

SDĚLENÍ

Městský úřad Kaplice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že územní rozhodnutí č.j. MěÚK/08051/2020 ze dne 16.3.2020 pro stavbu „Most ev. č. 154-003 přes Malši v Kaplici“

nabylo právní moci

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dne 22.4.2020 a je vykonatelné.

Městský úřad Kaplice
Odbor dopravy a silničního hospodářství
382 41 Kaplice

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Příloha: - rozhodnutí č.j. MěÚK/08051/2020 s vyznačením právní moci
- ověřená projektová dokumentace

Obdrží:

účastníci (dodejky)

1. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická č.p. 2133/10, České Budějovice 3, 370 10
České Budějovice 10



69. jednání Rady Jihočeského kraje dne 27. 08. 2015

K bodu: Svěření rozhodování o smlouvách s vlastníky veřejné technické infrastruktury a o dohodách o předčasném užívání stavby

Usnesení č. 887/2015/RK-69

Rada Jihočeského kraje

I. svěřuje

podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, hejtmanovi rozhodování o uzavírání smluv s vlastníky veřejné technické infrastruktury a rozhodování o uzavírání dohod o předčasném užívání stavby se zhotoviteli stavby, a to pro účely správních řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, týkajících se staveb pozemních komunikací.

II. ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.
