

SMLOUVA O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renesná třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČ: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen: [REDAKCE]
ve věcech běžného plnění smlouvy: [REDAKCE]
[REDAKCE]
číslo smlouvy objednatele: 16000064

a

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
se sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno
IČ: 25317628
DIČ: CZ25317628
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
[REDAKCE]
zapsán dne v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144
zastoupen Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
ve věcech běžného plnění smlouvy [REDAKCE]
ve věcech technických [REDAKCE]
číslo smlouvy zhotovitele: 3/2016

II.

Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele opravu chodníků na ulici Filipínského v Brně dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu včetně přílohy s názvem „Ulice Filipínského - oprava chodníků“, v jejímž rámci je tato smlouva o dílo uzavírána (dále jen „dílo“).

(2) Přesný popis díla:

Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a jsou zařazeny pod číselný kód 42.11 Klasifikace produkce (CZ-CPA).

III.

Termíny provedení díla a místo plnění

- (1) Provádění díla bude zahájeno: 03/2016
- (2) Provádění díla bude ukončeno: 10/2016
- (3) Místo plnění: Brno
- (4) Dílo bude provedeno dle přiloženého harmonogramu plnění prací zhotovitele zpracovaného podle termínů zahájení a ukončení provádění díla dle této smlouvy a tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

IV.

Cena díla

- (1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena **bez DPH na 3 469 825,07 Kč.**
- (2) Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
- (3) Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami.
- (4) Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, náklady na komplekaci, zaškolení obsluhy, apod.).
- (5) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V.

Splatnost ceny

- (1) Objednatel uhradí smluvní cenu za dílo postupně, placením skutečně a řádně provedených prací v jednotlivých měsících, na základě soupisu skutečně provedených prací, potvrzeného oběma smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při konečné fakturaci budou odečteny dříve zaplacené částky z titulu dílčí fakturace.
- (2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena dle §28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na adresu sídla společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, Štýřice.
- (3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- (4) Zhotovitel na každé faktuře uvede číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
- (5) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
- (6) Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
- (7) Zhotovitel se zavazuje uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky a číslo smlouvy objednatele.

VI.

Předání staveniště

(1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 15 dnů po podpisu této smlouvy, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla.

(2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak, současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení provádění díla, zejména stavební povolení.

(3) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

(4) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.

(5) Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel na svůj náklad.

(6) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.

(7) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvláště v oblasti bezpečnosti práce za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“, bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. zejména při uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.

(8) Objednatel nezajišťuje vytyčení sítí, energií, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku ani dopravní značení.

VII.

Stavební deník

(1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky, apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.

(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.

(4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno do tří dnů.

(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

VIII.

Technický dozor

(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.

(2) Technický dozor je oprávněn nařídít přerušování prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.

(3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.

IX.

Další povinnosti smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.

(2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.

(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu na své náklady.

X.

Předání a převzetí díla

(1) Zhotovitel oznámí objednateli, kdy bude dílo bez vad a nedodělků připraveno k předání, a to nejméně 15 dnů předem, u prací netrvajících déle než 3 měsíce pak nejméně 4 dny předem.

(2) Zhotovitel v součinnosti s objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude zahájeno předávací řízení.

(3) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:

- zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
- zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
- originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních a v elektronické podobě
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby odsouhlasené geodetem objednatele ve dvou vyhotoveních.

(4) Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, do jaké doby je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci. Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.

(5) Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.

(6) Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem při kolaudaci díla.

XI.

Záruka na dílo

(1) Zhotovitel přejímá na provedené dílo tuto záruku:

- záruční doba činí **60 měsíců** a začíná běžet ode dne předání díla,
- zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v souladu se smlouvou a platnými technickými a právními předpisy, a že po dobu trvání záruční doby bude způsobilé k užívání k obvyklému účelu a zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle platných právních a technických předpisů.

(2) Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemně, a to ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy je zjistil. V reklamaci objednatel uvede, o jaké vady se jedná, jak se projevují, popř. v jaké lhůtě požaduje jejich odstranění.

(3) Objednatel je oprávněn zvolit, zda požaduje odstranění vad či přiměřenou slevu z ceny.

(4) Zhotovitel je povinen do deseti dnů od doručení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či ne, a z jakých důvodů. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že uznává reklamaci v plném rozsahu. Pokud objednatel zvolí odstranění vad, je zhotovitel povinen je odstranit bezplatně ve lhůtě dohodnuté s objednatel.

(5) Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na tu část díla, na které byly odstraněny vady díla v rámci záruky za dílo, dodatečnou záruční dobu v délce jednoho roku ode dne předání a převzetí části díla s odstraněnými vadami. Toto ustanovení se uplatní v případě, že k odstranění vady díla dojde ve lhůtě kratší než jeden rok před koncem běhu záruční lhůty dle tohoto čl. XI., odst. 1, první odrážka.

XII.

Další ujednání

(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků,
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů, jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.

(3) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.

(4) V případě použití subdodavatele nebo subdodavatelů při plnění předmětu smlouvy se zhotovitel zavazuje předložit seznam subdodavatelů participujících na její realizaci ke schválení objednateli. Objem subdodávek nepřevyší 30 % hodnoty předmětu smlouvy.

(5) Hospodaření s vytěženým materiálem se řídí směrnicí objednatele. Podmínky vyplývající z této směrnice budou zhotoviteli objasněny při předání staveniště a upřesněny v protokolu vytěženého materiálu.

(6) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.

(7) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(8) Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

(9) Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírání žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

(1) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, považuje:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
- prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 20 dní,
- prodlení objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění smlouvy o více než 20 dní,
- úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb. insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Dojde-li k výše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. na její poslední známou adresu bez ohledu na to, zda toto oznámení o odstoupení bylo druhou smluvní stranou převzato či nikoliv.

XIV.

Sankce

(1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

(2) V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo s jeho předáním bez zavinění objednatele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

(3) Při prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

(4) V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště způsobem a ve lhůtách dle čl. X je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení.

(5) V případě, že některá ze smluvních stran poruší své povinnosti dle čl. XII., je povinna zaplatit druhé straně smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé takové porušení.

(6) Zhotovitel je na základě ustanovení čl. XII. odst. 1 této smlouvy povinen zabezpečit prokazatelné proškolení každého pracovníka na staveništi s předpisy BOZP. Zhotovitel udělí pracovníku na staveništi pokutu za každé porušení předpisů BOZP, a to ve výši 200,- Kč (slovy: dvě sta korun českých) až 1 500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých) dle intenzity porušení. Do doby zaplacení pokuty zhotovitel nevpustí takového pracovníka na staveniště.

(7) V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této

skutečnosti zápis do stavebního deníku dle čl. VII. této smlouvy. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli.

(8) Smluvní pokuta udělená mezi objednatelem a zhotovitelem bude započtena na časově nejbližší fakturu vystavenou zhotovitelem.

(9) V případě, že zhotovitel použije k realizaci předmětu smlouvy subdodavatele nebo více subdodavatelů, použijí se na tyto subjekty ustanovení čl. XIV., odst. 6 a 7 obdobně.

(10) Nároky na náhradu škody nejsou dotčeny ani kompenzovány zaplacením úroků z prodlení nebo smluvních pokut dle této smlouvy.

XV.

Důvěrnost informací

(1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:

- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

(2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.

(3) Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.

(4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.

(5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVI.

Závěrečná ustanovení

(1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.

(4) Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na zmocnění dané objednatelem statutárním městem Brnem mandátní smlouvou č. 3/2000 ze dne 10.3.2000 a jejích dodatků.

(5) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

(6) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

(7) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

(8) Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy dle textu smlouvy.

(9) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Seznam subdodavatelů zhotovitele

Příloha č. 3: Harmonogram


Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne

29 -02- 2016

V Brně dne



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 9346 Ulice Filipínského - oprava chodníků

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
Renneská třída 1a
65768 Brno

IČ: 60733098
DIČ: CZ60733098

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 171 585,07
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			75 000,00
Ostatní náklady			223 240,00
Celkem			3 469 825,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	3 469 825,07
Základní DPH	21 %	728 663,26

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

4 198 488,3

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
000	Ostatní a vedlejší náklady					

000.1	Ostatní a vedlejší náklady		298 240	62 630	360 870
101	Stavební úpravy				
101.1	Stavební úpravy		3 171 585	666 033	3 837 618
Celkem za stavbu			3 469 825		4 198 488

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			439 390,19	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			164 480,45	
5	Komunikace	HSV			1 486 668,40	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			11 946,00	
8	Trubní vedení	HSV			16 974,00	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			296 761,90	
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			1 612,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			388 547,89	
961	Zemní práce	HSV			80 145,87	
962	Bourání konstrukcí - hmoty	HSV			240 019,79	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			45 038,58	
VN	Vedlejší náklady	VN			75 000,00	
ON	Ostatní náklady	ON			223 240,00	
Cena celkem					3 469 825,07	

Položkový rozpočet

S:	9346	Ulice Filipínského - oprava chodníků
O:	000	Ostatní a vedlejší náklady
R:	000.1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	VN	Vedlejší náklady				75 000,00
1	00511 R	Geodetické práce <i>Dle zákona č.10/1974 Sb. ve znění pozdějších předpisů.</i>	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
2	005121 R	Zařízení staveniště <i>Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.</i>	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				223 240,00
3	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť <i>Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. Včetně nákladů na případné provedení kopaných sond.</i>	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
4	005211030R	Dočasná dopravní opatření <i>Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.</i>	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
5	00523 R	Zkoušky a revize <i>Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí, jako např. zkoušky nad rámec KZP, apod.</i>	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení <i>Náklady na zajištění autorského dozoru a vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</i>	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
7	00526a	Finanční náklady <i>Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním údržby vegetačních ploch po dobu 36 měsíců po dokončení stavby.</i>	m2	912,00000	20,00	18 240,00
8	00526b	Finanční náklady <i>Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním náhradní výsadby za asanované stromy ve výši 319.382,- Kč.</i>	soubor	1,00000	130 000,00	130 000,00
9	00526c	Finanční náklady <i>Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním pasportu stávajících budov, konstrukcí a tech.zařízení.</i>	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00

Položkový rozpočet

S:	9346	Ulice Filipínského - oprava chodníků
O:	101	Stavební úpravy
R:	101.1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				439 390,19
1	112100011RA0	Kácení stromů 30-40 cm, naložení a odvoz vč. likvidace	kus	3,00000	2 500,00	7 500,00
2	112100012RA0	Kácení stromů 40-50 cm, naložení a odvoz vč. likvidace	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
3	112100014TA0	Kácení stromů nad 60 cm, naložení a odvoz vč. likvidace	kus	1,00000	7 500,00	7 500,00
4	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, bagrem s kladivem odhad : 5,0	m3	5,00000	4 520,00	22 600,00
5	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 strojně i ručně včetně příplateku za lepkovost, blízkost vedení a odstranění kořenů v prostoru odkopávek. Začátek provozního součtu chodník : 1601,0*0,16 vjezdy, parkov.stání : 107,36*0,32+490,64*0,28+48,0*0,42 Konec provozního součtu 0,5*448,054	m3	224,02700	165,00	36 964,46
6	122302203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 10000 m3 strojně i ručně včetně příplateku za lepkovost, blízkost vedení a odstranění kořenů v prostoru odkopávek.	m3	224,02700	210,00	47 045,67
7	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 2*224,027	m3	448,05400	127,00	56 902,86
8	162601152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m3	5,00000	202,00	1 010,00
9	180403111R00	Založení trávníku parterového výsevem v rovině	m2	912,00000	22,30	20 337,60
10	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se ztuhnutím	m2	2 860,00000	16,20	46 332,00
11	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovností do 10 cm v rovině	m2	912,00000	20,60	18 787,20
12	182303111R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině	m2	912,00000	21,20	19 334,40
13	183901148R00	Doplnění zeminy tl. vrstvy 0,1m, nádoba pl. 7,0 m2	kus	5,00000	281,00	1 405,00
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	448,05400	260,00	116 494,04
15	199000000R00	Poplatek za skládku suti 5,0*2,1	t	10,50000	250,00	2 625,00
16	00572422R	Směs travní OBNOVA balení 25 kg PROFIL 912,00*0,04*1,03	kg	37,57440	95,00	3 569,57
17	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy 912,00*0,05*1,03 6,0*0,1*5	m3	49,96800	550,00	27 482,40
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				164 480,45
18	388111110U00	Žlaby betonové do rýhy TK 1 67,0+67,0	m	134,00000	189,30	25 366,20
19	388317777R00	Těleso trub. kabelovodu z bet.C 12/15 otevř. výkop Včetně: - vyrovnání povrchu mezivrstev, - úpravy krycí desky nad tělesem kabelovodu.	m3	7,26280	2 832,00	20 568,25
		3,14*0,11*0,1*91,0		3,14000		
		3,14*0,16*0,1*82		4,12000		
20	388992111T00	Trubky tělesa kabelovodu AROT 110 mm, výkop Provedeno dle PD.	m	82,00000	177,00	14 514,00
21	388992212R00	Trubky tělesa kabelovodu AROT 110 mm, dělená 9,0+82,0	m	91,00000	262,00	23 842,00

	22	388994212R00	Trubky tělesa kabelovodu AROT 160/4,2 mm, výkop	m	81,00000	208,00	16 848,00
	23	388995111T00	Trubky tělesa kabelovodu AROT 160/6,2 mm, půlená	m	81,00000	782,00	63 342,00
			Provedeno dle PD.				
Díl:	5		Komunikace				1 486 668,40
	24	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	1 743,00000	120,00	209 160,00
	25	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm	m2	454,50000	160,00	72 720,00
	26	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm včetně nákladů na opatření dle TP 170.	m2	454,50000	274,00	124 533,00
	27	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	310,00000	25,00	7 750,00
	28	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00000	510,00	158 100,00
	29	596211113U00	Klad zámek dl tl60 skA 300m2- chod 1681+62	m2	1 743,00000 1 743,00000	230,00	400 890,00
	30	596211233U00	Klad zámek dl tl80 skC 300m2- chod	m2	454,50000	250,00	113 625,00
	31	592451151R	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé 80*1,05	m2	84,00000 84,00000	264,00	22 176,00
	32	592451158R	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm červená, dlažba pro nevidomé 46*1,05	m2	48,30000 48,30000	338,00	16 325,40
	33	592451170R	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní 402*1,05	m2	422,10000 422,10000	150,00	63 315,00
	34	592451171R	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm červená 6,50*1,05	m2	6,82500 6,82500	180,00	1 228,50
	35	5924511900R	Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní 1601*1,05+62*1,05	m2	1 746,15000 1 746,15000	170,00	296 845,50
Díl:	62		Úpravy povrchů vnější				11 946,00
	36	622470051RA0	Omítka stěn vnější, oprava zídek složitost 2 oprava zídek do výšky 20cm : 165,0*0,2	m2	33,00000 33,00000	362,00	11 946,00
Díl:	8		Trubní vedení				16 974,00
	37	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	4,00000	1 620,00	6 480,00
	38	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte 2+9	kus	11,00000 11,00000	954,00	10 494,00
Díl:	9i		Doplňující práce na komunikaci				296 761,90
	39	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	14,00000	580,00	8 120,00
	40	916261111R00	Osazení řady betonové dlažby do bet. lože 2*16,6+4*53,4	m	246,80000 246,80000	116,00	28 628,80
	41	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 844+70	m	914,00000 914,00000	210,00	191 940,00
	42	40445920R	Stojan k silničním dopravním značkám jednoduchý	kus	9,00000	520,00	4 680,00
	43	40445962.AR	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	9,00000	445,00	4 005,00
	44	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní	kus	812,00000	59,50	48 314,00
	45	59217460R	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm 28+70	kus	98,00000 98,00000	70,50	6 909,00
	46	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	4,00000	69,50	278,00
	47	592451170R	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní 2*16,6*0,10*1,05+4*53,4*0,10*1,05	m2	25,91400 25,91400	150,00	3 887,10
Díl:	93		Dokončovací práce inženýrských staveb				1 612,00
	48	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu podkladu živice/beton	m2	310,00000	5,20	1 612,00
Díl:	96		Bourání konstrukcí				388 547,89
	49	113107230U00	Odstraň podklad 200m2- beton 10cm 2704,6424+26,5 6,0*0,3	m2	2 732,94240 2 731,14240 1,80000	69,80	190 759,38
	50	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	505,59434	80,00	40 447,55
	51	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	4 550,34910	6,80	30 942,37
	52	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno	t	505,59434	250,00	126 398,59
Díl:	961		Bourání konstrukcí - suti				80 145,87
	53	113107143R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	48,00000	59,00	2 832,00

		2,0*2,0*0,5*2+(15,0+2,0)*2,0+5,0*(0,0+2,0)/2*2		48,00000		
54	113108305R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 5 cm	m2	26,50000	97,50	2 583,75
55	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	310,00000	172,52	53 481,20
56	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	52,18300	80,00	4 174,64
57	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	208,73200	6,80	1 419,38
		4*52,183		208,73200		
58	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	52,18300	300,00	15 654,90
Díl:	962	Bourání konstrukcí - hmoty				240 019,79
59	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	2 000,00000	36,10	72 200,00
60	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těžném	m2	99,56000	26,50	2 638,34
		10/10 : 17,0*4,68+6,0*1,0+3,5*4,0		99,56000		
61	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	35,50000	36,10	1 281,55
62	113201112U00	Vytrhání obruba silniční ležatá	m	20,00000	102,00	2 040,00
		rozšíření vozovky : 20,0		20,00000		
63	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	205,00000	50,10	10 270,50
		výsadbová místa : (3,0+2,0)*2*27/2		135,00000		
		70		70,00000		
64	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	200,00000	55,20	11 040,00
		u park.stání vlevo :		60,00000		
		6,0+2,5*2+3,75+2,5+5,25+2,25+2,5*2+2,75+2,5*11				
		přídlažba dvojrádek : 2*70		140,00000		
65	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	9,00000	332,00	2 988,00
66	966006211R00	Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí	kus	14,00000	39,30	550,20
67	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	225,00000	20,30	4 567,50
		205+20		225,00000		
68	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	119,56000	22,60	2 702,06
		99,56+60,0*0,1+2*70*0,10		119,56000		
69	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	363,21850	80,00	29 057,48
70	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 452,87400	6,80	9 879,54
		4*363,2185		1 452,87400		
71	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	363,21850	250,00	90 804,63
		Uložení na skládce vyřezaného materiálu BKOM a.s. předepsaným způsobem nebo uložení a poplatek na nejbližší řízené skládce.				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				45 038,58
72	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	847,70521	53,13	45 038,58




Mlýnská 68, 602 00 BRNO

SUBDODAVATELÉ – Čestné prohlášení

Předkládáme seznam subdodavatelů


SUI	% z celé zakázky	DRUH ČINNOSTI
I.F.O. a 3064/68L, 612 00 Brno IC: 01977822, tel. [REDACTED] [REDACTED]	0,2	Geodetické a zeměměřičské práce
Celkem	0,2	

V Brně dne 10.2.2016



Ulice Filipínského
- oprava chodníků

Harmonogram prací

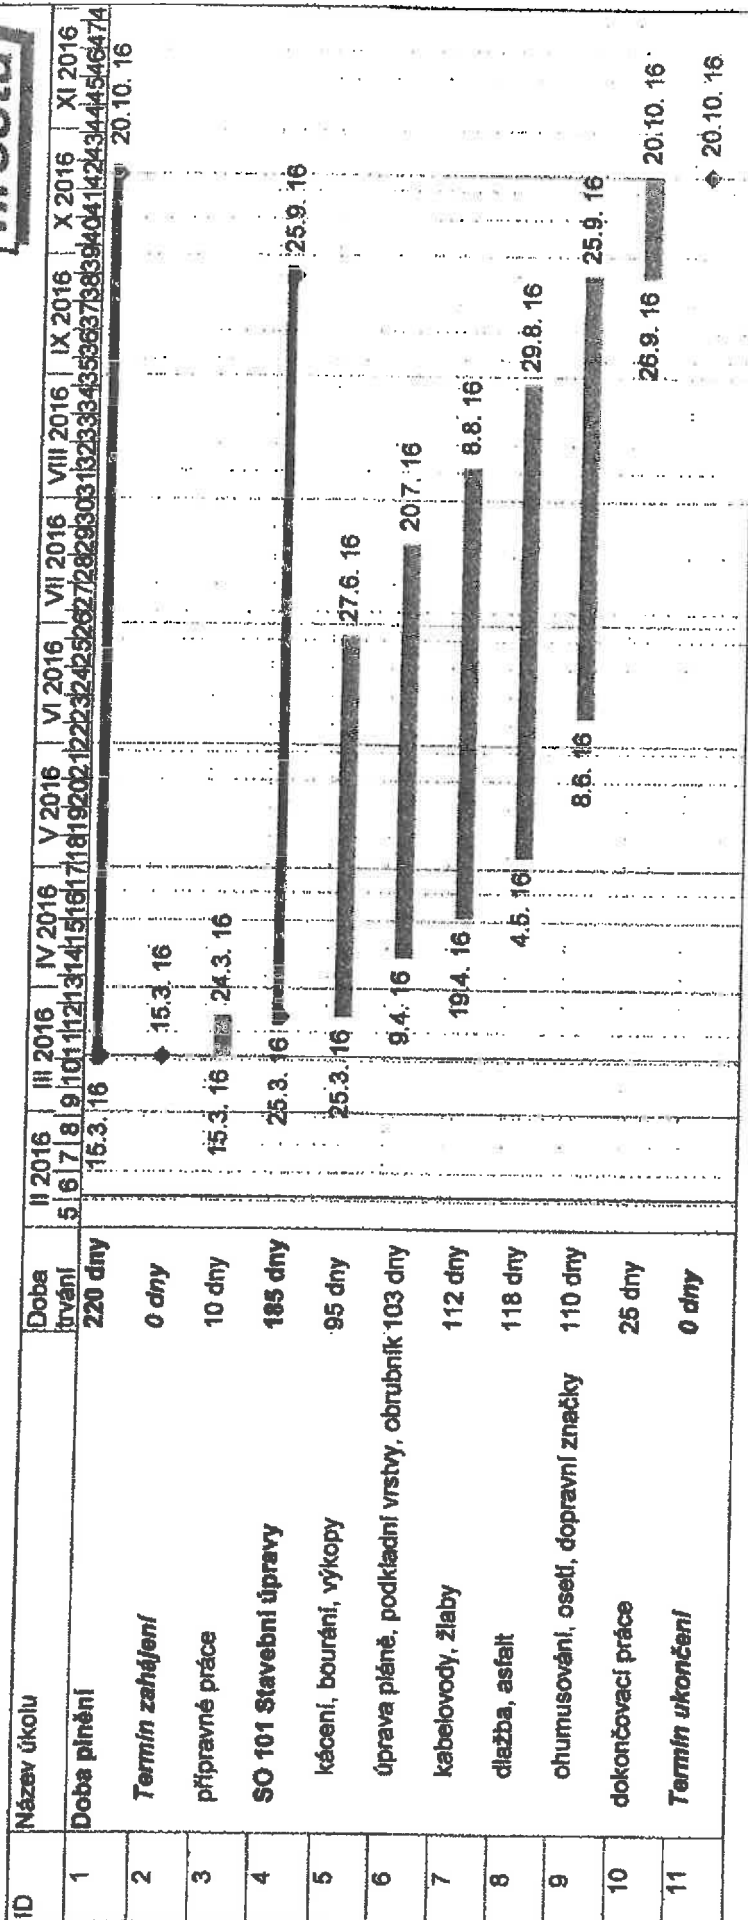

Projekt: Bohunice_hmg_pt_1
Datum: 9.2.16

Úkol

Přerušení

Milník

Souhrnný

