

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00228  
Číslo smlouvy Stavebníka: 5622050261

SAP S/4 Hana: 8030002930  
Registr smluv: ANO

---

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY  
SÍŤE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
č. VPI/MJ/2021/00228**

---

mezi

**CETIN a.s.**

a

**Statutární město Brno**

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00228

SAP S/4 Hana: 8030002930

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

**CETIN a.s.**

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623  
zastoupená na základě pověření [redacted] manažerem, Provoz pevné přístupové  
sítě ČR dle pověření ev. č. PŘ/3018/2021

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „CETIN“)

a

**Statutární město Brno**

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna  
podpisem smlouvy pověřen usnesením RMB na schůzi R8/189 konané dne 20. prosince 2021  
Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

korespondenční adresa: Odbor investiční Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „Stavebník“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací  
(dále jen „**Smlouva**“)

**DEFINICE**

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

**CTN** je cenový a technický návrh a současně realizační dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

**Překládka** je stavba v k.ú. Staré Brno spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

**Příprava Překládky** jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00228

SAP S/4 Hana: 8030002930

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

**Předpoklady pro realizaci Překládky** mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

**SEK** je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

**Vyjádření o existenci SEK** je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 27.7.2021 vydané pod čj. 738648/21, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Brno Mendlovo náměstí I.fáze**“, u stavebníka pod označením „Mendlovo náměstí – úprava veřejného prostranství, I. fáze“.

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

## 3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
  - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
  - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.

(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00228  
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030002930  
Registr smluv: ANO

3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizaci Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

#### 4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování CTN;
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však čtyři (4) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník se zavazuje, nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, jejíž vzor je uveden v Příloze č. 2 Smlouvy a převést na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky. Ve lhůtě dle předchozího odstavce je Stavebník povinen předat společnosti CETIN územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
- (c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 bodu (i) Smlouvy;

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00228  
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030002930  
Registr smluv: ANO

(d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).

- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.
- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinností dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

## 5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **827.771,- Kč** (slovy: osm set dvacet sedm tisíc sedm set sedmdesát jedna korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN.
- 5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00228  
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030002930  
Registr smluv: ANO

- dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
  - (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
  - (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
  - (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
  - (f) náklady na identifikaci parcel,
  - (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
  - (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
  - (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
  - (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
  - (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
  - (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
  - (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.
- 5.5 Výše nákladů na Překládku stanovené na základě CTN se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

## 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:
- (a) Faktura za CTN Překládky ve výši **12.960,- Kč** (slovy: dvanáct tisíc devět set šedesát korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od uzavření této Smlouvy,
  - (b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.
- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00228

SAP S/4 Hana: 8030002930

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.
- 6.7 Smluvní strany souhlasí ve smyslu ust. § 26 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, že faktury mohou být vystavovány i v elektronické podobě.

## 7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do dvaceti (20) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

## 8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

### 8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: [REDACTED] [REDACTED]  
funkce: specialista pro výstavbu sítě - překládky SEK

[REDACTED] [REDACTED] tel: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED] [REDACTED]  
funkce: senior specialista pro výstavbu sítě

[REDACTED] [REDACTED] tel: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

### 8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Pivec  
funkce: vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

[REDACTED] [REDACTED] tel: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED] [REDACTED]  
funkce: technický a stavební dozor

[REDACTED] [REDACTED] tel: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

## 9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00228  
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030002930  
Registr smluv: ANO

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

## 10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

## 11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností



Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00228

SAP S/4 Hana: 8030002930

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přijímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přijímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přijímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přijímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přijímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přijímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

## 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- (a) v listinné podobě;
  - (b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00228  
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030002930  
Registr smluv: ANO

(c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy, věta první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem (b) a (c).

- 12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznamení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
  - § 1767 odst. 2;
  - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
  - § 1743.
- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00228

SAP S/4 Hana: 8030002930

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoliv souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13 Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavec 2).

12.14 Smlouva je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. CETIN obdrží jedno (1) vyhotovení a Stavebník obdrží dvě (2) vyhotovení.

12.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN


Příloha č. 2 - Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby – vzor

#### Doložka

Smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/189 dne 20. prosince 2021.

CETIN:

V Praze 11.1.2022



manažer, Provoz pevné přístupové sítě ČR



VPIC Brno Mendlovo náměstí I.fáze

Stavebník:

V Brně 24.1.2022



Statutární město Brno  
Ing. Tomáš Pivec  
vedoucí Odboru investičního Magistrátu  
města Brna

# VPIC Brno Mendlovo nám. úpravy fáze I

Technická zpráva

## Vstupní podklady:

ožadavek IPMS int.č. 45038/21/0036 na zpracování CTN: VPIC Brno Mendlovo nám. úpravy fáze I

## 2.2 Navrhované řešení:

**Překládka SEK CETIN v Brně na Mendlově nám. vyvolaná úpravami Mendlova nám. - I fáze. Překládka bude provedena podle podmínek Vyjádření o existenci SEK 738648-21 (v příloze).**

**V rámci překládky budou provedeny SO 451 překládka CETIN a SO 452 zrušení přípojek. Stavebník zajistí provedení SO 453 zabezpečení kabelovodu a tento SO není předmětem této překládky.**

V rámci přeložky budou řešeny trasy:

- A. Od spojky u vstupu do Mendlova muzea k ulici Výstavní a druhá větev směr Veletržní.
- B. Od Trasy u obj Mendl.n 19 k ulici Výstavní
- C. V části C bude nová trasa v délce cca 35m posunutá dále od komunikace z důvodu výstavby zastávkového zálivu u obchodního střediska na ul Veletržní..
- D. Nebude řešeno, pouze zrušení vedení.
- E. Ochrana vedení poblíž zastávky

Popis stávajícího stavu:

MET

V části A vede kabel: OPV150P0,6, který se dále dělí na JKP35XN0,8/JKP25XN0,8 a směr Veletržní do Rezervy a JKP5050XN0,8 která se dělí na 25XN0,6 do BOBE514 a druhý kabel 25XN0,8 do rezervy.

V části B vede kabel: KP30XN0,6/KP15XN0,6/KP7,5XN0,6 směr do ul Veletržní do rezervy.

V části C vedou kabely: JKP50XN0,8, QYPY25XN0,8, E 300XN0,4, QYPY 300XN0,8, E100XN0,6, E200P0,6, E100P0,5

V části D vede kabel 3XN0,4 BOBE4538 (Novinový stánek).

V části E vedou kabely, viz C.

Řešení

V Části A bude u Mendlova muzea překopána komunikace a proveden průvrt do komory KK17. A dále průvrt z Komory KK13 a výkop cca 7m. Stávající kabely budou osazeny koncovkami. V nových trasách jako náhrada budou založeny dvě HDPE40. Ostatní bude zrušeno.

V části B nebudou nové výkopy. Bude v části zrušeno.

V části C bude proveden nový výkop v délce cca 35m dále od vozovky.

V části D u Mendl náměstí 16 bude kabel zrušen- osazen koncovkou SKH2.

V části E budou vedení uložena do SYSPRO v délce 3+4m.

Navržené řešení MET.

V části A Kabely budou osazeny koncovkami a zrušeny. Jako náhrada budou v nových trasách založeny dvě HDPE40.

V části B budou kabely osazeny koncovkami a zrušeny

V části C budou provedeny nové kabelové vložky s kabely TCEPKPFLE a spojkami XAGA.

V části D u Mendl náměstí 16 bude kabel zrušen- osazen koncovkou SKH2. Na kabelu je služba. **V nové situaci stánek nefiguruje – je prověřováno vypovězení stánku. Bude doplněno do CTN.**

V části E budou stávající kabely uložena do SYSPRO 200/160.

V komunikaci bude uloženo v PE, + založena rezervní, obetonováno. DO komor bude provedeno jádrové vrtání + zatěsnění.

**Technické řešení navržené v CTN zohledňuje pouze podklady dodané k vytvoření CTN. Případné další podmínky správců sítí, majitelů pozemků, a další, které nebyly předány ke zpracování CTN nebyly zohledněny.**

## 2.3 Popis tras

viz. přiložené podklady

VVN: ne

El. trakce: ne

Vodní toky: ne

## 2.4 Použitá technologie:

XAGA, ,

Metalický kabel TCEPKPFLE 0,4, 0,6, 0,8

Minimarker Ball

## 2.5 Použité předpisy:

TPP 2001-1 (TP 69a) - Výstavba přístupových sítí -  
Metalické kabely (část I.)

TPP 2001-2 (TP 69b) - Výstavba přístupových sítí -  
Metalické kabely (část II.)

TPP 2001-3 (TP 69c) - Výstavba přístupových sítí -  
Metalické kabely (část III.)

TA 10 (I.-III.) - Výstavba nadzemních sítí

ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického  
vybavení

ČSN 334050 - Podzemní sdělovací vedení

ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení

Výkop, položení a obsazení chráničky je v souladu s ČSN 73 6005

## 2.6 Koordinace:



## 2.7 Ostatní:

PD:NE

ÚR: NE

GEO zaměření: ANO \_ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom

Vytyčení nové trasy SEK: ANO \_ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom

VBŘ: ANO \_ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom

GP: ANO \_ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom

SoUZ: NE

PEW: ANO (MET) \_ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom

RZ je povinný oznámit PC ( [redacted] [redacted] [redacted] ) a pracovníkovi provozní složky spol. CETIN [redacted] [redacted] [redacted] časové období realizace stavby, termíny provedení záhozů a termín závěrečných měření.

Kabelové spojky budou umístěny v nepojízdných plochách a budou opatřeny detekčními markery miniBall.

Technické řešení navržené v CTN zohledňuje pouze podklady dodané k vytvoření CTN.

Případné další podmínky správců sítí, majitelů pozemků a jiné, které nebyly předány ke zpracování CTN, nejsou zohledněny.

### Měření:

metalické kabely = před provedením překládek bude na metalických kabelech provedeno kontrolní stejnosměrné měření vybraných párů (cca 10%). Po provedení překládky bude provedeno standardní měření na celém profilu kabelů.




955/1

Trasy vycházejí z koordinace s HIP PK OSSENDORF 11/2021  
 KU STARÉ BRNO



KU STARE BRNO

KS

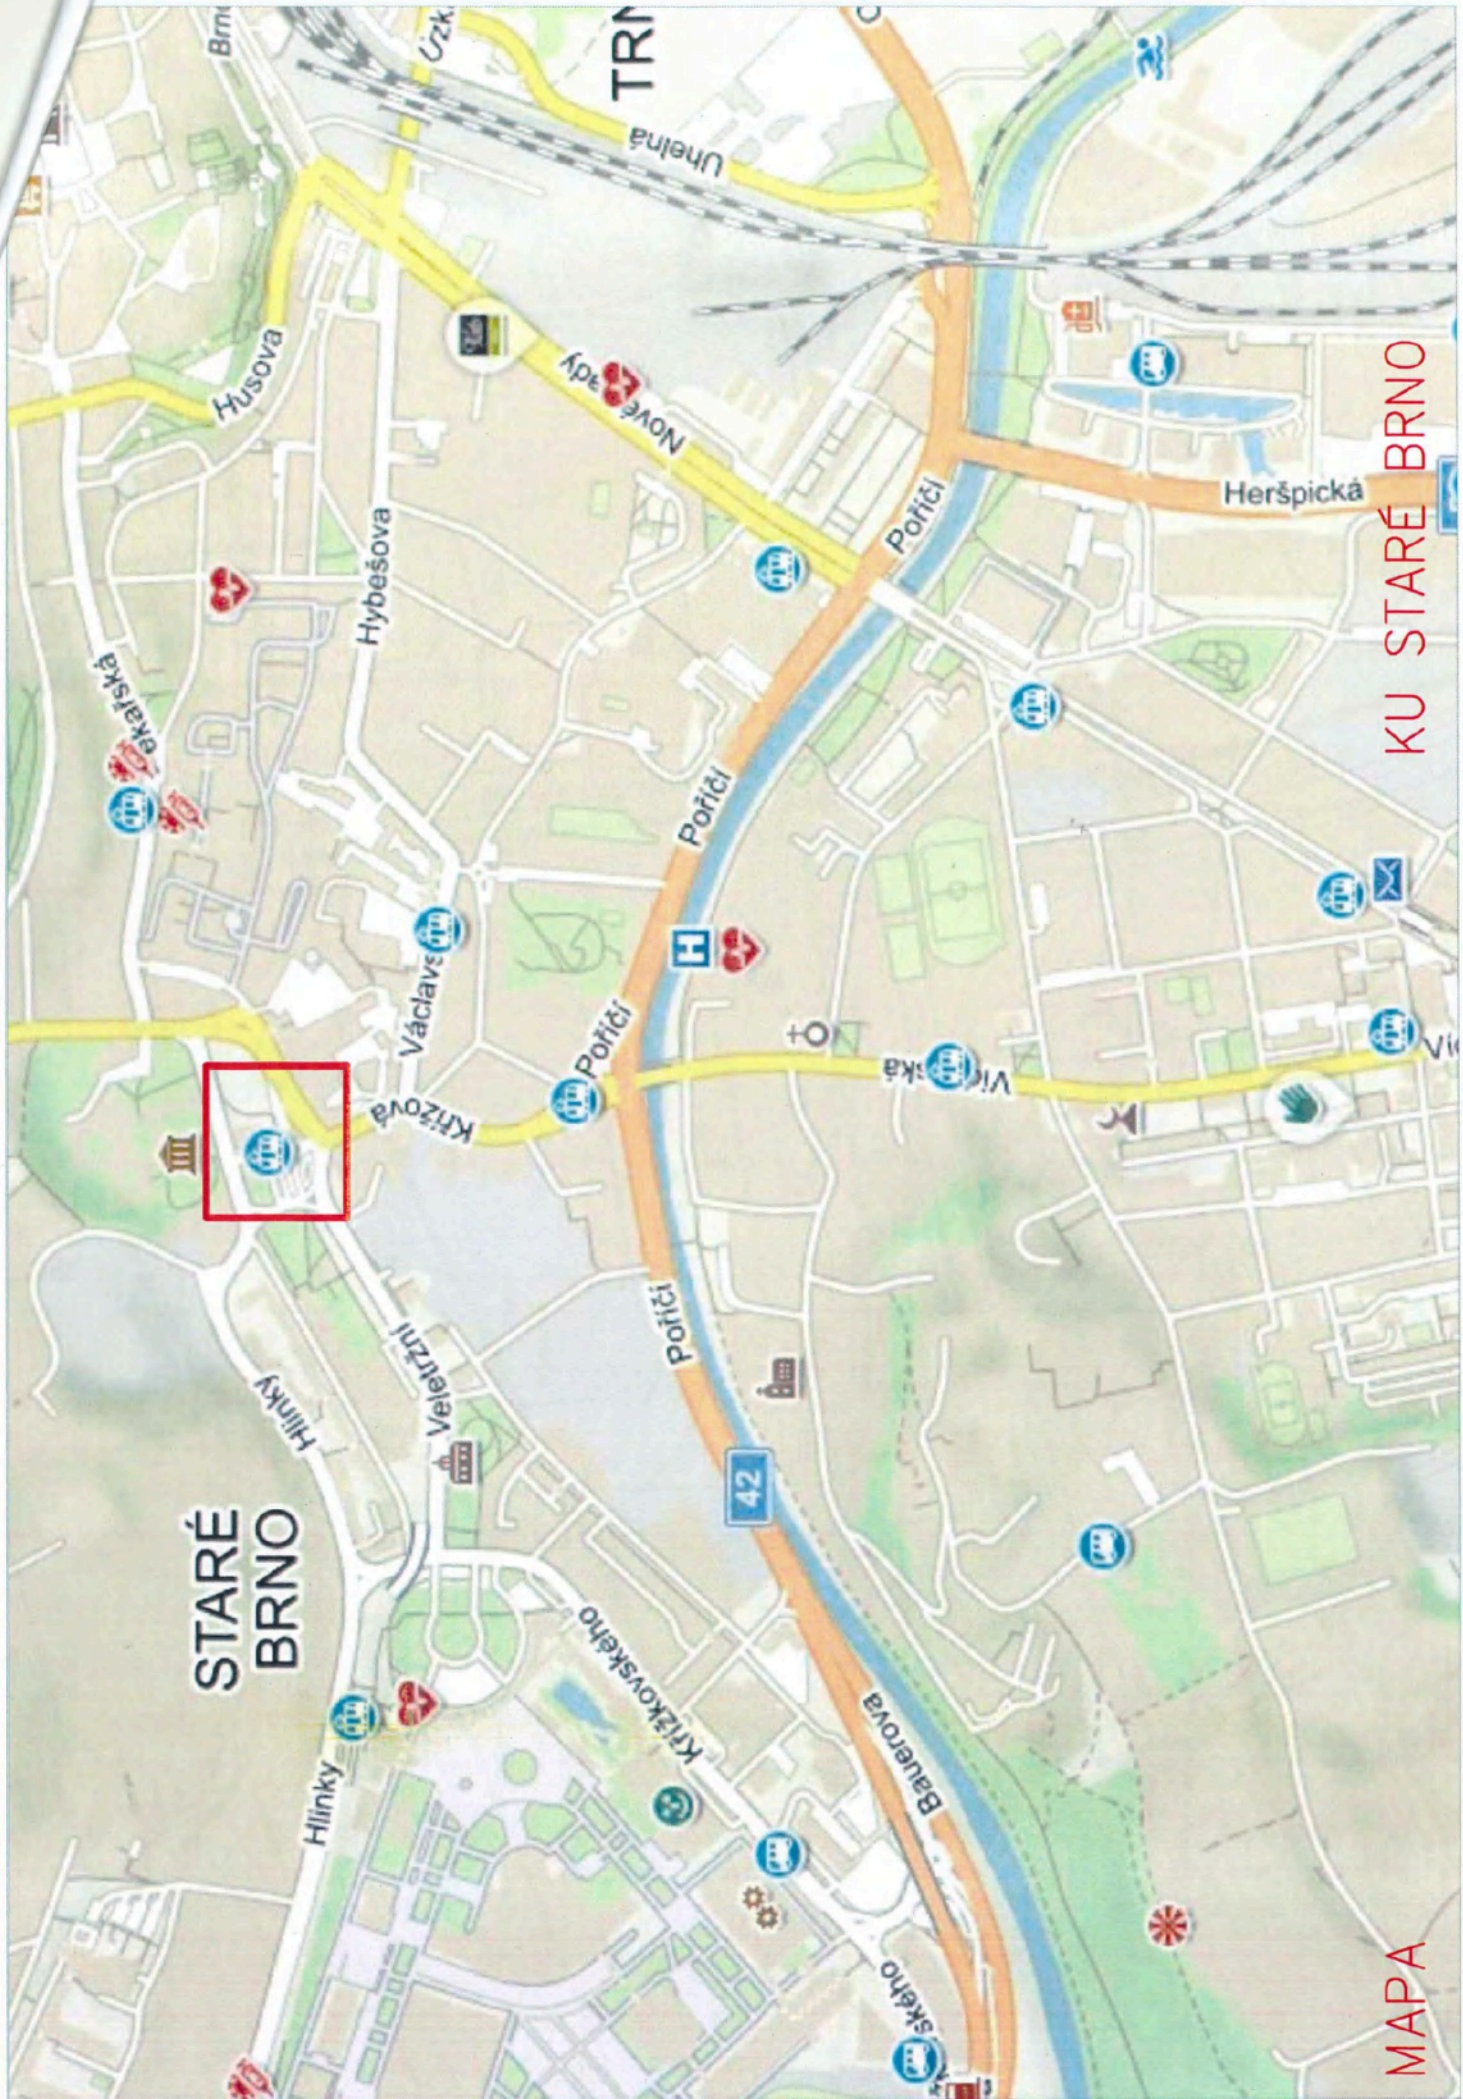

STARÉ  
BRNO


KU STARÉ BRNO

MAPA



# KU STARÉ BRNO

Legenda:  
Trasy nové - výhledy  
Rušaré

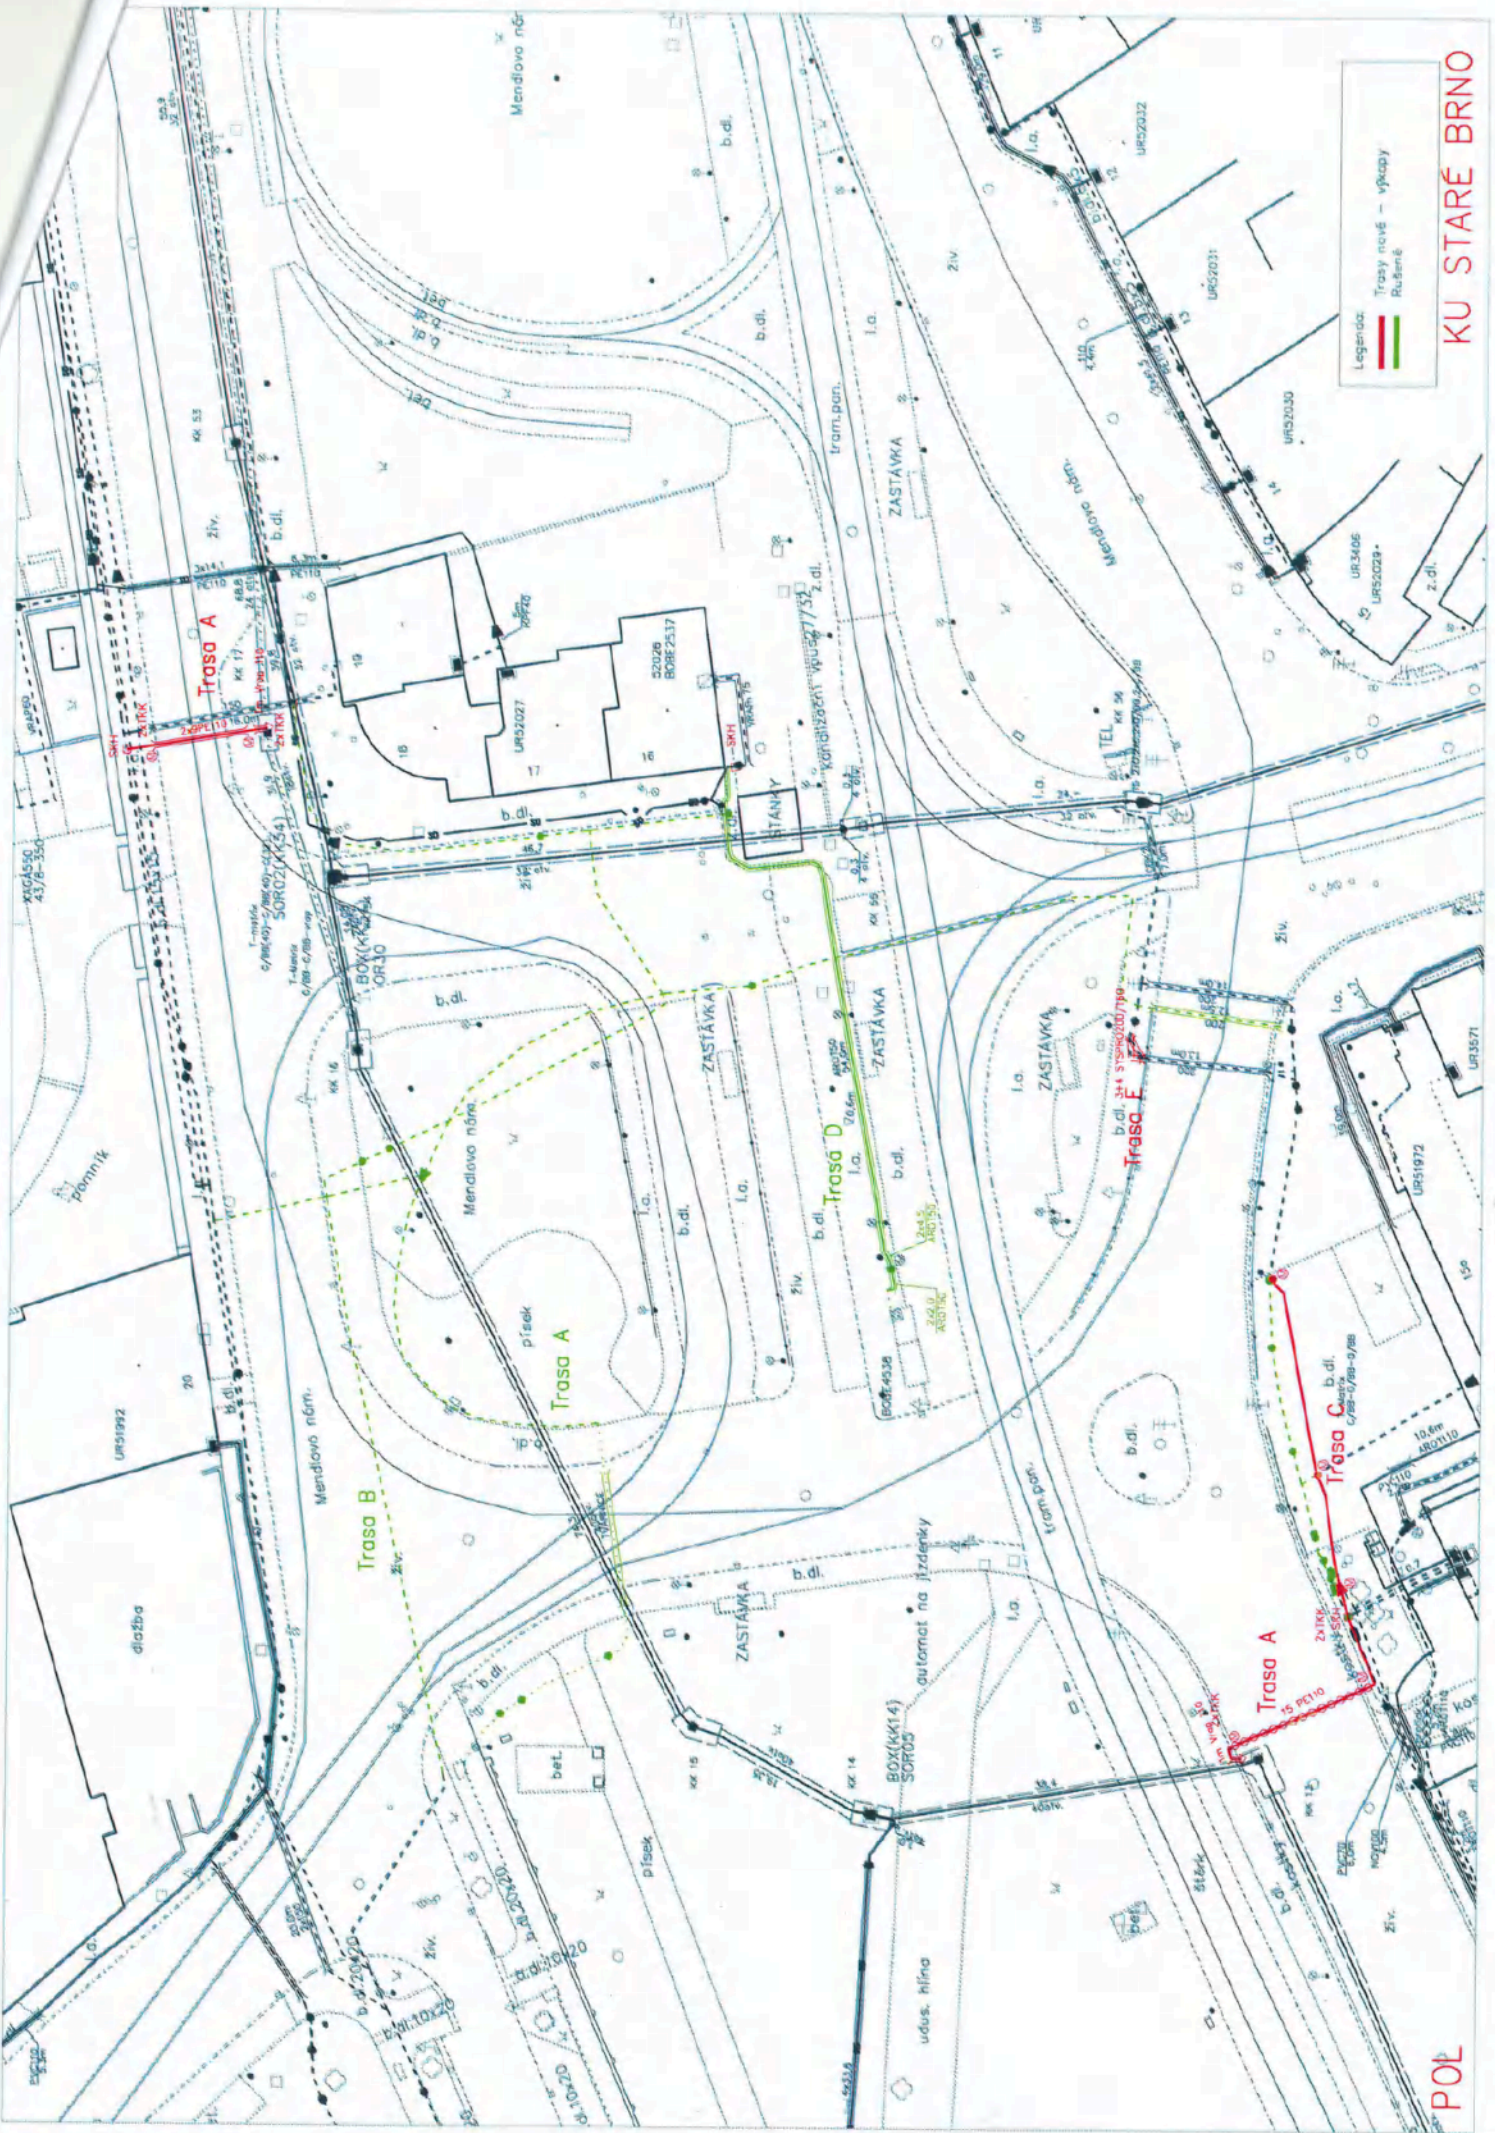

**Specifikace nákladů\_VPIC Brno Mendlovo nám. úpravy fáze I**

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: ¼ VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. - 2021.11

Položková 2021.11

Název stavby: **VPIC Brno Mendlovo nám. úpravy fáze I**

Číslo SPP prvku: 45038/21/0036

Zhotovitel PD: [REDAKCE]

KPO: JMO

HOST: Brno - Bezručova

VUJ: Staré Brno

## Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	12 960,15 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	216 617,60 Kč
MONTÁŽ	252 576,65 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	10 449,79 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	6 665,22 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	31 922,48 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	296 579,02 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

**Celkové náklady: 827 770,91 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST 780 172,82 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 47 598,09 Kč

## Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
<b>PŘÍPRAVA</b>				
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks	12 960,15 Kč
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				
954969 S		Podvrt řízený do 150 mm	15.00 m	50 420,40 Kč
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	20.00 m	478,00 Kč
955265 S		Práce zemní pro podzemní tratě síťové	12400.00 J	12 400,00 Kč
2x Jádrové vrtání do komor				
954959 S		Rýha v chodn.zám.dlaž.35/50-70rozš.o10cm	186.00 m	39 396,66 Kč
952346 S		Rýha v chodníku l.asf.35/50-70rozš.o10cm	9.00 m	2 333,70 Kč
954951 S		Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70	6.00 m	6 109,80 Kč
952362 S		Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70	68.00 m	51 425,68 Kč
954962 S		Rýha ve vozovce l.asf.50/130rozš.o 10 cm	30.00 m	12 412,80 Kč
954952 S		Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130	19.00 m	40 337,00 Kč
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	108.00 m	1 303,56 Kč
<b>MONTÁŽ</b>				
958306 S		Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	86.00 m	341,42 Kč

952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	16.00 ks	2 847,36 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	1037.00 ks	42 589,59 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	942.00 ks	25 791,96 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	8.00 ks	766,56 Kč
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	8.00 ks	1 423,68 Kč
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	950.00 ks	26 011,00 Kč
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	950.00 ks	32 509,00 Kč
955255 S	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	8.00 ks	312,72 Kč
955288 S	Montáž koncovky SKH	3.00 ks	164,25 Kč
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	64529.60 J	64 529,60 Kč
	Montáž Syspro		
	Rezerva		
955282 S	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	12.00 ks	22 998,96 Kč
955281 S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	4.00 ks	5 202,12 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	86.00 m	1 539,40 Kč
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	225.00 m	9 240,75 Kč
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	155.00 m	4 459,35 Kč
957753 S	Realizace tratě síťové dohodou	837.00 JV	837,00 Kč
	Doprava betonu		
958469 S	Uvedení stavby do provozu	5262.56 JV	5 262,56 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	5 749,37 Kč
	<b>GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE</b>		
955278 S	Provedení geodetického měření pro tratě síťové	4340.00 JV	4 340,00 Kč
	Vytyčení nové trasy SEK		
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	6 109,79 Kč
	<b>VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA</b>		
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks	6 665,22 Kč
	<b>VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE</b>		
958747 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	3 949,76 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	16000.00 J	16 000,00 Kč
	Odhadovaná náhrada Vbř		
	Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.		
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks	5 184,06 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z Kl	2.00 ks	6 788,66 Kč
	Limitka materiálu		
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství Celková cena
	<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný</b>		
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	139.00 ks	5 284,78 Kč
319093 S	Díl ohybový Syspro 200/160	2.00 ks	936,84 Kč
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	38.00 m	145,92 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	149.00 m	658,58 Kč
300122 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,6	90.00 m	46 101,60 Kč
300132 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 150x4x0,8	90.00 m	122 539,50 Kč
300129 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,8	65.00 m	15 433,60 Kč
300112 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 300x4x0,4	45.00 m	31 987,35 Kč
300121 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6	45.00 m	11 774,25 Kč
300130 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,8	45.00 m	20 326,95 Kč

316534 S	Koncovka smršť. SKH 2 9/20 mm	1.00 ks	63,36 Kč
316541 S	Koncovka smršť. SKH 3 15/35 mm	1.00 ks	106,87 Kč
316547 S	Koncovka smršť. SKH 4 25/55 mm	1.00 ks	152,12 Kč
302788 S	Koncovka trubky 40 mm Plasson	8.00 ks	923,28 Kč
320879 S	Materiál pro tratě síťové	4932.00 ks	4 932,00 Kč
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball	10.00 ks	2 036,60 Kč
312417 S	Modul konektor. 4000-25P	80.00 ks	3 859,20 Kč
312425 S	Modul konektor. 9700-10P	180.00 ks	4 150,80 Kč
312881 S	Spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FLE	4.00 ks	2 862,76 Kč
312889 S	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	4.00 ks	2 878,08 Kč
303501 S	Spojka plastová 110/94 mm	2.00 ks	73,32 Kč
320294 S	Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460	4.00 ks	3 173,24 Kč
320295 S	Spojka smršťovací XAGA 500-125/30-460	4.00 ks	4 766,12 Kč
319184 S	Spona trubkySYSPRO	42.00 ks	855,54 Kč
319210 S	Trubka dělená SYSPRO 200/160	7.00 m	4 514,51 Kč
300027 S	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	43.00 m	1 036,30 Kč
300036 S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	43.00 m	1 036,30 Kč
302655 S	Trubka PE 110/3,5/6000mm	3.00 ks	1 539,69 Kč
302672 S	Trubka PE 110/6,3/6000mm	3.00 ks	2 346,18 Kč
302423 S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	2.00 m	83,38 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
304267 S	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	20.00 ks	0,00 Kč

## DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

### **CETIN a.s.**

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623  
IČO: 04084063  
DIČ: CZ04084063  
zastoupená na základě pověření [•]

(dále jen „**Nabyvatel**“)

a

[•]

se sídlem [•]  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u [•]  
IČO: [•]  
DIČ: [•]  
zastoupena [•]

(dále jen „**Převodce**“)

Nabyvatel a Převodce dále společně jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

dne, měsíce a roku níže uvedeného, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“) uzavírají tuto

## DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

(dále jen „**Dohoda**“)

### 1. PŘEDMĚT DOHODY

- 1.1 Převodce je na základě rozhodnutí o umístění stavby „[•]“, které bylo vydáno dne [•], [KÝM] pod čj. [•] a nabylo právní moci dne [•] (dále jen „**Rozhodnutí o umístění stavby**“) oprávněn k umístění [•] (dále jen „**Stavba**“). Rozhodnutí o umístění stavby je Přílohou č. 1 Dohody.
- 1.2 Předmětem převodu jsou některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to právo k umístění Stavby za podmínek v citovaném rozhodnutí stanovených, a dále s ním související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, tak jak jsou stanoveny v Rozhodnutí o umístění stavby.

### 2. PŘEVOD PRÁV

- 2.1 Převodce uzavřením Dohody, s účinností ke dni uzavření Dohody, převádí na Nabyvatele některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to toliko právo k umístění Stavby za podmínek v Rozhodnutí o umístění stavby stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Rozhodnutí o umístění stavby

stanoveny.

- 2.2 Převodce se zavazuje postoupení písemně oznámit Správnímu orgánu ne třiceti (30) pracovních dnů ode dne uzavření Dohody.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Dohoda, a práva a povinnosti Smluvních stran z Dohody vyplývající, se řídí právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem, a případné spory budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
- 3.2 Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani projev učiněný po uzavření Dohody, jež není v Dohodě uveden, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek ani jedné ze Smluvních stran.
- 3.3 Dohoda může být měněna nebo zrušena pouze písemně; změna jinou formou je vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 3.4 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Dohody byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Dohody, ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 3.5 Dohoda nabývá platnosti a účinnosti v den jejího uzavření.
- 3.6 Dohoda je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.7 Následující Přílohy jsou nedílnou součástí Dohody:

Příloha č. 1 – Rozhodnutí o umístění stavby

Nabyvatel:

Převodce:

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CETIN a.s.

[\*]

\_\_\_\_\_  
[ ]
