

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00018
Číslo smlouvy Stavebníka: 149670

SAP S/4 Hana: 8030002957
Registr smluv: ANO

PRÁVNÍ



KUJIP01MRZ0D

35/12

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. VPI/MJ/2022/00018**

mezi

CETIN a.s.

a

Kraj Vysočina

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00018
Číslo smlouvy Stavebníka: 149670

SAP S/4 Hana: 8030002957
Registr smluv: ANO

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená dle pověření Ing. Miroslavem Kotem, supervizorem pro výstavbu sítě

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „**CETIN**“)

a

Kraj Vysočina

se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

IČO: 70890749

DIČ: CZ70890749

zastoupený Ing. Miroslavem Houškou, náměstkem hejtmána

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Telč spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00018
Číslo smlouvy Stavebníka: 149670

SAP S/4 Hana: 8030002957
Registr smluv: ANO

elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 23.9.2021 vydané pod čj. 768622/21, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC III_40618 Telč, JI, ul.Radkovská**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00018
Číslo smlouvy Stavebníka: 149670

SAP S/4 Hana: 8030002957
Registr smluv: ANO

- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektu,
- (ii) podat žádost o vydání územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a učinit nezbytné kroky směřující k vydání rozhodnutí o umístění stavby Překládky,
- (iii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však jeden (1) měsíc od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby(Překládky), vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00018
Číslo smlouvy Stavebníka: 149670

SAP S/4 Hana: 8030002957
Registr smluv: ANO

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **369.462,- Kč** (slovy: tři sta šedesát devět tisíc čtyři sta šedesát dva korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do jednoho (1) měsíce od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky) oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v nákladech překládky stanovených po vyhotovení Projektu dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy. Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit na základě dodatku k této smlouvě, přičemž smluvní strany se zavazují takový dodatek uzavřít před provedením prací nebo vznikem nákladů souvisejících s překládkou SEK a to do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jeho uzavření Stavebníkovi. Pokud k uzavření takového dodatku v uvedené lhůtě nedojde, uhradí Stavebník tyto náklady společnosti CETIN na základě jejich uplatnění.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00018
 Číslo smlouvy Stavebníka: 149670

SAP S/4 Hana: 8030002957
 Registr smluv: ANO

- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „Faktura“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:

- (a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši **63.375,- Kč** (slovy: šedesát tři tisíc tři sta sedmdesát pět korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy,
- (b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.

6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.

6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00018
Číslo smlouvy Stavebníka: 149670

SAP S/4 Hana: 8030002957
Registr smluv: ANO

- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: Ludmila Uhrová
funkce: specialista pro výstavbu sítě - překládky SEK
e-mail: ludmila.uhrova@cetin.cz ,tel.: 238 462 454

ve věcech technických: Petr Macho, DiS.
funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: petr.macho@cetin.cz, tel.: +420 720 758 105

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Houška
funkce: náměstek hejtmána
e-mail: posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111

ve věcech technických: Ing. Iveta Hartmanová Pavlů
funkce: investiční technik
e-mail: hartmanova.p@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 216, 724 650 221

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00018
Číslo smlouvy Stavebníka: 149670

SAP S/4 Hana: 8030002957
Registr smluv: ANO

- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle Čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.
- 9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKY

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „**Osobní údaje**“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**GDPR**“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00018
Číslo smlouvy Stavebníka: 149670

SAP S/4 Hana: 8030002957
Registr smluv: ANO

vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přijímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přijímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přijímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přijímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přijímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přijímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společností CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- (a) v listinné podobě;
 - (b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00018
 Číslo smlouvy Stavebníka: 149670

SAP S/4 Hana: 8030002957
 Registr smluv: ANO

(c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy, věta první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem (b) a (c).

- 12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoliv svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00018
Číslo smlouvy Stavebníka: 149670

SAP S/4 Hana: 8030002957
Registr smluv: ANO

odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv delikttní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoliv jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoliv souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.


12.13 Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

CETIN: 20-01-2022

V Brně dne _____



CETIN a.s.
Ing. Miroslav Kot
supervizor pro výstavbu sítě

Stavebník:

V Jihlavě dne 29.1.2022



Kraj Vysočina
Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmána

CETIN a.s.
Čulákova 2510/19, Úbeň
100 00 Praha 9
příč. 0204024063

212


Kraj Vysočina
Žitavská 1882/57, 586 01 Jihlava

21

Technická zpráva

Název stavby : VPIC.III_40618 Telč, II, ul.Radkovská

Stručný popis:

Rekonstrukce komunikace v ulici Radkovská a budování přilehlých parkovacích ploch zasáhne částečně do PVSEK v majetku společnosti Cetin a.s. Z tohoto důvodu je nutno realizovat opatření na jejich ochranu.

Dotčené prvky PVSEK :

Kabel met. PPFLE35XN0,6 2xPPFLE35XN0,8 PPFLE150XN0,6 TCEKE25XN0,8
Optické prvky HDPE40 Z HDPE40 B HDPE40 C – bez OK a HDPE40 O obsazená kabelem 24f

Technické řešení :

Stávající trasy PVSEK budou dotčeny stavbou parkovacích stání podél ulice Radkovská v Telči (viz polohopis). Nově budovaná stání a přilehlé chodníky svým umístěním budou částečně umístěny nad kabelovými trasami. Přestože jejich konstrukční vrstvy by neměly zasáhnout přímo kabelové prvky a optické trubky, je nutno provést opatření pro jejich ochranu formou zřízení chrániček pod zpevněnými povrchy a uložení PVSEK do těchto chrániček.

Dokumentace stavby má označena tři místa styku s PVSEK:

- dotčení část 1

Stávající podzemní metalický kabel (CETIN a.s.) v km 0,075 – 0,185 silnice III/40618 ul. Radkovská po pravé straně se nachází pod nově navrženou silniční obrubou. Přeložka podzemního metalického kabelu (CETIN a.s.) je navržena v km 0,075 – 0,185 vpravo mimo komunikaci a bude provedena v délce 120 m. Nová trasa je vedena částečně pod parkovacími plochami (rozebíratelný povrch ze žulových kostek) a část povede v zeleni ve vzdálenosti alespoň 0,5 m od silniční obruby. Pod parkovacími plochami a v místě přechodu přes místní komunikaci bude kabel uložen v chráničkách.

V této části byla navržena přeložka kabelu OPV70p0,6, který je mimo provoz a překládat se nebude. Kabel bude v celé délce zrušen bez náhrady.

- dotčení část 2

Stávající podzemní metalický kabel (CETIN a.s.) v km 0,165 – 0,220 vede pod navrženým podélným parkovacím stáním a chodníkovou obrubou. Pod parkovacími plochami a v místě přechodu přes místní komunikaci bude PVSEK uloženo v chráničkách.

Ochrana PVSEK je řešena uložení do půlených kabelových žlabů SYSPRO (viz polohopis). Jsou zde dvě trasy. V jedné jsou vedeny dva kabely PFLE35XN0,8 a TECE35XN0,6, ve druhé jsou 4x HDPE40 a kabely TCEKE25XN0,8 a PFLE150XN0,6. Obě trasy budou v místech křížení odbočení z hlavní komunikace a pod zpevněnými plochami nového parkovacího stání obnaženy a uloženy do připravených kabelových žlabů SYSPRO.

Kabel 35XN0,6 z TELC71 do TELC541, TELC540, TELC548 a TELC549 vede pravděpodobně (v dokumentaci ADS jeho trasa není jednoznačně určena) ve stejné trase s kabely 2x PFLE35XN0,8. Pokud tomu tak bude, není potřeba tento kabel překládat. Projekt však počítá s možností nutné ochrany kabelu přeložkou u domu č.p.214 (viz polohopis a schema) a s jeho přepojením na kabel PFLE 35XN0,8 z TELC71 do RKDV3 (viz TELC71 rozpárovací tabulka nová). Km 0,140.

Nově budované chráničky budou řešeny s přesahem min. 0,5 m za okraj zpevněné plochy.

- **dotčení část 3**

Stávající podzemní optický kabel (CETIN a.s.) v km 0,865 – 0,895 vede pod navrženou chodníkovou obrubou. Stranový posun optického kabelu SEK je navržen v km 0,865 – 0,895 vlevo alespoň 0,3 m od obruby a bude proveden v délce 31 m, optický kabel bude uložen do chráničky.

Zde projekt počítá s obnažením stávající kabelové trasy v délce cca 32m a jejím uložením do připravených kabelových žlabů SYSPRO. Jedná se o kabely PFLE 3XN0,4, PFLE5XN0,4, PFLE35XN0,8 a 4x HDPE40 – jedna trubka je obsazena OK 24f. I v tomto případě nutnost realizace ochrany PVSEK bude zřejmá až po přesném zaměření stavby a určení přesné polohy stávajícího PVSEK.

Z tohoto důvodu projekt počítá s nutností určení přesné polohy stávajících tras PVSEK ve vztahu k budovaným zpevněným plochám. Pro případ, že by došlo ke kolizi PVSEK s budovanými obrubami chodníku, počítá projekt v kolizních místech s ručním odkopáním trasy PVSEK a jejich uložením do připravených chrániček SYSPRO.

ÚR - Ano

PD - Ano

Geo - Ano

GP - Ano

VBŘ - Ano

Ivestor:

Krajský úřad Kraje Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

IČ: 70890749 web: www.kr-vysocina.cz

Projektant:

Ing. Dagmar Klajmonová

autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

DOPRAPLAN s.r.o.


Přemyslovců 462/6

709 00 Ostrava – Mar. Hory


Mobil: 605 248 614

Email: d.klajmonova@doprplan.cz



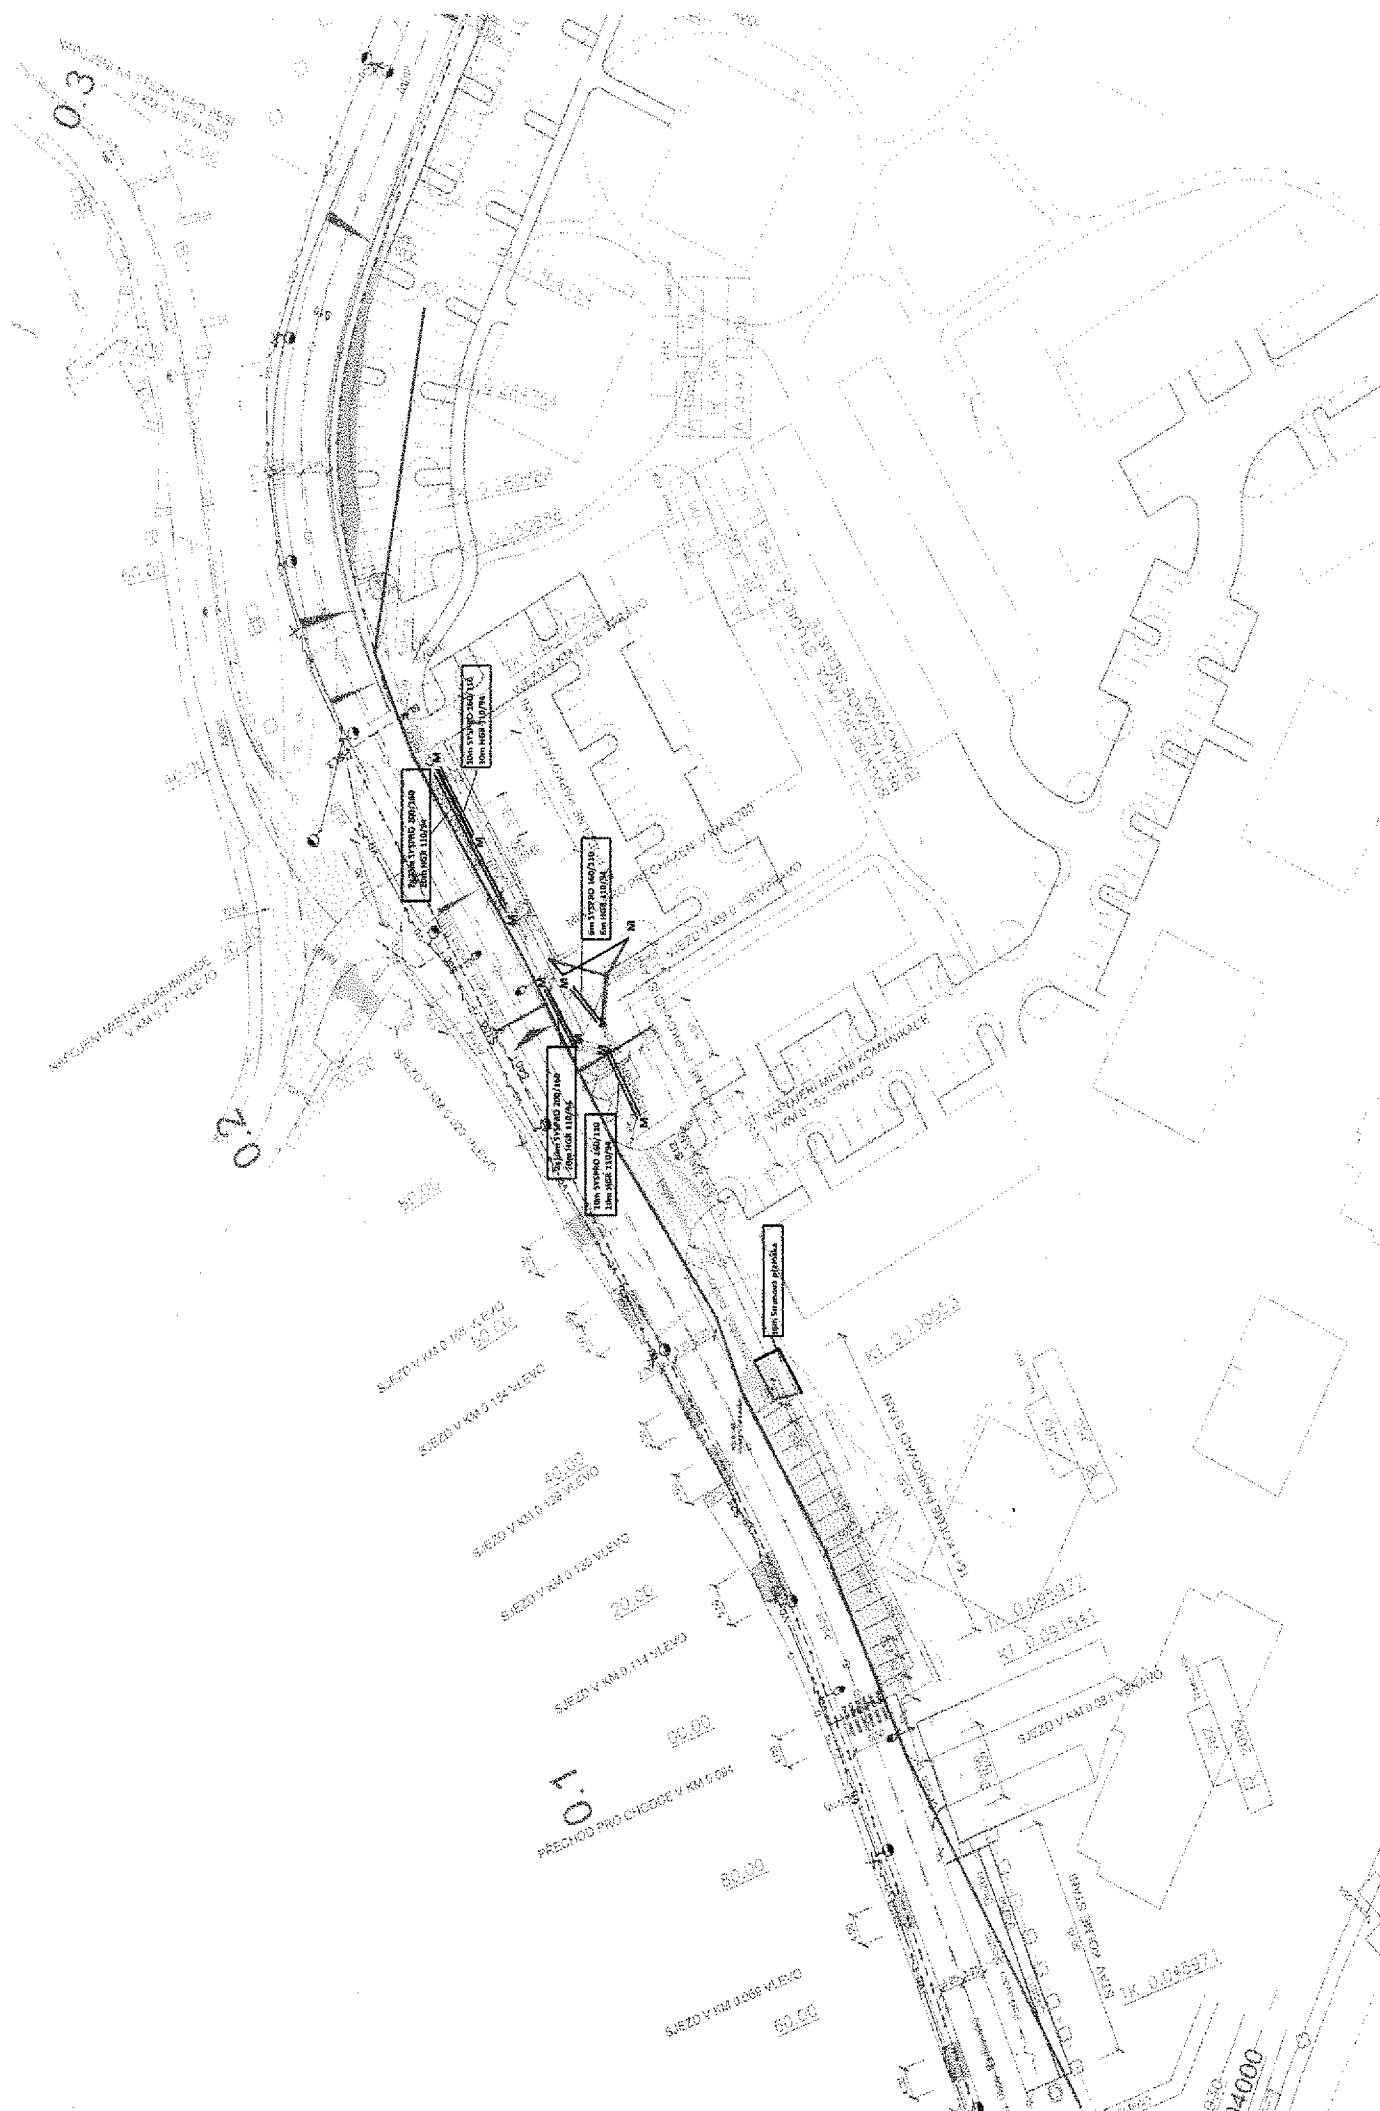

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
 2. ПОДРОБНОСТИ
 3. ПОДРОБНОСТИ
 4. ПОДРОБНОСТИ
 5. ПОДРОБНОСТИ
 6. ПОДРОБНОСТИ
 7. ПОДРОБНОСТИ
 8. ПОДРОБНОСТИ
 9. ПОДРОБНОСТИ
 10. ПОДРОБНОСТИ
 11. ПОДРОБНОСТИ
 12. ПОДРОБНОСТИ
 13. ПОДРОБНОСТИ
 14. ПОДРОБНОСТИ
 15. ПОДРОБНОСТИ
 16. ПОДРОБНОСТИ
 17. ПОДРОБНОСТИ
 18. ПОДРОБНОСТИ
 19. ПОДРОБНОСТИ
 20. ПОДРОБНОСТИ
 21. ПОДРОБНОСТИ
 22. ПОДРОБНОСТИ
 23. ПОДРОБНОСТИ
 24. ПОДРОБНОСТИ
 25. ПОДРОБНОСТИ
 26. ПОДРОБНОСТИ
 27. ПОДРОБНОСТИ
 28. ПОДРОБНОСТИ
 29. ПОДРОБНОСТИ
 30. ПОДРОБНОСТИ
 31. ПОДРОБНОСТИ
 32. ПОДРОБНОСТИ
 33. ПОДРОБНОСТИ
 34. ПОДРОБНОСТИ
 35. ПОДРОБНОСТИ
 36. ПОДРОБНОСТИ
 37. ПОДРОБНОСТИ
 38. ПОДРОБНОСТИ
 39. ПОДРОБНОСТИ
 40. ПОДРОБНОСТИ
 41. ПОДРОБНОСТИ
 42. ПОДРОБНОСТИ
 43. ПОДРОБНОСТИ
 44. ПОДРОБНОСТИ
 45. ПОДРОБНОСТИ
 46. ПОДРОБНОСТИ
 47. ПОДРОБНОСТИ
 48. ПОДРОБНОСТИ
 49. ПОДРОБНОСТИ
 50. ПОДРОБНОСТИ
 51. ПОДРОБНОСТИ
 52. ПОДРОБНОСТИ
 53. ПОДРОБНОСТИ
 54. ПОДРОБНОСТИ
 55. ПОДРОБНОСТИ
 56. ПОДРОБНОСТИ
 57. ПОДРОБНОСТИ
 58. ПОДРОБНОСТИ
 59. ПОДРОБНОСТИ
 60. ПОДРОБНОСТИ
 61. ПОДРОБНОСТИ
 62. ПОДРОБНОСТИ
 63. ПОДРОБНОСТИ
 64. ПОДРОБНОСТИ
 65. ПОДРОБНОСТИ
 66. ПОДРОБНОСТИ
 67. ПОДРОБНОСТИ
 68. ПОДРОБНОСТИ
 69. ПОДРОБНОСТИ
 70. ПОДРОБНОСТИ
 71. ПОДРОБНОСТИ
 72. ПОДРОБНОСТИ
 73. ПОДРОБНОСТИ
 74. ПОДРОБНОСТИ
 75. ПОДРОБНОСТИ
 76. ПОДРОБНОСТИ
 77. ПОДРОБНОСТИ
 78. ПОДРОБНОСТИ
 79. ПОДРОБНОСТИ
 80. ПОДРОБНОСТИ
 81. ПОДРОБНОСТИ
 82. ПОДРОБНОСТИ
 83. ПОДРОБНОСТИ
 84. ПОДРОБНОСТИ
 85. ПОДРОБНОСТИ
 86. ПОДРОБНОСТИ
 87. ПОДРОБНОСТИ
 88. ПОДРОБНОСТИ
 89. ПОДРОБНОСТИ
 90. ПОДРОБНОСТИ
 91. ПОДРОБНОСТИ
 92. ПОДРОБНОСТИ
 93. ПОДРОБНОСТИ
 94. ПОДРОБНОСТИ
 95. ПОДРОБНОСТИ
 96. ПОДРОБНОСТИ
 97. ПОДРОБНОСТИ
 98. ПОДРОБНОСТИ
 99. ПОДРОБНОСТИ
 100. ПОДРОБНОСТИ

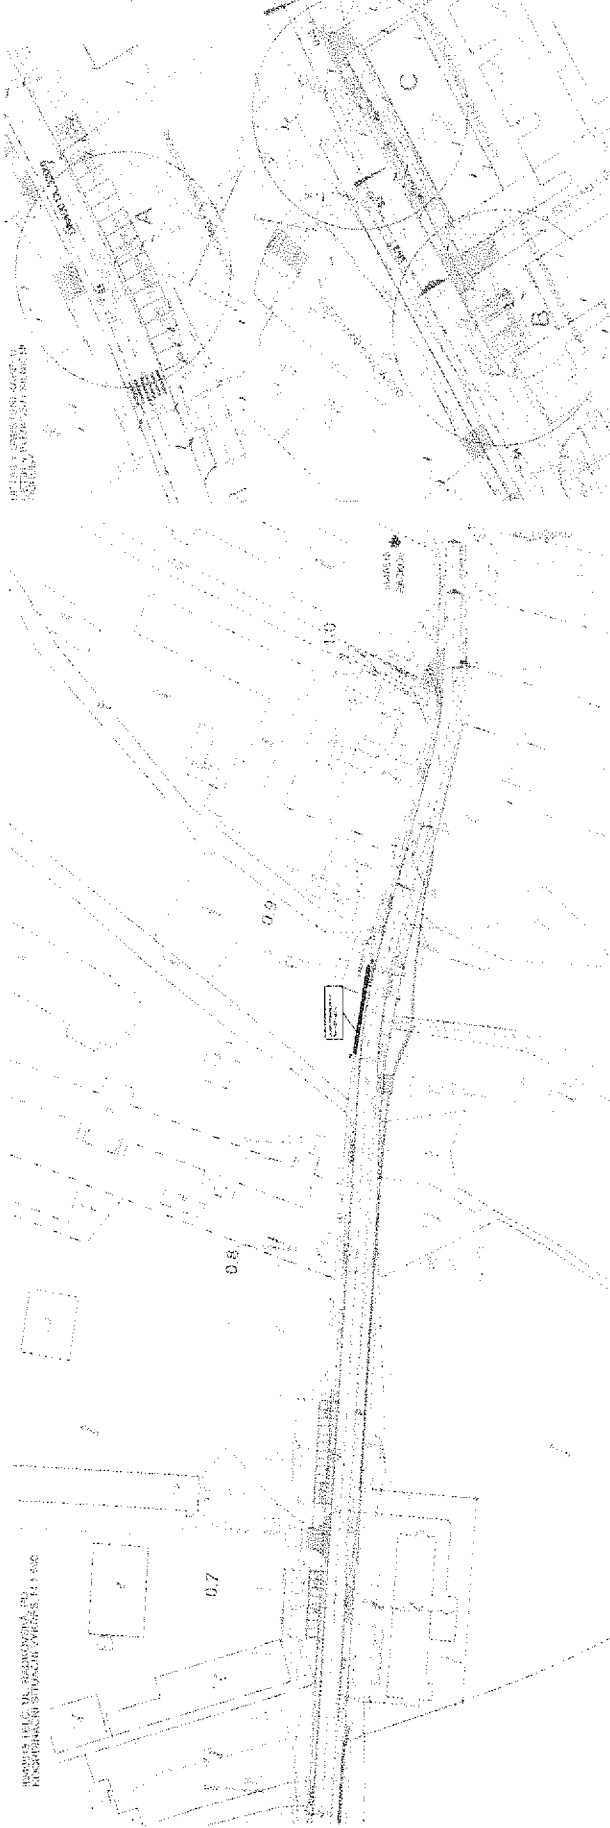

The map depicts the Balkan region, focusing on the area around Belgrade. It shows the Sava and Danube rivers, major cities like Belgrade, Zemun, and Novi Sad, and various military units and positions. The map includes numerous handwritten notes and labels in Cyrillic and Latin script, indicating military movements, positions, and administrative details. Key locations marked include Zemun, Belgrade, Novi Sad, and various districts and units.

[illegible]

Hand-drawn map of the Fukushima Daiichi nuclear power plant area. The map shows the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant (Fukushima Daiichi Genjiyoku) and the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant (Fukushima Daiichi Genjiyoku). The map also shows the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant (Fukushima Daiichi Genjiyoku) and the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant (Fukushima Daiichi Genjiyoku).

姓名	学号	成绩	备注
张三	1001	85	
李四	1002	78	
王五	1003	92	
赵六	1004	65	
孙七	1005	88	
周八	1006	72	
吴九	1007	80	
郑十	1008	75	
陈十一	1009	82	
冯十二	1010	70	

[illegible][illegible]

PPD - Propočet projektové dokumentace
Specifikace nákladů dle CTN

Ceník: z VP TEMO 2021 - STAND. - 2021.12
Položková databáze: 2021.12

Název stavby:
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD:

VPIC III_40618 Telč, JI, ul.Radkovská
Roman Vík

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	58 919,21 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	100 503,39 Kč
MONTÁŽ	73 841,74 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	9 457,09 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	6 109,79 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	3 456,04 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	9 542,60 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	106 631,85 Kč
POPLATKY	1 000,00 Kč

Celkové náklady: 369 461,71 Kč

Číslo SAP	Seznam položek	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA	Název položky		
958210	Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	5 184,06 Kč
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě do - 0,100 km	16540.36 JV	16 540,36 Kč
957746	Šetření technické rozšíření	1.00 ks	1 234,79 Kč
954635	Získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby	35960.00 JV	35 960,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE			
954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	86.00 m	1 785,36 Kč
955265	Práce zemní pro podzemní tratě síťové	12400.00 JV	12 400,00 Kč
	Ruční výkop ve stávající kabelové trase		
955551	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	158.00 m	9 623,78 Kč
955552	Rozšíření prohloubení výk.hl.10cm,š.10cm	250.00 m	4 500,00 Kč
955577	Rýha v chodníku 35/50-70	79.00 m	47 795,00 Kč
955578	Rýha v chodníku rozšíření o10cm	125.00 m	21 631,25 Kč
955054	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	200.00 m	2 768,00 Kč
MONTÁŽ			
955031	Demontáž úložných kabelů do 300 XN	40.00 m	1 426,80 Kč
955030	Demontáž úložných kabelů do 50 XN	108.00 m	2 666,52 Kč
955824	Instal.metal. kab. do stávajících trubek	110.00 m	5 567,10 Kč
958314	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	24.00 ks	2 289,84 Kč
952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	8.00 ks	1 426,88 Kč
952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	348.00 ks	14 320,20 Kč
952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	348.00 ks	9 549,12 Kč
952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	8.00 ks	768,24 Kč
954998	Montáž jedné čtyřky bez číslování	20.00 ks	274,20 Kč
955000	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	35.00 ks	1 200,15 Kč
955282	Montáž spojky smršťovací nad 50 čtyřek	1.00 ks	1 920,78 Kč
955281	Montáž spojky smršťovací do 50 čtyřek	1.00 ks	1 303,38 Kč
954990	Montáž úložných kabelů do 15 XN	8.00 m	186,56 Kč
954992	Montáž úložných kabelů do 300 XN	8.00 m	335,20 Kč
954991	Montáž úložných kabelů do 50 XN	28.00 m	806,68 Kč
954980	Překládka trubky úložné	120.00 m	2 161,20 Kč
957753	Realizace tratě síťové dohodou	24800.00 JV	24 800,00 Kč
	Rozpočtová rezerva		
958556	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 838,89 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA			
956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km	170.00 m	3 347,30 Kč
956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	6 109,79 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
956281	Doměření trasy do 100 m	1.00 ks	6 109,79 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	3 456,04 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
958747	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	3 019,10 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	1000.00 JV	1 000,00 Kč
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 283,46 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	3 240,04 Kč
POPLATKY			
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	1000.00 JV	1 000,00 Kč
	Poplatek UR		

Číslo SAP	Limitka materiálu	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	Název položky		
303918	Deska krycí plast. 300x1000 mm	79.00 ks	2 894,56 Kč
303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	46.00 m	170,66 Kč
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	79.00 m	336,54 Kč
300120	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,6	12.00 m	1 528,44 Kč
302550	Mini Marker 1401 3M Ball	12.00 ks	2 355,12 Kč
320313	Souprava odbočovací BOKT-5L-160/42-200/50	2.00 ks	1 297,48 Kč
312881	Spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FLE	1.00 ks	689,66 Kč
320294	Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460	1.00 ks	764,47 Kč
319184	Spona trubkySYSPRO	876.00 ks	17 195,88 Kč
319209	Trubka dělená SYSPRO 160/110	86.00 m	38 257,10 Kč
319210	Trubka dělená SYSPRO 200/160	60.00 m	37 288,80 Kč
302423	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	86.00 m	3 454,62 Kč
309759	Vodič prop. SM-clip-volný B6 10114-B6U50	6.00 ks	398,52 Kč

Petr
Macho,
DiS.

Digitálně podepsal
Petr Macho, DiS.
Datum: 2022.01.03
11:21:47 +01'00'
