

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00048
Číslo smlouvy Stavebníka: 150299

SAP S/4 Hana: 8030003024
Registr smluv: ANO

635/22



**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. VPI/MJ/2022/00048**

mezi

CETIN a.s.

a

Kraj Vysočina

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00048
Číslo smlouvy Stavebníka: 150299

SAP S/4 Hana: 8030003024
Registr smluv: ANO

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená na základě pověření Ing. Miroslavem Kotem, supervizorem pro výstavbu sítě

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „**CETIN**“)

a

Kraj Vysočina

se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

IČO: 70890749

DIČ: CZ70890749

zastoupená Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem, k podpisu této smlouvy pověřen

Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh a současně realizační dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Hrotopice; Rouchovany; Slavětice spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní,

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00048
Číslo smlouvy Stavebníka: 150299

SAP S/4 Hana: 8030003024
Registr smluv: ANO

kteře umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.“ ze dne 15.10.2021 vydané pod čj. 796704/21, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC II_152 Hrotovice-Dukovany 1.stavba**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickým) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00048
 Číslo smlouvy Stavebníka: 150299

SAP S/4 Hana: 8030003024
 Registr smluv: ANO

- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování CTN;
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však dva (2) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník se zavazuje uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí a převést na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky. Ve lhůtě dle předchozího odstavce je Stavebník povinen předat společnosti CETIN územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
- (c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 bodu (i) Smlouvy.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00048
Číslo smlouvy Stavebníka: 150299

SAP S/4 Hana: 8030003024
Registr smluv: ANO

povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **474.220,- Kč** (slovy: čtyři sta sedmdesát čtyři tisíc dvě stě dvacet korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN.
- 5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v nákladech překládky stanovených po vyhotovení Projektu dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy. Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit na základě dodatku k této smlouvě, přičemž smluvní strany se zavazují takový dodatek uzavřít před provedením prací nebo vznikem nákladů souvisejících s překládkou SEK a to do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jeho uzavření Stavebníkovi. Pokud k uzavření takového dodatku v uvedené lhůtě nedojde, uhradí Stavebník tyto náklady společnosti CETIN na základě jejich uplatnění.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníků Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vážnoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00048
 Číslo smlouvy Stavebníka: 150299

SAP S/4 Hana: 8030003024
 Registr smluv: ANO

- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordinální výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku stanovené na základě CTN se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:

- (a) Faktura za CTN Překládky ve výši **10.826,- Kč** (slovy: deset tisíc osm set dvacet šest korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od uzavření této Smlouvy,
- (b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.

6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.

6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.

6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00048
Číslo smlouvy Stavebníka: 150299

SAP S/4 Hana: 8030003024
Registr smluv: ANO

- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: Ludmila Uhrová
funkce: specialista pro výstavbu sítě - překládky SEK
e-mail: ludmila.uhrova@cetin.cz, tel.: 238 462 454

ve věcech technických: Petr Bílek
funkce: senior specialista pro výstavbu sítě
e-mail: petr.bilek@cetin.cz, tel.: 606 758 332

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Houška
funkce: náměstek hejtmana
e-mail: houska.m@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 126

ve věcech technických: Ing. Miroslav Dokulil
funkce: referent ODSH
e-mail: dokulil.m@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 222

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00048
Číslo smlouvy Stavebníka: 150299

SAP S/4 Hana: 8030003024
Registr smluv: ANO

- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKY

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marne uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přijímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00048
Číslo smlouvy Stavebníka: 150299

SAP S/4 Hana: 8030003024
Registr smluv: ANO

- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společností CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- (a) v listinné podobě;
 - (b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;
 - (c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.
- Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy, věta první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem (b) a (c).
- 12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00048
 Číslo smlouvy Stavebníka: 150299

SAP S/4 Hana: 8030003024
 Registr smluv: ANO

Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

- 12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoliv svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).
- Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00048
Číslo smlouvy Stavebníka: 150299

SAP S/4 Hana: 8030003024
Registr smluv: ANO

účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.


12.13 Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

CETIN:

V Brně dne 21. 01. 2022



CETIN a.s.
Ing. Miroslav Kot
supervizor pro výstavbu sítě

CETIN a.s.
Česká republika, 25101/19, Libeň
193 00 Praha 9
IČ: 254084665

212

Stavebník:

21. 01. 2022
V Jihlavě dne _____



Kraj Vysočina
Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmána


Kraj Vysočina
Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava

21

TECHNICKÁ ZPRÁVA CTN

VPIC II_152 Hrotovice-Dukovany 1.stavba

CTN řeší situaci vyvolanou stavbou *II/152 Hrotovice - Dukovany, 1. stavba, okružní křižovatka*.
Předmětem stavby je úprava stávající průsečné křižovatky silnic II/152 a II/399 na křižovatku okružní s úpravou navazujících částí komunikací v délce cca 100 – 200 m.

Tento CTN se zabývá jižní částí křižovatky. V situačním plánu označeno jako SO 401.
Zde dochází ke kolizi s vedením SEK CETIN, obsahující metalický kabel 50XN0,6 a 4 HDPE trubky, z nichž je jedna obsazena optickým kabelem. Na konci dotčeného úseku se nachází spojka na optickém kabelu. Vedení bude přeloženo do nové trasy mimo budované komunikace, pouze s jedním kolmým křížením silnice II/399.

Přeložení metalického kabelu a HDPE trubek bude realizováno vložkami vedení stejných typů a dimenzí.

Optický kabel SAM 24f Cu bude ve spojce OS07 přerušen a vyfouknut na začátek překládaného úseku. Na začátku překládaného úseku bude zřízena nová optická spojka a do nově položené HDPE trubky bude zafouknut nový optický kabel OFS 24f MIDIA Cu. V spojkách bude navařen na stávající.

V místě křížení silnice II/399 bude vedení uloženo v chrániče v hloubce 1,2 m pod úrovní vozovky.

Dotčené pozemku v k.ú. Slavětice
338/1 - Kovář Bohumil Mgr., č. p. 44, 67555 Slavětice

Dotčené pozemku v k.ú. Hrotovice
741/8, 941 - Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava
741/1 - Lesy České republiky, s.p.

Na akci nebude zpracován realizační stupeň PD, bude využit situační plán stavby.

ÚR zajistí stavebník.

VBř 3x

VPIC II_152 Hrotovice-Dukovany 1.stavba

stávající metalický sdělovací kabel CETIN
(nominální průběh)

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

stávající metalický sdělovací kabel CETIN
stávající optický sdělovací kabel
stávající kabely telefonní sítě
stávající kabely rozvodné sítě
stávající kabely rozvodné sítě
stávající kabely rozvodné sítě

LEGENDA PŘELOŽENÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

přeložka metalického sdělovacího kabelu
přeložka optického sdělovacího kabelu
přeložka kabelu telefonní sítě
přeložka kabelu rozvodné sítě
přeložka kabelu rozvodné sítě
přeložka kabelu rozvodné sítě

SO 402: PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO KABELU
(předpokládaná trasa, dl. cca 180 m)

stávající metalický sdělovací kabel CETIN
(nominální průběh)

SO 101 - KOMUNIKACE - ZÁPADNÍ VĚTEV

Začátek přeložky CETIN sdělní
1. SO
2. SO
3. SO
4. SO
5. SO
6. SO
7. SO
8. SO
9. SO
10. SO
11. SO
12. SO
13. SO
14. SO
15. SO
16. SO
17. SO
18. SO
19. SO
20. SO
21. SO
22. SO
23. SO
24. SO
25. SO
26. SO
27. SO
28. SO
29. SO
30. SO
31. SO
32. SO
33. SO
34. SO
35. SO
36. SO
37. SO
38. SO
39. SO
40. SO
41. SO
42. SO
43. SO
44. SO
45. SO
46. SO
47. SO
48. SO
49. SO
50. SO
51. SO
52. SO
53. SO
54. SO
55. SO
56. SO
57. SO
58. SO
59. SO
60. SO
61. SO
62. SO
63. SO
64. SO
65. SO
66. SO
67. SO
68. SO
69. SO
70. SO
71. SO
72. SO
73. SO
74. SO
75. SO
76. SO
77. SO
78. SO
79. SO
80. SO
81. SO
82. SO
83. SO
84. SO
85. SO
86. SO
87. SO
88. SO
89. SO
90. SO
91. SO
92. SO
93. SO
94. SO
95. SO
96. SO
97. SO
98. SO
99. SO
100. SO

SO 401 - PŘELOŽKA OPTICKÉHO KABELU
(předpokládaná trasa, dl. cca 190 m)

stávající optická spojka OS97


SO 101 - KOMUNIKACE - VÝCHOVNÍ VĚTEV

ADRESA PŘELOŽKY CETIN SDĚLNÍ
1. SO
2. SO
3. SO
4. SO
5. SO
6. SO
7. SO
8. SO
9. SO
10. SO
11. SO
12. SO
13. SO
14. SO
15. SO
16. SO
17. SO
18. SO
19. SO
20. SO
21. SO
22. SO
23. SO
24. SO
25. SO
26. SO
27. SO
28. SO
29. SO
30. SO
31. SO
32. SO
33. SO
34. SO
35. SO
36. SO
37. SO
38. SO
39. SO
40. SO
41. SO
42. SO
43. SO
44. SO
45. SO
46. SO
47. SO
48. SO
49. SO
50. SO
51. SO
52. SO
53. SO
54. SO
55. SO
56. SO
57. SO
58. SO
59. SO
60. SO
61. SO
62. SO
63. SO
64. SO
65. SO
66. SO
67. SO
68. SO
69. SO
70. SO
71. SO
72. SO
73. SO
74. SO
75. SO
76. SO
77. SO
78. SO
79. SO
80. SO
81. SO
82. SO
83. SO
84. SO
85. SO
86. SO
87. SO
88. SO
89. SO
90. SO
91. SO
92. SO
93. SO
94. SO
95. SO
96. SO
97. SO
98. SO
99. SO
100. SO


stávající optický sdělovací kabel CETIN
(geodetický zaměřený průběh)


SWECO

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha			
Tabulka 31. 140 16 Plana 4: přehled o stavu sítě			
VYPRACOVANÁ	Ing. Svoboda	Ing. Svoboda	Ing. Svoboda
PROJEKTOVÁNÍ	Ing. Svoboda	Ing. Svoboda	Ing. Svoboda
ODKRYVATEL	Ing. Svoboda	Ing. Svoboda	Ing. Svoboda
II/152 Hrotovice - Dukovany, okružní křižovatka			
ČÍSLO STAVBY	SO 400 - Elektro a sdělovací sítě	ČÍSLO STAVBY	SO 401 - ADE
PRŮBĚH	Situace	ČÍSLO PRŮBĚHU	032

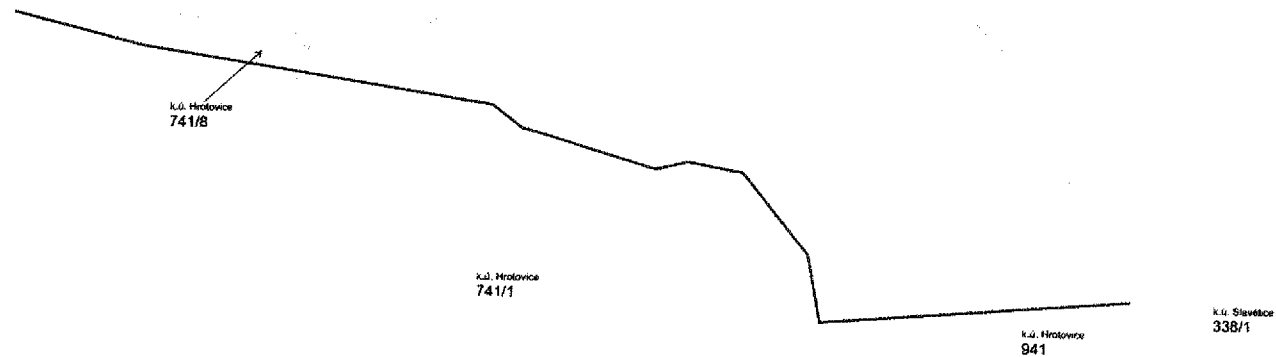

VPIC II_152 Hrotovice-Dukovany 1.stavba

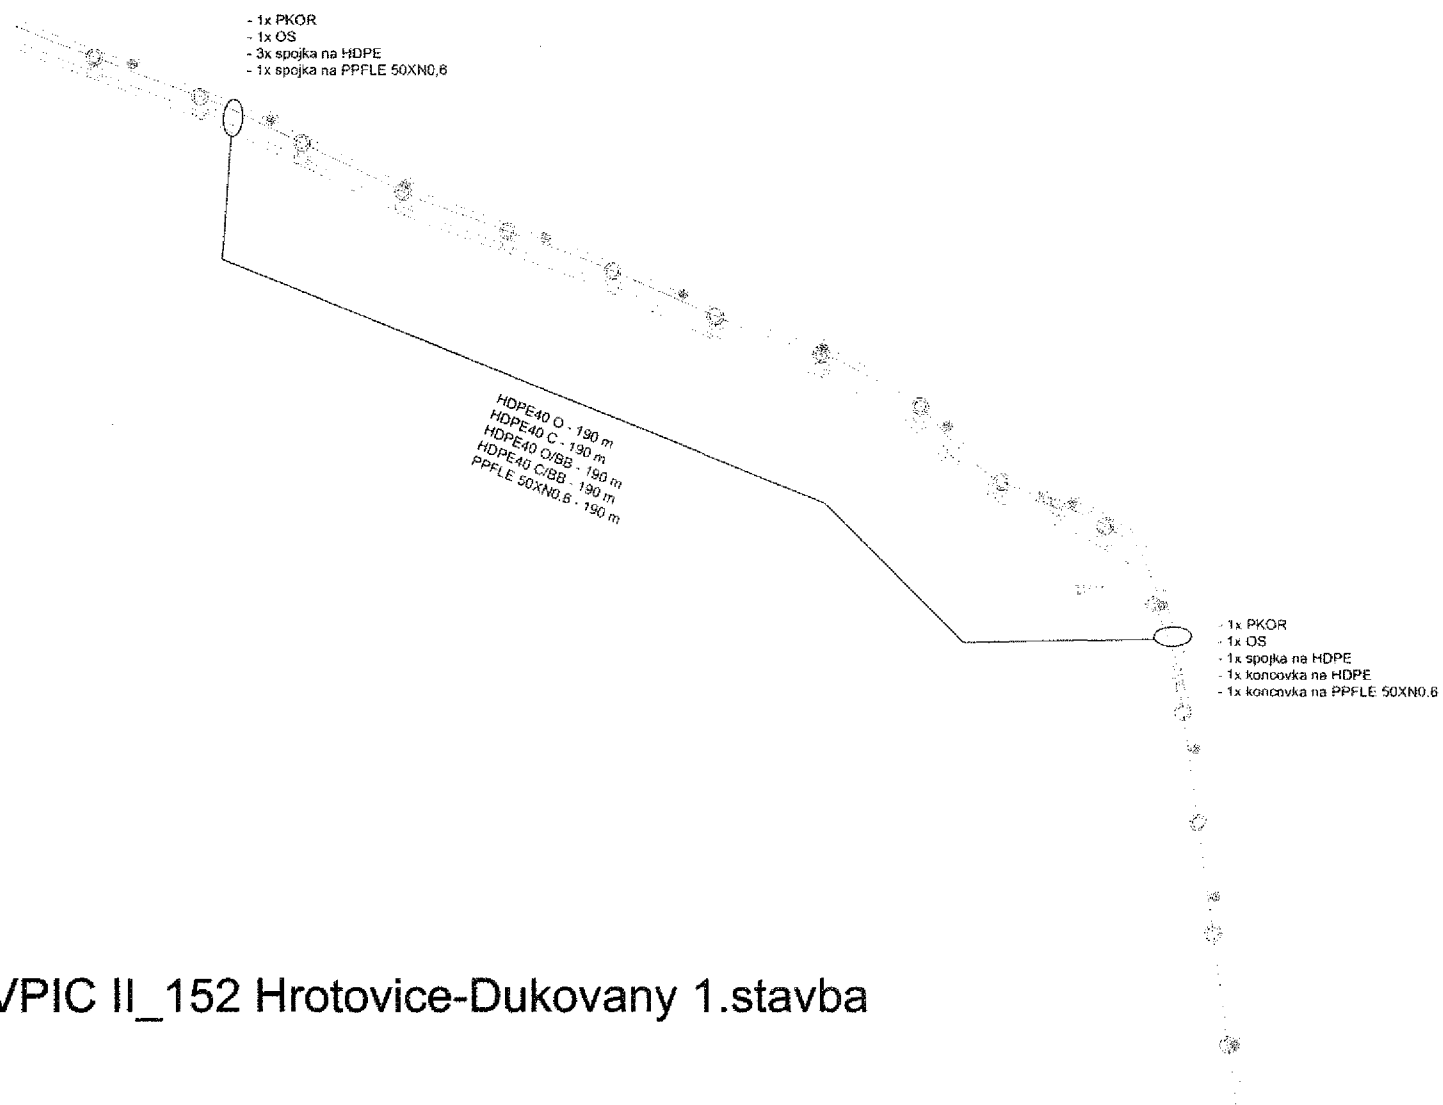

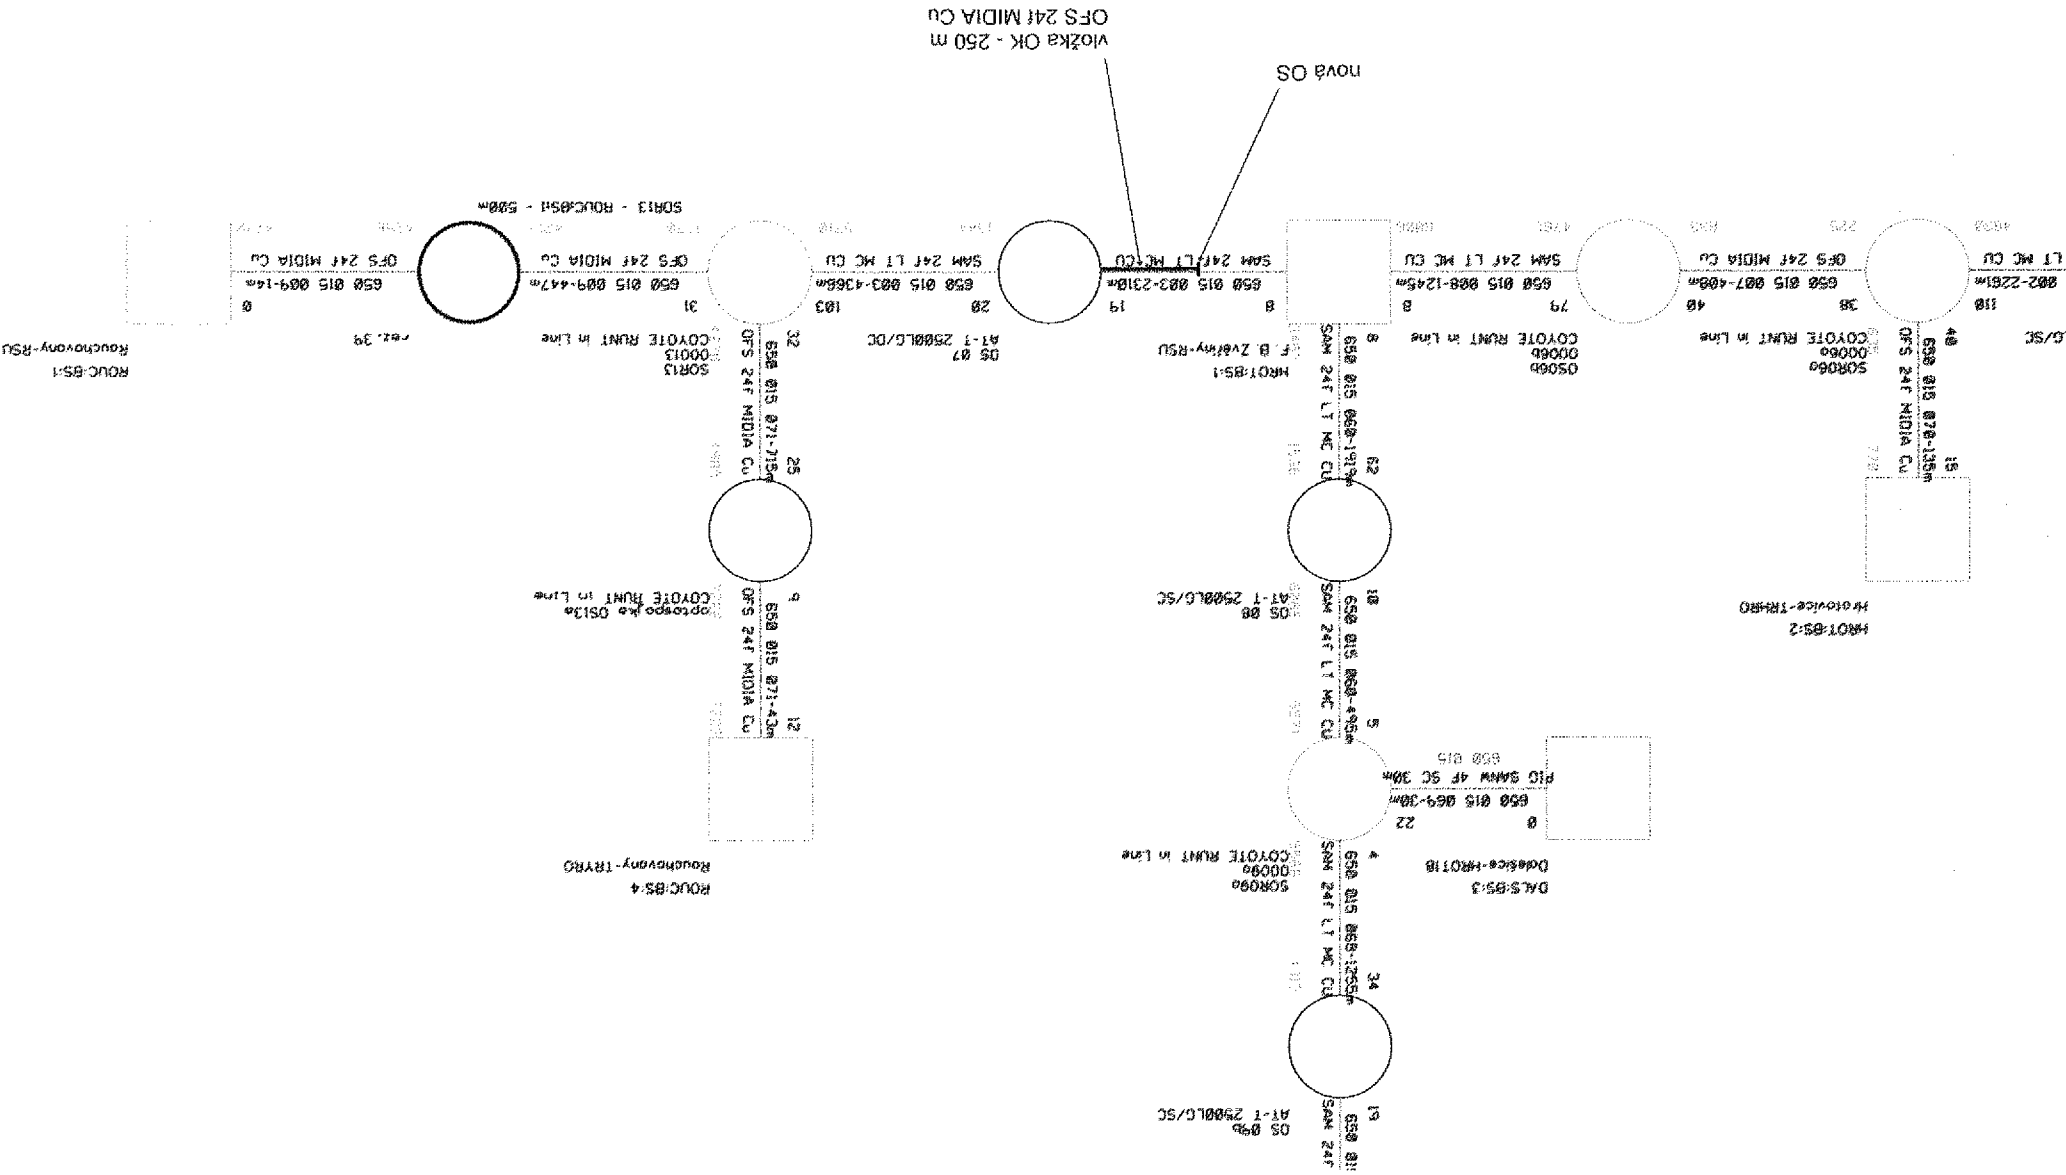

VPIC II_152 Hrotovice-Dukovany 1.stavba - specifikace nákladů

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: α VP TEMO 2021 - STAND. - 2022.01

Název stavby: **VPIC II_152 Hrotovice-Dukovany 1.stavba**

Číslo SPP prvku:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	10 861,84 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	170 142,44 Kč
MONTÁŽ	116 255,04 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	7 881,89 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	7 881,89 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	10 368,12 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	42 608,70 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE	108 220,08 Kč

Celkové náklady: **474 220,00 Kč**

Číslo SAP	Seznam položek Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA			
958084	Návrh cenový a technický	1.00 ks	10 861,84 Kč
ZEMNÍ PRÁCE			
954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	100.00 m	2 076,00 Kč
955551	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	190.00 m	11 572,90 Kč
955577	Rýha v chodníku bosém 35/50-70	190.00 m	114 950,00 Kč
958755	Rýha v chodníku bosém 50/130	26.00 m	38 913,94 Kč
955054	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	190.00 m	2 629,60 Kč
MONTÁŽ			
958306	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	760.00 m	3 549,20 Kč
958310	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm)	24.00 ks	9 917,04 Kč
958314	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm)	24.00 ks	2 289,84 Kč
952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	1.00 ks	178,36 Kč
952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	49.00 ks	2 016,35 Kč
954999	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	50.00 ks	1 372,00 Kč
955255	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	2.00 ks	81,30 Kč
955288	Montáž koncovky SKH	1.00 ks	54,88 Kč
955003	Montáž ochranného boxu pro spojku	2.00 ks	1 567,34 Kč
955269	Montáž podzemní tratě síťové optické	12400.18 JV	12 400,18 Kč
955286	Montáž spojky bez montáže vláken	2.00 ks	2 537,54 Kč
955282	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	1.00 ks	1 920,78 Kč
955284	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	4.00 ks	216,80 Kč
952602	Montáž trubky úložné	760.00 m	14 060,00 Kč
954991	Montáž úložných kabelů do 50 XN	190.00 m	5 473,90 Kč
958557	Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks	15 552,18 Kč
958331	Svaření jednotlivého vlákna v transp. a metrop.síti	48.00 ks	20 517,60 Kč
958469	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	5 262,56 Kč
958336	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	440.00 m	12 540,00 Kč

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.

Číslo SAP	Limitka materiálu	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE				
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		190.00 m	809,40 Kč
300218	Kabel opt. MiDia ,24vl. AW+,OD 7,5mm,Cu		250.00 m	5 660,00 Kč
300121	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6		190.00 m	46 477,80 Kč
318863	Kazeta24 svárůCoyoteRunt modré držáky4x6		2.00 ks	1 011,10 Kč
316547	Koncovka smršť. SKH 4 25/55 mm		1.00 ks	146,59 Kč
302788	Koncovka trubky 40 mm Plasson		2.00 ks	222,44 Kč
321713	Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x300		2.00 ks	16 956,32 Kč
302532	Mini Marker 1255 80-6102-2191-5		2.00 ks	444,86 Kč
302550	Mini Marker 1401 3M Ball		2.00 ks	392,52 Kč
312425	Modul konektor. 9700-10P		10.00 ks	222,20 Kč
323050	Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm		48.00 ks	251,52 Kč
306776	Průchodka spojky Coyote s 4 vst. 8-11mm		4.00 ks	2 739,72 Kč
303251	Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon		2.00 ks	185,18 Kč
312889	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE		1.00 ks	693,35 Kč
306732	Spojka opt.univerzální.Coyote RUNT In-Line		2.00 ks	9 932,28 Kč
325454	Spojka trubky HDPE 40mm Plassim		4.00 ks	403,00 Kč
300027	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy		190.00 m	4 413,70 Kč
300023	Trubka HDPE 40/33 černá		190.00 m	4 413,70 Kč
300036	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy		190.00 m	4 413,70 Kč
300030	Trubka HDPE 40/33 oranžová		190.00 m	4 413,70 Kč
302423	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem		100.00 m	4 017,00 Kč
