
**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍŤE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. HK 2022_0008**

mezi

CETIN a.s.

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

ID DS: qa7425t

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená Jiřím Valešem, supervizorem, Výstavba PPS Čechy

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „CETIN“)

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČO: 00085031

DIČ: CZ00085031

ID DS: ffhk8fq

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn.

Pr 162

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem

(dále jen „Stavebník“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Slatina nad Zdobnicí; Kameničná spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 14.5.2021 vydané pod čj. 645218/21, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Kameničná(UO), SÚS úprava křižovatky**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastněním takového práva.(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.

- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektů,
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky,
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však šest (6) měsíců od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník se zavazuje, nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, jejíž vzor je uveden v Příloze č. 2 Smlouvy a převést na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky. Ve lhůtě dle předchozího odstavce je Stavebník povinen předat společnosti CETIN územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
- (c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy;
- (d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodloužení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodloužení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **186 895,00 Kč** (slovy: jedno sto osmdesát šest tisíc osm set devadesát pět korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do šesti (6) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou

- dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoúci na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
 - (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
 - (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
 - (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
 - (f) náklady na identifikaci parcel,
 - (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
 - (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
 - (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
 - (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
 - (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
 - (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
 - (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „Faktura“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:

- (a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši **28 637,00Kč** (slovy: dvacet osm tisíc šest set třicet sedm korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy,
- (b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.

6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.

- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: [REDACTED]
funkce: specialista pro výstavbu sítě
tel. [REDACTED]

ve věcech technických: Luboš Minář
funkce: specialista pro výstavbu sítě
tel. 607 039 087, e-mail: lubos.minar@cetin.cz

- 8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: [REDACTED]
funkce: technik přípravy staveb

ve věcech technických: [REDACTED]
funkce: technický náměstek

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst.

- 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN od smlouvy dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.
- 9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a

Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv

jedním z těchto způsobů:

- (a) v listinné podobě;
- (b) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zaručený elektronický podpis**“);
- (c) e-mailovou zprávou opatřenou Zaručeným elektronickým podpisem;
- (d) e-mailovou zprávou zaslou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.7, věty první Smlouvy a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmeny (c) a (d).

- 12.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.
- 12.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
- 12.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.10 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

12.11 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které

Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

12.12 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

12.13 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktivní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoliv souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.14 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.

12.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby – vzor

CETIN
V Praze dne

Stavebník
V Pardubicích dne


Jiří Valeš
Digitálně podepsal Jiří Valeš
Datum: 2022.03.07 09:51:59
+01'00'



Ing. Miroslav Němec
2022.03.09 14:26:58
+01'00'

CETIN a.s.
Jiří Valeš
supervizor, Výstavba PPS Čechy
(podepsáno elektronicky)

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Miroslav Němec
ředitel
(podepsáno elektronicky)

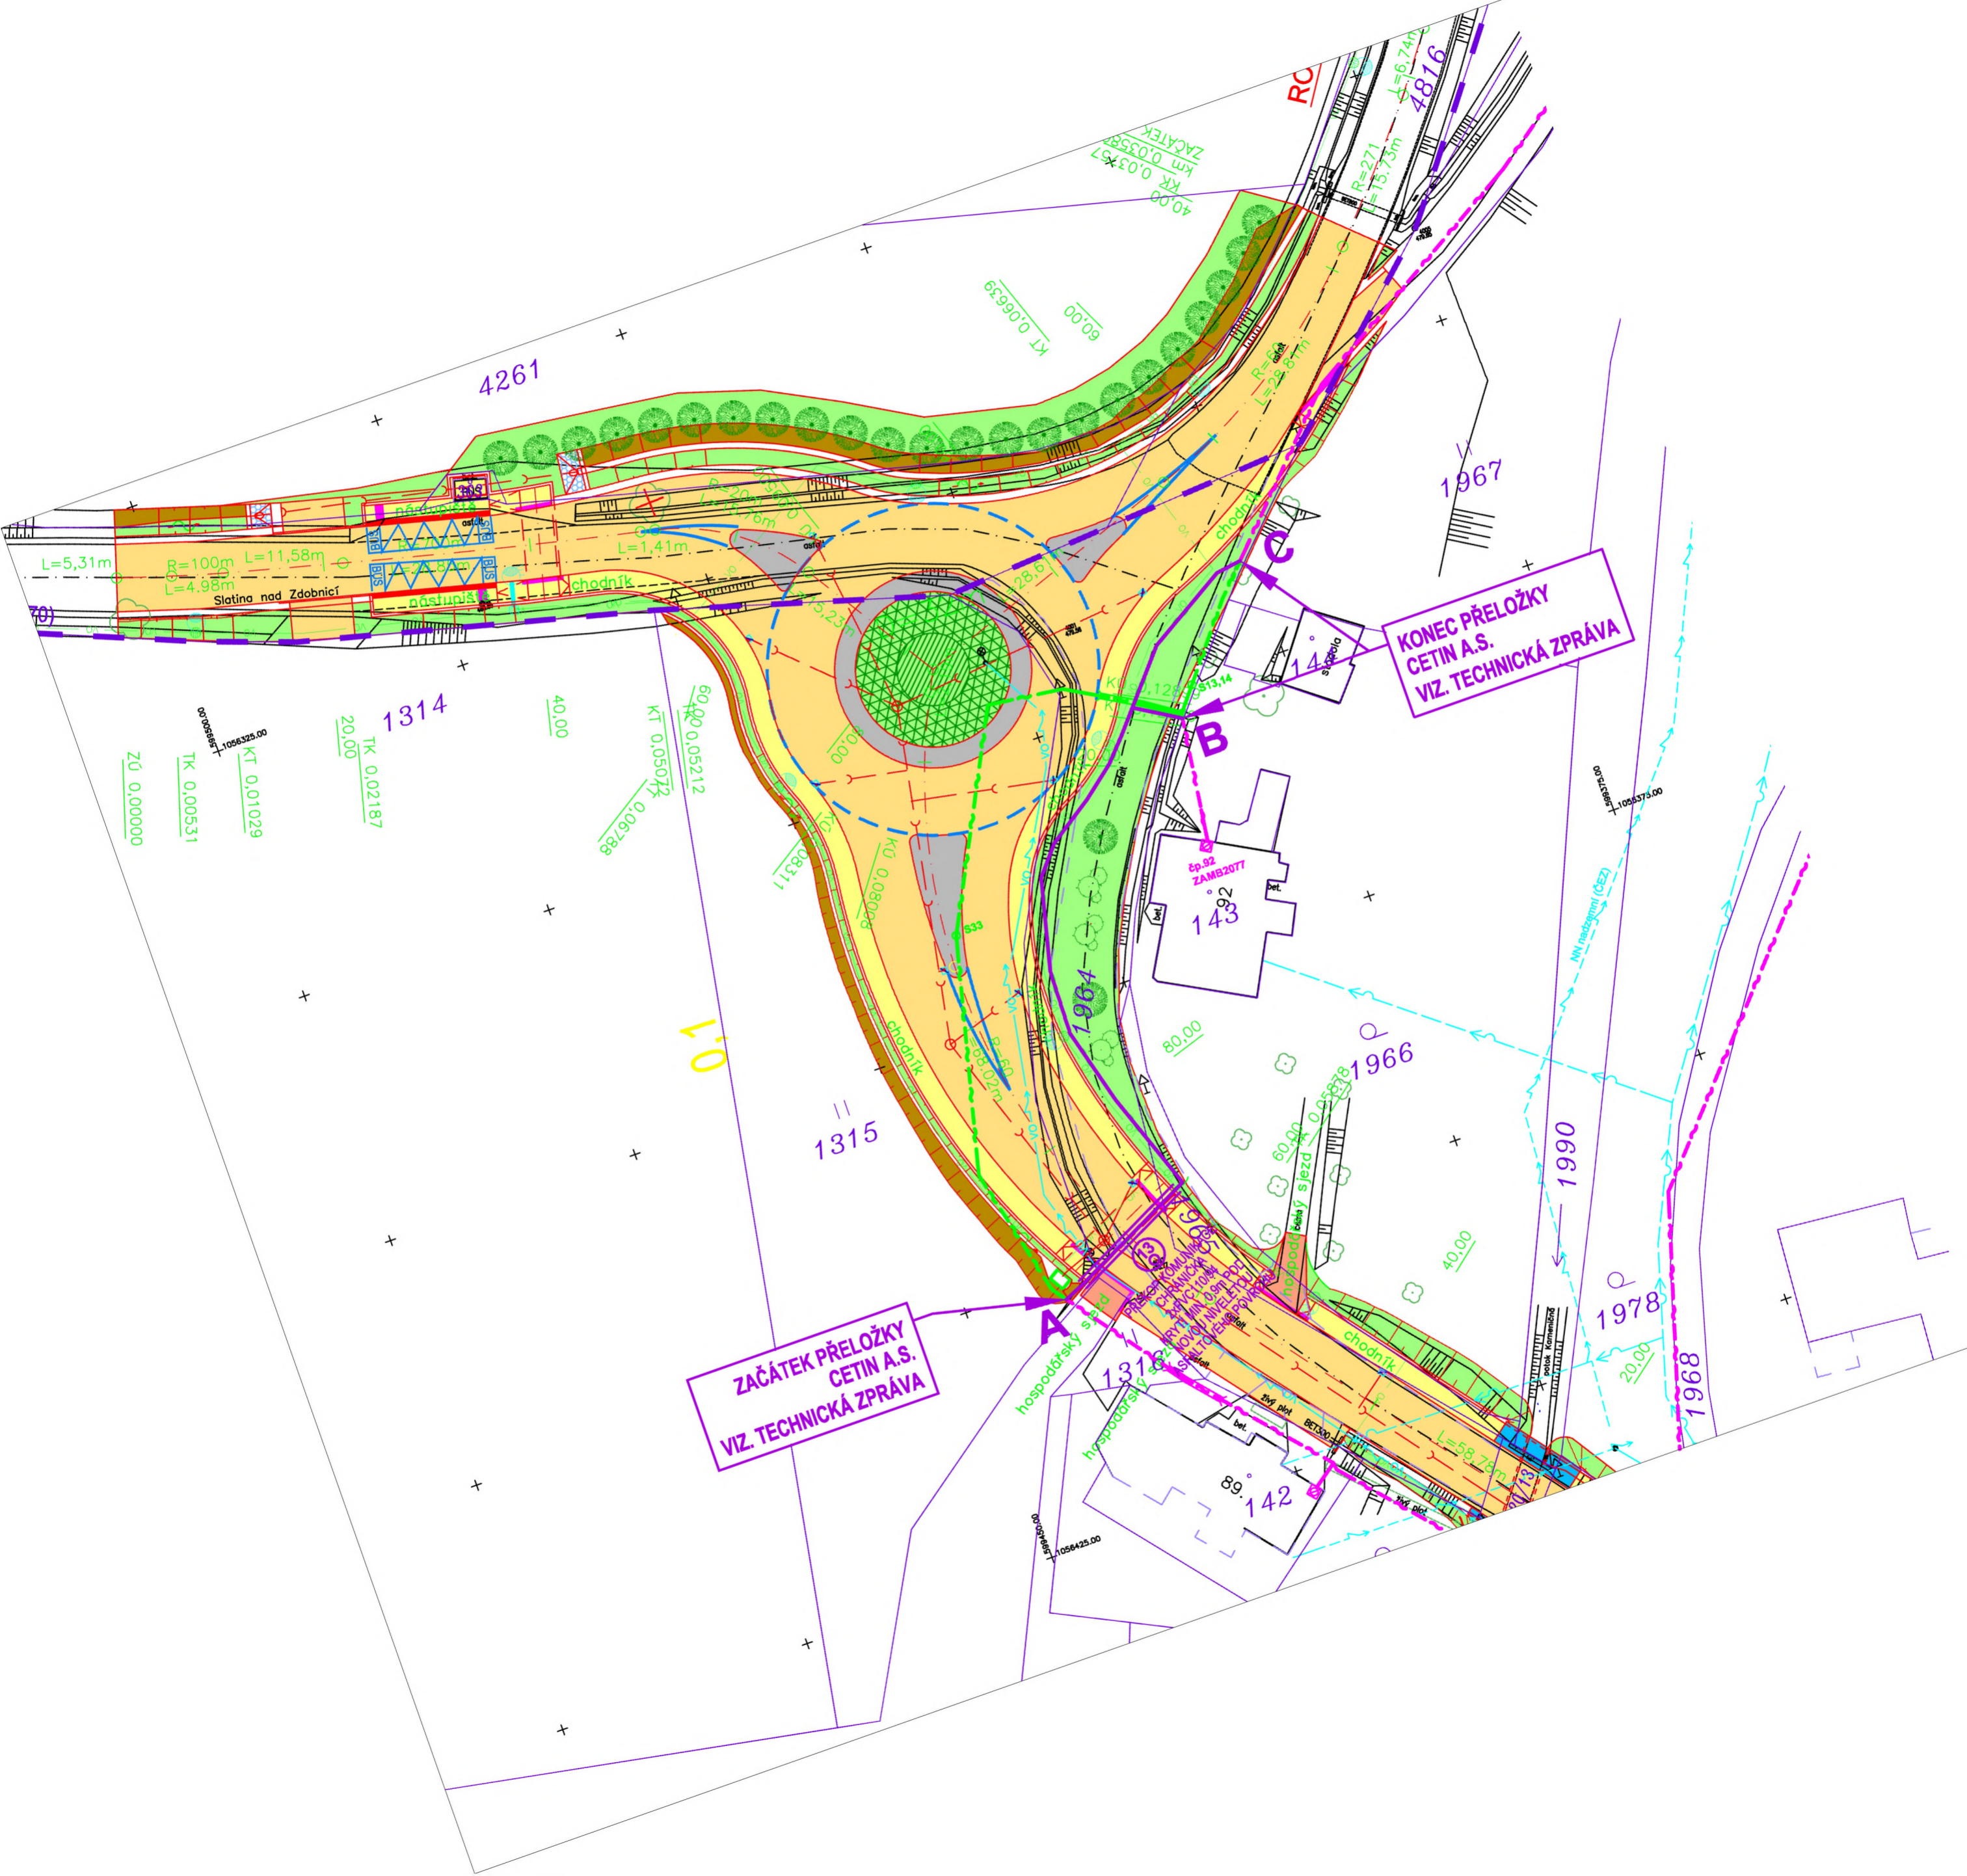

KONEC PŘELOŽKY
CETIN A.S.
VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZAČÁTEK PŘELOŽKY
CETIN A.S.
VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

4261

1314

1315

143

1966

1967

1990

1978

1968

89. 142

1312

L=5,31m

L=4,98m

L=11,58m

L=1,41m

60,00

KT 0,055072

0,06788

60,00

KT 0,05212

0,08098

80,00

40,00

20,00

1056425,00

1056375,00

1056325,00

ZÚ 0,00000

TK 0,00531

TK 0,01029

TK 0,02187

20,00

1,0

1967

1312

1312

1312

1312

1312

1312

1312

1312

1312

1312

1312

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd


hospodářský sjezd

hospodářský sjezd


hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

hospodářský sjezd

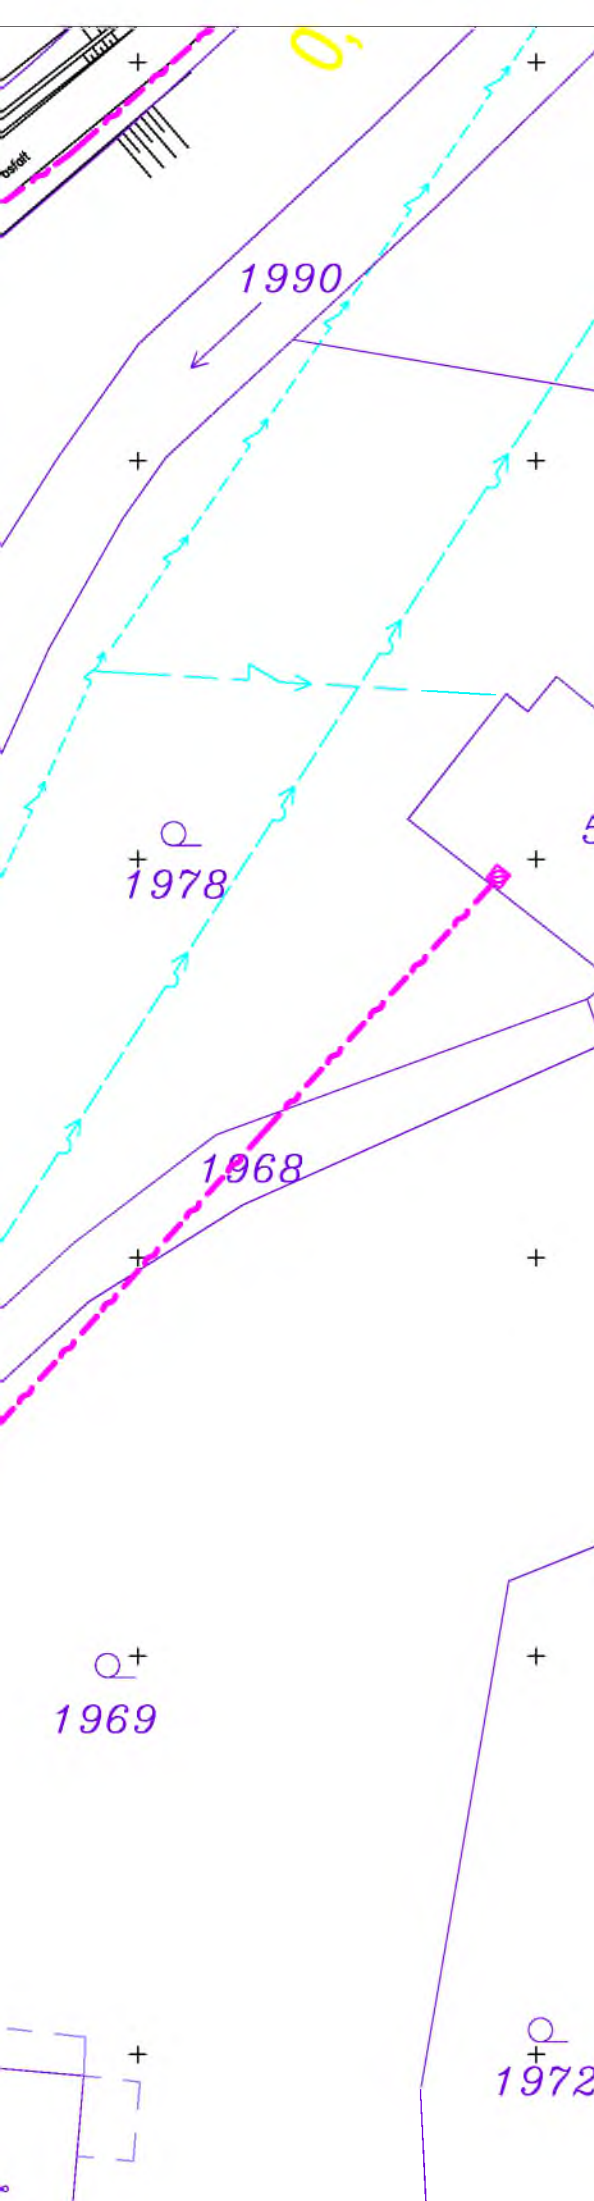


NEJMENŠÍ DOVOLENÉ KRYTÍ
SDĚLOVACÍ KABELY OPTICKÉ MÍSTNÍ VE SPOLEČNÉM VÝKOPU
S KABELY METALICKÝMI MÍSTNÍMI

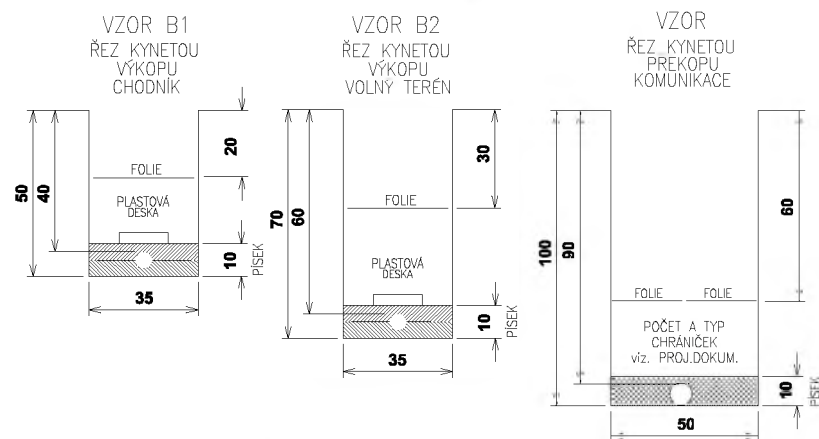

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:



PŘELOŽKY, ÚPRAVY SÍTÍ:



LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ CETIN a.s.:




POZNÁMKA:

PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ PRO POKLÁDKU SDĚLOVACÍCH KABELU JE NUTNO VYTYČIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ NACHÁZEJÍCÍ SE V ZÁJMOVÉ OBLASTI POKLÁDKY TĚCHTO SDĚLOVACÍCH KABELU - SONDAMI A VYTYČENÍM. NORMATIVNÍ ULOŽENÍ KABELU A TRUBEK HDPE V PŘEKOPECH A VÝKOPECH JE PATRNO NA TOMTO VÝKRESE.

ZAKRESLENÍ VEŠKERÝCH INŽ. SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ. TRASA TLK. KABELU JE OKÓTOVÁNA POUZE ORIENTAČNĚ, SKUTEČNÁ TRASA BUDE STANOVENA V DOBĚ VÝSTAVBY NA ZÁKLADĚ PROVEDENÝCH SOND.


SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV



D.11. DUSP

HLAVNÍ PROJEKTANT:	FÖRSTEROVA 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL.: MDS@MDSPROJEKT.CZ		
	ING. JAN BURSA		
ZPRACOVAL:	BULENA PETR		Ing. Stanislav Marhold CTI PROJEKT V. Nezvala 1329, 565 01 Choceň tel: 604 234 069, e-mail: projekt@ctiprojekt.cz
ZODP. PROJEKTANT:	ING. STANISLAV MARHOLD		
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. STANISLAV MARHOLD		
KRAJ: PARDUBICKÝ, KRÁLOVÉHRADECKÝ	OKRES: ÚSTÍ N. O., RYCHNOV N.K.	OBEC: KAMENIČNÁ	STUPEŇ: DUSP
INVESTOR: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE			ZAK. Č.: 2276-20-3
AKCE:	II/310 KAMENIČNÁ, PROSTOROVÁ ÚPRAVA KŘIŽOVATKY		ARCH. Č.: 2276
OBJEKT: D.11. SO 461 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍ KABELU CETIN A.S.			DATUM: 04/2021
OBSAH: SITUACE TRASY			FORMÁT: 3A4
			MĚŘÍTKO: 1:500
			ČÍSLO SOUPRAVY: ČÍSLO PŘÍL. VÝKRESU: D.11.2.

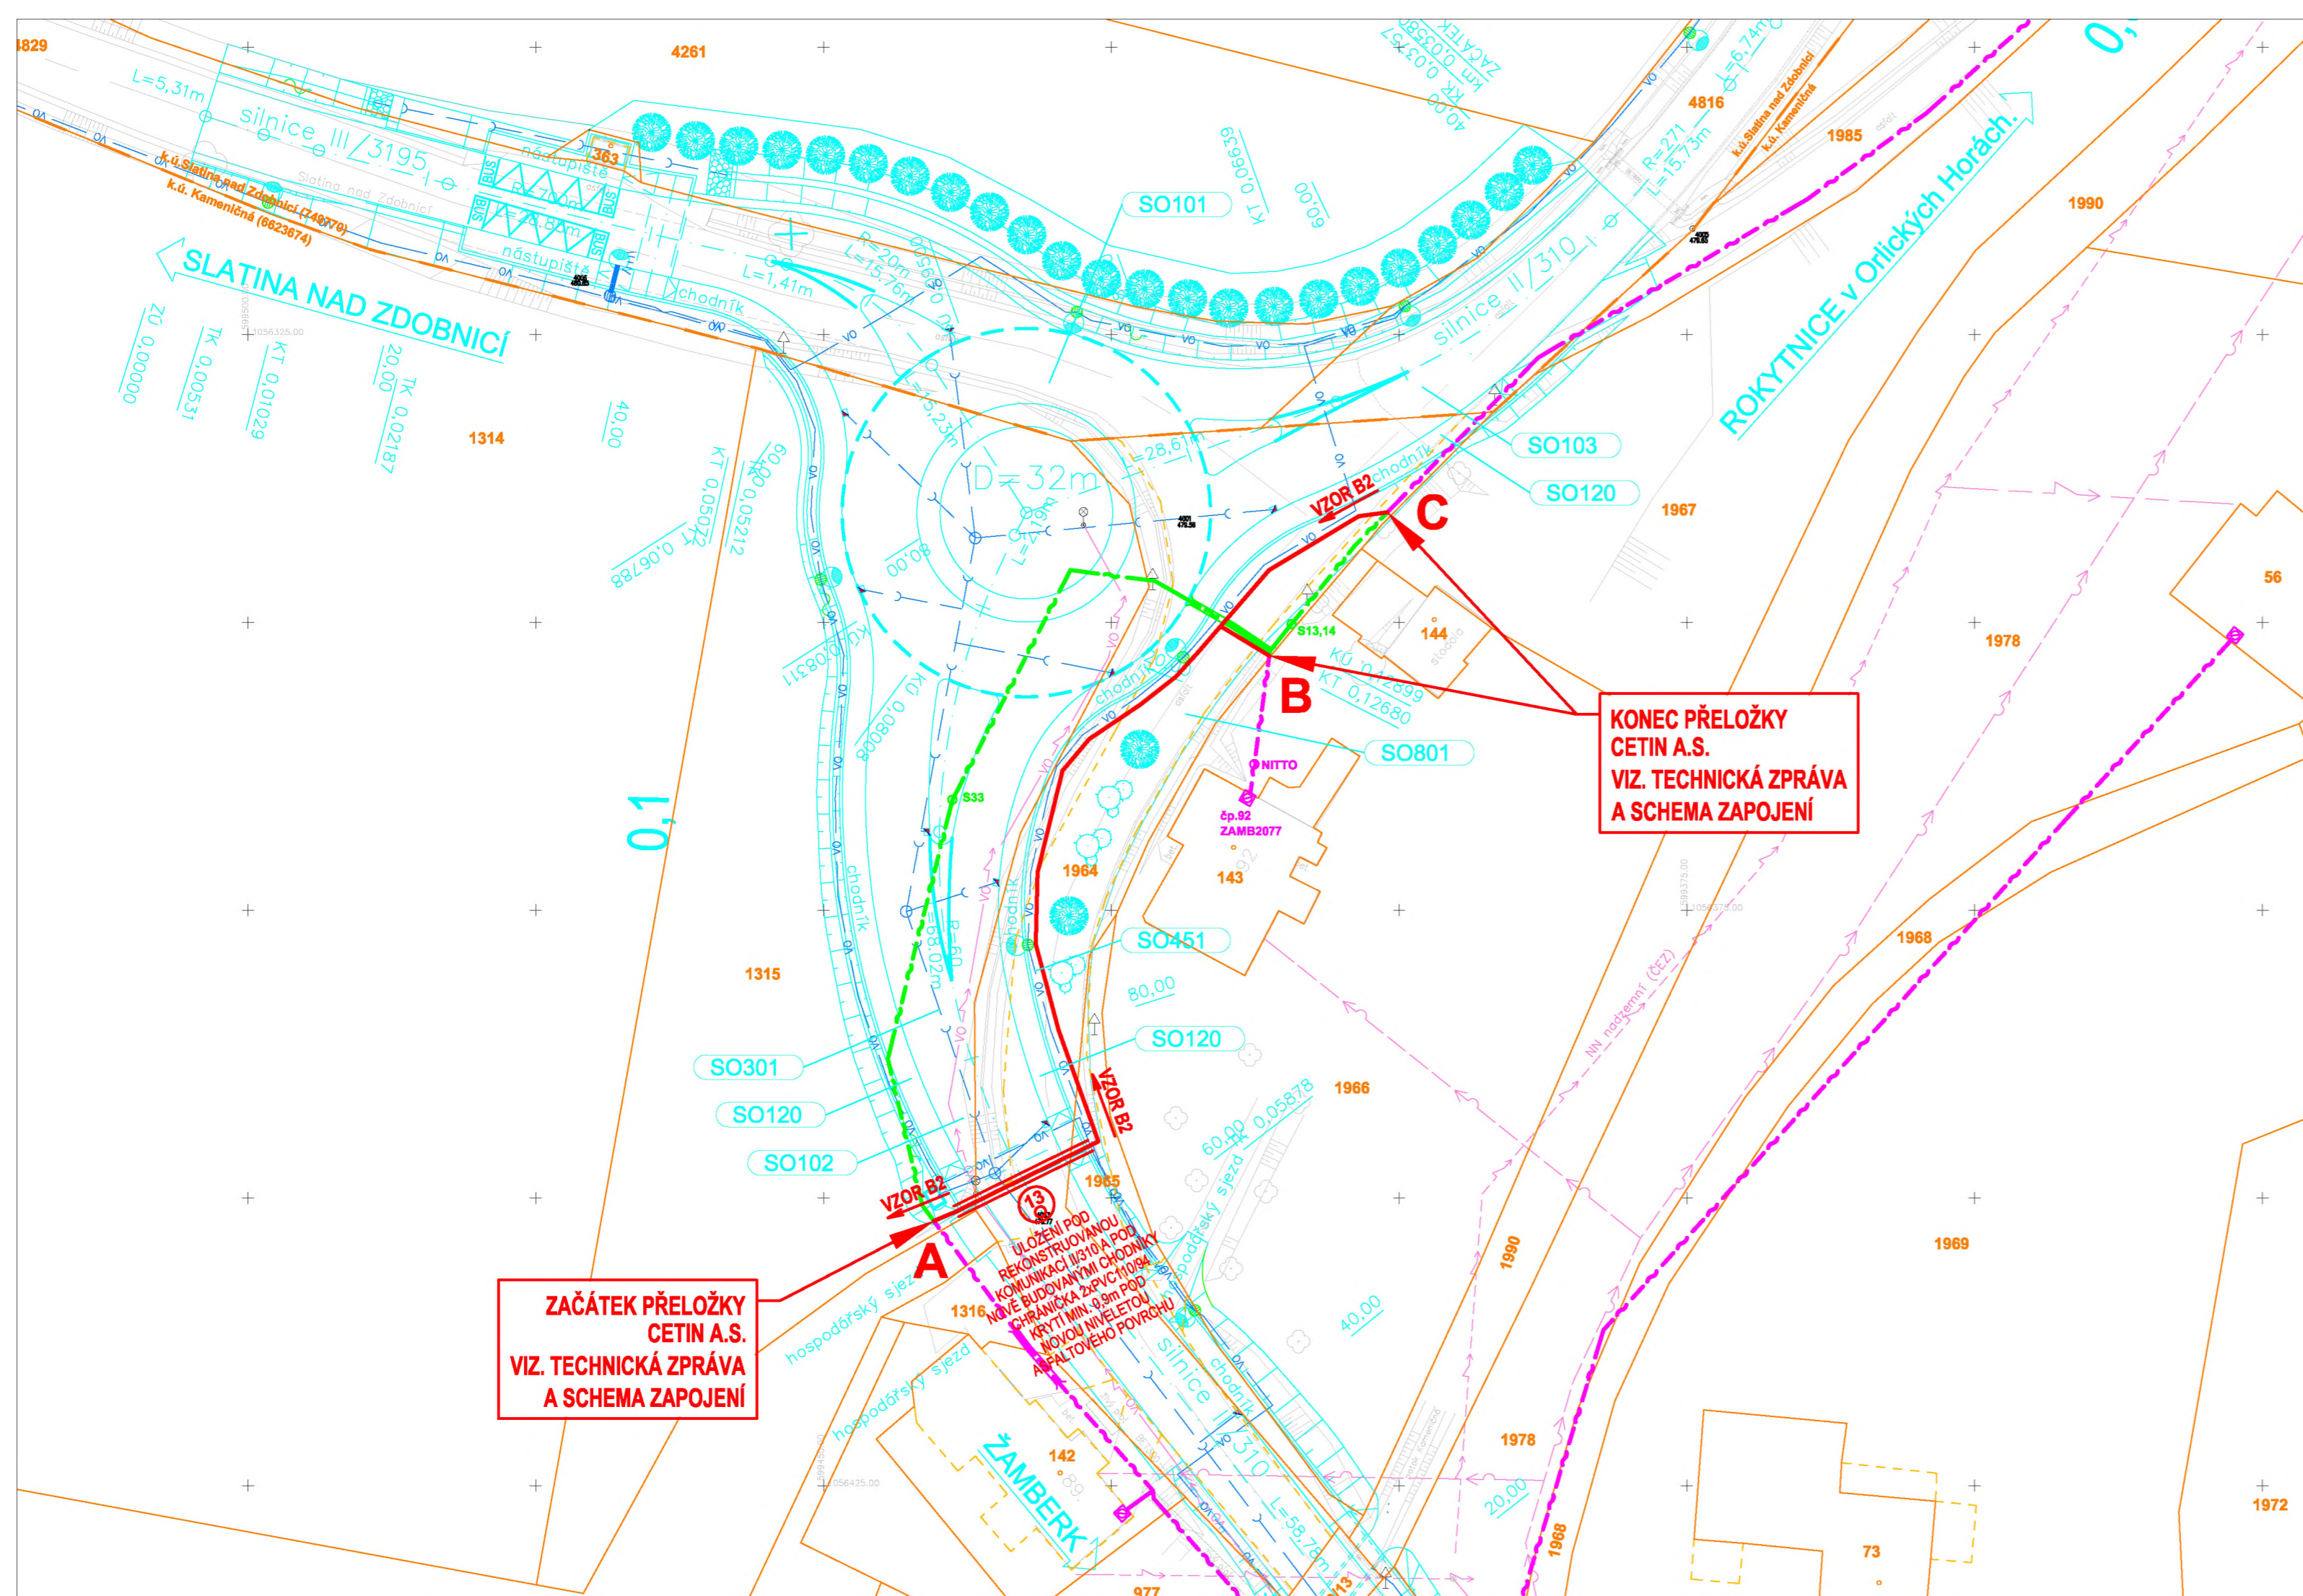


**ZAČÁTEK PŘELOŽKY
CETIN A.S.
VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
A SCHEMA ZAPOJENÍ**

**KONEC PŘELOŽKY
CETIN A.S.
VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
A SCHEMA ZAPOJENÍ**

ÚLOŽENÍ POD
REKONSTRUOVANOU
KOMUNIKAČNÍ MÍSTO A POD
NOVÉ BUDOVAČNÍ CHODNÍKY
CHRÁNICÍKA ZPŘEVY
KRYTÍ MIN. 0,9m POD
NOVOU NIVELETOU
ASAL TOVĚHO POVRCHU

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

- SO101 Okružní křižovatka
- SO102 Úprava silnice II/310 – směr Kameničná
- SO120 Chodníky
- SO301 Odvodnění silnice
- SO451 Veřejné osvětlení
- SO801 Vegetační úpravy

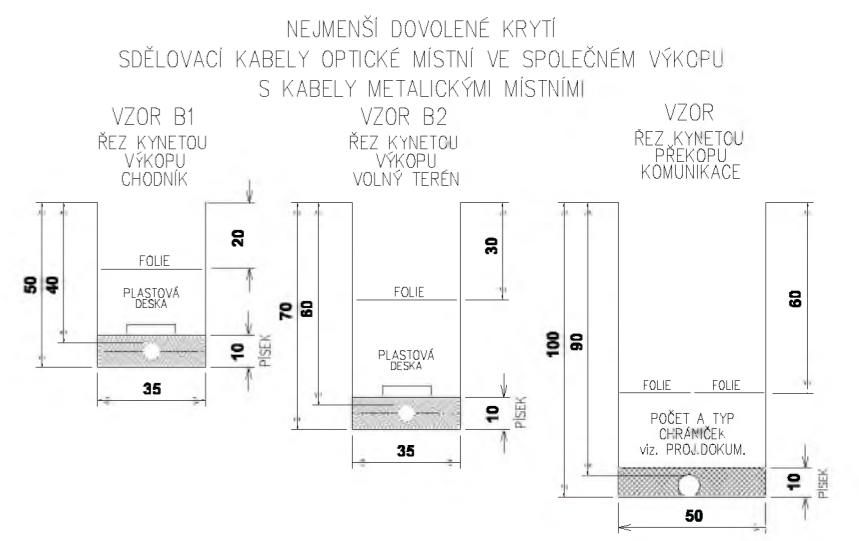


POZNÁMKA:
ZHOTOVITEL STAVBY SILNICE JE POVINEN ZAJISTIT VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ. PO DOBU STAVBY JE POVINEN V MÍSTECH VEDENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘELOŽENÝCH SÍTÍ ZAJISTIT DOSTATEČNOU OCHRANU TĚCHTO SÍTÍ PŘED POŠKOZENÍM V PŘÍPADĚ DOČASNĚ SNÍŽENÉHO KRYTÍ.

PŘELOŽKU NUTNO PROVÁDĚT V KOORDINACI S POKLÁDKOU OSTATNÍCH NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A S VÝSTAVBOU NOVÝCH A REKONSTRUOVANÝCH KOMUNIKACÍ.

PO DOBU VÝSTAVBY BUDE NA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACI ÚPLNĚ UZAVÍRKA PROVOZU.

PŘED PROVÁDĚNÍM PŘELOŽKY BUDE PROVEDENO STAVBOU SEJMUTÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU DO HLUBKY 44CM.


PŘELOŽKY, ÚPRAVY SÍTÍ:



LEGENDA:

— NOVOSTAVBA

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:




LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ CETIN a.s.:




POZNÁMKA:

PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ PRO POKLÁDKU SDĚLOVACÍCH KABELU JE NUTNO VYTÝČIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ NACHÁZEJÍCÍ SE V ZÁJMOVÉ OBLASTI POKLÁDKY TĚCHTO SDĚLOVACÍCH KABELU - SONDAMI A VYTÝČENÍM. NORMATIVNÍ ULOŽENÍ KABELU A TRUBEK HDPE V PŘEKOPECH A VÝKOPECH JE PATRNO NA TOMTO VÝKRESE.







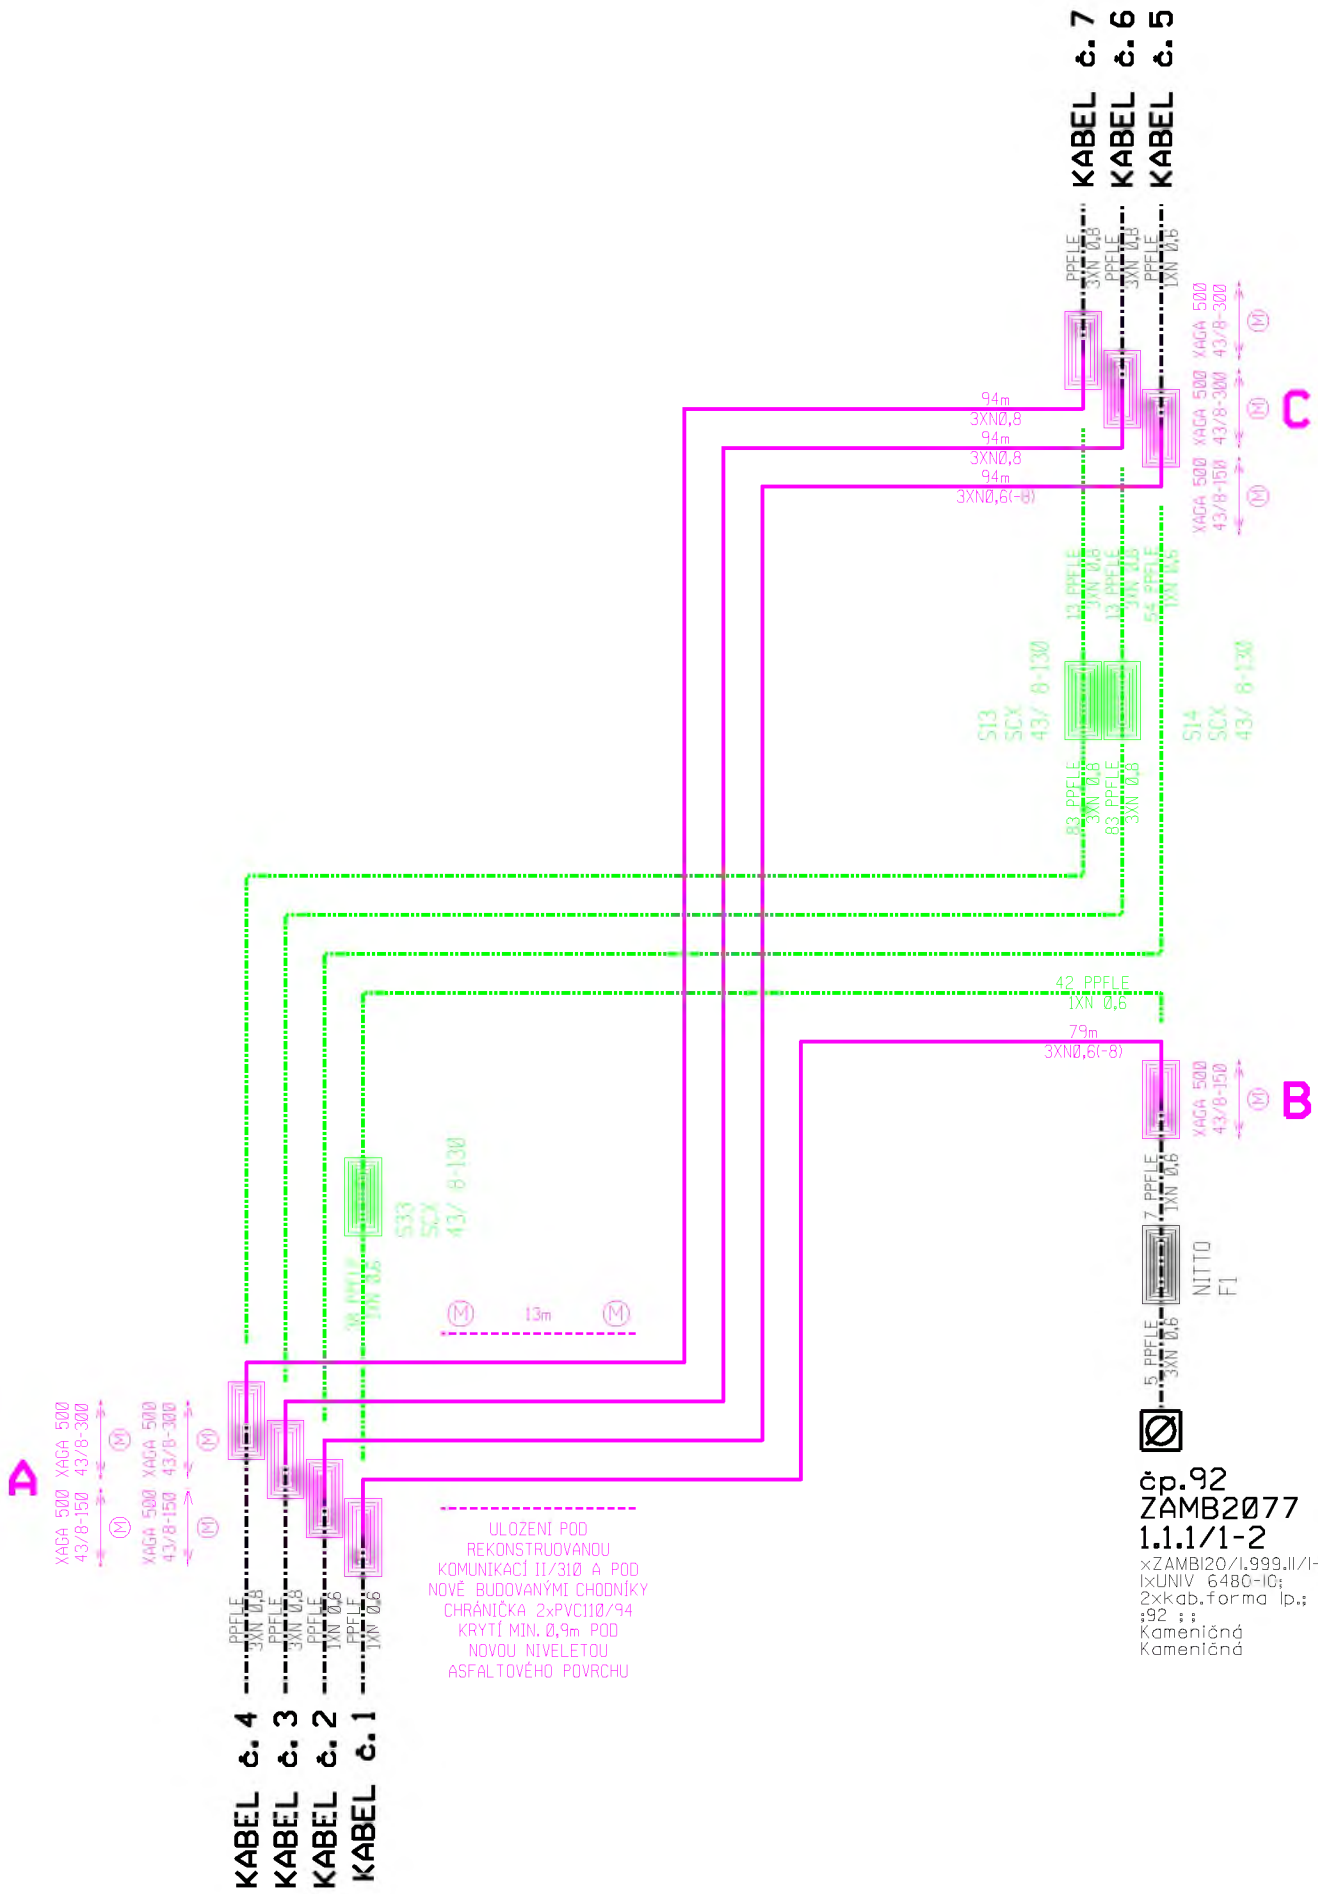



ZAKRESLENÍ VEŠKERÝCH INŽ. SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ. TRASA TLK. KABELU JE OKÓTOVÁNA POUZE ORIENTAČNĚ, SKUTEČNÁ TRASA BUDE STANOVENA V DOBĚ VÝSTAVBY NA ZÁKLADĚ PROVEDENÝCH SOND.



Generální projektant:	TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. U Záběhlického Zámku 233/15 106 00 Praha 10 - Záběhlice IČ: 25740253 tel.: +420 272 760 085, email: temo@temo.cz	 Sítě k Vaším službám
Zpracoval:	BULENA PETR	
Zodp. projektant:	ING. STANISLAV MARHOLD	Ing. Stanislav Marhold CTI PROJEKT V. Nezvala 1329, 565 01 Choceň IČO: 44462948 tel: 604 234 069, e-mail: projekt@ctiprojekt.cz
Technická kontrola:	ING. STANISLAV MARHOLD	
Kraj:	PARDOBICKÝ	Obec: KAMENIČNÁ
Investor:	CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9	
Akce:	VPIC Kameničná(UO), SÚS úprava křižovatky číslo stavby 70490/21/0051	
Stupeň:	CTN	
Zak. č.:	952	
Arch. č.:	952	
Datum:	11/2021	
Formát:	3 A4	
Obsah:	SITUACE TRASY	
Měř.:	1:500	
Kóty:	M	Číslo pñl. výkresu: P01





LEGENDA :

-  projektovaný telekomunikační kabel
-  projektovaná trubka HDPE
-  přeložený telekomunikační kabel
-  přeložená trubka HDPE
-  překládaný telekomunikační kabel
-  překládaná trubka HDPE
-  stávající telekomunikační kabely
-  stávající trubky HDPE
-  zrušené telekomunikační kabely
-  zrušené trubky HDPE

POZNÁMKA:

Neoznačené kabely jsou typu TCEPKPFLE

Generální projektant:		TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. U Záběhlického Zámku 233/15 106 00 Praha 10 - Záběhlice IČ: 25740253 tel.: +420 272 760 095, email: temo@temo.cz	 Sítě k Vaším službám Ing. Stanislav Marhold CTI PROJEKT V. Nezvala 1329, 565 01 Choceň IČO: 44462948 tel: 604 234 069, e-mail: projekt@ctiprojekt.cz		
Zpracoval:	BULENA PETR				
Technické kontroloval:	ING. STANISLAV MARHOLD				
Zodp. projektant:	ING. STANISLAV MARHOLD				
Kraj:	PARDOBICKÝ	Okres:	ÚSTÍ NAD ORLICÍ	Obec:	KAMENIČNÁ
Investor:	CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9		Stupeň:	CTN	
Akce:	VPIC Kameničná(UO), SÚS úprava křižovatky číslo stavby 70490/21/0051		Zak. č.:	952	
			Arch. č.:	952	
			Datum:	11/2021	
			Formát:	2 A4	
Obsah:	SCHEMA ZAPOJENÍ		Měř.:	Číslo příl. výkresu:	
			Kóty:	M	
				S01	

NÁVRH CENOVÝ A TECHNICKÝ

Název stavby: VPIC Kameničná(UO), SÚS úprava
křižovatky

SPP prvek: 70490/21/0051

Investor: CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

Generální projektant: TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.
U Záběhlického Zámku 233/15, 106 00 Praha 10-Záběhlice

Zpracovatel: Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT

Zodpovědný projektant: Ing. Stanislav Marhold

Projektant: Petr Bulena

Zpracováno: 11. 2021

CTI PROJEKT, V. Nezvala 1329, 565 01 Choceň
projekce telekomunikačních sítí

A.	S O U H R N N Á Z P R Á V A	2
A.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY	2
A.2	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA.....	2
A.3	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA	2
A.4	VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY	3
A.5	VÝCHOZÍ A POUŽITÉ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PD.....	3
A.6	TERMÍN VÝSTAVBY	3
A.7	ÚDAJE O PROJEKTOVANÝCH KAPACITÁCH SÍTĚ.....	3
B.	T E C H N I C K Á Z P R Á V A	4
B.1	CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY	4
B.2	ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S ODPADY	4
B.3	VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	4
B.4	POPIS TRASY, ZEMNÍ PRÁCE, TECHNOLOGIE A MONTÁŽ	4
B.5	MAJETKOPRÁVNÍ PROJEDNÁNÍ	6
B.6	BEZPEČNOST PRÁCE A PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA	6
C.	VÝKRESOVÁ ČÁST	7
C.1	SITUACE TRASY P01	7
C.2	SCHEMA ZAPOJENÍ S01.....	7
D.	ROZPOČET	8

A. SOUHRNNÁ ZPRÁVA

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby: **VPIC Kameničná(UO), SÚS úprava křižovatky**
SPP prvek: 70490/21/0051
Místo stavby: k.ú. Kameničná
Kraj: Pardubický
Účel stavby: Výstavba nové telekomunikační sítě
Druh stavby: Telekomunikační
Zhotovitel stavby:
Stavební úřad: Žamberk

A.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA

Obchodní jméno investora: CETIN a.s.
Sídlo investora: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063
Zápis v obchodní rejstříku: Městský soud v Praze, odd. B, vložka 20623

A.3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA

Obchodní jméno projektanta: Ing. Stanislav Marhold
Sídlo projektanta: V. Nezvala 1329, Choceň
IČ: 444 62 948
Autorizace: Osvědčení o autorizaci číslo 26826
Osvědčení o autorizaci číslo 26972

A.4 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY

Výstavba dle této PD má věcné a časové vazby se stavbou „II/310 KAMENIČNÁ, PROSTOROVÁ ÚPRAVA KŘÍŽOVATKY“ v obci Kameničná.

A.5 VÝCHOZÍ A POUŽITÉ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PD

- stavební projektová dokumentace MDS PROJEKT, Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
- konzultace s pracovníky CETIN a.s.
- konzultace se zástupci ostatních zainteresovaných firem
- pochůzka projektanta na místě budoucího staveniště

A.6 TERMÍN VÝSTAVBY

Požadované zahájení realizace: 2021

Požadované ukončení realizace: 2021

A.7 ÚDAJE O PROJEKTOVANÝCH KAPACITÁCH SÍTĚ

km kabelů:		0,361
z toho v kolektoru:		0
v kabelovodu:		0
vzdušné vedení:		0
km párů:		2,166
km vláken:		0
km trubek:		0
km výkopů:		0,103
z toho zastavěný terén:		0,103
volný terén:		0
komunikace:		0
počet rozvaděčů:	SR:	0
	UR:	0
	KBS:	0
Počet párů na MDF:		0
Počet párů na SR:		0
Počet párů na ÚR:		0

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY

Stavba bude provedena v k.ú. Kameničná. Stavbou bude řešena přeložka telekomunikačních vedení v rámci výstavby II/310 KAMENIČNÁ, PROSTOROVÁ ÚPRAVA KŘÍŽOVATKY a souvisejících stavebních objektů - viz situace. V rámci této stavby nebudou pokládány nové HDPE trubky pro optický kabel.

Trasa kabelů není vedena chráněným územím. V místech ochranných pásem jednotlivých inž. sítí budou dodržena vyjádření jejich správců a prostorová norma.

B.2 ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

V případě, že při výstavbě vzniknou odpady, realizační společnost je povinna provést jejich likvidaci v souladu se Zákonem č. 125/1997 Sb. o odpadech.

B.3 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při dodržení předepsaných pracovních a technologických postupů při výstavbě, nedojde k žádnému ohrožení životního prostředí. Při budoucím provozu stavba také nebude mít na životní prostředí žádné škodlivé účinky. Stavební firma je povinna dodržovat Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí.

B.4 POPIS TRASY, ZEMNÍ PRÁCE, TECHNOLOGIE A MONTÁŽ

V souvislosti s výstavbou nové okružní křižovatky a souvisejících stavebních objektů bude provedena přeložka podzemního vedení společnosti CETIN a.s.

POZNÁMKA:

Po dobu výstavby bude na stávající komunikaci úplná uzavírka provozu.

Před prováděním přeložky bude provedeno stavbou sejmutí stávajícího povrchu do hloubky 44cm.

ÚSEK A – B – C

STÁVAJÍCÍ STAV

V řešeném území jsou mezi body „A“, „B“ a „C“ uloženy metalické kabely 2x PPFLE 1XN 0,6 a 2x PPFLE 3XN 0,8 vedoucí z UR_1/1 ZAMB120 do čp.92 ZAMB2077, čp.87 ZAMB2076, čp.88 ZAMB2075, čp.41 ZAMB2074.

Stávající trasa bude v kolizi s výstavbou SO101 Okružní křižovatka, SO102 Úprava silnice II/310 – směr Kameničná, SO120 Chodníky, SO301 Odvodnění silnice, SO451 Veřejné osvětlení,

PLÁNOVANÝ STAV

ZEMNÍ PRÁCE

Od bodu „A“ bude nová trasa vedena zeleným prostranstvím (krytí 0,6m) k překopu rekonstruované komunikace II/310. Pod budoucí komunikací budou založeny chráničky 2xPVC110/97, krytí chrániček bude min. 0,9m pod novou niveletou asfaltového povrchu (chráničky budou na obou stranách ukončeny za nově budovanými chodníky). Niveleta stávající komunikace a rekonstruované komunikace bude ve stejné úrovni. Za překopem bude trasa vedena novým zeleným prostranstvím (krytí 0,6m) do bodů „B“ a „C“ v souběhu s trasou nového vedení veřejného osvětlení.

Nová trasa bude geodeticky zaměřena včetně nových spojek a chrániček. Spojky a konce chrániček PVC budou označeny markery.

Poznámka: Zhotovitel stavby nových stavebních objektů je povinen zajistit vytýčení stávajících sítí. Po dobu stavby je povinen v místech vedení stávajících a přeložených sítí zajistit dostatečnou ochranu těchto sítí před poškozením v případě dočasně sníženého krytí.

Pokládka nových telekomunikačních vedení musí být koordinována s pokládkou ostatních nových inženýrských sítí a s výstavbou nových stavebních objektů.

TRUBKY HDPE A METALICKÉ KABELY

Do nové trasy budou mezi body „A“, „B“ a „C“ uloženy nové metalické kabely 2x TCEPKPFLE 3XN0,6(-8) a 2x TCEPKPFLE 3XN0,8. Nové metalické kabely budou v bodech „A“, „B“ a „C“ naspojovány na stávající přerušené metalické kabely 2x PPFLE 1XN 0,6 a 2x PPFLE 3XN 0,8 – viz. schema zapojení.

K montáži metalických kabelů budou použity smršťovací spojky typu XAGA. Po ukončené montáži bude na metalických kabelech provedeno kompletní stejnosměrné měření.

Vyjádření o existenci ostatních inž. sítí si samostatně zajišťuje projektant stavební části akce a je součástí stavební PD.

Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení veškerých podzemních inženýrských sítí. Zemní práce budou prováděny takovým způsobem, aby byla zkrácena na minimum doba, po kterou bude výkop otevřen. Výkopek v zeleném prostranství bude použit k opětovnému zásypu výkopu, v komunikacích bude navezen odpovídající zásypový materiál. Veškeré výkopy hloubky 1m a vyšší budou paženy. Trasa bude důkladně po vrstvách zhutněna nestlačitelným materiálem.

V místech, kde trasa výkopu příp. kříží trasy chodců budou přes otevřený výkop umístěny přechodové lávky. Trasa výkopu bude ohraničena po celou dobu výstavby červenobílou výstražnou páskou a v době snížené viditelnosti bude výkop označen výstražným světlem.

Při provádění stavby zajistí dodavatel dostatečné klopení komunikací k zamezení úniku nadměrného množství prachu do ovzduší. Vozidla vyjíždějící ze stavby budou řádně očištěna. V případě znečištění městských komunikací zajistí dodavatel okamžité uvedení jejich povrchu do řádného stavu.

Kabely budou ukládány vedle sebe do kabelového lože z jemného písku s krytím podle ČSN pro podzemní sdělovací vedení. V místech, kde bude zřizováno kabelové lože budou kabely kryty krycími deskami. Celá trasa bude zakryta výstražnou folií. Na překopech (šíře kynety 50 cm) položit folii 2 x vedle sebe. Při křížování s ostatními sítěmi bude telekomunikační vedení uloženo do betonových žlabů.

Nejmenší dovolené krytí kabelů: rychlostní komunikace – 1,2m, komunikace – 0,9m (DOK – 1,2m), volný terén v obci - 0,6m (DOK – 1,0m), chodník - 0,4m (DOK – 0,5m), pole a louka extravilán – 0,9m viz. řezy kynetou v PD.

Pokládka kabelů bude provedena v souladu s normou ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 73 3050 - Zemní práce.

Při výstavbě dojde ke střetu s těmito stávajícími inž. sítěmi: vodovod, podzemní vedení vo, sdělovací kabely CETIN a.s., nadzemní vedení nn.

Při výstavbě dojde ke střetu s těmito novými inž. sítěmi: kanalizace, podzemní vedení vo, sdělovací kabely CETIN a.s..

Provádějící organizace musí dodržet podmínky vydaného Územního rozhodnutí (zajišťuje projektant stavební části), veškerá vyjádření a požadavky jednotlivých majitelů pozemků, správců sítí, dotčených organizací a organizací státní správy a řídit se příslušnými technickými předpisy a normami. Při provádění veškerých prací je nutné dodržovat Zákon o elektronických komunikacích č.127/2005 Sb., zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále je nutné dodržovat příslušné ČSN, vyhlášky a interní předpisy.

Realizace musí být v dostatečném předstihu projednána s příslušnými pracovníky společnosti CETIN a.s. jako majitele a provozovatele zemního vedení.

Před přerušением provozu na telekomunikačním vedení (přerušení kabelů) je nutné o toto požádat příslušné pracovníky společnosti CETIN a.s. v předstihu min. 30 dní před požadovaným termínem.

B.5 MAJETKOPRÁVNÍ PROJEDNÁNÍ

Nutno uzavřít s majiteli pozemků, jež budou dotčeny pokládkou telekomunikačního kabelu smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k těmto pozemkům.

Před zahájením prací je nutné, aby pracovník dodavatelské firmy oznámil všem dotčeným majitelům nemovitostí a pozemků termín zahájení prací na jejich majetku. Rovněž tak po skončení prací zajistí dodavatel prací s vlastníkem pozemku jeho předání a toto vlastníkem potvrdí svým podpisem.

B.6 BEZPEČNOST PRÁCE A PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA

Při provádění prací na staveništi je třeba bezpodmínečně dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.

Některé základní legislativní předpisy:

- Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu čl.16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
- Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce - účinnost od 1.1. 2007
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) - účinnost od 1.1.2007
- Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích - účinnost od 1.1.2007
- Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti - účinnost od 1.1.2007

Zpracovatel stav. objektu:
Bulena Petr, Stanislav Marhold
V Chocni, listopad 2021

Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT
V. Nezvala 1329, 565 01 Choceň
IČO: 44462948, tel: 604 234 069
e-mail:projekt@ctiprojekt.cz

Název stavby: VPIC Kameničná(UO), SÚS úprava křižovatky

Číslo SPP prvku: 70490/21/0051

Zhotovitel PD: V. Nezvala 1329, Choceň

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	21 724,42 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	42 781,07 Kč
MONTÁŽ	34 601,43 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	6 109,79 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	5 801,21 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	6 912,08 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	40 166,10 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazov	26 798,69 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevyka	0,00 Kč
POPLATKY	2 000,00 Kč

Celkové náklady: 186 894,79 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	5 184,06 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	16540.36 J'	16 540,36 Kč
		PD úložná trasa Z1 (do 0,1 km)		
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	26.00 m	539,76 Kč
958327 S		Rýha bez povrchu 35/70 -100	50.00 m	15 552,00 Kč
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	53.00 m	20 544,92 Kč
954958 S		Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	44.00 m	4 873,00 Kč
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	91.00 m	1 132,95 Kč
951349 S		Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	1.00 ks	138,44 Kč
MONTÁŽ				
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	4.00 ks	713,44 Kč
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	6.00 ks	246,90 Kč
955000 S		Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	16.00 ks	548,64 Kč
955268 S		Montáž podzemní tratě síťové metalické	6200.00 JV	6 200,00 Kč
		Finance na případné vícenáklady		
955281 S		Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	8.00 ks	10 427,04 Kč
954990 S		Montáž úložných kabelů do 15 XN	361.00 m	8 418,52 Kč
958469 S		Uvedení stavby do provozu	5208.00 JV	5 208,00 Kč
958556 S		Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 838,89 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA				

956278	Předměření trasy do 100 m	1.00 ks	6 109,79 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE			
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	5 801,21 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks	6 912,08 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
958747 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	3 019,10 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	26100.00 J'	26 100,00 Kč
Náhrada vlastníkům za VBŘ			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks	4 566,92 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	2.00 ks	6 480,08 Kč
POPLATKY			
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	2000.00 JV	2 000,00 Kč
Správní poplatek			

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303838 S		Deska krycí plast. 150x1000 mm	84.00 ks	1 450,68 Kč
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	110.00 m	408,10 Kč
303777 S		Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	182.00 m	400,40 Kč
300116 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,6	173.00 m	4 456,48 Kč
300125 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,8	188.00 m	6 608,20 Kč
320879 S		Materiál pro tratě síťové	6049.00 ks	6 049,00 Kč
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	10.00 ks	1 962,60 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	8.00 ks	177,76 Kč
407578 S		Souprava čistící 4413L	1.00 ks	615,45 Kč
312845 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	4.00 ks	1 588,64 Kč
312863 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ	4.00 ks	1 989,84 Kč
302423 S		Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	26.00 m	1 044,42 Kč
303465 S		Víčko plastové trubky 110/100 mm	2.00 ks	47,12 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267 S		Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	2.00 ks	0,00 Kč
403175 S		Pěna montážní Soudal 300ml	1.00 ks	0,00 Kč

Číslo Dohody:
Číslo Dohody stavebníka:

SAP: ...NE
Registr smluv: NE

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

CETIN a.s.

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
zastoupená Theodorem Valentou, Specialistou pro výstavbu sítě - překládky SEK, Výstavba PPS Čechy, na základě pověření ze dne 2.6.2021
(dále jen „Nabyvatel“)

a

[•]

se sídlem [•]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u [•]
IČO: [•]
DIČ: [•]
zastoupena [•]
(dále jen „Převodce“)

Nabyvatel a Převodce dále společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“,

dne, měsíce a roku níže uvedeného, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) uzavírají tuto

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

(dále jen „Dohoda“)

1. PŘEDMĚT DOHODY

- 1.1 Převodce je na základě rozhodnutí o umístění stavby „[•]“, které bylo vydáno dne [•], [KÝM] pod čj. [•] a nabylo právní moci dne [•] (dále jen „Rozhodnutí o umístění stavby“) oprávněn k umístění [•] (dále jen „Stavba“). Rozhodnutí o umístění stavby je Přílohou č. 1 Dohody.
- 1.2 Předmětem převodu jsou některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to právo k umístění Stavby za podmínek v citovaném rozhodnutí stanovených, a dále s ním související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, tak jak jsou stanoveny v Rozhodnutí o umístění stavby.

2. PŘEVOD PRÁV

- 2.1 Převodce uzavřením Dohody, s účinností ke dni uzavření Dohody, převádí na Nabyvatele některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to toliko právo k umístění Stavby za podmínek v Rozhodnutí o umístění stavby stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Rozhodnutí o umístění stavby stanoveny.

Číslo Dohody:
Číslo Dohody stavebníka:

SAP: ...NE
Registr smluv: NE

2.2 Převodce se zavazuje postoupení písemně oznámit Správnímu orgánu nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne uzavření Dohody.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Dohoda, a práva a povinnosti Smluvních stran z Dohody vyplývající, se řídí právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem, a případné spory budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

3.2 Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani projev učiněný po uzavření Dohody, jež není v Dohodě uveden, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek ani jedné ze Smluvních stran.

3.3 Dohoda může být měněna nebo zrušena pouze písemně; změna jinou formou je vyloučena. Pojmem „písemně“ se pro účely Dohody rozumí předání zpráv v listinné podobě anebo prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zaručený elektronický podpis**“). Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv než výše uvedených.

3.4 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Dohody byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Dohody, ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

3.5 Dohoda nabývá platnosti a účinnosti v den jejího uzavření.

3.6 Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.

3.7 Smluvní strany ujednaly, že Dohodu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Dohoda je uzavřena doručením Dohody opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.

3.8 Následující Přílohy jsou nedílnou součástí Dohody:

Příloha č. 1 – Rozhodnutí o umístění stavby

Nabyvatel:

Převodce:

V _____ dne _____

V _____ dne _____

CETIN a.s.
[]

[]
