



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen jako „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: PT PROLES s.r.o.
sídlo/bydliště: Kasárenská 1147, Prachovice

IČ: 281 47 871
DIČ: CZ 28147871
Zápis v OR: vedeného krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C vložka 21340

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo

(tato smlouva je realizována v rámci projektu „Realizace odchovného a reprodukčního prvku Fritzův mlýn – refugia pro jedince perlorodky říční“, reg.č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_142/0014000)

Lento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



II. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem plnění zakázky je realizace díla: Realizace odchovného a reprodukčního prvku Fritzu mlýn – refugia pro jedince perlorodky říční 2022.
Předmět díla je blíže specifikován v příloze č. 1 Podrobná specifikace díla a č.3 Položkový rozpočet
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede výše uvedený předmět smlouvy o dílo a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení za podmínek uvedených v této SoD.
- 2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.4 Dále zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.
- 2.5 Zakázka je realizována v rámci projektu „Realizace odchovného a reprodukčního prvku Fritzu mlýn – refugia pro jedince perlorodky říční“ registrační číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_142/001/4000.

III. Kvalitativní podmínky

- 3.1 Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami ČSN. Pokud porušením právních předpisu vznikne škoda, nese ji pouze zhotovitel. Dosažená kvalita musí garantovat, že dílo bude mít vlastností srovnatelné s podobnými díly, případně vlastností lepší.

IV. Dodací podmínky

- 4.1 Záruční doba: **60 měsíců** na práce provedené zhotovitelem.
- 4.2 Záruční doba se vztahuje na všechny práce a dodávky, které prováděl zhotovitel a které jsou spojeny s realizací díla. Záruční doba začíná plynout dnem protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.3 Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah svého záměru, případně vypustit provedení některých prací. Je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a případně dohodnout změnu lhůt provádění prací. Zhotovitel je povinen přistoupit na rozšíření dodávky o práce, které jsou nutné k dokončení a správné funkčnosti včetně užívání realizované stavby (např. požadavky kolaudačního řízení).
- 4.4 Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelům opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy.





V. Staveniště

- 5.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání staveniště. Termín předání staveniště se dohodne při podpisu smlouvy o dílo.
- 5.2 Vytýčení stavby, podzemních a nadzemních vedení a inženýrských sítí oprávněnou osobou zajistí zhotovitel.
- 5.3 Objednatel při předání staveniště přesně vymezí hranice staveniště.
- 5.4 Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a skládky materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Do termínu ukončení stavby je povinen uvést prostor staveniště do původního nebo dohodnutého stavu.
- 5.5 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisu o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.
- 5.6 Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu, nebo škodu odstranit na své náklady.
- 5.7 Objednatel kontroluje provádění prací a svá stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
- 5.8 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 5.9 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 5.10 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že autorizovaná osoba pro vodohospodářské stavby bude trvale přítomna na stavbě po celou dobu realizace díla. V případě nepřítomnosti této osoby je zhotovitel povinen zajistit náhradu této osoby osobou stejné nebo vyšší kvalifikace.

VI. Stavební deník

- 6.1 Stavební deník vede zhotovitel ode dne předání staveniště. Do deníku zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Zapisuje veškeré údaje o pracích, které provádí, o jejich průběhu. Zejména o časovém postupu prací a jejich jakosti.
- 6.2 Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím posledního objektu stavby a dnem odstranění poslední vady a provedení poslední vícepráce podle zápisu o odevzdání a převzetí díla.
- 6.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, mistr nebo ve smlouvě pověřená osoba vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem plnění.
- 6.4 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele.





- název, sídlo, IČO, DIČ objednatele.

- 6.5 Mimo stavbyvedoucího muže do stavebního deníku provádět záznamy pověřená osoba objednatele a příslušné orgány státní správy.
- 6.6 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem zástupce objednatele, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnu, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnu.
- 6.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu SoD, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňku a změn SoD.

VII. Technický dozor investora

- 7.1 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 7.2 Zaměstnanec objednatele pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště, odsouhlasuje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště, účastní se kontrolní činnosti organizované nadřízeným orgánem a odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce, účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad, kontroluje vyklizení staveniště.
- 7.3 Technický dozor objednatele je oprávněn dat zaměstnancům zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, hrozí-li nebezpečí způsobení škody.
- 7.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozorec a činit neprodlená opatření k odstranění vytknutých závad.

VIII. Cenové podmínky

- 8.1 Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. II. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle pevně zadáných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

Cena bez DPH 3 639 456,34 21% DPH 764 285,83 Cena vč. 21% DPH 4 403 742,17
cena celkem: 4 403 742,17





Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisu v platném znění podle všech pozdějších předpisu, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle §92f zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisu.

- 8.2** V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací předmětu SoD. Cena za dílo může být překročena pouze v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane taková skutečnost, nutná ke zprovoznění či zkolaudování díla nebo změna termínu dokončení z důvodu na straně objednatele, kterou nebylo možno před podpisem této smlouvy předvídat.
- 8.3** Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu provádění a předání díla.
- 8.4** Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření díla vyplývajících z podmínek při provádění díla a odborných znalostí zhotovitele nebo z vyskytnutých se nenadálých nutných úprav, které nelze předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplnků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, a předložit tento soupis objednateli. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.
- 8.5** Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla smluvného touto smlouvou v plné výši po celou dobu plnění.
- 8.6** Každou fakturu musí zhotovitel označit číslem a názvem projektu následovně:
„Předmětná služba je realizována v rámci projektu Realizace odchovného a reprodukčního prvku Fritzu mlyn – refugia pro jedince perlorodky říční, registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_142/001/4000.
- 8.7** Faktury zhotovitele musí dále obsahovat tyto náležitosti:
- Označení faktury a její číslo
 - Název, sídlo a identifikační číslo zhotovitele
 - Předmět smlouvy
 - Číslo účtu, bankovní spojení
 - Fakturovanou částku v Kč
 - Informaci, zdali je zhotovitel plátec nebo neplátec DPH v ČR nebo zahraničí
 - Datum vystavení faktury, případně datum zdanitelného plnění u zhotovitele registrovaného v ČR





IX. Čas plnění, lhuty

- 9.1 Zahájení prací: uveřejněním smlouvy v registru smluv
Dokončení prací: 30. 9. 2023
- 9.2 V případě, že zhotovitel bude muset přerušit provádění prací z titulu působení vyšší moci nebo nepříznivých klimatických podmínek, bude řešen termín dokončení stavby dodatkem ke smlouvě, ve kterém bude na základě vzniklých skutečností upraven termín dokončení stavby. O těchto skutečnostech bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele a provede záznam do stavebního deníku.
- 9.3 V případě, že dojde ke změně termínu zahájení a dokončení stavby z důvodu uvedených v bodě 9.2, není zhotovitel v prodlení se splněním závazku a nevztahují se na něj smluvní pokuty uvedené v bodě 14.1.
- 9.4 Dodržení doby plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel se splněním závazku v prodlení.
- 9.5 Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladu o významných událostech vzniklých při realizaci díla, jako jsou vstupy na pozemky jiných vlastníků.

X. Financování

- 10.1 Podkladem pro placení je faktura - daňový doklad.
- 10.2 Veškeré provedené práce budou fakturovány k datu předání dokončené stavby. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a po odsouhlasení objednatelem vystaví daňový doklad fakturu, jejíž součástí jsou soupisy provedených prací, bez nichž je faktura neplatná. Fakturované práce se zdaňují příslušnou DPH. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části.
- 10.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Práce, které provedl zhotovitel bez zakázky, nebo o své újmě, odehlyně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přikládá i dodatečné oznámení objednatele.
- 10.4 Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze 1x měsíčně s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce.





- 10.5** Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat požadavkům právní úpravy zejména pak zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty a mít náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li faktura splňovat tyto náležitosti, nebude odpovídat předmětu plnění, nebude-li doložena příslušnými doklady nebo bude-li jinak v nesouladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění či jinou opravu, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné částky. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením doplněné nebo opravené faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele podle této smlouvy.
- 10.6** Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu objednatele dle této smlouvy. Úhrada faktury bude provedena v české měně bezhotovostně z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Číslo tohoto bankovního účtu bude uvedeno rovněž na zhotovitelem vystavené faktuře. Lhůta splatnosti je dodržena, pokud v její poslední den byl podán příkaz k převodu příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.

XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1** Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 11.2** Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 11.3** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.
- 11.4** Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 11.5** Za podstatné porušení smlouvy se považuje prodlení v dokončení díla, opakované vadné plnění díla nebo taková jakost dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné užívání podle stanovených parametrů anebo jestliže objednatel nesplní své finanční závazky a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 11.6** Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady, spojené s odstoupením od smlouvy, jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 11.7** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 14 dnu od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.
- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemně zrušení smlouvy.
- strana, která duvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy.

XII. Odevzdání a převzetí díla

- 12.1** Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli, včetně odstranění vad z řízení o odevzdání a převzetí.
- 12.2** Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že dílo vykazuje vady, které brání řádnému a obvyklému užívání díla. Jestliže dílo vykazuje jiné vady, než se kterými počítá předchozí věta, budou zachyceny v předávacím protokolu s tím, že se zhotovitel zavazuje tyto odstranit na své náklady po podpisu tohoto protokolu v dohodnutém termínu.
- 12.3** Vlastnické právo k věcem zabudovaným do díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání díla. Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech, nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku protokolárního převzetí díla objednatелеm.
- 12.4** Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 10 dnu předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 14 dnu od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

XIII. Odpovědnost za vady díla

- 13.1** Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:
- a) při přejímce,
 - b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby.
- 13.2** Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečně, bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.
- 13.3** Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.





- 13.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamaci písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 13.5 Termín odstranění reklamované vady se dohodne písemně, jinak je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 30 dnů po jejím uplatnění.
- 13.6 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.
- 13.7 V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat.

XIV. Smluvní pokuty

- 14.1 Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 14.2 Za pozdě zaplacené faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XV. Protikorupční strategie

- 15.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:
- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo
 - b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 15.2 Zhotovitel nebyl v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmu ve vztahu k zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě zadávacího řízení; zhotovitel nemá ani žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální).
- 15.3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

XVI. Závěrečná ustanovení

- 16.1 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.






- 16.2** Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnu poté, co tato potřeba vyvstane.
- 16.3** Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem, na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
- 16.4** Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazku z této smlouvy.
- 16.5** Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy.
- 16.6** Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.
- 16.7** Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Přílohy:

- 1. Podrobná specifikace díla**
- 2. Kontaktní údaje**
- 3. Položkový rozpočet**

Ve Vimperku dne 

V Prachaticích dne 14.3.2022



Příloha 1 Podrobná specifikace díla

Technický popis akce:

Seznam pozemků dotčených záměrem (podle katastru nemovitostí): Pozemky dotčené vybudováním záměru ORP Fritzuv mlýn p. č. KN 527/2, 528/1, 528/2, 528/3, 626/1, 628/2, 979/3, 1008/1, 1010, 1038, 1039, 1216 v k. ú. Zbytíný se nacházejí v nivě řeky Blanice, na území I. zóny odstupňované ochrany CHKO Šumava a na území NPP Blanice.

V rámci akce bude realizována následující aktivita:

Výstavba předmětného ORP Fritzuv mlýn. Účelem stavby je vytvořit nové koryto podél náhonu Fritzova mlýna jako refugium (odchovný a reprodukční prvek), které by svými parametry (hloubka, šířka, rychlost proudění, charakter dna) odpovídalo optimálním podmínkám pro perlorodku říční. Rameno tak bude fungovat jako refugium pro jedince perlorodky říční z řeky Blanice z důvodu jejich ochrany.

Navrhovaná stavba se člení na 7 samostatných stavebních objektů:

- SO1 Koryto refugia
- SO2 Nátokový objekt
- SO3 Skluz
- SO4 Měrný profil
- SO5 Kamenná rampa - přejezd
- SO6 Rozdělovací objekt na Zbytinském potoce
- SO7 Křížení s polní cestou: propustek





Nad stavbou bude prováděn technický dozor investora (TDI) a ekologický, oba externě, dodavateli, kteří mají zkušenosti s podobnými akcemi. Ekologický dozor bude mít zkušenosti s dozorem nad stavbami v perlorodkových povodích.

Na základě rozhodnutí příslušného orgánu státní správy musí investor rovněž zajistit biologický dozor, který bude podobně jako TDI realizován externě. Úkolem biologického dozoru bude zejména průzkum a vyhledání perlorodek před zahájením stavby v místě realizace a dozor stavby včetně měření pH, měrné vodivosti a zákalu.

V trase nového koryta ORP bude provedeno potřebné kácení v blízkosti nátokového a rozdělovacího objektu a dále pak v blízkosti propustku. Přesný rozsah kácení je dán soupisem prací a je součástí povolení kácení. Při kácení se jedná o plochy do 20 m² a většinou náletové stromy.

Bližší specifikace je uvedena v projektové dokumentaci.

Bližší specifikace jednotlivých aktivit je uvedena v projektové dokumentaci.

- Zahájení prací: uveřejněním smlouvy v registru smluv
- Dokončení prací: 30. 9. 2023

Technické vybavení:

1. Použitými pracovními technologiemi nesmí dojít k poškození funkce biotopu perlorodky říční a použité stavební materiály nesmí vykazovat toxické působení na společenstva oligotrofních toků a perlorodku říční. Bude-li nutné použít beton nebo betonové směsi, musí být místo betonáže zabezpečeno tak, aby před vytvrzením betonu nedošlo ke kontaktu betonových povrchů a vody protékající vodním tokem. Beton musí splňovat vyšší stupeň odolnosti vůči chemicky agresivnímu prostředí (min. XA2). Zděné části






budou prováděny s co nejúžší spárkou z materiálu odolných vůči chemicky agresivnímu prostředí.

2. Pro „SO 07 Propustek“ a „SO 08 Napájecí potrubí“ bude použito výhradně plastových korugovaných trub. Dřevěné prvky musejí být bez chemického ošetření.
3. Tmelicí materiály mohou být použity pouze za předpokladu vyloučení jejich negativního působení na juvenilní stádia perlorodek.
4. Při stavbě může být použito pouze kamenivo – granulit puvodem z prachatického granulitového masívu. Zemina musí být nekarbonátová s pH max. 7,3 bez cizorodých příměsí. Kamenivo, které může přijít do styku s vodou, musí mít atest na obsah vápníku v uhličitanové a síranové formě.
5. Po dobu prací v řečišti, nad řečištěm a ve vzdálenosti 50 m od řečiště bude pod stavbou umístěn protizákalový límec.
6. Po celou dobu realizace prací bude prováděna vizuální kontrola vodního toku a kontinuální měření zákalu a konduktivity, které musí provádět odborný pracovník, zajištěný investorem. Je možná instalace automatického zařízení s dálkovým přenosem dat, které zajišťuje kontinuální měření dat. Mezní hodnota je krátkodobě (po dobu 1 hodiny) 50 j. ZF a dlouhodobě 20 j. ZF zákalu a 100 μ S konduktivity v profilu pod stavbou. Při překročení mezních hodnot musí být okamžitě zastaveny práce, které tento stav způsobily. Pokračování prací musí být odsouhlaseno Správou. Naměřené hodnoty budou dokumentovány a budou součástí stavebního deníku.
7. Všechny stavební mechanismy musí být v dobrém technickém stavu, zajištěny proti úkapům a vybaveny ekologickými provozními náplněmi. Všechny stavební mechanismy budou každý den po ukončení prací odstaveny mimo nivu řeky Blanice a zaplavitelné území. Celá plocha zařízení staveniště bude bezpečně zajištěna proti úniku ropných a jiných znečišťujících látek a na staveništi musí být k dispozici dostatečné množství sorbentu a dalších jímacích látek pro případ havárie.





Obr. 1. Lokalizace zájmového území

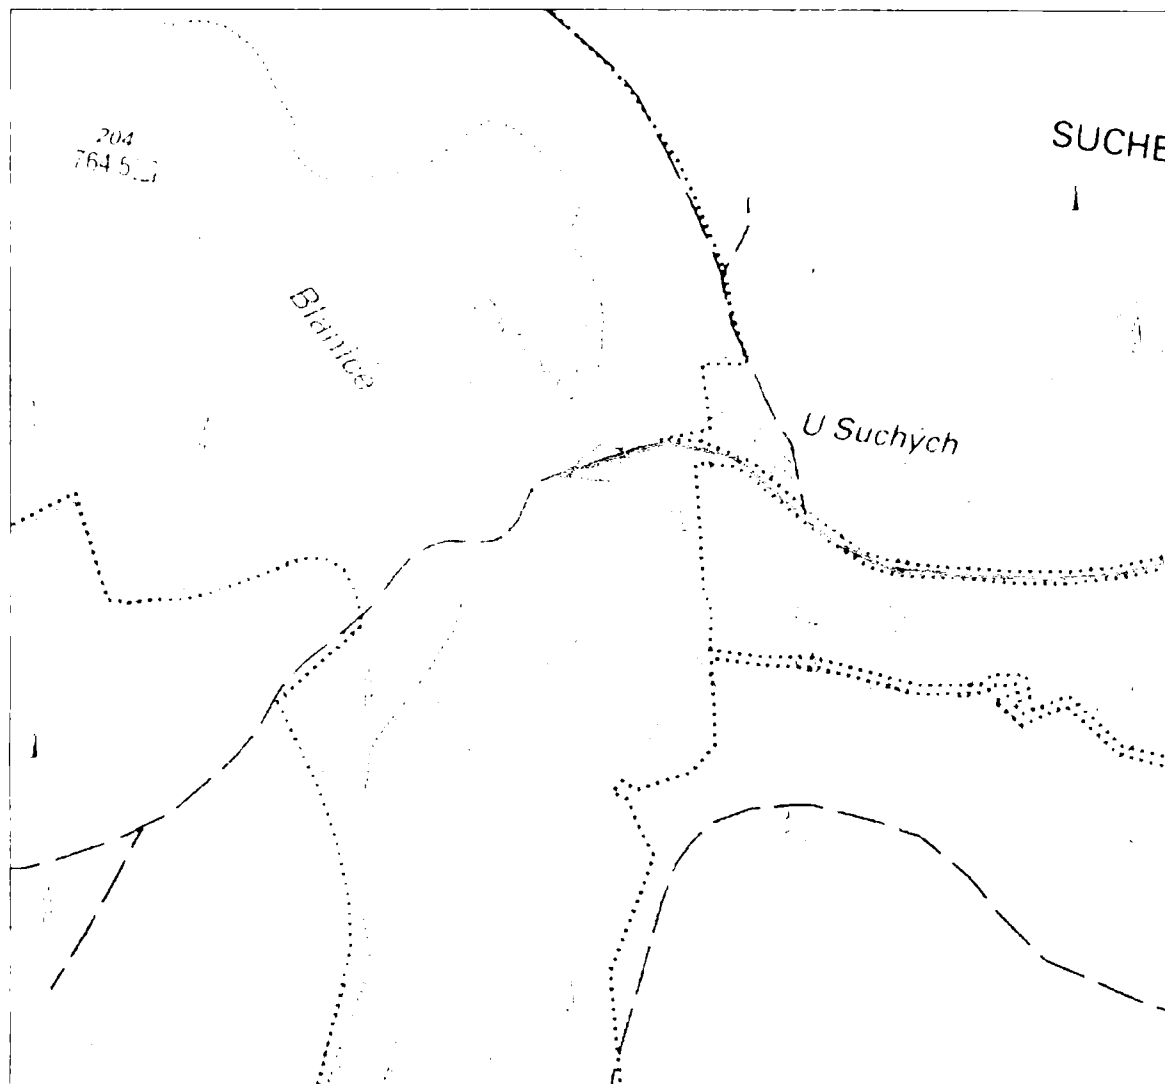

TRATÉŘ PŘÍLOHA
K ZÁKONU O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY







Příloha 2 Kontaktní údaje








Príloha 3 Položkový rozpočet




















1. *What is the purpose of this document?*

2. *What are the main findings of the study?*

3. *What are the implications of the findings?*

4. *What are the limitations of the study?*

5. *What are the conclusions of the study?*

6. *What are the recommendations for future research?*

7. *What are the acknowledgments?*

8. *What are the references?*

9. *What are the appendices?*

10. *What are the footnotes?*

11. *What are the tables?*

12. *What are the figures?*

13. *What are the conclusions?*

14. *What are the recommendations?*

15. *What are the acknowledgments?*


16. *What are the references?*


17. *What are the appendices?*


18. *What are the footnotes?*


19. *What are the tables?*


20. *What are the figures?*


























the 1990s, the number of people in the UK who are aged 65 and over has increased by 1.5 million (1990–1999) and is projected to increase by a further 1.5 million by 2010 (Office of National Statistics 2000).

There is a growing awareness of the need to develop strategies to meet the needs of the ageing population. The Department of Health (2000) has identified the need to develop a 'new paradigm' for the care of the elderly, one that is based on the concept of 'active ageing' and 'positive ageing'. This paradigm is based on the idea that ageing is a process, not a state, and that the quality of life of the elderly can be improved by promoting their health, well-being and participation in society.

The Department of Health (2000) has identified a number of key areas for action in the new paradigm, including: (1) promoting the health and well-being of the elderly; (2) promoting the participation of the elderly in society; (3) promoting the independence of the elderly; (4) promoting the dignity of the elderly; (5) promoting the safety of the elderly; (6) promoting the security of the elderly; (7) promoting the comfort of the elderly; (8) promoting the convenience of the elderly; (9) promoting the accessibility of the elderly; (10) promoting the affordability of the elderly.

The Department of Health (2000) has also identified a number of key areas for action in the new paradigm, including: (1) promoting the health and well-being of the elderly; (2) promoting the participation of the elderly in society; (3) promoting the independence of the elderly; (4) promoting the dignity of the elderly; (5) promoting the safety of the elderly; (6) promoting the security of the elderly; (7) promoting the comfort of the elderly; (8) promoting the convenience of the elderly; (9) promoting the accessibility of the elderly; (10) promoting the affordability of the elderly.

The Department of Health (2000) has also identified a number of key areas for action in the new paradigm, including: (1) promoting the health and well-being of the elderly; (2) promoting the participation of the elderly in society; (3) promoting the independence of the elderly; (4) promoting the dignity of the elderly; (5) promoting the safety of the elderly; (6) promoting the security of the elderly; (7) promoting the comfort of the elderly; (8) promoting the convenience of the elderly; (9) promoting the accessibility of the elderly; (10) promoting the affordability of the elderly.

The Department of Health (2000) has also identified a number of key areas for action in the new paradigm, including: (1) promoting the health and well-being of the elderly; (2) promoting the participation of the elderly in society; (3) promoting the independence of the elderly; (4) promoting the dignity of the elderly; (5) promoting the safety of the elderly; (6) promoting the security of the elderly; (7) promoting the comfort of the elderly; (8) promoting the convenience of the elderly; (9) promoting the accessibility of the elderly; (10) promoting the affordability of the elderly.

The Department of Health (2000) has also identified a number of key areas for action in the new paradigm, including: (1) promoting the health and well-being of the elderly; (2) promoting the participation of the elderly in society; (3) promoting the independence of the elderly; (4) promoting the dignity of the elderly; (5) promoting the safety of the elderly; (6) promoting the security of the elderly; (7) promoting the comfort of the elderly; (8) promoting the convenience of the elderly; (9) promoting the accessibility of the elderly; (10) promoting the affordability of the elderly.

The Department of Health (2000) has also identified a number of key areas for action in the new paradigm, including: (1) promoting the health and well-being of the elderly; (2) promoting the participation of the elderly in society; (3) promoting the independence of the elderly; (4) promoting the dignity of the elderly; (5) promoting the safety of the elderly; (6) promoting the security of the elderly; (7) promoting the comfort of the elderly; (8) promoting the convenience of the elderly; (9) promoting the accessibility of the elderly; (10) promoting the affordability of the elderly.

The Department of Health (2000) has also identified a number of key areas for action in the new paradigm, including: (1) promoting the health and well-being of the elderly; (2) promoting the participation of the elderly in society; (3) promoting the independence of the elderly; (4) promoting the dignity of the elderly; (5) promoting the safety of the elderly; (6) promoting the security of the elderly; (7) promoting the comfort of the elderly; (8) promoting the convenience of the elderly; (9) promoting the accessibility of the elderly; (10) promoting the affordability of the elderly.

The Department of Health (2000) has also identified a number of key areas for action in the new paradigm, including: (1) promoting the health and well-being of the elderly; (2) promoting the participation of the elderly in society; (3) promoting the independence of the elderly; (4) promoting the dignity of the elderly; (5) promoting the safety of the elderly; (6) promoting the security of the elderly; (7) promoting the comfort of the elderly; (8) promoting the convenience of the elderly; (9) promoting the accessibility of the elderly; (10) promoting the affordability of the elderly.

