
**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. VPI/PH/2022/015**

mezi

CETIN a.s.

a

Středočeský kraj

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

ID DS: qa7425t

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

(dále jen „**CETIN**“)

a

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5

IČO: 70891095

DIČ: CZ70891095

ID DS: keebyyf

(dále jen „**Stavebník**“)

zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

ID DS: a6ejgmx

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. Pr 1478
zastoupenou Ing. Janem Lichnegerem, ředitelem

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

Překládka je stavba v k.ú. Beroun, Králův Dvůr, Zahořany u Berouna spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v Projektu;

Etapu Překládky je jakákoliv část Překládky v Projektu označená za etapu, vymezená v Projektu a co do rozsahu určená položkami v Projektu; Etapa Překládky je pro účely Smlouvy samostatným plněním;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky, která je přílohou č. 1 této Smlouvy;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.3 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 14. 12. 2021 vydané pod čj. 885736/21, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPI, Beroun, rek. kom. II605 a III2365**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v Projektu.
- 3.2 Je-li Smlouvou ujednána pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci Překládky a dokončení Překládky jakákoliv lhůta, podmínka nebo povinnost a/nebo pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci Překládky a dokončení Překládky stanoven počátek běhu lhůty ke splnění podmínky nebo povinnosti, má se za to, že lhůta, podmínka nebo povinnost je ujednána rovněž pro Etapu překládky a počátek běhu lhůty ke splnění podmínky nebo povinnosti je stanoven rovněž pro Etapu překládky, není-li Smlouvu výslovně sjednáno jinak.
- 3.3 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
- (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva,
- (vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.4 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.5 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.6 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

- (a) před realizací Překládky:
 - (i) zajistit zpracování Projektu;
 - (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.
- (b) po realizaci Překládky:
 - (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
 - (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
 - (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;

- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však čtyři (4) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“);
- (iii) Kvalifikovanou výzvu učinit pro každou Etapu Překládky.

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí Městského úřadu Beroun, odbor výstavby – rozhodnutí o umístění stavby III/605 a III/2365 Beroun rek. silnic Beroun, Králův Dvůr, Zahorany č.j. MBE/37364/2017/VÝST-Čp ze dne 29.5.2017, pravomocného dne 13.6.2017 (dále jen „**Územní rozhodnutí**“), a to (i) práva k umístění, resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v Územním rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Územním rozhodnutí výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Územní rozhodnutí je Přílohou č. 2 Smlouvy.

- 4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci každé Etapy Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:
- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
 - (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
 - (c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy.
- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení dle Zákona o vyvlastnění. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle Zákona o vyvlastnění.
- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinností dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Etapy Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Etapy Překládky. Smluvní strany ujednaly a

souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu činí ke dni uzavření Smlouvy **2.768.839,- Kč** (slovy: dva miliony sedm set šedesát osm tisíc osm set třicet devět korun českých) (dále jen „**Náklady překládky stanovené na základě Projektu**“). Specifikace těchto nákladů je uvedena v Projektu.
- 5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím;
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázanosti na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu;
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými;
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty;
- (f) náklady na identifikaci parcel;
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky;
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění;
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění;
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky;
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky;
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu;

(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

- 5.5 Výše nákladů na Překládku stanovených na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY


- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:
- (a) Faktura za Přípravu Překládky ve **výši 490.333,- Kč** (slovy: čtyři sta devadesát tisíc tři sta třicet tři korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od uzavření Smlouvy;
 - (b) Faktura za Etapu Překládky bude vystavena do patnácti (15) dnů od ukončení realizace té které Etapy Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.
- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.
- 6.7 Stavebník potvrzuje a souhlasí, aby Faktury dle odst. 6.1 a 6.2 tohoto článku:
- (i) společnost CETIN vystavila na Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizaci, IČO: 00066001 (dále jen „**Krajská správa a údržba silnic**“) a zaslala na adresu Krajské správy a údržby silnic, uvedenou v hlavičce Smlouvy;
 - (ii) byly společností CETIN uhrazeny Krajskou správou a údržbou silnic.
- 6.8 V případě prodlení s uhrazením jakékoliv Faktury vystavené společností CETIN dle odst. 6.7 tohoto článku ze strany Krajské správy a údržby silnic, odpovídá za toto prodlení v plném rozsahu Stavebník a je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu dle čl. 7., odst. 7.1. Smlouvy.

7. SANKCE


- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Za společnost CETIN:



- 8.2 Za Stavebníka:



9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 nebo 9.3 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Vznikne-li společnosti CETIN právo odstoupit od Smlouvy dle předchozího odstavce, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit i částečně, s účinky pro každou Etapu Překládky v odstoupení označenou.
- 9.4 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 nebo 9.3 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.

- 9.5 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.6 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva pro každou Etapu Překládky musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí lhůty je dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti části Smlouvy v rozsahu každé Etapy Překládky, pro kterou ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy nebyla společnosti CETIN doručena Kvalifikovaná výzva.
- 10.2 Dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy zanikne Smlouva:
- (a) zčásti, a to v rozsahu každé Etapy Překládky, pro kterou nebyla společnosti CETIN doručena Kvalifikovaná výzva ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy;
 - (b) v celém rozsahu, nebyla-li společnosti CETIN doručena žádná Kvalifikovaná výzva ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy. Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou jen zčásti, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze zaniklé části Smlouvy.
- 10.4 Zánikem Smlouvy nebo její části rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy nebo její části.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přijímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- (a) v listinné podobě;
 - (b) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zaručený elektronický podpis**“);
 - (c) e-mailovou zprávou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem;

- (d) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.7 Smlouvy, věta první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmeny (c) a (d).

- 12.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.
- 12.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
- 12.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.10 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.11 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

12.12 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

12.13 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoliv souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.14 Smlouva je vyhotovena elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.

12.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - Projekt

Příloha č. 2 - Územní rozhodnutí Městského úřadu Beroun, odbor výstavby – rozhodnutí č.j. MBE/37364/2017/VÝST-Čp

CETIN:

Stavebník:

V Praze dne _____ Digitálně

V _____ dne _____



Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2022/015
Číslo smlouvy Stavebníka: S-1139/KSUS/2022
S-470/00066001/2022

SRM: 8030003086

Registr smluv: Ano

Název stavby: VPI , Beroun rek.kom II605 a III2365

Číslo SPP prvku: 16010-040761

Zhotovitel PD: Araneanetwork a.s.

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.000	KMP:	0.000	bytových H	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.000	podnik. HT:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HT	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní úze 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	48 753,16 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MONTÁŽ	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	441 579,44 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazo	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevyka	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 490 332,60 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 0,00 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 490 332,60 Kč

Seznam položek


Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks	#####
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	36687.88 J'	#####
		celkem 623m		

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

954830		Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	406550.00	#####
		náhrady náhrady náhrady náhrady náhrady		
955315		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	6.00 ks	#####
958085		Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z	6.00 ks	#####

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
-----------	------------------	---------------	----------	--------------

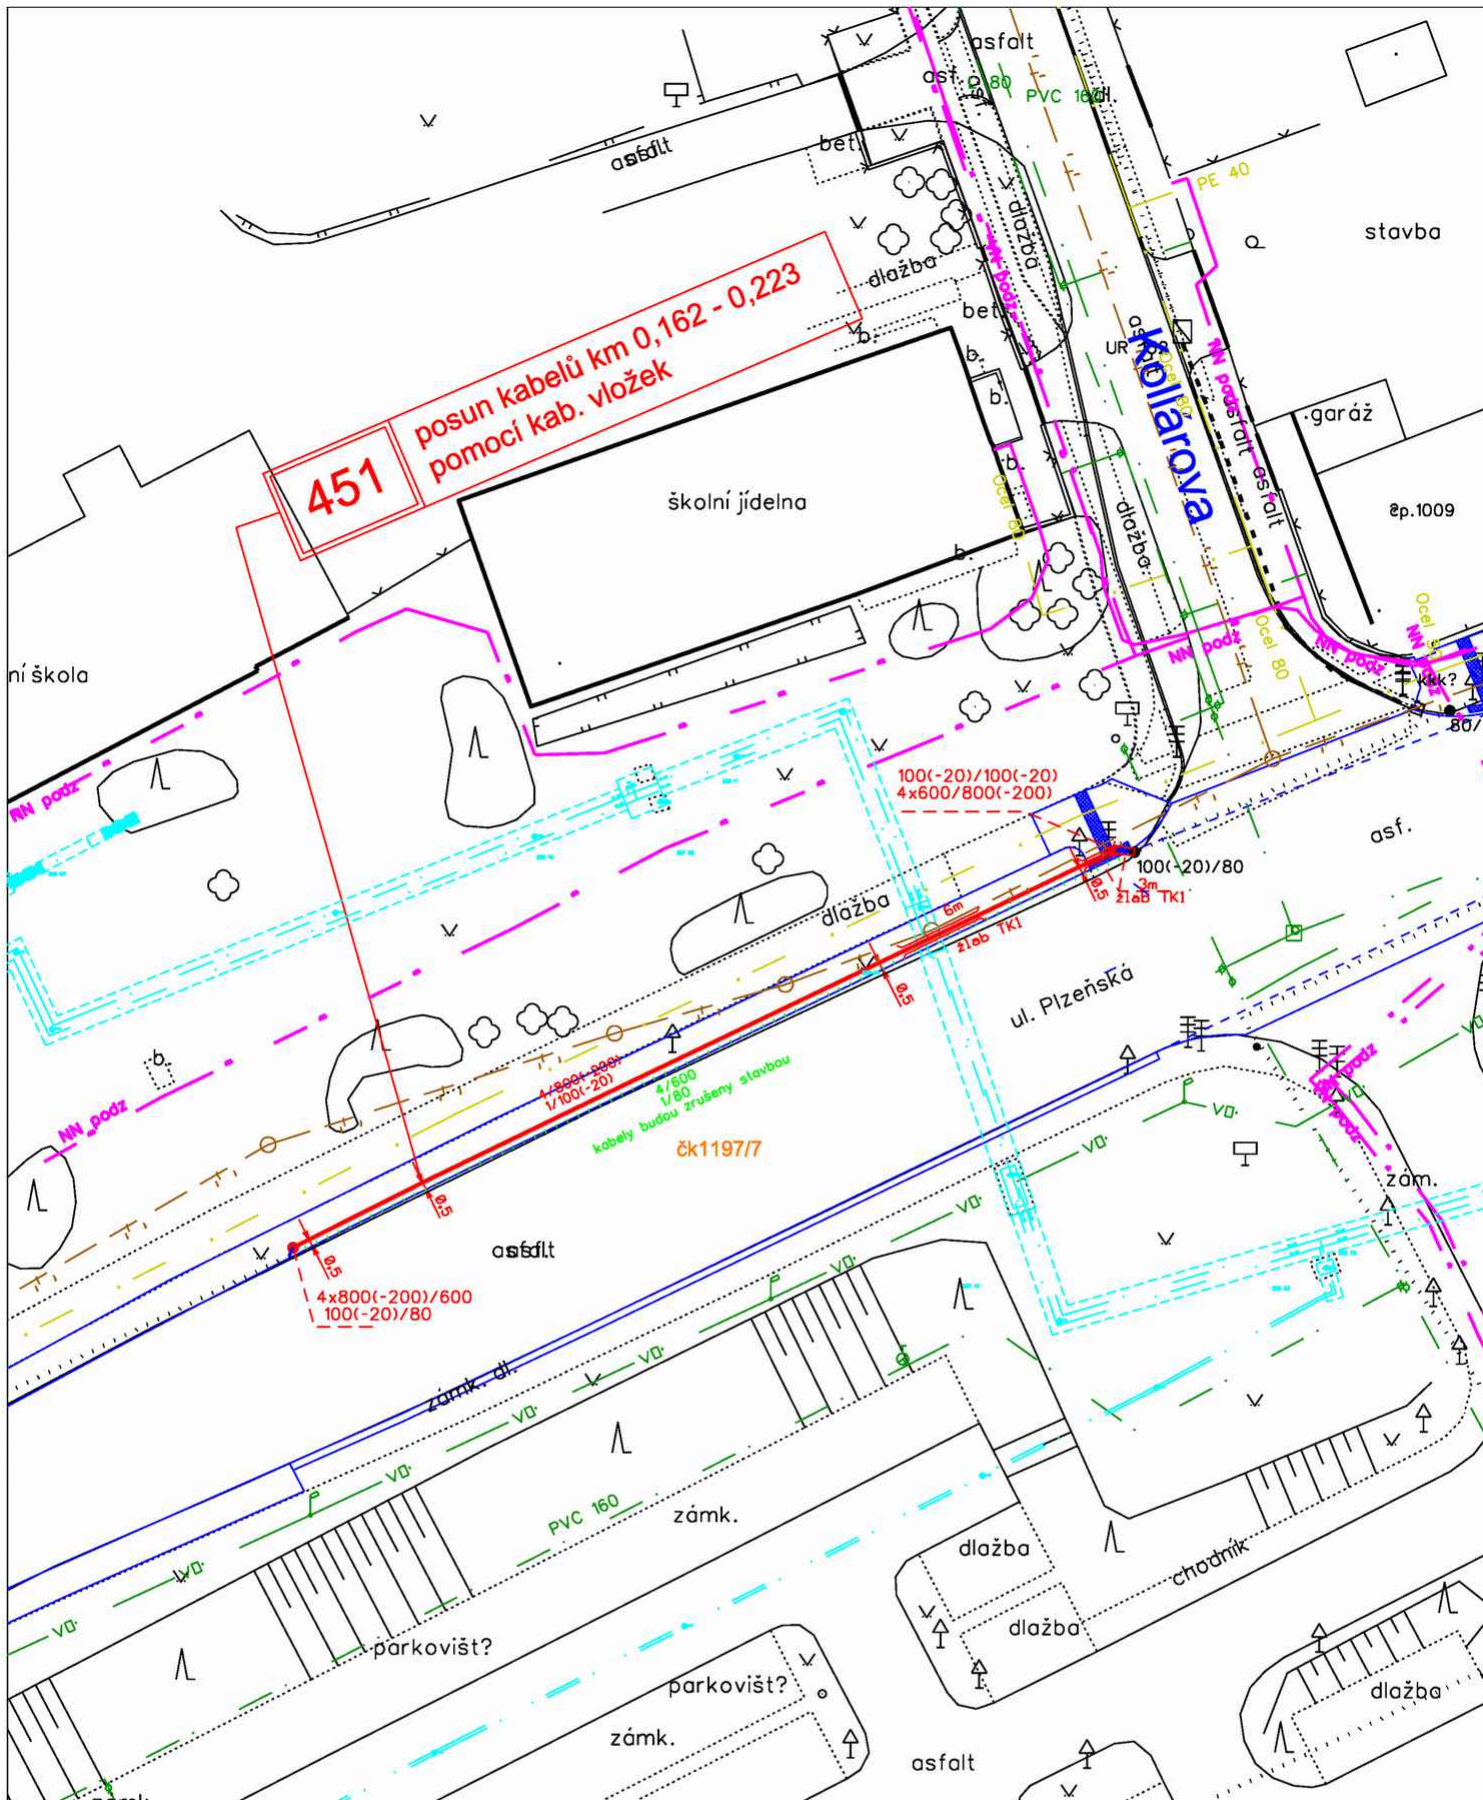


Legenda IS

PLYN
 KANALIZACE
 VODA
 ELEKTRIKA

— PROJEKTOVANÉ ZAŘÍZENÍ
 - - - BUĐOUČÍ STAV KOMUNIKACE
 — RUŠENÉ ZAŘÍZENÍ

	Stavebník / Investor:	CETIN	SAP: 16010-040761
	K.ú.:		Zakázka:
	Kreslil:		Stupeň : DPS
Vypracoval:	Formát : A4		
Zodp. proj.:	Měřítko : 1:500		
HIP.:	Datum: 02/2018		
Název výkresu:			Číslo výkresu: 1
Polohopis-SO451			
Název zakázky: VPI, Beroun, rek.komun.II605 a III2365			

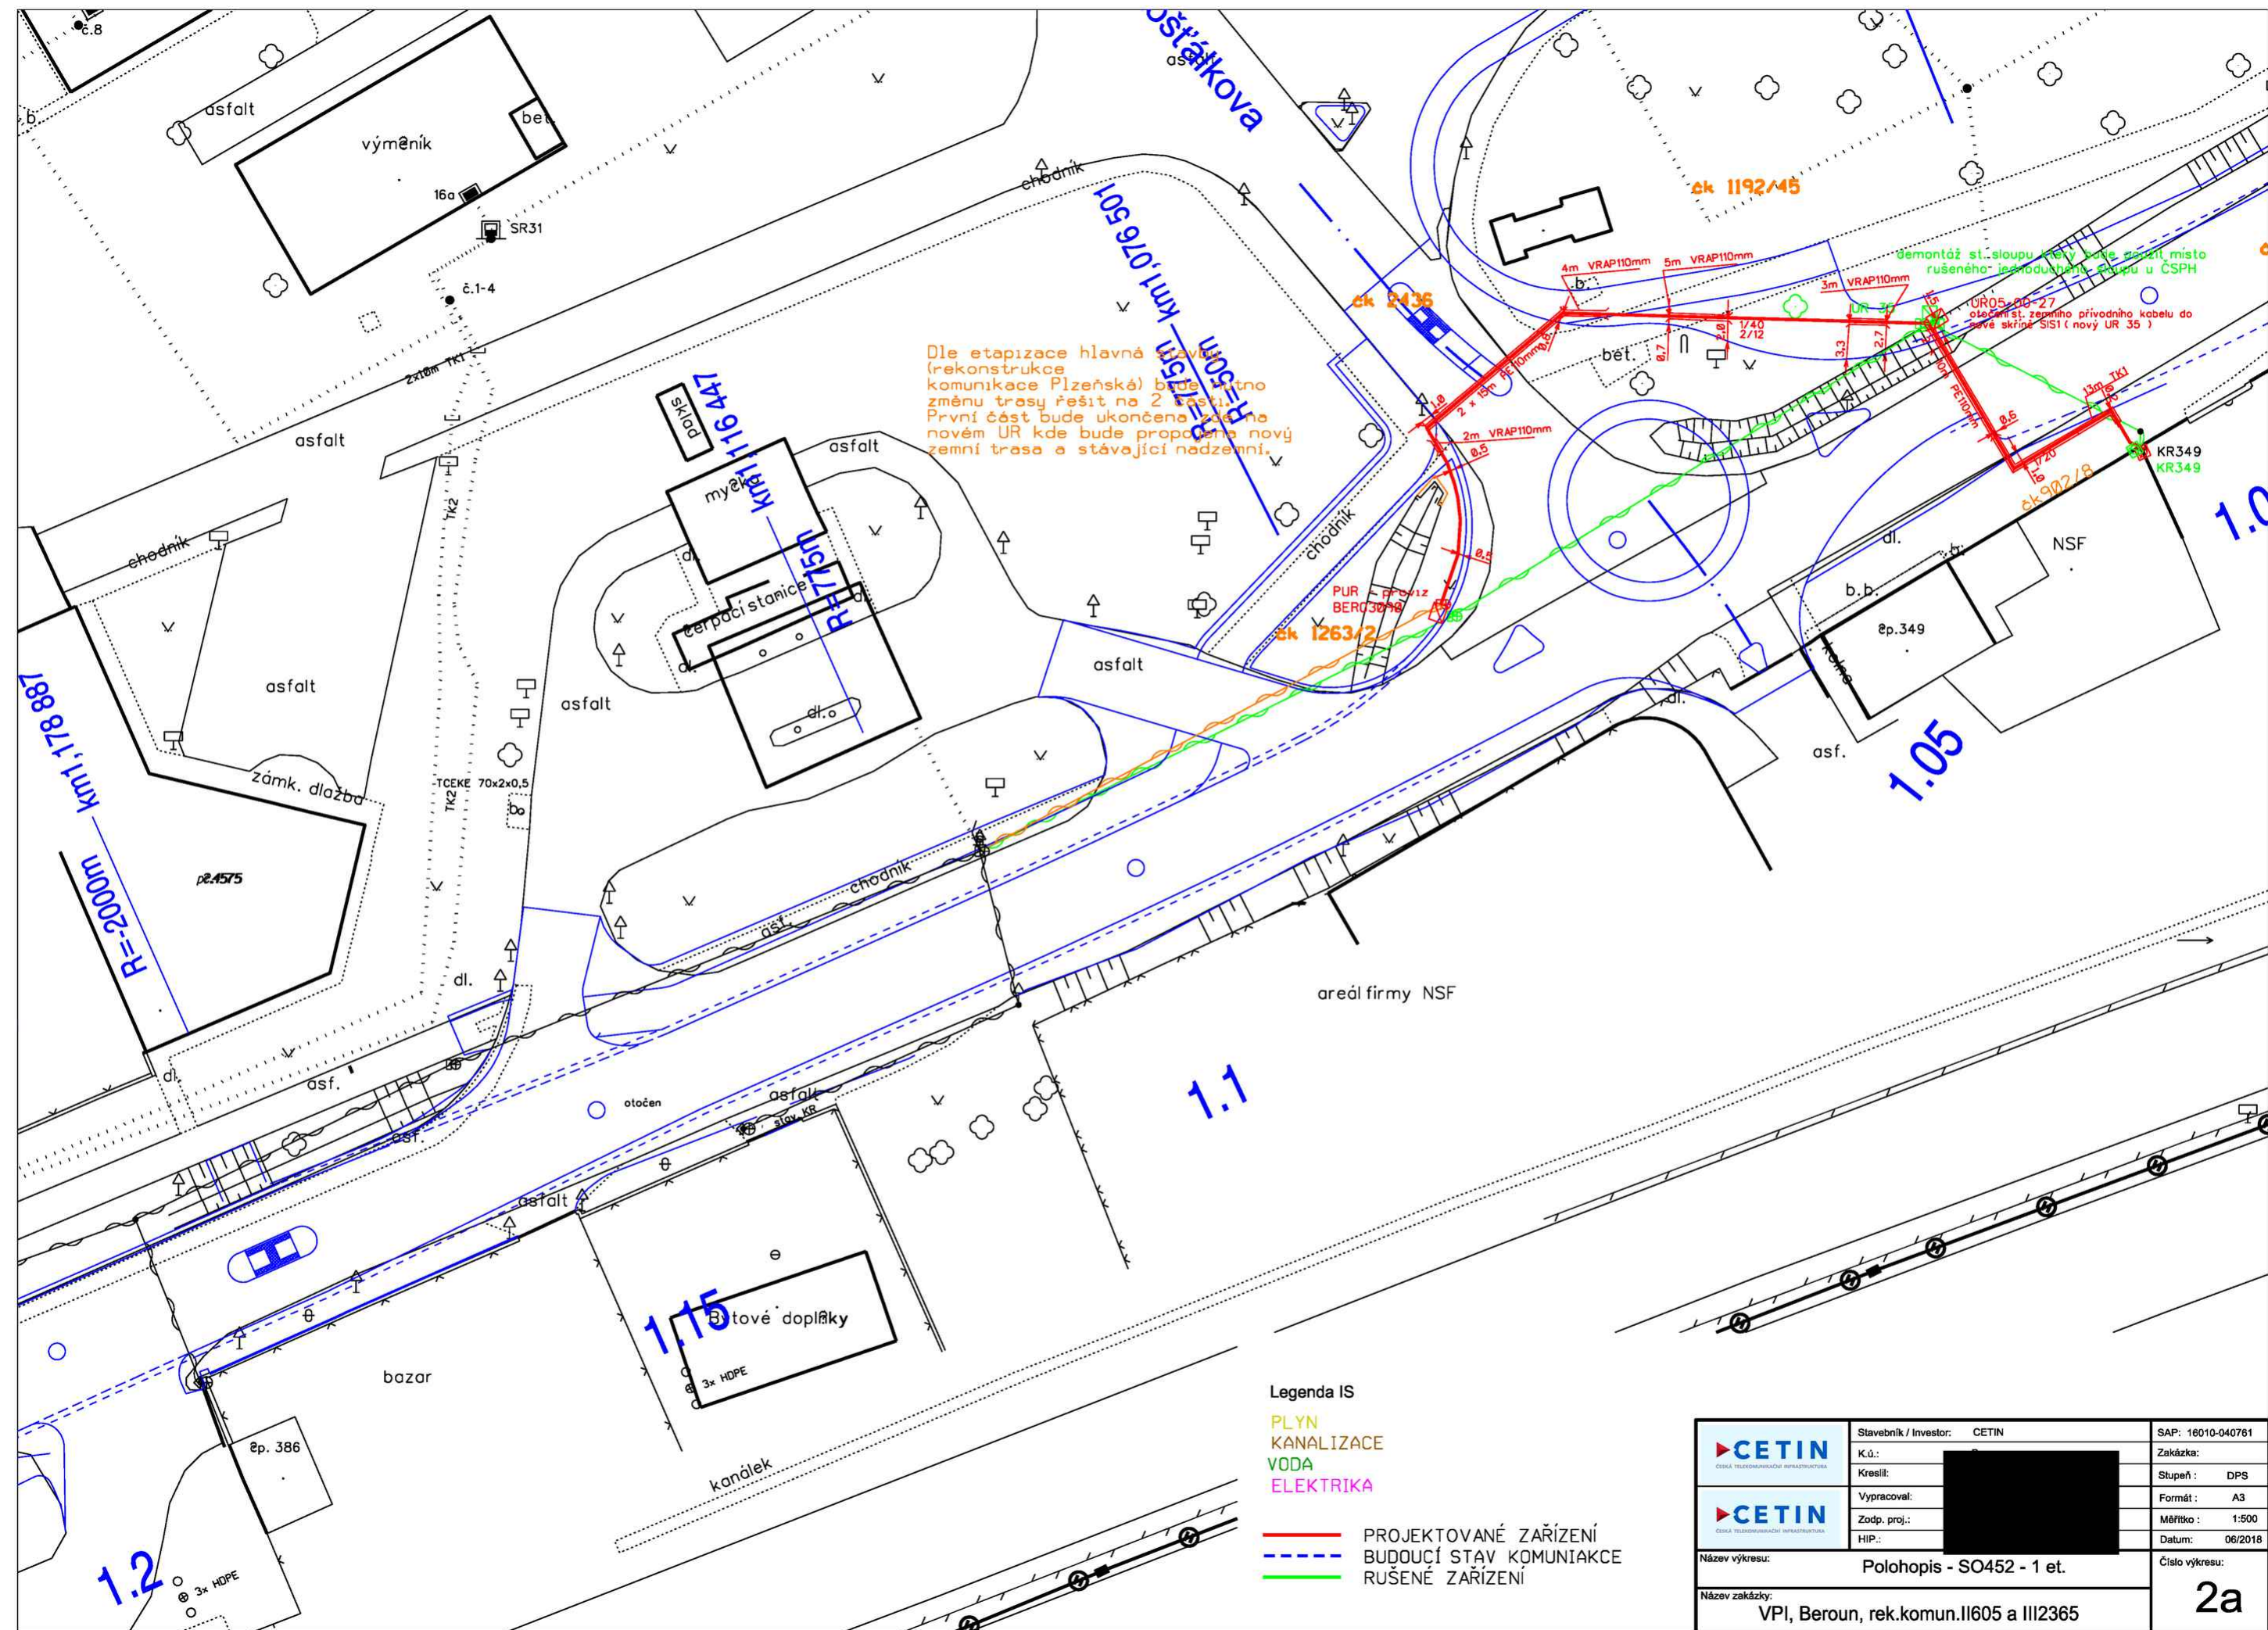

Dle etapizace hlavního plynu (rekonstrukce komunikace Plzeňská) bude nutno změnu trasy řešit na 2 částech. První část bude ukončena zde na novém UR kde bude propojena nová zemní trasa a stávající nadzemní.

Legenda IS

- PLYN
- KANALIZACE
- VODA
- ELEKTRIKA

- PROJEKTOVANÉ ZAŘÍZENÍ
- BUDOUCÍ STAV KOMUNIKACE
- RUŠENÉ ZAŘÍZENÍ

	Stavebník / Investor: CETIN	SAP: 16010-040761
	K.ú.: [redacted]	Zakázka:
	Kreslil: [redacted]	Stupeň: DPS
	Vypracoval: [redacted]	Formát: A3
	Zodp. proj.: [redacted]	Měřítko: 1:500
	HIP.: [redacted]	Datum: 06/2018
	Název výkresu: Polohopis - SO452 - 1 et.	Číslo výkresu:
	Název zakázky: VPI, Beroun, rek.komun.II605 a II2365	2a

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: x VP SUPTEL 2021 - STAND. - 2021.12

Položková databáze: 2021.12

Název stavby: VPI, Beroun, rek. komunikace II605 a III2365 - SO 452 - 1 et,

Číslo SPP prvku: 16010-04761

Zhotovitel PD: CETIN

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	12 065,28 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	116 632,11 Kč
MONTÁŽ	53 762,13 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	5 554,35 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	11 849,28 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	1 391,05 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	6 742,54 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	39 210,09 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	12 300,00 Kč

Celkové náklady: 259 506,83 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 223 292,27 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 36 214,56 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
PŘÍPRAVA			
958084	Návrh cenový a technický		1.00 ks
ZEMNÍ PRÁCE			
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		61.00 m
952367 S	Pokládka žlabů TK1		13.00 m
955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě sítové		7130.00 JV
	Obetonování cht.trubek pod komunikací		
954949 S	Průvrt zdivem betonovým tl. nad 600 mm včetně		1.00 ks
954951 S	Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70		30.00 m
952355 S	Rýha v trávě 50/110		38.00 m
954952 S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130		25.00 m
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu		93.00 m
951349 S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky		2.00 ks
MONTÁŽ			
955020 S	Demontáž dvojitého patkovaného stožáru		1.00 ks
955017 S	Demontáž jednoduch. patkovaného stožáru		1.00 ks
955091 S	Demontáž rozvaděče sloupového		1.00 ks
955015 S	Demontáž samonos. kabelů do 5 XN		210.00 m
956509 S	Demontáž samostatné konzole(háku) na stěnu		1.00 ks
955311 S	Demontáž skříň.rozv.na omítku do 10 čtyř.		1.00 ks

955029 S	Demontáž úložných kabelů do15 XN	3.00 m
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	14.00 ks
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	60.00 ks
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	14.00 ks
955299 S	Montáž objektu samost. SIS do 50 čtyřek	1.00 ks
955292 S	Montáž rozvaděče skříň.zasek.do 50 čtyř.	1.00 ks
955296 S	Montáž rozvaděče sloupového	1.00 ks
954981 S	Montáž samonosných kabelů do 5 XN	90.00 m
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	260.00 m
955303 S	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	2.00 ks
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	53.00 ks
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	11.00 ks
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	3.00 ks
954987 S	Vystrojení jednod.patkov.stož.s kotvou	1.00 ks
955021 S	Vystrojení na stávajících podpěrách - demontáž	5.00 ks
954989 S	Vystrojení na stávajících podpěrách	1.00 ks
955022 S	Zrušení samonosných kabelů do 5 XN	28.00 m
956510 S	Zrušení samostatné konzole(háku) na stěnu	1.00 ks
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	17.00 ks
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	4.00 ks
955097 S	Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	3.00 ks
--------	--------------------------	---------

PROVOZNÍ PRÁCE

955204 S	Zrušení převodu v rozvaděci - 1.pár	1.00 ks
955205 S	Zrušení převodu v rozvaděci - další pár	3.00 ks
955208 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	4.00 ks
955209 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár	4.00 ks

POPLATKY

955366	Poplatky k nadzemním tratím síťovým zábor pozemků města (mimo zábor stavby)	12300.00 JV
--------	---	-------------

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
-----------	------------------	---------------	----------

MATERIÁL VYŘAZENÝ

306419 S	Skříň rozvaděče SIS 1-QT 50p-sloupek	1.00 ks
----------	--------------------------------------	---------

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

306577 S	Bleskojistka třípólová 230V 10A/10kA	20.00 ks
305463 S	Deska kotevní 40x25x5 cm s otvorem	1.00 ks
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	46.00 ks
305745 S	Drát ocelový pozink. D 1,8 mm	1.00 kg
305789 S	Drát ocelový pozink. D 4,0 mm	0.30 kg
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	88.00 m
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	68.00 m
303777 S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	68.00 m
300118 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,6	75.00 m

300116 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,6	150.00 m
300117 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,6	35.00 m
306358 S	Lano ocelové 42x1 mm Zn130 1kg=3,23m	2.20 kg
306610 S	Matice napínače M 16 ČSN 021682	1.00 ks
306701 S	Napínač šroubový oko-hák M 16	1.00 ks
306745 S	Napínač šroubový oko-oko M 16	1.00 ks
307247 S	Objímka kotevní D 140 mm	1.00 ks
309698 S	Očnice kovová FeZn pro lano 10mm	2.00 ks
303272 S	Očnice kovová FeZn pro lano 7,1mm	1.00 ks
309931 S	Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m	20.00 kg
305506 S	Patka stožárová EZP 16x20x290 cm	1.00 ks
305338 S	Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1	26.00 ks
310698 S	Propojka uzem. 10114-00125	5.00 ks
313137 S	Příchytka kabelu 42-48 mm 05-633-05600	3.00 ks
308743 S	Sběrnice zemnicí 12-ti pólová	2.00 ks
306320 S	Skříň rozváděče MRK 20-QT 10-20p-pod omítku	1.00 ks
306356 S	Skříň rozváděče MRS 3-QT 100p-na sloup	1.00 ks
301339 S	Sloup dřevěný 7m-impregnace Korasit CK	1.00 ks
306997 S	Svorka lanová D 4-6 mm	2.00 ks
307033 S	Svorka lanová D 9-12 mm	6.00 ks
309974 S	Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm	2.00 ks
309380 S	Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400	8.00 ks
306789 S	Svorník M 16x1520x85x85 FeZn	1.00 ks
306843 S	Svorník M 20x410x90x25	2.00 ks
306457 S	Šroub s okem M 16 x 140 ČSN021371	2.00 ks
302655 S	Trubka PE 110/3,5/6000mm	9.00 ks
302423 S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	11.00 m
309773 S	Vana mont. SID-C 100P+zem 20175-101 CZ	1.00 ks
310024 S	Vana mont. SID-C 60P 34175-060 CZ	1.00 ks
306206 S	Vložka speciální 2008/1 Praha-24573	2.00 ks
302483 S	Vodič propoj. s V svorkou A6 10114-A6L50	5.00 ks
309814 S	Zemnič tyčový D25 1500 mm FeZn	1.00 ks
305195 S	Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1	13.00 ks

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný

401646 S	Matice šestihránná M 16,0 ČSN 021601	4.00 ks
401706 S	Matice šestihránná M 20,0 ČSN 021601	4.00 ks
404063 S	Podložka D 17 mm ČSN 021702	4.00 ks
404231 S	Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M20	5.00 ks
408348 S	Šroub s šestihr.hl. M16x45 ČSN021301	2.00 ks
314473 S	Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY)	5.00 m
402871 S	Vrut s šestihr.hl. 10x80 mm ČSN021810	5.00 ks

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: ¤ VP SUPTEL 2021 - STAND. - 2021.12
Položková databáze: 2021.12

Název stavby: VPI, Broun rek.kom.II605+III2365 - SO452-2et.
Číslo SPP prvku: 16010-040761
Zhotovitel PD: CETIN

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	142 521,38 Kč
MONTÁŽ	49 801,97 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	5 590,15 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	3 949,76 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	2 032,84 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	6 742,54 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	46 961,28 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 257 599,92 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 253 650,16 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST 3 949,76 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
ZEMNÍ PRÁCE			
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		65.00 m
955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové obetonování cht.trubek pod komunikací		9610.00 JV
954951 S	Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70		48.00 m
952355 S	Rýha v trávě 50/110		23.00 m
954952 S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130		31.00 m
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu		102.00 m
951349 S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky		2.00 ks
MONTÁŽ			
955017 S	Demontáž jednoduch. patkovaného stožáru		3.00 ks
955091 S	Demontáž rozvaděče sloupového		1.00 ks
955078 S	Demontáž spojky hrncové		1.00 ks
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka		7.00 ks
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka		17.00 ks
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka		7.00 ks
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování		22.00 ks
955299 S	Montáž objektu samost. SIS do 50 čtyřek		1.00 ks
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické zjištění skutečných průběhů služeb a kabelů		4281.47 JV

955296 S	Montáž rozvaděče sloupového	1.00 ks
954981 S	Montáž samonosných kabelů do 5 XN	4.00 m
955281 S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	5.00 ks
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	255.00 m
955303 S	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	2.00 ks
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	25.00 ks
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	5.00 ks
954988 S	Vystrojení dvojitého patkovaného stožáru	1.00 ks
955021 S	Vystrojení na stávajících podpěrách - demontáž	4.00 ks
955022 S	Zrušení samonosných kabelů do 5 XN	296.00 m
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	16.00 ks
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	3.00 ks
955097 S	Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE		
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	2.00 m
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA		
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks
PROVOZNÍ PRÁCE		
955204 S	Zrušení převodu v rozvaděči - 1.pár	4.00 ks
955205 S	Zrušení převodu v rozvaděči - další pár	4.00 ks
955208 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	4.00 ks
955209 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár	4.00 ks


Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
MATERIÁL VYŘAZENÝ			
306419 S	Skříň rozváděče SIS 1-QT 50p-sloupek		1.00 ks
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		66.00 ks
305833 S	Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m		0.30 kg
305789 S	Drát ocelový pozink. D 4,0 mm		0.60 kg
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová		85.00 m
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		71.00 m
315633 S	Hmoždina sloupová 16x16x30 cm		3.00 ks
300118 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,6		105.00 m
300116 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,6		150.00 m
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball		1.00 ks
312425 S	Modul konektor. 9700-10P		1.00 ks
306745 S	Napínač šroubový oko-oko M 16		1.00 ks
307247 S	Objímka kotevní D 140 mm		1.00 ks
309698 S	Očnice kovová FeZn pro lano 10mm		1.00 ks
309931 S	Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m		40.00 kg
305506 S	Patka stožárová EZP 16x20x290 cm		2.00 ks
310698 S	Propojka uzem. 10114-00125		2.00 ks
313137 S	Příchytka kabelu 42-48 mm 05-633-05600		2.00 ks
308707 S	Sběrnice zemnicí 6-ti pólová		2.00 ks
306356 S	Skříň rozváděče MRS 3-QT 100p-na sloup		1.00 ks
301339 S	Sloup dřevěný 7m-impregnace Korasit CK		2.00 ks

407578 S	Souprava čistící 4413L	4.00 ks
320296 S	Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350	5.00 ks
302326 S	Spojka stínění uzemnění 52672533-00	6.00 ks
307033 S	Svorka lanová D 9-12 mm	2.00 ks
309974 S	Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm	1.00 ks
309380 S	Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400	5.00 ks
306824 S	Svorník M 20x370x90x25	2.00 ks
306843 S	Svorník M 20x410x90x25	7.00 ks
302655 S	Trubka PE 110/3,5/6000mm	11.00 ks
309621 S	Vana mont. SID-C 20P 14175-020 CZ	1.00 ks
309506 S	Vana mont. SID-C 30P 22175-030 CZ	1.00 ks
306206 S	Vložka speciální 2008/1 Praha-24573	2.00 ks
302289 S	Zásobník blesk. SID-C 3 pól. 79126-51000	3.00 ks

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný

401646 S	Matice šestihranná M 16,0 ČSN 021601	2.00 ks
401706 S	Matice šestihranná M 20,0 ČSN 021601	18.00 ks
404063 S	Podložka D 17 mm ČSN 021702	2.00 ks
404231 S	Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M20	18.00 ks
408324 S	Šroub s šestihr.hl. M16x180 ČSN021301	2.00 ks
402871 S	Vrut s šestihr.hl. 10x80 mm ČSN021810	6.00 ks

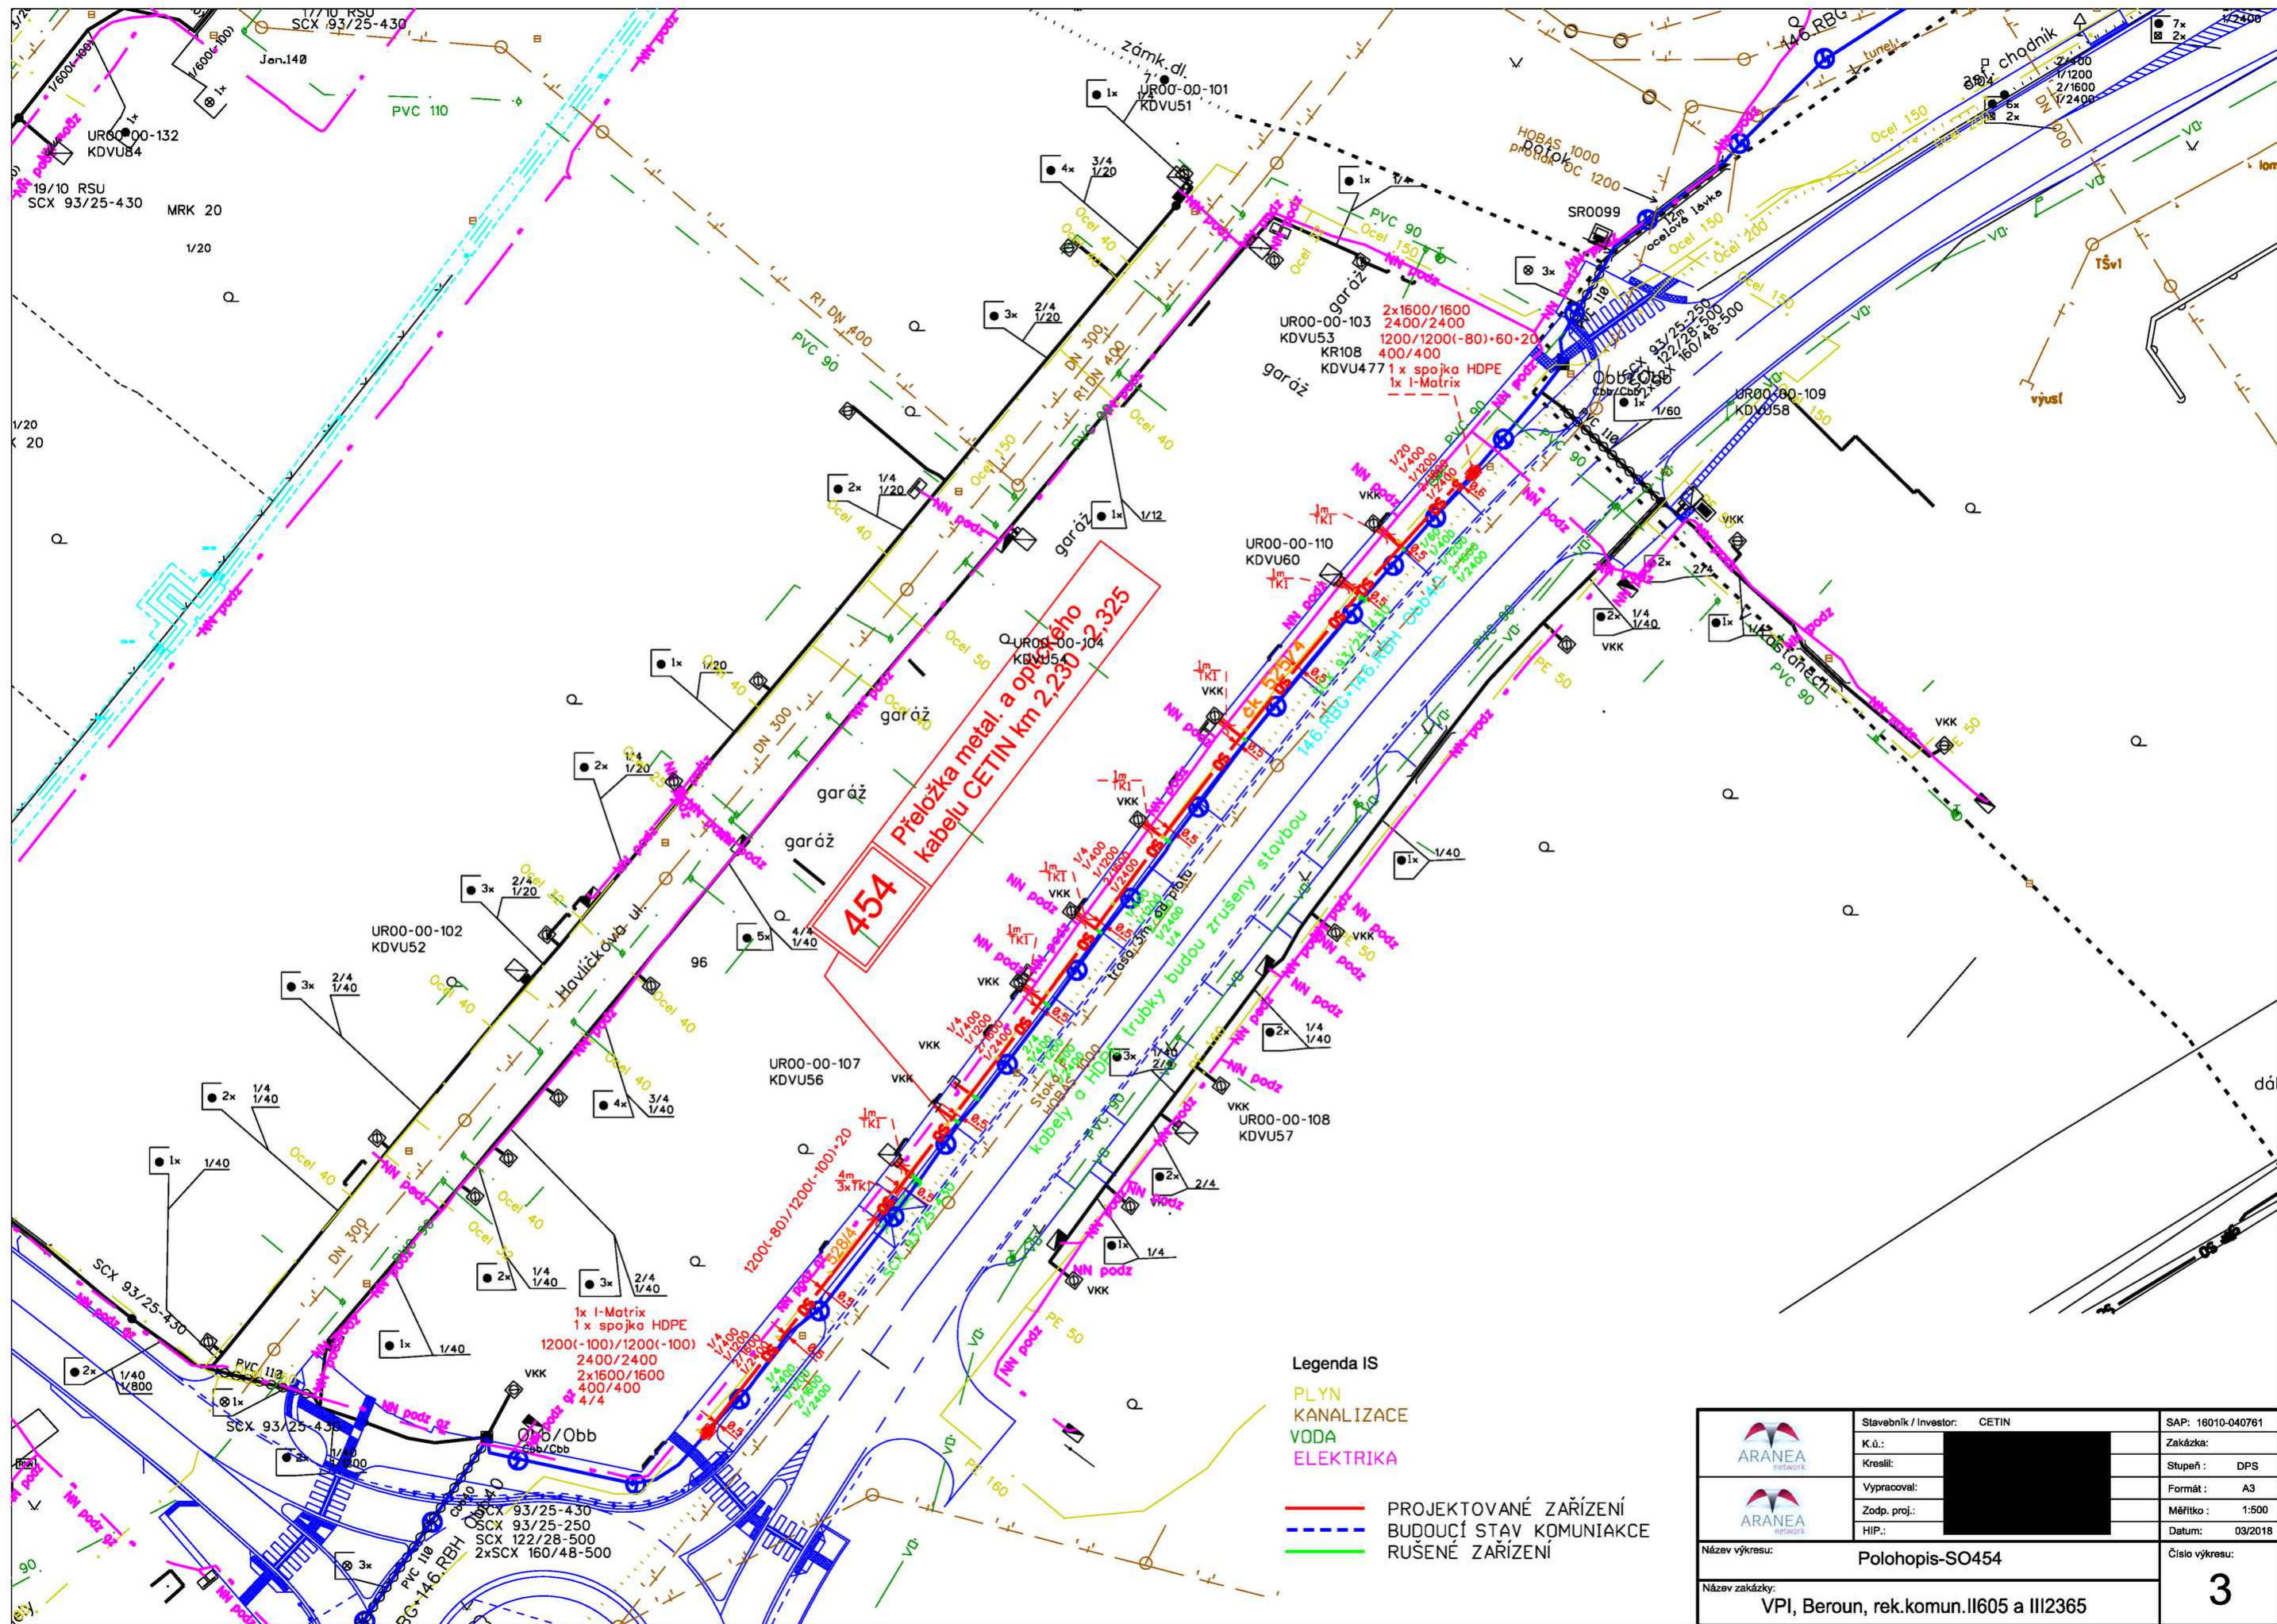

	Stavebník / Investor: CETIN	SAP: 16010-040761
	K.ú.: [REDACTED]	Zakázka: [REDACTED]
	Kreslil: [REDACTED]	Stupeň: DPS
	Vypracoval: [REDACTED]	Formát: A3
	Zodp. proj.: [REDACTED]	Měřítko: 1:500
	HIP.: [REDACTED]	Datum: 03/2018
Číslo výkresu: 3		

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: x VP SUPTEL 2021 - STAND. - 2021.12
 Položková databáze: 2021.12

Název stavby: VPI, Beroun, rek. kom. II605 a III2365_SO454-MET
 Číslo SPP prvku: 16010-040761
 Zhotovitel PD: CETIN

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	5 677,78 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	216 418,80 Kč
MONTÁŽ	353 222,96 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	5 912,35 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	3 949,76 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	287,94 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	635 927,02 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 1 221 396,61 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 1 211 769,07 Kč
 NESTAVEBNÍ ČINNOST 9 627,54 Kč


Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
PŘÍPRAVA			
958210	Návrh cenový a technický bez projednání		1.00 ks
ZEMNÍ PRÁCE			
952367 S	Pokládka žlabů TK1		20.00 m
954949 S	Průvrt zdívkou betonovým tl. nad 600 mm včetně		5.00 ks
952346 S	Rýha v chodníku l.asf.35/50-70rozš.o10cm		240.00 m
954951 S	Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70		120.00 m
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu		120.00 m
951349 S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky		5.00 ks
MONTÁŽ			
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba		216.00 m
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka		136.00 ks
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka		3506.00 ks
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka		63.00 ks
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování		3901.00 ks
955288 S	Montáž koncovky SKH		2.00 ks
955282 S	Montáž spojky smršťitelné nad 50 čtyřek		11.00 ks
955281 S	Montáž spojky smršťitelné do 50 čtyřek		1.00 ks
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb		2.00 ks
952602 S	Montáž trubky úložné		216.00 m

954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	245.00 m
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	324.00 m
954993 S	Montáž úložných kabelů nad 300 XN	216.00 m
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	23.00 ks
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	15.00 ks
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	23.00 ks
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	15.00 ks
955040 S	Zrušení úložných kabelů do15 XN	34.00 m
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE		
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	20.00 m
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA		
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
MATERIÁL VYŘAZENÝ			
303003 S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson		2.00 ks
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		108.00 ks
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová		120.00 m
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		120.00 m
303777 S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá		130.00 m
300122 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,6		108.00 m
300115 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 1x4x0,6		216.00 m
300112 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 300x4x0,4		108.00 m
300113 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 400x4x0,4		108.00 m
300273 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 400x4x0,6		108.00 m
300105 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4		27.00 m
300114 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 600x4x0,4		108.00 m
316527 S	Koncovka smršť. SKH 1 4/10 mm		2.00 ks
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball		3.00 ks
312425 S	Modul konektor. 9700-10P		781.00 ks
305338 S	Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1		40.00 ks
407578 S	Souprava čistící 4413L		12.00 ks
320313 S	Souprava odbočovací BOKT-5L-160/42-200/50		3.00 ks
312845 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE		1.00 ks
320301 S	Spojka smršťovací XAGA 550 122/30-500		3.00 ks
320302 S	Spojka smršťovací XAGA 550 160/42-500		8.00 ks
300027 S	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy		108.00 m
300036 S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy		108.00 m
305195 S	Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1		20.00 ks
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
304267 S	Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá		12.00 ks
301685 S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda		12.00 ks

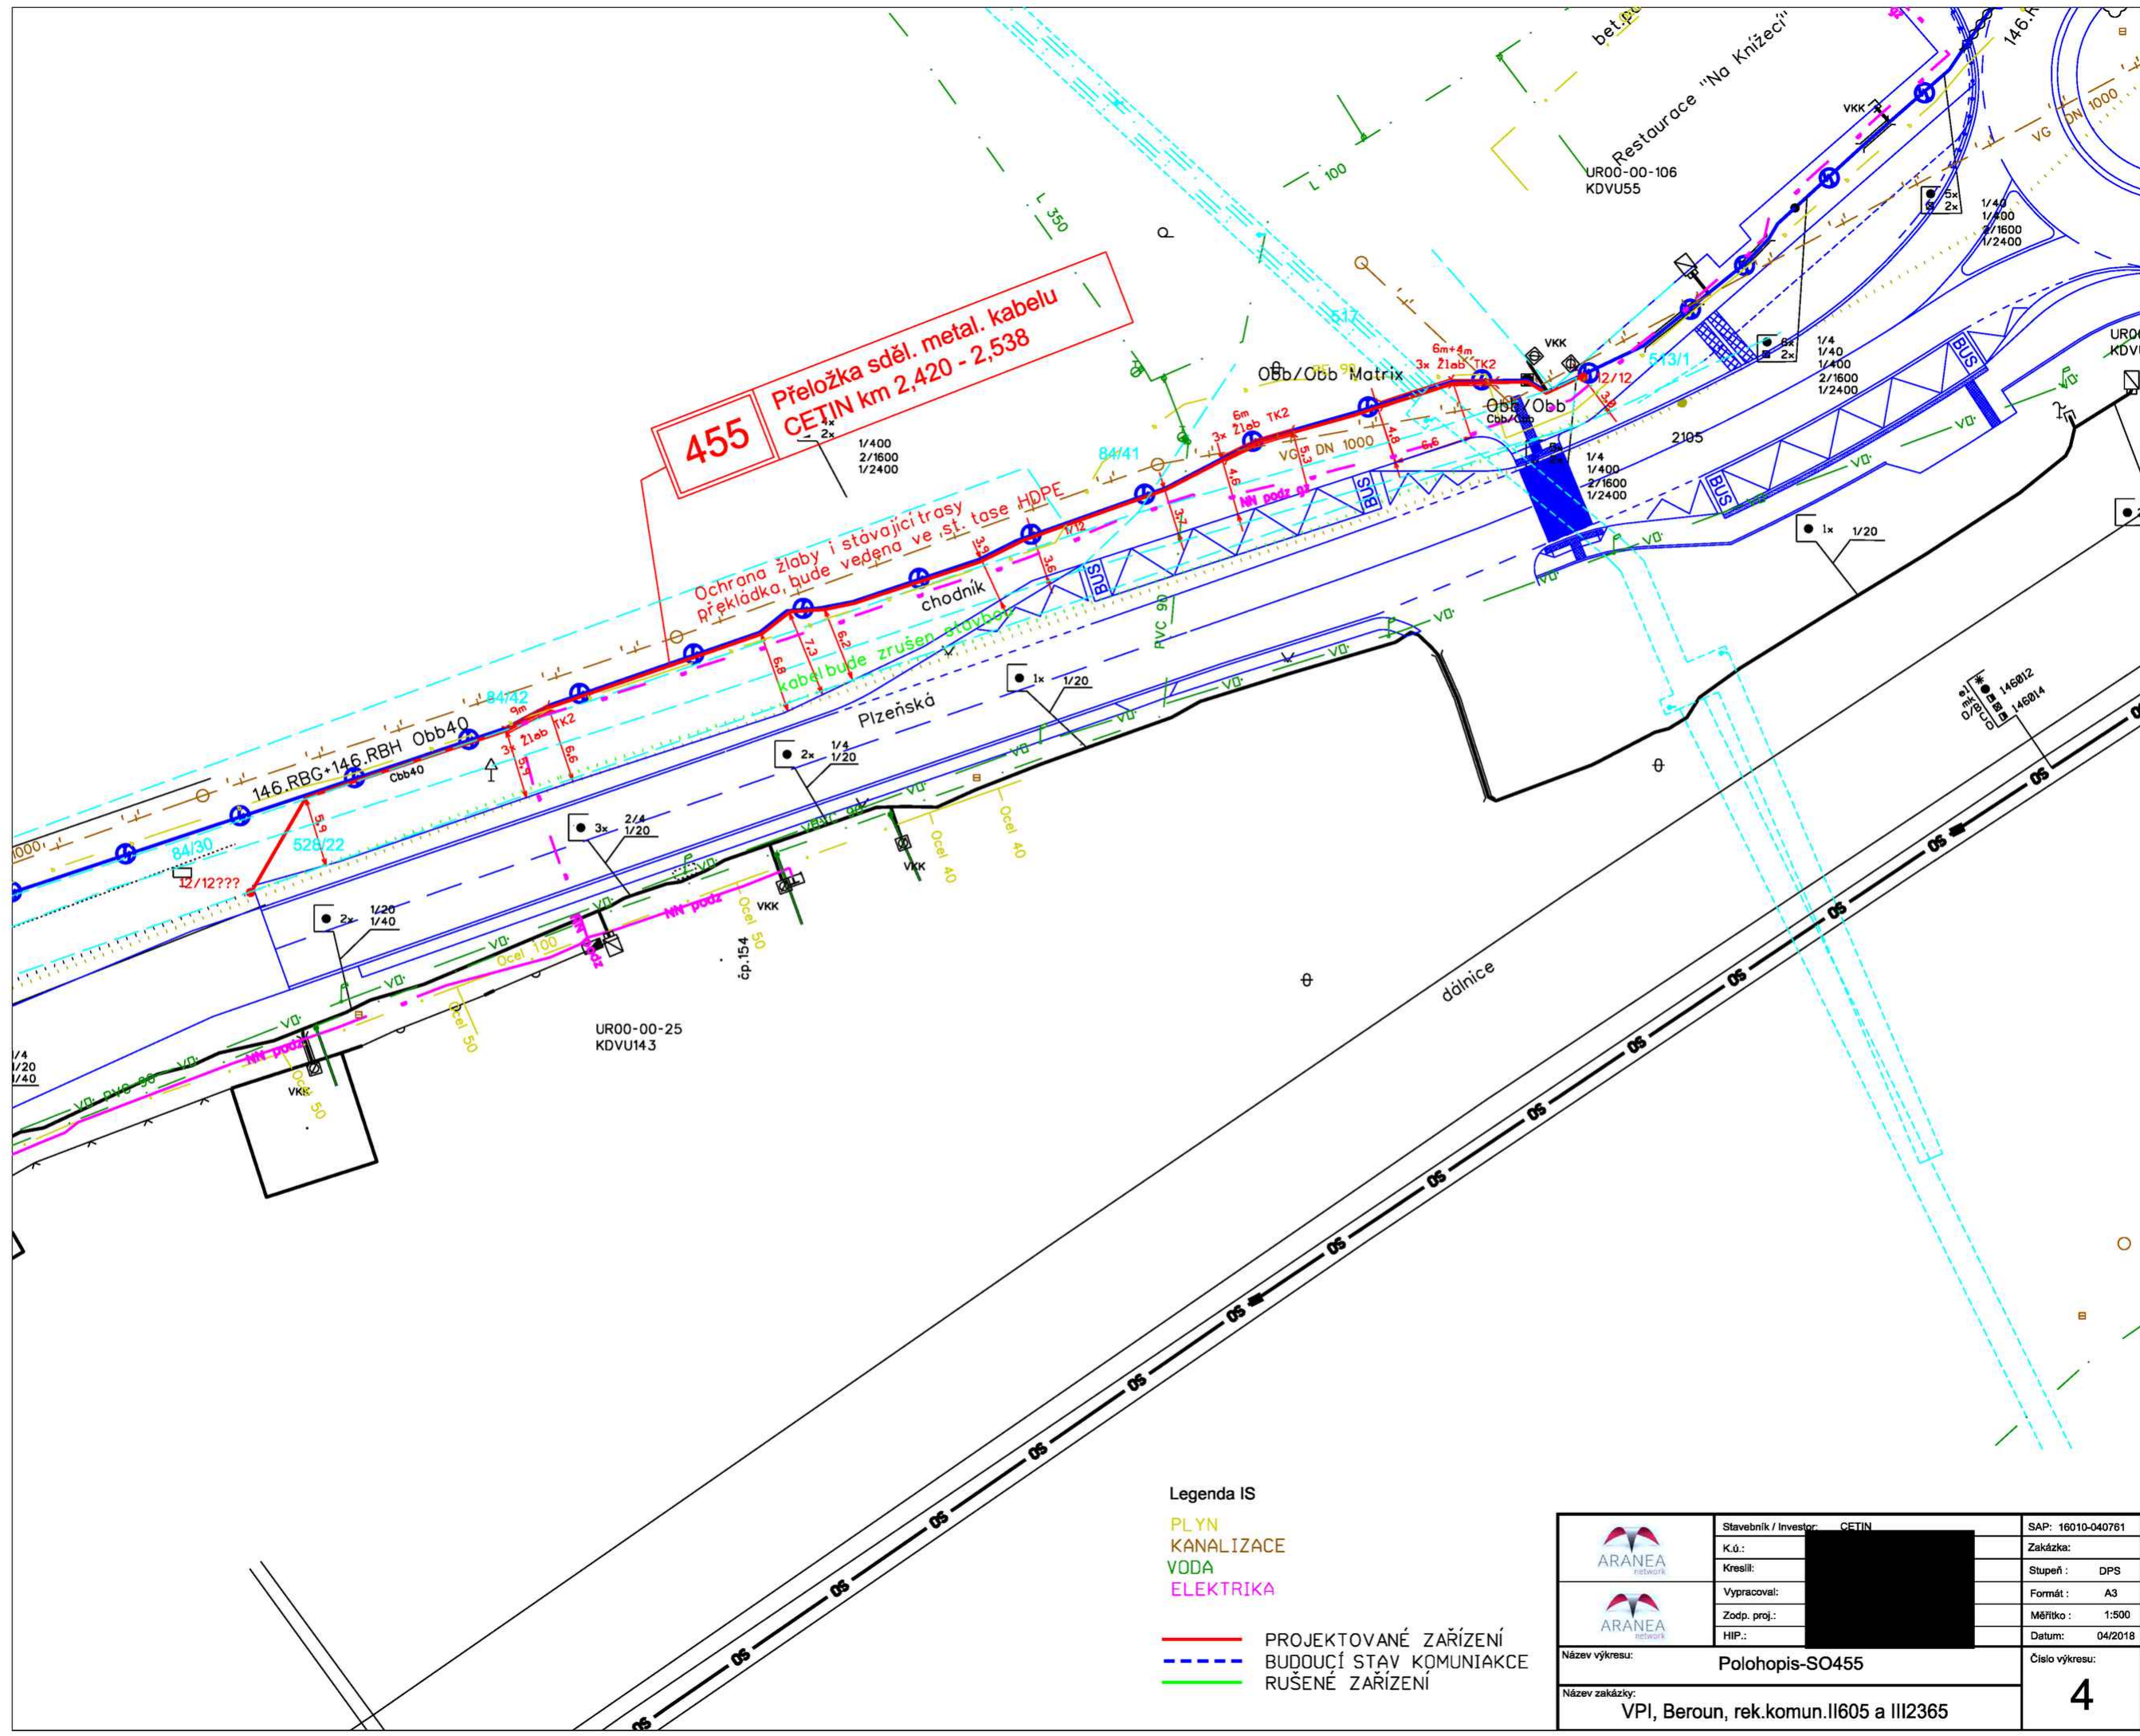

Legenda IS

- PLYN
- KANALIZACE
- VODA
- ELEKTRIKA

- PROJEKTOVANÉ ZAŘÍZENÍ
- BUDOUCÍ STAV KOMUNIKACE
- RUŠENÉ ZAŘÍZENÍ

	Stavebník / Investor:	CETIN	SAP: 16010-040761
	K.ú.:		Zakázka:
	Kreslil:		Stupeň : DPS
	Vypracoval:		Formát : A3
	Zodp. proj.:		Měřítko : 1:500
	HIP.:		Datum: 04/2018
Název výkresu:			Číslo výkresu:
Polohopis-SO455			
Název zakázky:			4
VPI, Beroun, rek.komun.II605 a III2365			

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: x VP SUPTEL 2021 - STAND. - 2021.12
 Položková databáze: 2021.12

Název stavby: VPI, Beroun, rek. kom. II605 a III2365_SO455
 Číslo SPP prvku: 16010-040761
 Zhotovitel PD: CETIN

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	5 677,78 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	97 328,98 Kč
MONTÁŽ	7 553,81 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	5 966,05 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	3 949,76 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	42 044,98 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 162 521,36 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 152 893,82 Kč
 NESTAVEBNÍ ČINNOST 9 627,54 Kč


Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
PŘÍPRAVA			
958210	Návrh cenový a technický bez projednání		1.00 ks
ZEMNÍ PRÁCE			
952368 S	Pokládka žlabů TK2,T2N		75.00 m
954959 S	Rýha v chodn.zám.dlaž.35/50-70rozš.o10cm		18.00 m
954951 S	Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70		3.00 m
952362 S	Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70		6.00 m
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100		114.00 m
954958 S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm		342.00 m
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu		123.00 m
951349 S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky		1.00 ks
MONTÁŽ			
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka		2.00 ks
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka		4.00 ks
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování		6.00 ks
955281 S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek		2.00 ks
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN		132.00 m
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě		1.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)		2.00 ks

956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	23.00 m
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA		
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		193.00 ks
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		243.00 m
303777 S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá		130.00 m
300116 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,6		132.00 m
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball		2.00 ks
312425 S	Modul konektor. 9700-10P		2.00 ks
305356 S	Poklop žlabu beton 50x23x6 cm k TK 2		150.00 ks
407578 S	Souprava čistící 4413L		2.00 ks
312845 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE		2.00 ks
305232 S	Žlab kabelový beton 100x23x19 cm TK 2		75.00 ks
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
304267 S	Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá		2.00 ks
301685 S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda		2.00 ks

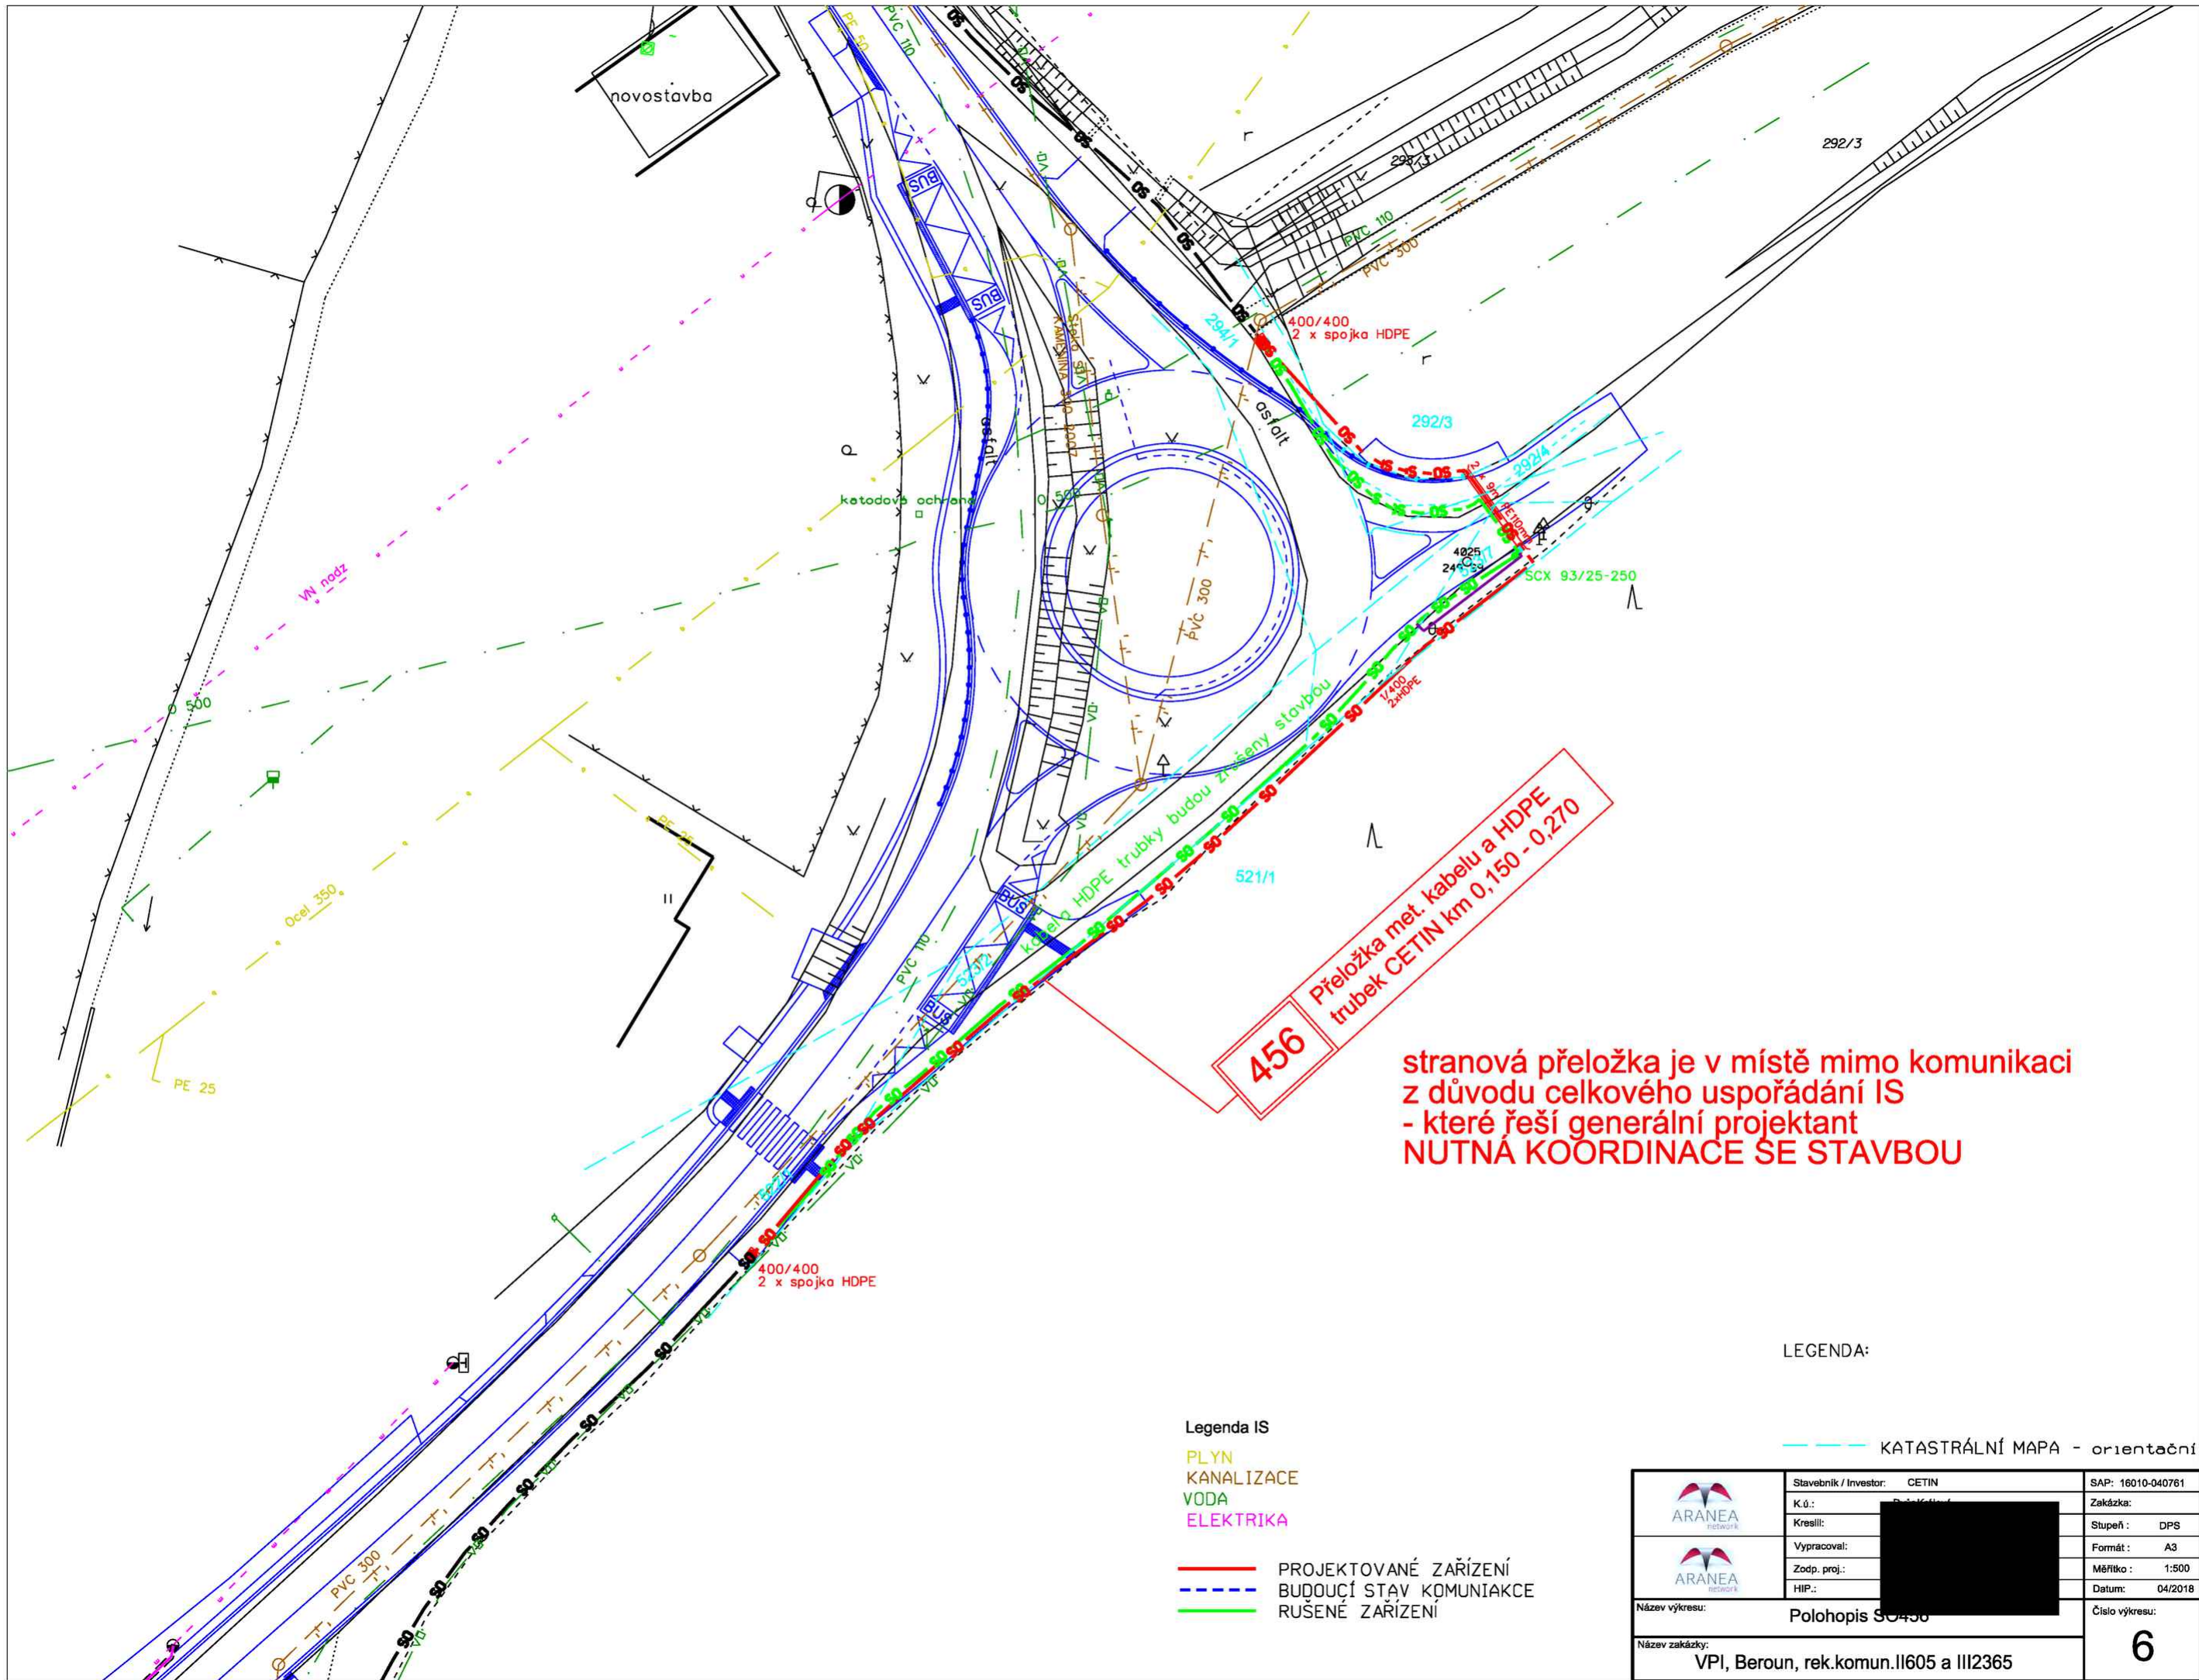

Legenda IS

PLYN
KANALIZACE
VODA
ELEKTRIKA

— PROJEKTOVANÉ ZAŘÍZENÍ
- - - - - BUĐOUČÍ STAV KOMUNIKACE
— RUŠENÉ ZAŘÍZENÍ

LEGENDA:

— KATASTRÁLNÍ MAPA - orientační

	Stavebník / Investor:	CETIN	SAP: 16010-040761
	K.ú.:		Zakázka:
	Kreslil:		Stupeň: DPS
	Vypracoval:		Formát: A3
	Zodp. proj.:		Měřítko: 1:500
	HIP.:		Datum: 04/2018
Název výkresu: Polohopis SO430			Číslo výkresu:
Název zakázky: VPI, Beroun, rek.komun.II605 a III2365			6

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: ⌘ VP SUPTEL 2021 - STAND. - 2021.12
 Položková databáze: 2021.12

Název stavby: VPI, Beroun, rek. kom. II605 a III2365_SO456
 Číslo SPP prvku: 16010-040761
 Zhotovitel PD: CETIN

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	5 677,78 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	63 221,54 Kč
MONTÁŽ	29 023,87 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	5 948,15 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	11 849,28 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	575,88 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	85 479,98 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 201 776,48 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 184 249,42 Kč
 NESTAVEBNÍ ČINNOST 17 527,06 Kč


Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
PŘÍPRAVA			
958210	Návrh cenový a technický bez projednání		1.00 ks
ZEMNÍ PRÁCE			
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		18.00 m
952367 S	Pokládka žlabů TK1		5.00 m
955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě sítové obetonování chr. trubek pod komunikací		3348.00 JV
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100		113.00 m
955570 S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100		9.00 m
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu		122.00 m
951349 S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky		2.00 ks
MONTÁŽ			
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba		270.00 m
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka		4.00 ks
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka		196.00 ks
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka		2.00 ks
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování		200.00 ks
955282 S	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek		2.00 ks
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb		4.00 ks
952602 S	Montáž trubky úložné		270.00 m

954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	135.00 m
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE		
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	22.00 m
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA		
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	3.00 ks

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
MATERIÁL VYŘAZENÝ			
303003 S		Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	4.00 ks
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	113.00 ks
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	18.00 m
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	113.00 m
303777 S		Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	130.00 m
300122 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,6	135.00 m
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	4.00 ks
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	40.00 ks
305338 S		Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1	10.00 ks
407578 S		Souprava čistící 4413L	2.00 ks
320294 S		Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460	2.00 ks
300027 S		Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	135.00 m
300036 S		Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	135.00 m
302655 S		Trubka PE 110/3,5/6000mm	3.00 ks
305195 S		Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1	5.00 ks
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
304267 S		Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	2.00 ks
301685 S		Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	2.00 ks

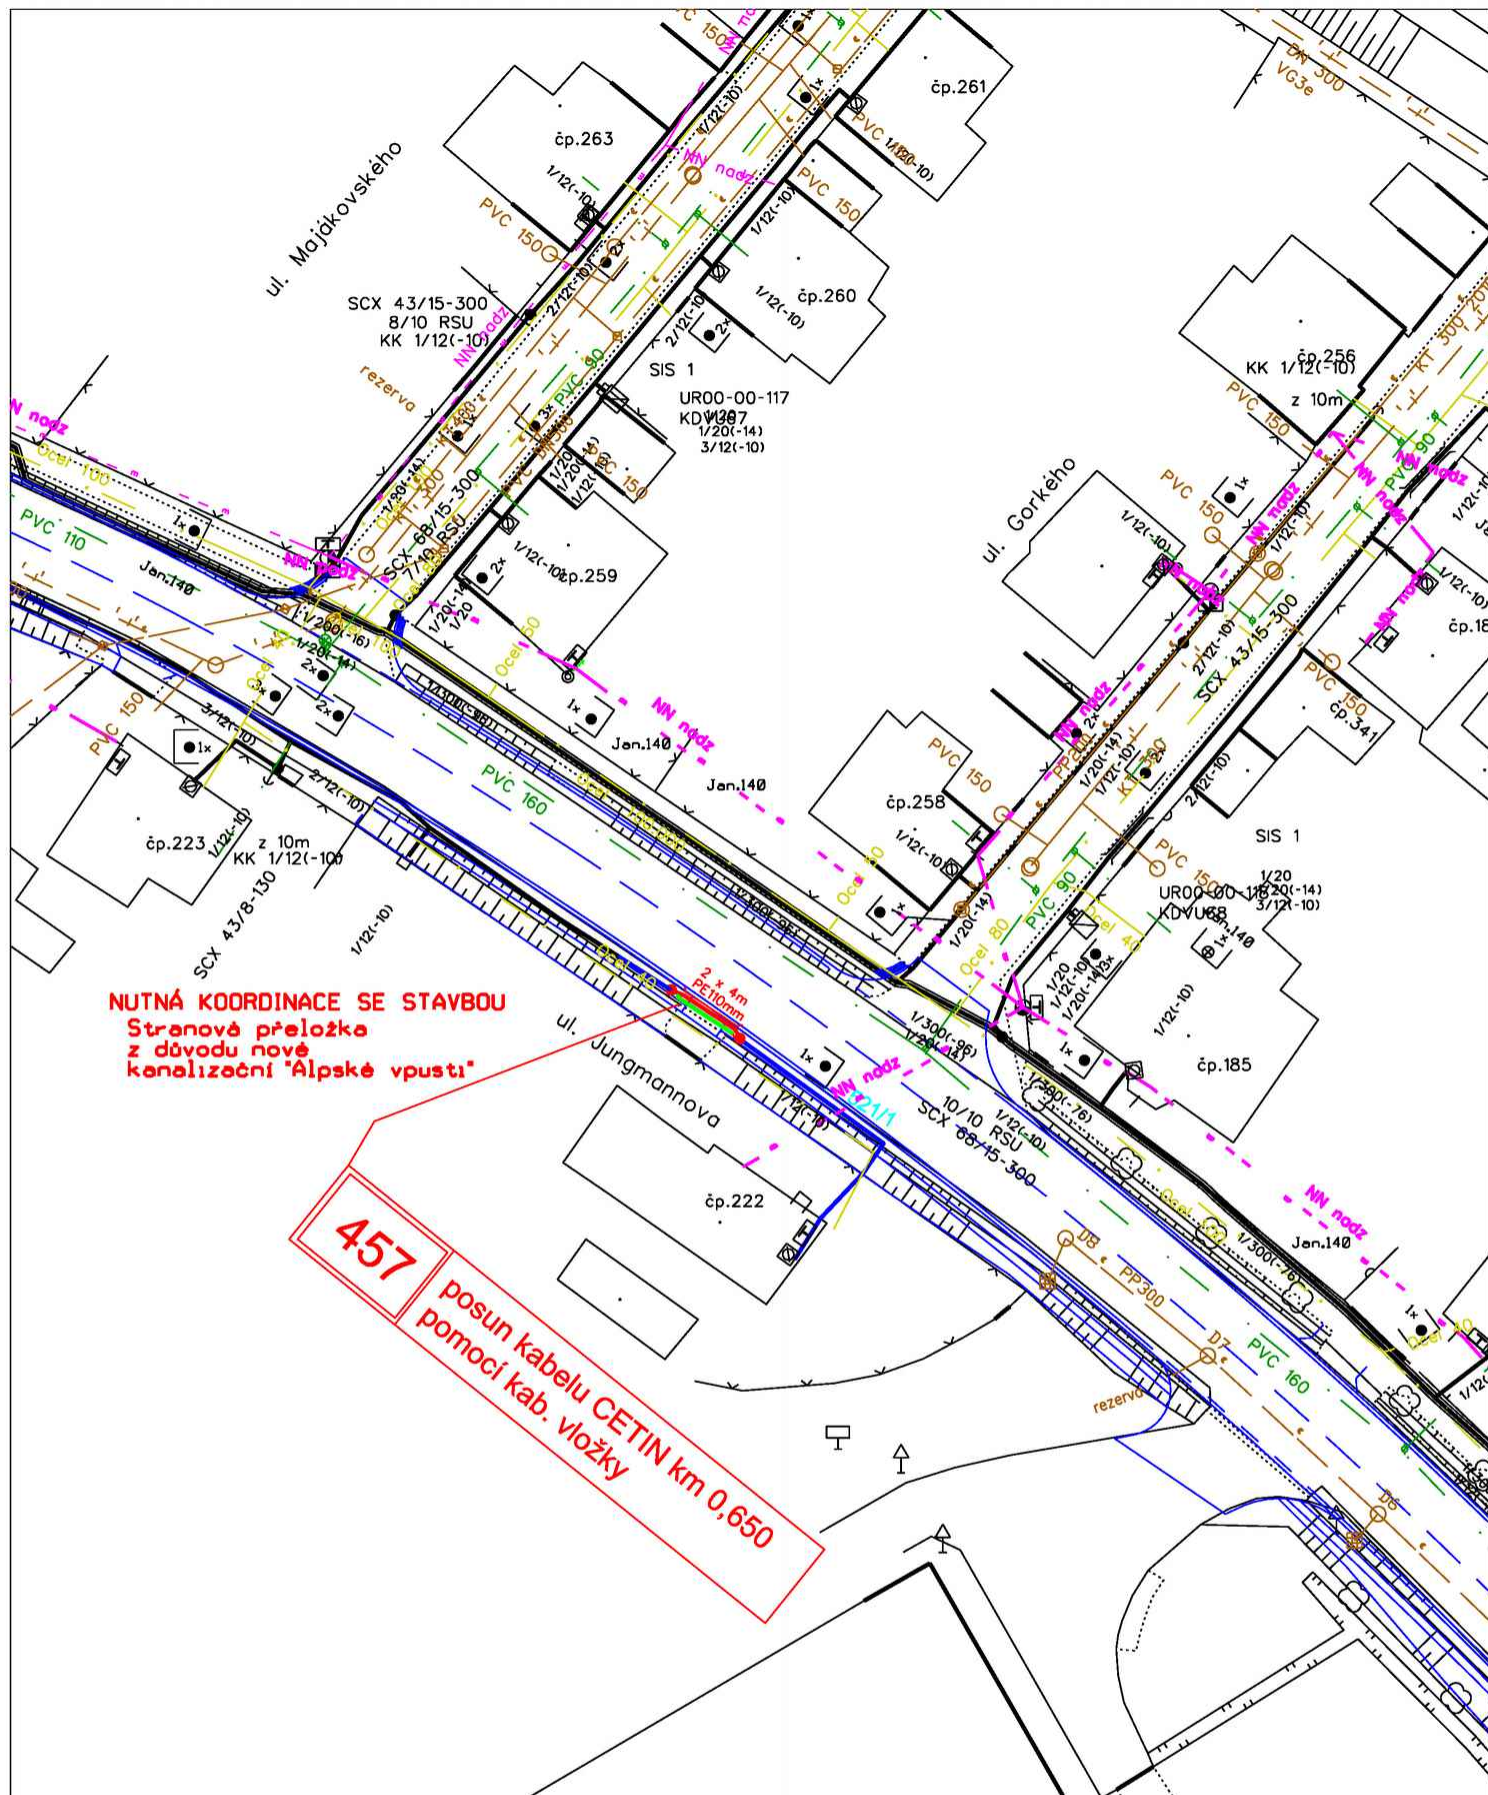

Legenda IS

PLYN
 KANALIZACE
 VODA
 ELEKTRIKA

— PROJEKTOVANÉ ZAŘÍZENÍ
 - - - - - BUDOUCÍ STAV KOMUNIKACE
 — RUŠENÉ ZAŘÍZENÍ

	Stavebník / Investor:	CETIN	SAP: 16010-040761
	K.ú.:	Králov dvůr	Zakázka:
	Kreslil:		Stupeň: DPS
	Vypracoval:		Formát: A4
	Zodp. proj.:		Měřítko: 1:500
	HIP.:		Datum: 04/2018
Název výkresu: Polohopis - S			Číslo výkresu:
Název zakázky: VPI, Beroun, rek.komun.II605 a III2365			5

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: x VP SUPTEL 2021 - STAND. - 2021.12
Položková databáze: 2021.12

Název stavby: VPI, Beroun, rek. II605 a II2365_SO457
Číslo SPP prvku: 16010-040761
Zhotovitel PD: CETIN

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	5 677,78 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	9 341,65 Kč
MONTÁŽ	3 673,82 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	5 554,35 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	3 949,76 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	4 198,18 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 32 395,54 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 22 768,00 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST 9 627,54 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
PŘÍPRAVA			
958210	Návrh cenový a technický bez projednání		1.00 ks
ZEMNÍ PRÁCE			
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		8.00 m
958554 S	Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti		1.00 ks
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100		10.00 m
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu		10.00 m
951349 S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky		1.00 ks
MONTÁŽ			
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka		2.00 ks
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka		4.00 ks
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování		6.00 ks
955281 S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek		2.00 ks
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN		12.00 m
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)		1.00 ks
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m		1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ		1.00 ks

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	6.00 ks
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	10.00 m
303777 S		Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	10.00 m
300000 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	12.00 m
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	3.00 ks
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	2.00 ks
407578 S		Souprava čistící 4413L	2.00 ks
312845 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	2.00 ks
302655 S		Trubka PE 110/3,5/6000mm	2.00 ks
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
304267 S		Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	2.00 ks
301685 S		Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	2.00 ks

Městský úřad Beroun
Odbor výstavby

Č.j.:

Spis. zn.:

Vyřizuje:

dně dne 29.5.2017

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Beroun, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") přezkoumal podle § 94a odst. 4, § 90 a 111 stavebního zákona žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společné rozhodnutí"), kterou dne 13.9.2016 podal

Středočeský kraj, IČO 70891095, Zborovská 81, 150 00 Praha,
kterého zastupuje NOVÁK & PARTNER, s.r.o., IČO 48585955, Perucká 2481, 120 00 Praha,
kterého zastupuje MILOTA Kladno, spol. s r.o., IČO 47550961, Hut'ská 1557, 272 01 Kladno

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 94a odst. 5, § 79 a 92 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

na stavbu:

**II/605 a III/2365 Beroun - rekonstrukce silnic
Beroun, Králův Dvůr, Zahořany**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 902/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 902/8 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 2623 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1181/1 (ostatní plocha), parc. č. 1182/7 (ostatní plocha), parc. č. 1182/18 (ostatní plocha), parc. č. 1182/20 (ostatní plocha), parc. č. 1182/47 (ostatní plocha), parc. č. 1182/49 (ostatní plocha), parc. č. 1182/50 (ostatní plocha), parc. č. 1192/17 (ostatní plocha), parc. č. 1192/45 (ostatní plocha), parc. č. 1192/68 (ostatní plocha), parc. č. 1193/5 (ostatní plocha), parc. č. 1197/34 (ostatní plocha), parc. č. 1197/56 (ostatní plocha), parc. č. 1203/2 (ostatní plocha), parc. č. 1232/6 (ostatní plocha), parc. č. 1235/4 (ostatní plocha), parc. č. 1235/18 (ostatní plocha), parc. č. 1235/19 (ostatní plocha), parc. č. 1260/1 (ostatní plocha), parc. č. 1260/2 (ostatní plocha), parc. č. 1261/6 (ostatní plocha), parc. č. 1261/12 (trvalý travní porost), parc. č. 1261/93 (orná půda), parc. č. 1263/2 (ostatní plocha), parc. č. 1263/5 (ostatní plocha), parc. č. 1263/8 (ostatní plocha), parc. č. 2255/1 (ostatní plocha), parc. č. 2256/1 (ostatní plocha), parc. č. 2258/1 (ostatní plocha), parc. č. 2258/10 (ostatní plocha), parc. č. 2258/28 (ostatní plocha), parc. č. 2436 (ostatní plocha), parc. č. 2437 (ostatní plocha), parc. č. 2441 (ostatní plocha), parc. č. 2442 (ostatní plocha), parc. č. 2445 (ostatní plocha), parc. č. 2454 (ostatní plocha), parc. č. 2584 (ostatní plocha) v katastrálním území Beroun, st. p. 13 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 14 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 17/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 519/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 10/2 (ostatní plocha), parc. č. 11/2 (ostatní plocha), parc. č. 11/3 (ostatní plocha), parc. č. 84/30 (ostatní plocha), parc. č. 84/33 (ostatní plocha), parc. č. 84/35 (trvalý travní porost), parc. č. 84/41 (ostatní plocha), parc. č. 84/42 (orná půda), parc. č. 84/49 (orná půda), parc. č. 84/50 (orná půda), parc. č. 89/4 (ostatní plocha), parc. č. 89/53 (ostatní plocha), parc. č. 89/78 (ostatní plocha), parc. č. 89/79 (ostatní plocha), parc. č. 89/91 (ostatní plocha), parc. č. 91/2 (ostatní plocha), parc. č. 91/56 (ostatní plocha), parc. č. 91/74 (ostatní plocha), parc. č.

91/75 (ostatní plocha), parc. č. 91/76 (ostatní plocha), parc. č. 91/77 (ostatní plocha), parc. č. 96/2 (ostatní plocha), parc. č. 96/7 (ostatní plocha), parc. č. 96/30 (ostatní plocha), parc. č. 106/5 (ostatní plocha), parc. č. 122/1 (ostatní plocha), parc. č. 122/56 (ostatní plocha), parc. č. 122/57 (ostatní plocha), parc. č. 134/1 (lesní pozemek), parc. č. 229/6 (ostatní plocha), parc. č. 229/10 (ostatní plocha), parc. č. 229/16 (ostatní plocha), parc. č. 229/22 (ostatní plocha), parc. č. 229/24 (orná půda), parc. č. 229/25 (orná půda), parc. č. 229/83 (ostatní plocha), parc. č. 229/113 (ostatní plocha), parc. č. 229/137 (orná půda), parc. č. 229/177 (ostatní plocha), parc. č. 229/178 (ostatní plocha), parc. č. 513/1 (ostatní plocha), parc. č. 514/1 (ostatní plocha), parc. č. 516 (ostatní plocha), parc. č. 517 (zahrada), parc. č. 521/5 (ostatní plocha), parc. č. 521/8 (ostatní plocha), parc. č. 521/11 (ostatní plocha), parc. č. 521/13 (ostatní plocha), parc. č. 522/5 (ostatní plocha), parc. č. 523/1 (ostatní plocha), parc. č. 523/4 (ostatní plocha), parc. č. 523/6 (ostatní plocha), parc. č. 523/7 (ostatní plocha), parc. č. 527/1 (ostatní plocha), parc. č. 528/13 (ostatní plocha), parc. č. 528/14 (ostatní plocha), parc. č. 528/17 (ostatní plocha), parc. č. 528/18 (ostatní plocha), parc. č. 528/22 (ostatní plocha), parc. č. 528/26 (ostatní plocha), parc. č. 529/2 (ostatní plocha), parc. č. 532/1 (ostatní plocha), parc. č. 544/2 (vodní plocha), parc. č. 544/4 (vodní plocha), parc. č. 746 (ostatní plocha), parc. č. 748/4 (ostatní plocha), parc. č. 801/1 (ostatní plocha), parc. č. 801/2 (ostatní plocha), parc. č. 806/2 (ostatní plocha), parc. č. 806/3 (ostatní plocha), parc. č. 825 (ostatní plocha), parc. č. 825/2 v katastrálním území Králův Dvůr, parc. č. 292/3 (zahrada), parc. č. 292/4 (zahrada), parc. č. 293/3 (ostatní plocha), parc. č. 294/1 (ostatní plocha), parc. č. 295/1 (ostatní plocha), parc. č. 295/3 (ostatní plocha), parc. č. 295/25 (ostatní plocha), parc. č. 296/1 (ostatní plocha), parc. č. 296/2 (ostatní plocha), parc. č. 304/1 (vodní plocha) v katastrálním území Zahořany u Berouna.

- II. **Vydává** podle § 94a odst. 5 a § 115 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu na pozemku st. p. 902/2, 902/8, 2623, parc. č. 1181/1, 1182/7, 1182/18, 1182/20, 1182/47, 1182/49, 1182/50, 1192/17, 1192/45, 1192/68, 1193/5, 1197/34, 1197/56, 1203/2, 1232/6, 1235/4, 1235/18, 1235/19, 1260/1, 1260/2, 1261/6, 1261/12, 1261/93, 1263/2, 1263/5, 1263/8, 2255/1, 2256/1, 2258/1, 2258/10, 2258/28, 2436, 2437, 2441, 2442, 2445, 2454, 2584 v katastrálním území Beroun, st. p. 13, 14, 17/1, 519/2, parc. č. 10/2, 11/2, 11/3, 84/30, 84/33, 84/35, 84/41, 84/42, 84/49, 84/50, 89/4, 89/53, 89/78, 89/79, 89/91, 91/2, 91/56, 91/74, 91/75, 91/76, 91/77, 96/2, 96/7, 96/30, 106/5, 122/1, 122/56, 122/57, 134/1, 229/6, 229/10, 229/16, 229/22, 229/24, 229/25, 229/83, 229/113, 229/137, 229/177, 229/178, 513/1, 514/1, 516, 517, 521/5, 521/8, 521/11, 521/13, 522/5, 523/1, 523/4, 523/6, 523/7, 527/1, 528/13, 528/14, 528/17, 528/18, 528/22, 528/26, 529/2, 532/1, 544/2, 544/4, 746, 748/4, 801/1, 801/2, 806/2, 806/3, 825, 825/2 v katastrálním území Králův Dvůr, parc. č. 292/3, 292/4, 293/3, 294/1, 295/1, 295/3, 295/25, 296/1, 296/2, 304/1 v katastrálním území Zahořany u Berouna.

Stavba obsahuje:

Stavba řeší rekonstrukci stávajících silnic II/605 (Plzeňská) a III/2365 (Jungmannova) v zastavěném území měst Berouna a Králova Dvora. Potřeba rekonstrukce těchto silnic je dána nutností výrazného zlepšení technických parametrů silnic, které již neodpovídají současným dopravním požadavkům. Jedná se především o dlouhodobě nevyhovující stavební stav vozovek a odvodnění.

Rekonstrukce silnice II/605 je navržena v úseku od ulice Koněpruská v Berouně (silnice III/11533) až 150 m před křižovatkou v Králově Dvoře (silnice III/11524). Silnice je navržena v základní návrhové kategorii MS2 8/50 s jízdními pruhy v šířce 3,25 m + vodící proužek 0,25 m. Minimální šířka mezi obrubami je tedy 7,0 m. Ve většině trasy je šířkové uspořádání doplněno o odstavňové zálivy, pruhy pro odbočení vlevo a vpravo nebo o autobusové zastávky.

Rekonstrukce silnice III/2365 je navržena v úseku městská část Zahořany - Králův Dvůr (II/605). Silnice je navržena v základní návrhové kategorii MO2 8/30 s jízdními pruhy v šířce 3,25 m + vodící proužek 0,25 m. Minimální šířka mezi obrubami je tedy 7,0 m. V začátku úseku (cca po km 0,120) je silnice navržena v kategorii MO2 7/30 s jízdními pruhy v šířce 2,75 m + vodící proužek 0,25 m. V blízkosti nové okružní křižovatky v Zahořanech, školy v Králově Dvoře a v lokalitě Na Knižecí je šířkové uspořádání doplněno o autobusové zastávky.

Celková délka rekonstrukce silnice II/605 je **2,538 km** a III/2365 je **1,092 km**.

Provedením stavby dojde k výraznému zvýšení užité hodnoty silnic. Návrhem 3 nových okružních křižovatek, úpravou povrchů a šířkového uspořádání včetně návrhů bezpečnostních ostrůvků v místech přechodů dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti dopravy (jak vozidel, tak i chodců a cyklistů) po silnicích II/605 a III/2365 a ke snížení nepříznivých účinků dopravy na obyvatele dotčených měst.

Provedením stavby také dojde k umožnění výstavby nové cyklostezky podél silnice II/605 a nových či rekonstrukci stávajících chodníků podél silnic II/605 a III/2365. Stavbu chodníků, cyklostezek a úpravu

veřejného osvětlení připravují města Beroun a Králův Dvůr a stavba by měla probíhat současně s rekonstrukcí silnic.

Stavební úpravy silnic II/605 a III/2365 budou realizovány v následujícím rozsahu:

- v rámci stavby silnice II/605 (SO 101) je provedena kompletní výměna obrusné a podkladní vrstvy od km 0,000 do km 2,538 v celkové délce 2,5 km s tím, že se v místě frézování odstraňuje 120 mm a nově pokládá 130 mm z důvodů zvýšení únosnosti vozovky, na zbylých úsecích dochází ke kompletní výměně konstrukce vozovky
- v souvislosti se zesílením vozovky v objektu SO 101 a díky zvětšení stávajících nenormových příčných sklonů vozovky dochází i k výškové úpravě nivelety v ose vozovky v celé délce 2,5 km
- stávající šířkové uspořádání silnice II/605 (Plzeňská, SO 101) se mění z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců, jsou doplněny přechody pro chodce a zejména ochranné ostrůvky u přechodů, ke změně šířkového uspořádání dochází i v místech nově budovaných okružních křižovatek (SO 111 a 113)
- úpravy šířkového uspořádání III/2365 (Jungmannova, SO 102) odpovídají kategorii MO2 8/30, kompletní výměna konstrukce vozovky v celé tloušťce
- rekonstrukce stávajících vozovek je provedena včetně odstavných zálivů, autobusových zálivů, nově položených silničních obrubníků (zajišťují odvod srážkové vody),
- návrh 3 nových okružních křižovatek a opravu 1 stávající okružní křižovatky,
- úpravu stávajících přechodů pro chodce tak, aby splňovaly ČSN 73 6110 a podmínky pro samostatný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace,
- rekonstrukci kompletního odvodnění komunikace spočívající v doplnění nových dešťových kanalizačních stok a uličních vpustí + oprava stávajících uličních vpustí tak, aby byl zajištěn bezproblémový odtok vody,
- rekonstrukce opěrné zdi podél Dibeřského potoka v městské části Zahořany, rekonstrukci mostu ev.č.2365-2 přes Dibeřský potok (ulice Jungmannova) a úpravu mostu ev.č.605-029 přes Dibeřský potok (ulice Plzeňská)
- doplnění autobusových zastávek (městská část Zahořany) nebo posunutí zastávek do nové polohy dle požadavků dotčených měst a policie ČR DI
- snížení hlukové zátěže návrhem obrusné vrstvy se sníženou hlučností
- úpravu svislého a vodorovného dopravního značení
- technickou rekultivaci (terénní úpravy) v místě stávajících příkopů, které se v rámci rekonstrukce silnic ruší a nezbytné terénní úpravy mimo prostor vozovky
- vegetační úpravy na k.ú. Beroun a tělesa silnic v místech bez chodníků nebo bez obrubníků a dále přeložky stávajících inženýrských sítí vyvolané rekonstrukcí silnic (přeložky inženýrských sítí zajistí správce těchto sítí): nadzemního vedení NN u silnice III/2365¹ sdělovacích kabelů (CETIN, a.s., dříve Telefonica 02)¹ veřejného osvětlení (město Beroun, město Králův Dvůr) STL plynovodu DN 50 PE (RWE a.s.)¹ vodovodů (VAK Beroun)

Králův Dvůr - chodníky a cyklostezky (Králův Dvůr)

Stavba řeší úpravu stávajících chodníků, výstavbu nových chodníků a cyklostezek, úpravu vjezdů na pozemky a úpravu veřejného osvětlení. Chodníky jsou navrženy přibližně ve stávajících trasách, podél komunikace. Nové cyklostezky budou vedeny podél chodníků, oddělené pouze hmatným vodícím pásem pro nevidomé a to na severní straně (vpravo ve směru staničení). V místech, kde jsou nedostatečné šířkové poměry pro samostatné vedení chodníku a cyklostezky, jsou navrženy smíšené stezky pro chodce a cyklisty.

V rámci stavby bude kromě stavební úpravy chodníků a vybudování cyklostezky dále provedeno:

- úprava veřejného osvětlení města Králův Dvůr
- doplnění intenzivního osvětlení v místě přechodu pro chodce
- vegetační úpravy v místech mezi obrubníkem silnice ve správě Středočeského kraje a chodníky středové ostrůvky uvnitř okružních křižovatek

Objekty řady 100 - Objekty pozemních komunikací

- SO 101 Rekonstrukce silnice II/605

- SO 102 Rekonstrukce silnice III/2365
- SO 111 Okružní křižovatka silnic II/605 a III/2365
- SO 112 Okružní křižovatka Zahořany
- SO 113 Okružní křižovatka s ul. Košťálkovou
- SO 156 Chodníky a cyklostezky na sil. II/605 - k. ú. Králův Dvůr
- SO 157 Chodníky na sil. III/2365
- SO 158.1 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k. ú. Beroun
- SO 158.2 Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k. ú. Králův Dvůr
- SO 159.1 Autobusové a odstavné zálivy - k. ú. Beroun
- SO 159.2 Autobusové a odstavné zálivy - k. ú. Králův Dvůr
- SO 160.1 Vjezdy na pozemky k. ú. Beroun
- SO 160.2 Vjezdy na pozemky k. ú. Králův Dvůr
- SO 161 Dopravní značení
- SO 162 Dopravně inženýrské opatření
- SO 181 Opravy stávajících komunikací

Objekty řady 200 - Mostní objekty a zdi

- SO 201 Rekonstrukce opěrné zdi, silnice III/2365 - Zahořany
- SO 202 Rekonstrukce mostu ev.č. 2365-2 přes Dibeřský potok (ul. Jungmannova)
- SO 203 Úprava mostu ev.č. 605-029 přes Dibeřský potok (ul. Plzeňská).

Objekty 300 - Vodohospodářské objekty

- SO 301 Kanalizace dešťová - II/605 km 0,000-1,440
- SO 302 Kanalizace dešťová - II/605 km 1,440-2,538
- SO 303 Kanalizace dešťová - III/2365
- SO 311 Úpravy vodovodů - II/605
- SO 312 Přeložky a úpravy vodovodů - III/2365

Objekt řad 400 - Elektro a sdělovací objekty

- SO 411 1) Stranový posun sloupů nadzemního vedení NN ČEZ u silnice III/2365
- SO 421 Veřejné osvětlení k. ú. Králův Dvůr
- SO 422 2) Veřejné osvětlení k. ú. Beroun
- SO 423 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k. ú. Králův Dvůr (Středočeský kraj)
- SO 424 Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k. ú. Beroun (Středočeský kraj)
- SO 451 3) Stranový posun sdělovacích kabelů CETIN, km 0,165-0,235 silnice II/605
- SO 452 3) Přeložka vrchního sdělovacího vedení CETIN, km 1,010-1,165 silnice II/605
- SO 453 3) Přeložka sdělovacího metalického kabelu CETIN, km 1,780-2,050 silnice II/605
- SO 454 3) Přeložka sdělovacího optického kabelu CETIN, km 2,230-2,325 silnice II/605
- SO 455 3) Přeložka sdělovacího metalického kabelu CETIN, km 2,420-2,538 silnice II/605
- SO 456 3) Přeložka sdělovacího optického kabelu CETIN, km 0,150-0,270 silnice III/2365
- SO 457 3) Stranový posun sdělovacího kabelu CETIN, km 0,650 silnice III/2365

Objekty řady 500 - Objekty trubních vedení

- SO 511 Přeložka STL plynovodu dn 50 PE v Zahořanech

Objekty řady 800 - Vegetační úpravy

- SO 801 Vegetační úpravy - Středočeský kraj
- SO 811 Vegetační úpravy - město Králův Dvůr

III. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemku st. p. 902/2, 902/8, 2623, parc. č. 1181/1, 1182/7, 1182/18, 1182/20, 1182/47, 1182/49, 1182/50, 1192/17, 1192/45, 1192/68, 1193/5, 1197/34, 1197/56, 1203/2, 1232/6, 1235/4, 1235/18, 1235/19, 1260/1, 1260/2, 1261/6, 1261/12, 1261/93, 1263/2, 1263/5, 1263/8, 2255/1, 2256/1, 2258/1, 2258/10, 2258/28, 2436, 2437, 2441, 2442, 2445, 2454, 2584 v katastrálním území Beroun, st. p. 13, 14, 17/1, 519/2, parc. č. 10/2, 11/2, 11/3, 84/30, 84/33, 84/35, 84/41, 84/42, 84/49, 84/50, 89/4, 89/53, 89/78, 89/79, 89/91, 91/2, 91/56, 91/74, 91/75, 91/76, 91/77, 96/2, 96/7, 96/30, 106/5, 122/1, 122/56, 122/57, 134/1, 229/6, 229/10, 229/16, 229/22, 229/24, 229/25, 229/83, 229/113, 229/137, 229/177, 229/178, 513/1, 514/1, 516, 517, 521/5, 521/8, 521/11, 521/13, 522/5, 523/1, 523/4, 523/6, 523/7, 527/1, 528/13, 528/14, 528/17, 528/18, 528/22, 528/26, 529/2, 532/1, 544/2, 544/4, 746, 748/4, 801/1, 801/2, 806/2, 806/3, 825, 825/2 v katastrálním území Králův Dvůr, parc. č. 292/3, 292/4, 293/3, 294/1, 295/1, 295/3, 295/25, 296/1, 296/2, 304/1 v katastrálním území Zahofany u Berouna, jak je zakresleno v koordinační situaci v měřítku 1:500, která je přílohou po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí pro stavebníka, obecní úřad a stavební úřad. a) Situaci vypracoval autorizovaný inženýr Ing. Martin Máša, ČKAIT 0009514, datum 05/2016.
2. Stavba řeší rekonstrukci stávajících silnic II/605 (Plzeňská) a III/2365 (Jungmannova) v zastavěném území měst Berouna a Králova Dvora.
3. Rekonstrukce silnice II/605 je navržena v úseku od ulice Koněpruská v Berouně (silnice III/11533) až 150 m před křižovatkou v Králově Dvoře (silnice III/11524). Silnice je navržena v základní návrhové kategorii MS2 8/50 s jízdními pruhy v šířce 3,25 m + vodící proužek 0,25 m. Minimální šířka mezi obrubami je tedy 7,0 m. Ve většině trasy je šířkové uspořádání doplněno o odstavňové zálivy, pruhy pro odbočení vlevo a vpravo nebo o autobusové zastávky.
4. Rekonstrukce silnice III/2365 je navržena v úseku městská část Zahofany - Králův Dvůr (II/605). Silnice je navržena v základní návrhové kategorii MO2 8/30 s jízdními pruhy v šířce 3,25 m + vodící proužek 0,25 m. Minimální šířka mezi obrubami je tedy 7,0 m. V začátku úseku (cca po km 0,120) je silnice navržena v kategorii MO2 7/30 s jízdními pruhy v šířce 2,75 m + vodící proužek 0,25 m. V blízkosti nové okružní křižovatky v Zahofanech, školy v Králově Dvoře a v lokalitě Na Knížecí je šířkové uspořádání doplněno o autobusové zastávky.
5. Celková délka rekonstrukce silnice II/605 je **2,538 km** a III/2365 je **1,092 km**.
6. Navrženy 3 nové okružní křižovatky, úprava povrchů a šířkové uspořádání včetně návrhů bezpečnostních ostrůvků.
7. Nové cyklostezky podél silnice II/605 a nových či rekonstrukci stávajících chodníků podél silnic II/605 a III/2365. Stavbu chodníků, cyklostezek a úpravu veřejného osvětlení.
8. Králův Dvůr - chodníky a cyklostezky (Králov Dvůr). Stavba řeší úpravu stávajících chodníků, výstavbu nových chodníků a cyklostezek, úpravu vjezdů na pozemky a úpravu veřejného osvětlení. Chodníky jsou navrženy přibližně ve stávajících trasách, podél komunikace. Nové cyklostezky budou vedeny podél chodníků, oddělené pouze hmatným vodícím pásem pro nevidomé a to na severní straně (vpravo ve směru staničení). V místech, kde jsou nedostatečné šířkové poměry pro samostatné vedení chodníku a cyklostezky, jsou navrženy smíšené stezky pro chodce a cyklisty.
9. Objekty řady 100 - Objekty pozemních komunikací: Rekonstrukce silnice II/605, Rekonstrukce silnice III/2365, Okružní křižovatka silnic II/605 a III/2365, Okružní křižovatka Zahofany, Okružní křižovatka s ul. Košťálkovou, Chodníky a cyklostezky na sil. II/605 - k. ú. Králův Dvůr, Chodníky na sil. III/2365, Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k. ú. Beroun, Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k. ú. Králův Dvůr, Autobusové a odstavňové zálivy - k. ú. Beroun, Autobusové a odstavňové zálivy - k. ú. Králův Dvůr, Vjezdy na pozemky k. ú. Beroun, Vjezdy na pozemky k. ú. Králův Dvůr, Dopravní značení, Dopravně inženýrské opatření, Opravy stávajících komunikací.
10. Objekty řady 200 - Mostní objekty a zdi:
SO 201 Rekonstrukce opěrné zdi, silnice III/2365 - Zahofany
SO 202 Rekonstrukce mostu ev.č. 2365-2 přes Dibeřský potok (ul. Jungmannova)
SO 203 Úprava mostu ev.č. 605-029 přes Dibeřský potok (ul. Plzeňská).
Úprava spočívá v posunutí komunikace jižním směrem cca o 0,75 m a změny šířek původně revizních chodníků širokých 1,25 m. Nyní je na severní straně veřejný chodník šířky 2,25 m, jižní revizní šířky 0,65 m.
11. Objekty 300 - Vodohospodářské objekty.
12. Objekt řad 400 - Elektro a sdělovací objekty.
13. Objekty řady 500 - Objekty trubních vedení.
14. Budou dodrženy ochranná pásma stávající technické infrastruktury.
15. Budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území ve znění pozdějších předpisů.

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval autorizovaný inženýr Ing. Martin Máša, ČKAIT 0009514, datum 05/2016. Projektová dokumentace je přílohou po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí pro stavebníka, obecní úřad a stavební úřad. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu, vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu s dostatečným předstihem fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby.
4. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
6. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
7. Veškeré práce na stavbě budou prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení práv a oprávněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí.
8. Stavebníkem je Středočeský kraj, Zborovská 81, 150 00 Praha.
9. Při provádění stavby je stavebník podle § 152 odst. 3 stavebního zákona povinen zejména oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště „štítek o povolení stavby“ a ponechat jej tam až do doby dokončení stavby. Dále je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie. Stavebník je dále povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby.
10. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Vybraného zhotovitele stavby stavebník písemně oznámí stavebnímu úřadu nejpozději 10 dnů před zahájením prací na stavbě.
11. Práce na staveništích, při kterých by hluk překračoval hranici 50 dB (max. 60 dB), nesmí být prováděny v době od 22:00 do 06:00 hodin. Stavba bude prováděna tak, aby bylo zabráněno v max. míře prašnosti a hlučnosti.
12. Stavebník je povinen nakládat s odpady vzniklými při realizaci stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
13. V průběhu stavby musí zhotovitel zajistit udržování navazujících komunikací v čistotě, zejména v době zhoršených povětrnostních podmínek.
14. Stavebník a organizace provádějící stavbu nebo zabezpečující její přípravu či provádějící jiné práce ohlásí orgánu státní památkové péče nebo orgánu státní ochrany přírody nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, jakož i archeologické nálezy a učiní nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
15. Materiály a všechny součásti použité na stavbě musí odpovídat dovozeným namáháním. Všichni zaměstnanci určení k práci na stavbě musí být prokazatelně obeznámeni a poučeni o bezpečnosti práci.
16. Zařízení na staveništi, pomocné konstrukce a jiná technická zařízení musí být bezpečná.
17. Při styku s podzemním vedením je nutné respektovat ČSN 73 60 05, včetně dodržení jejich ochranných pásem. Před zahájením stavby vyvolá investor (stavebník) jednání se správcem všech podzemních a nadzemních sítí, které mohou být stavbou dotčeny, za účelem vytyčení jejich trasy a ochranného pásma.
18. V případě, že stavba bude zasahovat do ochranného pásma podzemního nebo nadzemního vedení je povinen mít stavebník od příslušného provozovatele distribuční soustavy písemný souhlas s činností v jeho ochranném pásmu.
19. Při nedodržení projektového řešení se stavebník - investor vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle § 178 až 183 SZ.

20. Před zahájením prací budou vytyčeny všechny inženýrské sítě a dodržet prostorové uspořádání sítí. Při stavbě budou dodrženy podmínky vlastníků/správců sítí.
21. Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Vltavy, s.p., ze dne 4.8.2016 zn. 41336/2016/342/Ron: Dle ustanovení § 39 odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů bude zpracován havarijní plán platný po dobu stavby. Bude vypracován povodňový plán platný po dobu provádění stavby.
22. Budou dodrženy podmínky vyjádření KSÚS Středočeského kraje, p.o. ze dne 7.9.2016 zn. 5274/16/KSKU/KLT/KYS:
- 1/ v případě úpravy stávajících připojení na výše uvedené silnice budou provedena taková opatření, aby nedocházelo k vytékání dešťových vod ze soukromých pozemků na výše uvedenou komunikaci
- 2/ následná péče o novou vegetaci v rozsahu stavby bude ve správě měst Beroun a Králův Dvůr po kompletní rekonstrukci odvodnění převezme KSÚS do vlastnictví Stř. kraje pouze uliční vpustí a přípojky dešťové kanalizace
- 3/ doporučujeme realizovat středové ostrůvky z hlediska údržby jako pojižděné
- 4/ po dokončení stavby (kolaudaci) bude provedeno kompletní majetkové narovnání, tj. převod částí pozemků zastavěných stavbami silnic II. a III. tříd, chodníků, parkovacích ploch a zelených ploch mezi jednotlivými správci (viz. zák. č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších novel), kterými jsou Středočeský kraj a města Beroun a Králův Dvůr
- 5/ souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí na objekt SO511 „Přeložka STL plynovodu DN 50 PE“ v Zahofanech
23. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, dne 7.11.2016 č.j.: KHSSC 35950/2016:
1. 1/ Hlučné stavební práce používání těžké stavební techniky a vibračních strojů) nebudou prováděny v noční době a před 7:00 ranní.
2. 2/ Před užíváním stavby bude doloženo, že kvalita vody v nově provedených vodovodních rozvodech splňuje v souladu s § 3 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., v platném znění hygienické požadavky na zdravotní nezávadnost a čistotu pitné vody, které jsou upraveny vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. V souladu s § 4, odst. 2, písm. a) cit. vyhl. bude provedeno stanovení v rozsahu „kráceném“ dle přílohy č. 5
3. 3/ Před užíváním stavby bude doloženo, že užití výrobků, které přicházejí do přímého styku s pitnou vodou, neovlivní nežádoucím způsobem pitnou vodu - bude předložen doklad o dodržení ustanovení § 5 zákona Č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, hodnocení a rozsah záznamu o ověření bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.
24. Budou dodrženy podmínky vyjádření LESY ČR, s.p. ze dne 19.9.2016 č.j. LCR955/008951/2016:
- 1/ stavebními úpravami nedojde ke změnám v odtokových poměrech koryta vodního toku Dibří potok (IDVT 10101026)
- 2/ stavba bude provedena dle projektové dokumentace, vypracované Ing Lenkou Horálkovou, NOVÁK a PARTNER, inženýrská projekční kancelář, Perunská 5, 120 00 Praha 2, která byla zaslána jako příloha žádosti,
- 3/ v případě nutnosti zásahu do břehového porostu bude toto projednáno s orgánem ochrany přírody příslušného obecního úřadu a s vlastníkem pozemku bude projednán odkup dřevní hmoty.
- 4/ stavbou - rekonstrukce mostu ev.č. 2365-2 přes Dibeřský potok (ulice Jungmannova) včetně revizního schodiště, dále Nyústěň 1111 stoky „B5“, „B“ bude dotčen pozemek p.č. 544/2, stavbou vyústění stoky „A6“ pozemek 544/4 v k.ú. Králův Dvůr, který je ve správě a vlastnictví LČR s.p
- 5/ veškeré nově budované odvodnění dešťové kanalizace, tj. uliční vpustí a stoky vyvedené do koryta Dibeřského potoka, budou upraveny tak, aby netvořily překážku v průtočném profilu koryta, a budou opevněny dlažbou z lomového na MC, která bude přesahovat ve všech směrech vnější líc potrubí o 0,75m u profilu „D“ do 300mm, o 1,00m u profilu „D“ 300 - 600 mm a 1,5m u profilu „D“ větší 600mm. Od profilu větším 300 mm bude navíc vhodným způsobem zajištěna pata svahu.
- 6/ napojení nově budovaných stok do stávající kanalizační sítě musí být v souladu s manipulačním a provozním řádem stávající kanalizační sítě;
- 7/ při manipulaci s technikou a případných přejezdech mechanizace bude zhotovitel dbát na to, aby nebylo nijak poškozeno koryto toku ve správě Správy toků - oblast povodí Berounky (1.ČR ST-OP Berounky), stejně tak břehové porosty;
- 8/ bude zamezeno transportu sedimentu do vodního toku;

- 9/ uskladňování PHM, olejů a ostatních závadných látek včetně doplňování do strojů bude prováděno výhradně mimo území, kde by mohlo dojít ke splavení látek do toku;
- 10/ veškeré stavební materiály budou ukládány mimo záplavové území;
- 11/ v případě jakéhokoliv poškození koryta toku, bude provedeno jeho uvedení do původního stavu
- 12/ správa toků nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené vodním tokem na majetku na výše uvedené akci;
- 13/ zhotovitel provede fotodokumentaci místa stavby přeci zahájením prací, a dále bude tuto provádět i v průběhu provádění prací. Fotodokumentaci následně poskytne správci toku k nahlédnutí.
- 14/ po dokončení prací, které se dotýkají koryta Dibřického potoka, budou LČR ST-OP Berounky vyzvány k provedení kontroly provedených prací;
25. Budou dodrženy podmínky vyjádření LESY ČR, s.p. ze dne 17.8.2016 č.j. 1332/2016:
- 1/ Podkladem pro vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení bude souhlas orgánu státní správy s umístěním a realizací stavby (přímé dotčení lesního pozemku a ochranného pásma lesa) dle § 14 odst. 2 zákona Č. 289/1995 Sb., lesního zákona v platném znění.
- 2/ Před vydáním stavebního povolení bude daná část lesního pozemku, která bude dle předložené dokumentace stavbou dotčena, trvale odňata z pozemků určených k plnění funkcí lesa. Před nabytím právní moci stavebního povolení nebude s částí tohoto lesního pozemku nakládáno jiným způsobem, než jak je určeno lesním zákonem.
- 3/ Lesní správě Nižbor bude předložen výpočet náhrady škody na daném lesním pozemku a porostu - dle § 1 odst. f) vyhl. č. 77/1996 Sb., formou znaleckého posudku a její výše bude předepsána k úhradě investorovi stavby.
- 4/ Lesní pozemek bude dotčen pouze v rozsahu rozhodnutí o odnětí, na lesní pozemek nebude ukládán žádný výkopový či stavební materiál, realizací stavby nedojde k omezení přístupových cest na tento lesní pozemek, nedojde ke kácení dřevin či poškození jejich kořenového systému.
- 5/ Před zahájením stavby bude vyřešena a uzavřena smlouva budoucí o smlouvě na zřízení práva věcného břemene (trvalý zábor), která bude zároveň řešit pronájem části těchto pozemků po dobu výstavby, do doby zápisu práva věcného břemene v KN.
26. Bude dodržena podmínka závazného stanoviska MěÚ Beroun, odboru dopravy a správních agend ze dne 18.7.2016 č.j. MBE/47529/2016/DOPR-DrP.
- Projektová dokumentace pro stavební povolení musí být zpracována projektantem s autorizací v daném oboru.
4. Všeobecné podmínky:
5. 1/ Projektová dokumentace pro stavební povolení bude vyhovovat podmínkám uvedených ve vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
6. 2/ Projektová dokumentace pro stavební povolení bude celkově splňovat podmínky dle vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.
7. 3/ Pokud bude při realizaci stavby ovlivněna bezpečnost a plynulost silničního provozu, je třeba požádat odbor dopravy a správních agend Městského úřadu Beroun o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
8. 4/ V případě, že bude třeba částečně nebo úplně uzavřít provoz na pozemní komunikaci, je třeba v dostatečném předstihu požádat příslušný silniční správní úřad o povolení uzavírky a nařízení objížďky podle § 24 zákona o pozemních komunikacích.
9. 5/ Při provádění stavby musí být zajištěna očista vozidel vyjíždějících ze stavby, aby nedocházelo ke znečištění silnic a místních komunikací. V případě, že k poškození nebo ke znečištění dojde, je povinen ten, kdo poškození nebo znečištění způsobil, bezodkladně toto odstranit. Při provádění stavby musí být k nemovitostem zabezpečen přístup a příjezd včetně vozidel zdravotnické služby a požární techniky.
10. 6/ O stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, je třeba požádat odbor dopravy a správních agend Městského úřadu Beroun.
27. Bude dodržena podmínka závazného stanoviska MěÚ Beroun, odboru ŽP, dne 29.11.2016 č.j. MBE/74190/2016/ŽP-BrE:
- 1/ v souvislosti s realizací výše popsaného stavebního záměru nedojde k žádnému dotčení PUPFL, mimo části pozemku parc. číslo 134/1 k.ú. Králův Dvůr, který bude před zahájením stavby odňata plnění funkcí lesa;
- 2/ veškeré stavební práce budou prováděny s maximální šetrností tak, aby nedošlo k poškození lesních porostů včetně kořenového systému dřevin;

stavební a výkopový materiál nebude ukládán na lesním pozemku.

28. Bude dodržena podmínka závazného stanoviska závazné stanovisko MěÚ Beroun, odboru ŽP, dne 19.10.2016 č.j. MBE/61902/2016/ŽP-BrE:
- 1/ PUPFL, parc. číslo 134/1 k.ú. Králův Dvůr bude stavbou přímo dotčen, před zahájením stavby je nutné požádat o dotčení předmětné části tohoto pozemku a její odnětí plnění funkcí lesa, podle § 13 odst. 1 lesního zákona a žádost doložit doklady uvedenými v § 1 vyhlášky MZe č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa
 - 2/ v souvislosti s realizací předmětného stavebního záměru nedojde k žádnému dotčení PUPFL mimo jeho části, která bude odňata plnění funkcí lesa, ani k poškození lesních porostů na něm rostoucích včetně kořenového systému dřevin, a to ani ukládáním stavebního či výkopového materiálu
29. Bude dodržena podmínka závazného stanoviska MěÚ Beroun, odboru ŽP, dne 23.11.2016 č.j. MBE/61625/2016/ŽP-BIc:
- 1) v průběhu stavby nedojde ke znečištění příp. zmenšení průtočného profilu vodního toku
 - 2) v průběhu stavby bude ve vodním toku zajištěn minimální zůstatkový průtok umožňující normální režim ve vodním toku
 - 3) práce ve vodním toku budou probíhat při nízkém vodním stavu
 - 4) v rámci objektu SO 202 - rekonstrukce mostu ev.č. 2365-2 přes Dibeřský potok (ul. Jungmannova) bude provedena úprava podmostí s ohledem na migraci drobných živočichů - „zapuštění“ spárování
 - 5) přechod přes vodní tok Dibeřský potok řízeným podvrtem v rámci přeložky STL plynovodu (SO 511) proběhne s min. krytím chráničky 1,0 m pode dnem vodního toku, bez poškození břehů koryta vodního toku
 - 6) opevnění výustních objektů kanalizačních stok ve svahu koryta toku kamennou dlažbou (v rozsahu dle požadavku správce vodního toku) bude provedeno s přirozenou návazností na stávající sklon svahů a jeho opevnění
 - 7) výustní objekty nebudou zasahovat do průtočného profilu vodního toku
 - 8) v zájmu ochrany dřevin při stavební činnosti, vyjma dřevin dotčených stavbou (určených k pokácení) podle doloženého dendrologického posudku, bude dodržena norma ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
 - 9) kácení dřevin proběhne v době vegetačního klidu, mimo období hnízdění ptactva, tj. přibližně v období od 1.11. do 31.3.
 - 10) před zahájením stavebních prací a pro jejich průběh stavebník zajistí odborný biologický dozor zájmového území, který v případě nutnosti navrhne k realizaci příslušná opatření za účelem eliminaci negativních vlivů na živočichy
 - 11) stavebními pracemi na pozemku určeném k plnění funkcí lesa /PUPFL/ parc.č. 134/1, k.ú. Králův Dvůr, nedojde k žádnému dotčení lesního porostu včetně kořenového systému, stavební práce na PUPFL budou svým rozsahem probíhat v rámci stávajícího panelového chodníku.
30. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., dne 13.9.2016 zn. 8120056760.
31. Budou dodrženy podmínky vyjádření VAK Beroun, a.s. ze dne 10.8.2016 zn.: O161-6192/2016.
32. Budou dodrženy podmínky souhlasu s umístěním stavby a s provedením činností v ochranném písmu elektrického zařízení ev. č. 1089203346 ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 4.10.2016 zn. 001089203346.
33. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., odd. Správy energetického majetku Střed, pracoviště Příbram dne 13.9.2016 zn. 8120056760.

V. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

1. Dokončenou stavbu, případně část stavby schopnou samostatného užívání lze užívat na základě oznámení o užívání stavby. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr s užíváním stavby nejméně 30 dní předem. Spolu s oznámením stavebník předloží geometrický plán s vyznačením předmětné stavby. Stavebník zajistí, aby byly před započatím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.

Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) je:

Středočeský kraj, Zborovská 81, 150 00 Praha

Odůvodnění:

Dne 13.9.2016 podal žadatel žádost o vydání společného rozhodnutí. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 3.10.2016 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 20.4.2017.

Stavební úřad dne 13.9.2016 opatřením č.j.: MBE/29311/2017/VÝST-Čp oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. V průběhu řízení nebyly uplatněny námitky ani připomínky.

Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schváleným územním plánem obce. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavebnímu úřadu byly předloženy tyto doklady.

- kopie katastrální mapy
- informace o parcelách KN
- plná moc k zastupování
- plán kontrolních prohlídek
- smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku Středočeský kraj a Město Beroun
- smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku Středočeský kraj a vlastníci dotčených pozemků
- smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení ČEZ Distribuce, a.s. - Středočeský kraj
- smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. - Středočeský kraj
- smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení GasNet, s.r.o. - Středočeský kraj
- smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení Město Králův Dvůr - GasNet, s.r.o.
- smlouvy s vlastníky dotčených pozemků
- souhlas se vstupem na pozemek Lesy ČR, s.p.
- výpisy usnesení Zastupitelstva města Králův Dvůr ze dne 11.1.2017
- závazné stanovisko MěÚ Beroun, odboru ŽP, dne 10.8.2016 č.j. MBE/47528/2016/ŽP-Cir
- závazné stanovisko MěÚ Beroun, odboru ŽP, dne 23.11.2016 č.j. MBE/61625/2016/ŽP-Blc
- závazné stanovisko MěÚ Beroun, odboru ŽP, dne 23.11.2016 č.j. MBE/61624/2016/ŽP-HaL
- závazné stanovisko MěÚ Beroun, odboru ŽP, dne 8.12.2016 č.j. MBE/75546/2016/ŽP-HeJ
- závazné stanovisko MěÚ Beroun, odboru ŽP, dne 29.11.2016 č.j. MBE/74190/2016/ŽP-BrE
- závazné stanovisko MěÚ Beroun, odboru ŽP, dne 19.10.2016 č.j. MBE/61902/2016/ŽP-BrE
- sdělení MěÚ Beroun, odboru ŽP, dne 21.9.2017 č.j. MBE/61623/2016/ŽP-Blc
- rozhodnutí MěÚ Beroun, odboru dopravy a správních agend ze dne 1.12.2016 č.j. MBE/73980/2016/DOPR-KuK
- závazné stanovisko MěÚ Beroun, odboru dopravy a správních agend ze dne 18.7.2016 č.j. MBE/47529/2016/DOPR-DrP
- vyjádření MěÚ Beroun, odbor majetku a investic ze dne 10.2.2017 č.j. MBE/78234/2016/OMI-1-Vot
- sdělení MěÚ Králův Dvůr ze dne 2.8.2016 č.j. VYST-MH/4709/2016
- rozhodnutí MěÚ Králův Dvůr ze dne 5.1.2017 č.j. KTM-Lac/0043/2017
- závazné stanovisko KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, dne 7.11.2016 č.j.: KHSSC 35950/2016
- závazné stanovisko HZS Středočeského kraje úo Beroun, dne 27.7.2016 e.č. BE-467-2/2016/PD
- vyjádření Krajský úřad Středočeského kraje ze dne 23.9.2016 č.j. 134678/2016/KUSK
- vyjádření KSÚS Středočeského kraje, p.o. ze dne 7.9.2016 zn. 5274/16/KSKU/KLT/KYS

- stanovisko Povodí Vltavy, s.p., ze dne 4.8.2016 zn. 41336/2016/342/Ron
- stanovisko Technické služby Beroun, s.r.o. ze dne 8.9.2016
- vyjádření LESY ČR, s.p. ze dne 19.9.2016 č.j. LCR955/008951/2016
- vyjádření LESY ČR, s.p. ze dne 17.8.2016 č.j. 1332/2016
- vyjádření Spel eletro, s.r.o. ze dne 19.10.2016
- souhlas s umístěním stavby a s provedením činností v ochranném písmu elektrického zařízení ev. č. 1089203346 ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 4.10.2016 zn. 001089203346
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., dne 13.9.2016 zn. 8120056760
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., odd. Správy energetického majetku Střed, pracoviště Příbram dne 15.8.2016 zn. 1088162556/2016
- sdělení o existenci komunikačního vedení spol. TEKCO PRO Services, a.s.
- vyjádření VAK Beroun, a.s., dne 10.8.2016 zn.: O161-6192/2016

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Město Beroun, Město Králův Dvůr, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Nižbor, Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Technické služby Beroun, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Technické služby Beroun, s.r.o., Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., GridServices, s.r.o., ČD - Telematika a.s., Ředitelství silnic a dálnic ČR, [redacted] Parkování Beroun s.r.o., [redacted] TONSTAV-SERVICE s.r.o., Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče, [redacted] UNIPETROL RPA, s.r.o., K.C.K. KUNICK PLUS s.r.o., [redacted] Arriva Services a.s., SWPF CZ Retail s.r.o., [redacted] RMS Mezzanine, a.s., [redacted] LUDWIG POESCHL s.r.o., [redacted] Městský úřad Beroun - odbor majetku a investic

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, účastníkům řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu se toto rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Společné rozhodnutí má podle § 94a odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč, celkem 30000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

MILOTA Kladno, spol. s r.o., IDDS: vx4mtu6

sídlo: Huťská č.p. 1557, 272 01 Kladno 1

zastoupení pro: NOVÁK & PARTNER, s.r.o., Perucká 2481, 120 00 Praha

zastoupení pro: Středočeský kraj, Zborovská 81, 150 00 Praha

Město Beroun, Husovo náměstí č.p. 68, 266 43 Beroun-Centrum

Město Králův Dvůr, IDDS: eaabdfp

sídlo: náměstí Míru č.p. 139, 267 01 Králův Dvůr u Berouna

účastníci řízení (doručení podle § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Na Baních č.p. 1535, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Nižbor, IDDS: e8jcfsn

sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo Nábřeží č.p. 14, 304 20 Plzeň

Technické služby Beroun, s.r.o., IDDS: dmq6i5b

sídlo: Viničná č.p. 910, Beroun-Město, 266 01 Beroun 1

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Technické služby Beroun, s.r.o., IDDS: dmq6i5b

sídlo: Viničná č.p. 910, Beroun-Město, 266 01 Beroun 1

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., IDDS: 7vjgxyf

sídlo: Mostníkovská č.p. 255/3, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun 1

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp

sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz

sídlo: Čerčanská č.p. 12, 140 00 Praha 4-Nusle

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče, IDDS: keebyyf

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 21 Praha 5-Smíchov

UNIPETROL RPA, s.r.o., IDDS: upm88qu

sídlo: Záluží č.p. 1, 436 01 Litvínov 1

K.C.K. KUNICK PLUS s.r.o., IDDS: 7jvfe37

sídlo: Žloukovice č.p. 62, 267 05 Nižbor

Arriva Services a.s., IDDS: h43ftk6

sídlo: Pod Hájem č.p. 97, 267 01 Králův Dvůr u Berouna

SWPF CZ Retail s.r.o., IDDS: ngx5qvh

sídlo: Letenská č.p. 121/8, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011

[REDACTED]
RMS Mezzanine, a.s., IDDS: thtf326

sídlo: Sokolovská č.p. 394/17 Praha 8-Karlín 186 00 Praha 86
[REDACTED]

LUDWIG POESCHL s.r.o., IDDS: vfk5w35

sídlo: Plzeňská č.p. 75, 267 01 Králův Dvůr u Berouna
[REDACTED]

Městský úřad Beroun - odbor majetku a investic, Husovo náměstí č.p. 68, 266 43 Beroun-Centrum

dotčené správní úřady

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Beroun, IDDS: 92dhqcp

sídlo: Pod Studánkou č.p. 1258/24, Beroun-Město, 266 01 Beroun 1

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e

sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, 120 00 Praha 2-Nové Město

Městský úřad Beroun - odbor dopravy a správních agend, Husovo náměstí č.p. 68, 266 43 Beroun-Centrum

Městský úřad Beroun - odbor životního prostředí, Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun-Centrum

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Praha, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

ostatní

Městský úřad Beroun - odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Husovo náměstí č.p. 68, 266 43 Beroun-Centrum

Městský úřad Králův Dvůr, Stavební úřad, IDDS: eaabdfp

sídlo: náměstí Míru č.p. 139, 267 01 Králův Dvůr u Berouna

Městský úřad Králův Dvůr, náměstí Míru č.p. 139, 267 01 Králův Dvůr u Berouna

Městský úřad Beroun - kancelář tajemníka, Husovo náměstí č.p. 68, 266 43 Beroun-Centrum

K vyvěšení na úřední desce

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce.

Za den doručení se považuje 15. den ode dne vyvěšení na úřední desce.

Městský úřad Beroun, kancelář tajemníka, Husovo nám. č.p. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun 1

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Městský úřad Králův Dvůr, náměstí Míru č.p. 139, 267 01 Králův Dvůr u Berouna

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

POVĚŘENÍ

Obchodní korporace **CETIN a.s.**, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („**Společnost**“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje zaměstnance pana

adresa pro doručování: CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19,
Libeň, 190 00 Praha 9, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 ods.4 zákona č. 127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě a smlouvy nájemní a podnájemní k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti,

- uzavíral veřejnoprávní smlouvy nahrazující správní rozhodnutí v oblasti výstavby sítí elektronických komunikací,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo ukončení shora uvedených právních vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku **5.000.000,- Kč** (slovy: pět milionů korun českých).

Dále je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy (i rámcové) o realizaci, jejich předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě Společnosti pro stavebníka ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku **20.000.000,- Kč** (slovy: dvacet milionů korun českých). Zároveň je oprávněn projednávat jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou, které nejsou uvedeny výše.

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.



V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající zrušenému závazku.

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření se vystavuje s účinností od 19. 4. 2021 a je platné do 14.4.2022. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne 14-04-2021

CETIN a.s.
Představenstvo





Ověření – legalizace

