



S004P01F0W6J



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



MĚSTO
HODONÍN

Číslo smlouvy objednatele: SD/2022/0151/150

SMLOUVA O DÍLO

*uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník*

na akci:

Návštěvnické středisko NPP Hodonínská Důbrava – Dům přírody Hodonínské Důbravy - exponát E.11-Ptakolet

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN

Adresa: Masarykovo náměstí 53/1,695 35 Hodonín

IČO: 002 84 891

DIČ: CZ 699001303

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100

Zastoupené: ve smluvních záležitostech Liborem Střechou, starostou města Hodonína
v technických záležitostech [redacted] vedoucí odboru investic a
údržby, [redacted] zástupci dozoru
objednatele

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: MArch.Ing.arch. Jiří Vítek

Adresa: [redacted] Uherčice 691 62

IČO: 75552647

DIČ :

Bankovní spojení:

/dále jen zhotovitel/

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DÍLA A VYMEZENÍ POJMŮ

2.1. Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

2.2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

2.3. Pozhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

2.4. Název akce: Návštěvnické středisko NPP Hodonínská Důbrava – Dům přírody
Hodonínské Důbravy – exponát E.11 - Ptakolet

2.5. Místo stavby: Lipová alej 3532/19, 695 01 Hodonín, pozemky parc. č. st. 5818,
2058/68, 2058/44 v k.ú. Hodonín

2.6. Stavební povolení: veřejnoprávní smlouva č.j. MUHOCJ 64805/2019 (resp. dohoda č. 1
o veřejnoprávní smlouvě), vydal: Obecný stavební úřad Hodonín

2.7. Investor (objednatel): Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

Kontaktní osoby:

2.8. Projektová dokumentace:

Dokumentace pro provedení stavby s názvem „Návštěvnické středisko Národní přírodní
památky Hodonínská Důbrava – Dům přírody Hodonínské Důbravy
Datum zhotovení PD: 11/2020

2.9. Projektant (GP):

LÉTAJÍCÍ – INŽENÝŘI, Architektonický a projekční ateliér, Kounicova 23, 602 00 Brno

2.10. Autorský dozor (AD): Ing. Arch. Tomáš Havlíček, sídlem [REDACTED] 602 00 Brno,
IČO 60430435

2.10.1. Technický dozor stavebníka: Prost Hodonín, s.r.o., sídlem Brněnská 4062/3a, 695 01
Hodonín, IČO 60701366

2.11. Koordinátor BOZP objednatele: Ing. Vlastimil Trnečka [REDACTED] 69501 Hodonín,
IČO 72341874

2.12. Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených prací,
dodávek a služeb: [REDACTED]

2.13. Osoba odpovědná za provádění díla: MArch. Ing. arch. Jiří Vítek

3. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

3.1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky
vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či
omezovali plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně
závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se
záměry objednatele ohledně přípravy a realizace díla specifikovaného v následujících

ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklady a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

- 3.2. Předmětem smlouvy je dodávka a instalace exponátu E.11 Ptakolet - **výtvarné dílo - hejno ptáků, které bude zavěšeno nad schodištěm v rámci shora uvedeného Domu přírody Hodonínské Dúbravy a jeho orientační rozměry jsou šířka cca 1m, délka cca 3m, výška až 3m s ohledem na průchozí profil schodiště**, a to v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou projekční společností LÉTAJÍCÍ – INŽENÝŘI, Architektonický a projekční ateliér, Kounicova 23, 602 00 Brno, datum zpracování 11/2020 a touto smlouvou o dílo. Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je prováděno v rámci realizace schváleného projektu s názvem Návštěvnické středisko NPP Hodonínská Dúbrava – Dům přírody Hodonínské Dúbravy. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Registrační číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_129/0010842.

Udržitelnost výše uvedeného projektu je stanovena na období 10 let ode dne schválení posledního vyúčtování v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Dílo je dále prováděno za spolupráce Nadace Karel Komárek Family Foundation.

Zhotovitel dále bere na vědomí, že dílo může být rovněž předmětem dotace od Jihomoravského kraje a v případě obdržení této dotace se zavazuje dodržovat rovněž její podmínky.

Zhotovitel se zavazuje vytvořit v rámci plnění předmětu smlouvy podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout při provádění kontroly součinnost k provedení kontroly dokladů souvisejících s předmětem díla, to vše dle pokynů objednatele či dotčených orgánů, zejm. poskytne součinnost zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvoří výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, a to do konce roku 2033.

- 3.4. **Zhotovitel odpovídá** za to, že dílo bude realizováno v uvedeném rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací a touto smlouvou. Kompletní dodávkou se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení díla, včetně provedení všech činností souvisejících s dodávkou, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
- 3.5. **Zhotovení a realizace díla zahrnuje rovněž:**
- 3.5.1. průběžné schvalování díla a řešení realizace Pro účely kontroly provádění díla bude mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnut harmonogram průběžných kontrol díla ze strany objednatele a autorského dozoru;
- 3.5.2. konzultace s objednatelem, autorským dozorem a dále s Přírodovědnou supervizí (Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky)

- 3.5.3. návrh konkrétního prostorového a materiálového provedení se zohledněním možností instalace do konstrukcí dle architektonického řešení stavby, s ohledem na statiku, a to graficky, příp. fyzickým modelem, testovacím vzorkem/vzorky;
- 3.5.4. prezentace návrhu umělecko výtvarné instalace objednateli;
- 3.5.5. výroba a příprava na vlastní fyzickou instalaci;
- 3.5.6. instalace umělecko výtvarného díla do hotového stavebního díla;
- 3.5.7. důsledný úklid místa instalace, průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů;

4. ZMĚNY DÍLA

- 4.1. **Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:
 - 4.1.1. **neprovedení dohodnutých** prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v projektové dokumentaci a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
 - 4.1.2. **provedení dodatečných** prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
 - 4.1.3. **zlepšení efektivity**, hospodárnosti a účelnosti **budoucího provozu** díla.
- 4.2. **Pokud** objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace díla vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží ve lhůtě do 14 dnů od uplatnění práva objednatele **návrh Změnového listu** nejpozději na nejbližším KD k projednání.
- 4.3. **Změnový list** (Příloha č. 3)
 - 4.3.1. **Návrh** změnového listu bude **zpracován dle vzoru** předaného zhotoviteli (Příloha č. 3). Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla **odpovídá zhotovitel**.
 - 4.3.2. Změnové listy **budou odsouhlaseny** objednatelem **formou schválení dodatku ke smlouvě**. Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení objednatelem. Pokud objednatel neodsouhlasil změny, zhotovitel není v prodlení.

5. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

- 5.1. Termín zahájení díla:
 - do 10 dnů od účinnosti smlouvy.
- 5.2. Termín dokončení montáže exponátu v místě plnění:
 - do 60 dnů od výzvy objednatele (předpoklad zahájení montáže červen 2023)

5.3. Objednatel po domluvě zajistí zhotoviteli prohlídku místa plnění, a to nejpozději do 10 dnů od účinnosti smlouvy.

5.4. **Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.**

5.4.1. **Místem montáže exponátu** je město Hodonín, Lipová Alej 3532/19, pozemky parc. č.: st. 5818, 2058/68, 2058/44 v k. ú. **Hodonín**, Česká republika.

6. CENA DÍLA

6.1. Cena díla zahrnuje **veškeré náklady** potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 3 a v ostatních ustanoveních této smlouvy.

Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.

6.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

300.000,-Kč bez DPH

63.000,- Kč DPH 21 %

363.000,-Kč včetně DPH

6.3. Zhotovitel je plátcem DPH.

6.4. **Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě individuální kalkulace.**

6.5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%.

6.6. **Cena díla podle odst. 6.2. je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů:**

6.6.1. před **nebo** v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,

6.6.2. v průběhu díla vystane nezbytnost provedení víceprací ve smyslu čl. 4.1.2 této smlouvy.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě **dílčích daňových dokladů (faktur)**.

Každá faktura musí být označena názvem a číslem projektu **Návštěvnícké středisko NPP Hodonínská Důbrava – Dům přírody Hodonínské Důbravy reg. č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_192/0010842.**

7.2. Objednatel se zavazuje hradit zhotoviteli dílčí platby na základě faktur vystavených zhotovitelem v následujících termínech:

- 35 % smluvní ceny (tj. 127 050,- Kč včetně DPH) bude uhrazeno po zahájení prací na díle,
- 35 % smluvní ceny (tj. 127 050,- Kč včetně DPH) bude uhrazeno po odsouhlasení finální verze díla,
- 30 % smluvní ceny (tj. 108 900,- Kč včetně DPH) bude uhrazeno po úplném předání a převzetí díla.

7.3. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli (**referentovi** odpovědnému v technických záležitostech **na MěÚ Hodonín, odbor IaÚ** a to **elektronicky nebo fyzicky**) **nejpozději 13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli objednatelem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené **práce budou vypořádány až v následné faktuře.**

7.4. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – **konečná faktura** (vyúčtování ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli.

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
- částku zbývající k úhradě bez DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná. Součástí závěrečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla.

7.5. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného **doručení do sídla objednatele**. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.

7.6. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

8. VÝCHOZÍ PODKLADY – SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

8.1. **Objednatel**, v rámci spolupůsobení, **předá zhotoviteli** bezúplatně po podpisu smlouvy tyto dokumenty:

8.1.1. projektovou dokumentaci v rozsahu **dokumentace pro provádění stavby, PS-01 Expozice** zpracovanou společností zpracovanou společností: **LÉTAJÍCÍ – INŽENÝŘI**, Architektonický a projekční atelier, Kounicova 23, 602 00 Brno, datum zpracování 11/2020.

8.2. **Objednatel** odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob.

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla a zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele prezentovat průběžné výsledky zpracovávání díla. Pro účely takové kontroly se budou konat kontrolní dny v pravidelných intervalech. Takovýchto kontrolních dní je oprávněna se účastnit rovněž osoba ze strany Nadace Karel Komárek Family Foundation s tím, že připomínky ze strany Nadace Karel Komárek Family Foundation budou zapracovány, příp. zajištěna náprava v rozsahu, jako kdyby šlo o připomínky objednatele.
- 9.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP.
- 9.3. Zhotovitel nese odpovědnost za to, že v rámci provádění díla dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé.
- 9.4. Realizované dílo zhotovitelem bude definitivně odsouhlaseno ze strany autorského dozoru a objednatele.
- 9.5. Povinností zhotovitele je dbát na důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), vůči všem osobám, které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jeho zaměstnanci i osobami vykonávajícími práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně spravedlivého a rovného odměňování v práci a vyloučení diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.
- 9.7. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění stavebních prací učiní opatření, která jsou nezbytná k ochraně životního prostředí. Zhotovitel se tedy zavazuje zejména zabránit nadměrnému znečišťování ovzduší a půdy imisemi pocházejícími z výstavby; není-li možné imisím zabránit. Zhotovitel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k jejich eliminaci. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

9.8. Zhotovitel bere na vědomí, že v rámci realizace projektu – **Návštěvnícké středisko NPP Hodonínská Důbrava – Dům přírody Hodonínské Důbravy** budou zadavatelem realizovány zakázky s názvem:

- **Návštěvnícké středisko NPP Hodonínská Důbrava – Dům přírody Hodonínské Důbravy – rekonstrukce Centra ekologické výchovy**
- **Návštěvnícké středisko NPP Hodonínská Důbrava – Dům přírody Hodonínské Důbravy – interiér**
- **Návštěvnícké středisko NPP Hodonínská Důbrava – Dům přírody Hodonínské Důbravy – expozice**
- **Návštěvnícké středisko NPP Hodonínská Důbrava – Dům přírody Hodonínské Důbravy – sadové úpravy**

9.9. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou nezbytnou součinnost potřebnou nejen při realizaci předmětu smlouvy, ale rovněž potřebnou pro realizaci výše uvedených zakázek, realizovaných dodavateli, kteří vzejdou ze zadávacích řízení. Po realizaci předmětných zadávacích řízení bude objednatel informovat zhotovitele o osobě dodavatele vzešlých ze shora uvedených zadávacích řízení. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s ostatními dodavateli, zejména dodavatelem stavební části a dodavatelem expozice ve všech případech, kdy na sebe budou navazovat práce dle této smlouvy s pracemi ostatních dodavatelů.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným **dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků** zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek. **není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění.** Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. **Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.** Přejímacího řízení je oprávněna se účastnit, vznášet připomínky či upozornit na vady či nedodělky, rovněž osoba ze strany Nadace Karel Komárek Family Foundation.

11. VLASTNICKÉ PRÁVO A PŘECHOD NEBEZPEČÍ VZNIKU ŠKODY

11.1. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.

11.2. **Zhotovitel nese nebezpečí škody** na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku objednatelům. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

12. UŽITÍ DÍLA A LICENCE

12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu právo dílo užít (licence) výhradně pro účely provozu Domu přírody Hodonínské Důbravy, a to všemi známými způsoby užití (s výjimkou využití pro výrobu merchandise produktů) samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jinými díly, včetně případného doplnění díla o výtvarné prvky jiných autorů. Licence je poskytována na celou dobu trvání autorových majetkových práv k dílu a je omezená na území České republiky. Odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla.

- 12.2. Zhotovitel se zavazuje, že v okamžiku předání díla objednateli, bude výhradním nositelem neomezených práv k užití díla a bude oprávněn poskytnout licenci k užití díla v rozsahu předvídaným touto smlouvou.
- 12.3. Objednatel se zavazuje na samotném díle, na své webové stránce i ve všech propagačních a marketingových materiálech vhodným způsobem uvést jméno Zhotovitelova autorství díla, a to formou následujícího textu „Autor: Jiří Vitek“.
- 12.4. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.
- 12.5. V případě, že zanikne závazek z této smlouvy jinak než splněním, tj. řádným dokončením díla, je objednatel oprávněn dokončit dílo sám nebo prostřednictvím třetí osoby, které poskytne podlicenci k užití díla. Vyskytne-li se nutnost opravy díla, a zároveň nebude možné, aby vadu díla odstranil zhotovitel, zejména uplyne-li záruční doba nebo se na vadu nebude vztahovat záruka, může objednatel dokončit dílo sám nebo prostřednictvím třetí osoby.
- 12.6. Osobnostní práva autorská nejsou ujednáním této Smlouvy dotčena.
- 12.7. Objednatel nesmí svá oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout nebo postoupit třetí osobě.

13. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 13.1. **Zhotovitel** poskytuje objednateli záruku, že dodané bude prosto jakýchkoliv vad a zhotovitel **bez zbytečného prodloužení a na své vlastní náklady provede znovu** tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 13.2. **Dílo má vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 13.3. **Zhotovitel odpovídá** za vady, které dílo má v době jeho předání. (**vady zjevné**).
- 13.4. **Zhotovitel dále odpovídá** za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (**vady skryté**).
- 13.5. **Záruční doba na dílo jako celek** začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v **délce 24 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. **V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží** o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno.
- 13.6. **Zhotovitel je povinen se účastnit** na výzvu TDS nebo objednatele kontroly díla a jeho částí během záruční doby. Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit osoba odpovědná za provádění díla, pokud je to z objektivních důvodů možné.

14. REKLAMACE

- 14.1. **Jestliže** objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho částí a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu

písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. **Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby**, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou,

- 14.2. **Zhotovitel** potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně **přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů** od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v **co možná nejkratší technicky obhájitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno **na vlastní náklady zhotovitele**. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamace.
- 14.3. **Jestliže** se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu **nejpozději do 24 hodin** a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení.
- 14.4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 14.5. **V případě, že** zhotovitel do **3 pracovních dnů** nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji **nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 14.6. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- 14.7. **Smluvní strany** se mohou dohodnout, že drobné **odchyly od projektové dokumentace**, které byly dohodnuty, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami**. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.

15. SMLUVNÍ SANKCE

- 15.1. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1000 Kč** za každý započatý kalendářní týden **prodlení s předáním díla** oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy.
- 15.2. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci převíracího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce díla ve výši **1 000 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní týden prodlení s odstraněním vady.
- 15.3. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním reklamované vady** dle odst. 14.2. ve výši **1 000 Kč** za každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní týden prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady.

- 15.4. Za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z čl. 9.5., 9.6., 9.7. a 9.9. má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **2 000 Kč** za každé jednotlivé porušení.

16. Odstoupení od smlouvy

- 16.1. Tato **smlouva zanikne splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout **dohodou**, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 16.2. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy v případě nedostatku či omezení finančních prostředků odstoupit bez jakýchkoliv finančních sankcí. Objednatel v tomto případě uhradí zhotoviteli náklady provedené na podkladě této smlouvy o dílo vzniklé do doby odstoupení objednatele dle předešlé věty.
- 16.3. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o **podstatném porušení smlouvy**. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **30 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.
- 16.4. **Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy **je považováno**:
- 16.4.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů;
- 16.4.2. **prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů**;
- 16.4.3. případy, kdy zhotovitel **provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele**, projektovou dokumentací,
- 16.4.4. neposkytnutí **náležité součinnosti** zhotovitele technickému doзору objednatele, autorskému doзору, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele;
- 16.5. **Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele** odstoupit od smlouvy je:
- 16.5.1. prodlení objednatele **s platbami dle platebního režimu** dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti) ;
- 16.6. **Objednatel** je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla **zhotovitel opakovaně** (tj. více než 2x) **porušuje své povinnosti** vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.

17. Ostatní ujednání

- 17.1. Objednatel si vyhrazuje právo uzavřít dodatky této smlouvy o dílo, pokud nastane taková změna okolností, pro kterou nebude možno po objednateli požadovat, aby v plnění smlouvy pokračoval (např. nepřidělení finančních prostředků od Jihomoravského kraje). Z těchto důvodů je objednatel oprávněn změnit obsah předmětu plnění nebo od smlouvy odstoupit bez sankcí ze strany zhotovitele.

- 17.2. **Jakýkoliv spor** vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.
- 17.3. Za **případy vyšší moci** jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatel ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny.
- 17.4. Tato smlouva **nabývá platnosti** dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti **dnem jejího uveřejnění v registru** smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., za předpokladu, že je opatřena schvalovací doložkou Nadace Karel Komárek Family Foundation.
- 17.5. Před uveřejněním této smlouvy v registru smluv a nabytí její účinnosti, je nutná schvalovací doložka ze strany Nadace Karel Komárek Family Foundation, dříve smlouva v registru nebude uveřejněna.
- 17.6. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze **písemnými číslovanými dodatky** podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 17.7. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou **spolupůsobit při výkonu finanční kontroly** prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.
- 17.8. V souladu s ust. § 219 ZZVZ má Objednatel povinnost **uveřejnit na svém profilu zadavatele** tuto Smlouvu včetně jejích změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu Smlouvy.
- 17.9. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 17.10. Tato smlouva bude uveřejněna objednatel prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

- Příloha č. 1 **Položkový rozpočet prací** vypracovaný na základě soupisu prací
Příloha č. 2 **Popis a ilustrace exponátu E.11**
Příloha č. 3 **Požadavky na provedení/projednání/koordinaci uměleckého výtvarného díla**
Příloha č. 4 **Změnový list – vzor**

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 31.5.2022, č.usnesení 5990

V Hodoníně dne: 24.6.2022

V Hodoníně dne 17.6.2022

Objed

Zhotovitel:

.....
starosta

SCHV

Nadace Karel Komárek Family Foundation souhlasí s uzavřením této smlouvy.

.....
24.6.2022

Nadace Karel Komárek Family Foundation

Návštěvníké středisko národní přírodní památky Hodonínská dubrava - Dům přírody Hodonínské Dubravy
PS.01 Expozice-Exponát E.11

Nacenený soupis prací a výkaz výměr - rozpočet

UMĚLECKO VÝTVARNÉ DODÁVKY (extrakt z rozpočtu Expozice)

pom./

Položky výkazu výměr nezobrazují celkovou specifikaci objektu.

Kódy, kterými jsou položky výkazu označeny, odkazují na specifikace v PD, kde je uvedena veškerá k nasazení potřebná informace.

Bez specifikace v PD nelze nacenění provádět, nedílnou součástí PD je technická zpráva s objemnými požadavky.

U kódů rovněž důležitá se počítá se systémem generálního klíče.

sp.dle PD = specifikace dle projektové dokumentace expozice

	Název položky	Specifikace	MJ	Množství	Cena za MJ	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
Celkem	UMĚLECKÉ VÝTVARNÉ DODÁVKY CELKEM					300 000	363 000
Celkem dílčí	UMĚLECKÉ VÝTVARNÉ DODÁVKY DÍLČÍ					300 000	363 000

Exponát

E.11 Ptakolet Celkové náklady UMĚLECKÉ VÝTVARNÉ DODÁVKY exponátu -> ks 1 300 000 300 000 363 000

Položky pro 1 ks exponátu :

um	Umělecké instalace					300 000	363 000
um.01	a/ výtvorná instalace	sp.dle PD	ks	1			
um.02	a/ přeprava, sest., montáž, instalace, zajištění obsluhy, koordinace, etablování, administrace náklady	sp.dle PD	spil	1			
	b/ Realizační dokumentace	sp.dle PD	spil	1			

Ptakolet

Zaner

1. prezentovať umělecké dielo, inšpirované ptáky letiacimi nad krajinou

Význam díla - hejpt pláč. Zvěřeno nad skočkým

Objekt je neopracovaný chlovník hejno přibíh v létu, které je klasickým přírodním lesem s poměrně malými vlnitými hejny se stromy jako jasan, bříška a dubletě, nadevším velmi výhledově zplstňený, což by bylo jako česko říší. Jarozené nazpady Bouda - Zvířetě. Objekt je arhikovaný Ústejným hejnozem v roce 1386. Hejno se řídí těmi hlavními parametry: spazně, zaručeně a křehce. Tuto pravdu bylo odlišeno při generování výhledově dlo a vzhledu do té, že se nepřehledně a empozitně principy přírody.

Forn.

— — —

Předmět d'la

umělecké instalace

and before

n/ Vlámski inštalácie - hejno práb. Zväčšená nad schodiskom. Autor Jiri Vitek.

um (P) žije ici a celá kniha rozdělová náklady položky.

o/ přímou cestu, mariáž, kšafky, zvládnutí osob, koordinace, vztahování,
administrace zkušek

v razsegu, da potres o charakteru započela o v skladu s obecnimi požarnimi.

†/Výrobní realizační dokumentace v provedení dle účebních resp. sítěšských požadavků projektu – viz Technická zpráva esopce.

Page

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

grafika

011 Grafický náčrt tváře

of 15th finite field, correctly

21) Grafický návrh o uspořádání stavebního objektu

1

e03 Dodaka frite expend

[illegible]

- Komplex železa 3mm + polisk + laminace

g) 4. (odlično edukativnih obsegu ekspertu)

1999

415 Zřiváci z oslabí rozpočtové náklady položky

a) Kvalitace výroby s celoživotní profícií a zasloužením

b) příprava testů, inspekce, zařazení obsluhy, vzhledování, administrace záležitostí v rozsahu dle učební a pracovní expozice a v souladu s odbornými požadavky.

c/ Meritx v espotici

P

2

ostatní položky, režie

r(II) žhivnící a ostatní rozpočtové náklady pčitelův


n/ komunikace, cestování, koordinace, administrace zvláště

V rozsahu de minimis a charakteru exportu a v souladu s italskými právními


Pain

V případě tohoto esopodu se jedná o zplněný nádobní: mezi řadiací epopce a vnějším výhledu dooboku. Který není dooboku epopce, shodou jasně byl
gřebení kamenné, kování a chráněné a při ztížení, si uvolně
geneticky zastupuje epopce pro začátku řadiací epopce. Zastupí vnějším
výhledu dooboku. Vlnuje se s nerovným nosením, s dřevem a mokrými
prostrávkou a křivě prostrávkou tohoto esopodu s užitím epopce.
konkrétně v příjmu epopce i sady. Pádání vlny lze zjednotit není typně
zjednotí, kování, schování a dle zjednotí vlny k příjmu vnějším výhledu
zjednotí esopodu, to i vlně dooboku epopce, alfabeta.

Pūdorys 1:20

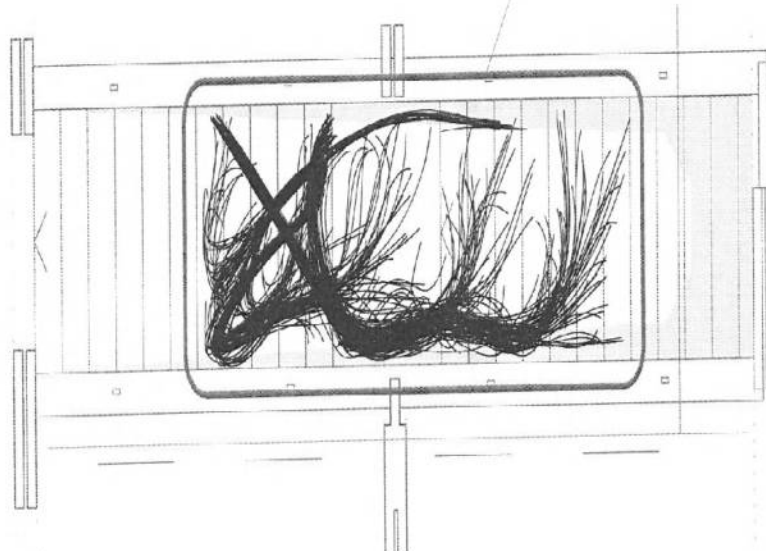

Nedílnou součástí této PD je textová zpráva o obecných požadavcích a specifikacích. Tato PD není výrobní realizační dokumentace, oddíl se opeklá k dalšímu doplnění před výrobou.



Perspektiva

TheBüro
/ architekti Brno

Vedlinou součástí této PD je textová zpráva s
obecnými požadavky a specifikacemi. Tato PD
není výrobní realizační dokumentace, jedná se
o podklad k dalšímu doplnění před výrobou.

Dům přírody Hodonínské Důbravy - Expozice **E.11**

str. 02

Požadavky na provedení / projednání / koordinaci uměleckého výtvarného díla

1/ Obecně

1.1/ Všeobecně

viz požadavky na koordinaci dle PD Expozice textová část – zejm. kap. 10 (Obsahy), 11 (Edukativní supervize), 12 (Obecné požadavky na provedení a součinnost), 13 (Obecné požadavky – zásady pro přípravu realizace, podněty stavebníkovi k zapracování do ujednání s budoucími dodavateli) v rozsahu projektové dokumentace

1.2/ Se zvláštním ohledem na umělecká výtvarná díla

- a/ Umělecká výtvarná díla jsou autorskými díly, zároveň však mají konkrétní poslání, a tedy je k jejich zpracování potřebná znalost kontextu, v jehož rámci má umělecko výtvarné dílo vzniknout (tj. poslání Domu přírody Hodonínské dubravy, architektonický návrh Expozice, technický návrh Expozice).
- b/ Umělecká výtvarná díla budou vznikat při vzájemné informovanosti stran zúčastněných na přípravě a realizaci Expozice, výsledná umělecká výtvarná díla budou tedy věcně v konsenzuálním provedení, avšak zároveň platí, že věcné podání, forma a styl provedení je integrální záležitostí autora/ky díla.
- c/ Umělecká výtvarná díla budou v průběhu přípravy prezentována Objednateli, čehož součástí je AD a TDI, a budou v návrhu koordinována s generálním dodavatelem Expozice za účelem správného prostorového a funkčního zapojení do Expozice.

2.1 / exponát E.11 Ptakolet

2.1.1 / Popis exponátu dle PD:

Výtvarné dílo - hejno ptáků. Zavěšeno nad schodištěm. Objekt je inspirován chováním hejna ptáků v letu, které je úžasným přírodním fenoménem pozorovatelným v krajině. Hejno se chová jako jeden celek a dokáže manévrovat velmi rychlým způsobem, aniž by bylo jasné kdo celek řídí. Tento fenomén nazývaný Boids - Bird like Object byl artikulován Craigem Reynoldsem v roce 1986. Hejno se řídí třemi hlavními parametry : separace, zarovnání a koherence. Tato pravidla byla aplikována při generování výtvarného díla a vzniklý objekt tak interpretuje emergetní principy přírody.

2.1.1 / Požadavky na koordinaci

- a/ úvodní konzultace zejm. s Přírodovědnou supervizí (konzultace k možnosti a vhodnosti zobrazení konkrétního živočišného druhu nebo abstraktního ptáka, s ohledem na výtvarný záměr, který spočívá primárně v zobrazení matematického pozadí, které generuje tvary a chování ptačího hejna, vč. zasazení do celkového kontextu výstavy s ohledem na její poslání).
- b/ návrh konkrétního prostorového a materiálového provedení se zohledněním možností instalace do konstrukcí dle architektonického řešení stavby, s ohledem na statiku. Graficky, příp. fyzickým modelem, testovací vzorek/vzorky.
- c/ Prezentace návrhu umělecko výtvarné instalace objednateli.
- f/ Výroba a příprava na vlastní fyzickou instalaci.
- g/ Instalace umělecko výtvarného díla do hotového stavebního díla.

Název akce:

**„Návštěvnícké středisko NPP Hodonínská Důbrava – Dům přírody Hodonínské
Důbravy – exponát E.11 - Ptakolet“**

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. XX

„(doplnit název změnového listu)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.:

1. Oddíl stavby: (Stavební objekt, Provozní soubor)
2. Zpracovatel změnového listu: (zhotovitel stavby)
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
 - 3.1 stavební deník: (SD č. xx, strana č. xx, datum xx.xx.xxxx)
 - 3.2 kontrolní den: (KD č. xx, ze dne xx.xx.xxxx)
 - 3.3 jiné související dokumenty: (dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele apod.)
4. Zdůvodnění a příčina změny:
(Podrobný popis příčiny změny.)
5. Návrh technického řešení a rozsah změny
(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)
6. Finanční náklady změny
(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	0,00	0,00
MĚNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	0,00	0,00

V dne

.....
(jméno, podpis zhotovitele)

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení **kontroly výkazu výměr** a nacenění víceprací dle podmínek SOD

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ
- Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd)
- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím
- stanovisky dotčených orgánů
- podmínkami dotačního programu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:

- Úprava harmonogramu stavby
- Dodatek IZ
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
- Dodatek Smlouvy o dílo
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS (ne)doporučuje ZL č. XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)

(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) (ne)doporučuje ZL.XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).

- a) *V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.*
- b) Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

FI:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150:

Dotace EU/SR:

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V dne

.....
(jméno, podpis)

VEDOUcí ODBORU :

V dne

.....
(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

V dne

.....
(jméno, podpis)

10. Přílohy ke změnovému listu:

- | | |
|--------------|--|
| Příloha č. 1 | Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce |
| Příloha č. 2 | položkový rozpočet |
| Příloha č. 3 | fotodokumentace |
| Příloha č. | xxx další přílohy dle odst. 3.3. |

Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka:

Změnový list č.	Název Změnového listu		celková částka	
Rozpis částky na roky:	2016			
	2017			
	2018			
Finanční profil:				
ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:	datum:	jméno:	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis:
