

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2017/00045

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění

Vlastník sítě elektronických komunikací:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623

Zastoupená: [REDAKCE] supervizorem pro výstavbu sítě dle pověření

Bankovní spojení: PPF banka

Číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „CETIN“)

a

Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací:

Město Znojmo

se sídlem Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

IČ: 00293881

DIČ: CZ00293881

Jednající Ing. Vlastimilem Gabrhelem, starostou města

Bankovní spojení: KB Znojmo, a.s.

Číslo účtu: 224741/0100

(dále jen „Stavebník“)

uzavírají tuto smlouvu:

Definice pojmů

Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) se rozumí stavba spočívající ve změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení veřejné komunikační sítě.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy.

Stavebník ve smyslu Vyjádření o existenci SEK a Všeobecných podmínek ochrany SEK vydaného dne 11.1.2017 pod č. 508259/17 vyvolává ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. překládku dotčeného úseku SEK.

Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením

„VPIC Znojmo Konice MK trasa C, D“.

Čl. 2 **Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy je požadavek Stavebníka na překládku SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, závazek společnosti CETIN zajistit si překládku SEK a s ní související záležitosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek Stavebníka, jež překládku SEK vyvolal, uhradit všechny nezbytné náklady, které společnosti CETIN v souvislosti se zajištěním překládky SEK vzniknou.

Čl. 3 **Překládka SEK, podmínky překládky SEK**

3.1 Překládka SEK dle této smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech dle Cenového a technického návrhu překládky SEK VPIC Znojmo Konice MK trasa C, D, který je Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Překládka“).

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

- zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu (Překládky),
- zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených překládkou SEK nebo vyvlastnění takového práva.

(to vše dále jen „Předpoklady pro realizaci překládky SEK“).

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci překládky SEK nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

Čl. 4 **Závazky spojené s překládkou SEK**

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje

- před realizací Překládky:

- pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy..

- po realizaci Překládky:

- zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky.

4.2 V souvislosti s provedením překládky se Stavebník zavazuje

- před realizací Překládky:
- zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky),
- zajistit zemní práce související s Překládkou včetně zřízení kabelového lože
- k převzetí výkopu a předání staveniště vyzvat zástupce společnosti CETIN viz kontakt Čl.8 věci technické této smlouvy
- písemně oznámit společnosti CETIN, nejpozději 8 týdnů před zahájením realizace Překládky, stavební připravenost a vyzvat CETIN k realizaci Překládky.

Po nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky), převést na společnost CETIN práva a povinnosti z tohoto územního rozhodnutí týkající se Překládky (uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby dle vzoru viz. příloha č. 3 této smlouvy) a předat toto územní rozhodnutí společnosti CETIN, to vše nejpozději do 15 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky do 6 měsíců od doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce a to za předpokladu, že ke dni doručení písemné výzvy stavebníka dle předchozího odstavce jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci překládky SEK uvedené v Čl. 3 bodu 3.2 této smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v Čl. 4. bodu 4.2 této smlouvy vyjma ustanovení o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 6 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN..

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 Sb. k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou, stejně tak v případě nákladů společnosti CETIN za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do Katastru nemovitostí event. případně nákladů vzniklých společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smlouvy o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.

4.6 Sjednaná lhůta realizace Překládky dle Čl. 4 bodu 4.3 této smlouvy se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.

4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v Čl. 8 této smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

Čl. 5

Náklady spojené s překládkou SEK

5.1 Stavebník je na základě zákona č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k překládce nedošlo.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu ke dni uzavření této smlouvy činí **111.553,- Kč**. Překládka na základě zákona č. 127/2005 Sb. je mimo předmět daně z přidané hodnoty.

5.3 Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Může se jednat například o:

- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v Čl. 4 bodu 4.4. této smlouvy),
- náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 bodu 4.4 této smlouvy,
- náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z Katastru nemovitostí,
- náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- náklady na identifikaci parcel,
- náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- náklady na peněžitě plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

Čl. 6 **Platební podmínky**

6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě faktury po realizaci Překládky do 30 dnů ode dne jejího vystavení.

6.2 Faktura dle Čl. 6 bod 6.1 bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 bod. 4.7 této smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.

6.3 Faktura bude Stavebníkovi zasílána na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy.

6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v Čl. 5 bod 5.4 této smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných faktur vystavených společností CETIN a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne vystavení každé jednotlivé faktury

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak. Dnem úhrady faktury (zaplacením fakturovaných nákladů) se rozumí den připsání účtované (fakturované) částky na účet společnosti CETIN.

Čl. 7 **Sankce**

7.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Stavebníka s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebníka zaplatit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.2. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.

7.3. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 a 7.2 tohoto článku, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

7.4. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 až 7.3. tohoto článku, trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

Čl. 8 **Kontaktní osoby**

a) Za CETIN:

ve věcech smluvních: [redacted] funkce: specialista pro výstavbu sítě

e-mail: [redacted]

ve věcech technických: [redacted], funkce: specialista pro výstavbu přístupové sítě

e-mail: [redacted]

b) Za stavebníka:

ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Gabrhel, funkce: starosta města

e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED] funkce: referent odboru investic a technických služeb,

e-mail: [REDACTED]

Čl. 9

Rozvazovací podmínka

9.1. Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.

9.2. Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. Zánikem smlouvy touto rozvazovací podmínkou není dotčeno právo společnosti CETIN na zaplacení smluvní pokuty dle Čl. 7 bodů 7.1.až 7.4. této smlouvy, a tomu odpovídající povinnost Stavebníka tuto pokutu zaplatit. Právo na náhradu škody zůstává zachováno. V případě, že dojde k zániku smlouvy touto rozvazovací podmínkou je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této smlouvy.

Čl. 10

Závěrečná ustanovení

10.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření.

10.2. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

10.3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

10.4. Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští.

10.5. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

10.6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude zasílána doporučeně na adresy uvedené v hlavičce této smlouvy nebo na adresy elektronické pošty uvedené v Čl. 8 této smlouvy, ustanovení § 573 občanského zákoníku se neuplatní.

10.7. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

10.8. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku na tuto smlouvu,

10.9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

10.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

10.11. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

10.12. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy

10.13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Znojma dne 20. 3. 2017, usnesením č. 92/2017, bodem č. 4654.

Přílohy:

1. Cenový a technický návrh Překládky
2. Specifikace nákladů
3. Vzor dohody o převodu práv z územního rozhodnutí

Za CETIN:

Za Stavebníka:

V Brně dne 10 -04- 2017

Ve Znojmě dne 26. 04. 2017

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.:
[redacted]
supervizor pro výstavbu sítě

Město Znojmo
Ing. Vlastimil Gabrhel
starosta města

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Členství 2061/6
139 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
231

MĚSTO ZNOJMO
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
-1-

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Startovací dokumentace

INVESTIČNÍ AKCE

Kategorie

Podkategorie

Číslo SAP

Číslo interní 68203/17/0016

Název

VPIC Znojmo Konice MK trasa C,D

Budoucí uživatel

GMO-BOZL Stojanov Ivo
Manažer/KPO

Zpracoval

Vedoucí
Manažer

Schváleno

Obsah:

1 Souhrnná zpráva

- 1.1 Základní údaje
- 1.2 Účel stavby

2 Technická zpráva

- 2.1 Vstupní podklady
- 2.2 Navrhované řešení
- 2.3 Popis tras
- 2.4 Použitá technologie
- 2.5 Použité předpisy
- 2.6 Koordinace
- 2.7 Ostatní

1. Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

Identifikační údaje

Název:	VPIC Znojmo Konice MK trasa C,D
Kategorie:	
Podkategorie:	
Typ investice:	Vynucená překládka s inženýringem CAPEX
Důvod 1:	Bez určení
Číslo interní:	68203/17/0016
Prvek SPP:	
ABC:	C
HOST:	
ATÚ:	VÚJ Havraníky-RSU

Kapacitní údaje

		Průměrný náklad na:
100800 Délka HDPE trubek pro OK	0 km	kmp mk
100200 Délka metalických kabelů	0.218 km	kmk mk
100700 Délka nadzemní tratě	0 km	km vyk
100100 Délka párů v metalických kabelech	7.112 km	km kv
100300 Délka výkopů vč. podvrtů a přechodů	0 km	kmo kv
Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř.	0 pár	b.j.
100400 Páry zakončené v účast. rozvaděčích	0 pár	
100900 Počet bytových domů	0 BD	
101100 Počet bytových jednotek v bytových domech	0 bj	
100500 Počet rodinných domů	0 RD	
100600 Počet bytových jednotek v rodinných domech	0 bj	
nástavba skříně SIS 2, 3 pro rDSLAM Micos	0 ks	
Skřín SIS 900-A s nást. rDSLAM HD 180	0 ks	
Skřín SIS 900 B HD180	0 ks	
Skřín SIS 900 C HD180	0 ks	
Skřín SIS 900 D HD180	0 ks	
Sloupek nn měření pro DSLAM 350 vč. zákl.	0 ks	
Nástavba Micos rDSLAM pod omítku	0 ks	
Skřín mDSLAM 450 HD180 s ventilátorem	0 ks	
Nástavba Micos rDSLAM	0 ks	
Skřín SIS 1350 D HD 180	0 ks	
Délka HDPE trubek pro OK	0 km	

Požadavky:

Název polygonu: VPIC Znojmo Konice MK trasa C,D

Termíny:

Platnost ÚR od:	
Platnost ÚR do:	
Plánované zahájení přípravy:	10.02.2017
Plánované ukončení přípravy:	30.06.2017
Plánované zahájení realizace:	30.08.2017
Plánované ukončení realizace:	30.11.2017
Nabídka k přejímce (Plán):	30.10.2017

1.2 Účel stavby:

Navržené technické řešení je v souladu s TM000072

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady:

Požadavek IPMS int.č. 68203/17/0016 na zpracování CaTN: VPIC Znojmo Konice MK trasa C,D

2.2 Navrhované řešení:

Z důvodu rekonstrukce místní komunikace v obci Konice u Znojma, dojde k přeložení stávajících prvků společnosti CETIN. Prvky spol. CETIN budou přeloženy mimo pojízdné plochy.

Jedná se o úseky od objektu lisovny po RD č.p. 91 a od RD č.p. 154 po RD č.p. 137 _ myšleno po konce úprav komunikace.

Bude-li to vyžadovat situace, dojde rovněž k přeložení rozvaděče HVRA65. Bude využito stávající skříň i vystrojení.

Umožní-li to situace, bude překládka kolem RD č.p. 91 realizována jako stranová _ tzn. bez přerušení provozu.

Pod pojízdnými plochami budou prvky spol. CETIN vedeny v ochranných trubkách PE 110mm, resp. TK1. K těmto chráničkám budou připořádány rezervní chráničky PE 110mm.

Kabelové spojky budou umístěny v nepojízdných plochách a budou, společně s konci kabelových chrániček, opatřeny detekčními markery miniBall.

2.3 Popis tras

viz. přiložené podklady

VVN: ne

El. trakce: ne

Vodní toky: ne

2.4 Použitá technologie:

Mini Markér Ball

PE110

TK1

XAGA

PFLE 0,6

2.5 Použité předpisy:

TPP 2001-1 (TP 69a) - Výstavba přístupových sítí -

Metalické kabely (část I.)

TPP 2001-2 (TP 69b) - Výstavba přístupových sítí -

Metalické kabely (část II.)

TPP 2001-3 (TP 69c) - Výstavba přístupových sítí -

Metalické kabely (část III.)

TA 10 (I-III.) - Výstavba nadzemních sítí

ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 334050 - Podzemní sdělovací vedení

ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení

Výkop, položení a obsazení chráničky je v souladu s ČSN 73 6005

2.6 Koordinace:

2.7 Ostatní:

PD: NE

ÚR: NE _ zajistí stavebník.

VBŘ: ANO

GEO: ANO

SoUZ: NE

PEW: ANO


Před vlastním zahájením prací je nutno zajistit PEW (přerušení metalických kabelů) - min. 40 dnů předem.

RZ je povinný oznámit zahájení výkopových prací a pozvat ke kontrole před záhozem výkopů PC a PTD.

CaTN je na přání zákazníka zpracován bez výkopových prací. Výkopy, kabelové lože, zához a úpravy povrchů provede investor stavby prostřednictvím svého zhotovitele zemních prací. V případě, že při výkopech stávající trasy dojde k poškození kabelů, bude nutné tyto kabely v celém úseku vyměnit a znovu naspojovat _ bude zhotovena okamžitá fotodokumentace vč. zápisů do stav. deníku, aby se předešlo pozdějším sporům.

Měření:


MK = před provedením překládky bude na metalických kabelech provedeno kontrolní stejnosměrné měření vybraných párů (cca 10%). Po provedení překládky bude provedeno standardní měření na celém profilu kabelů.

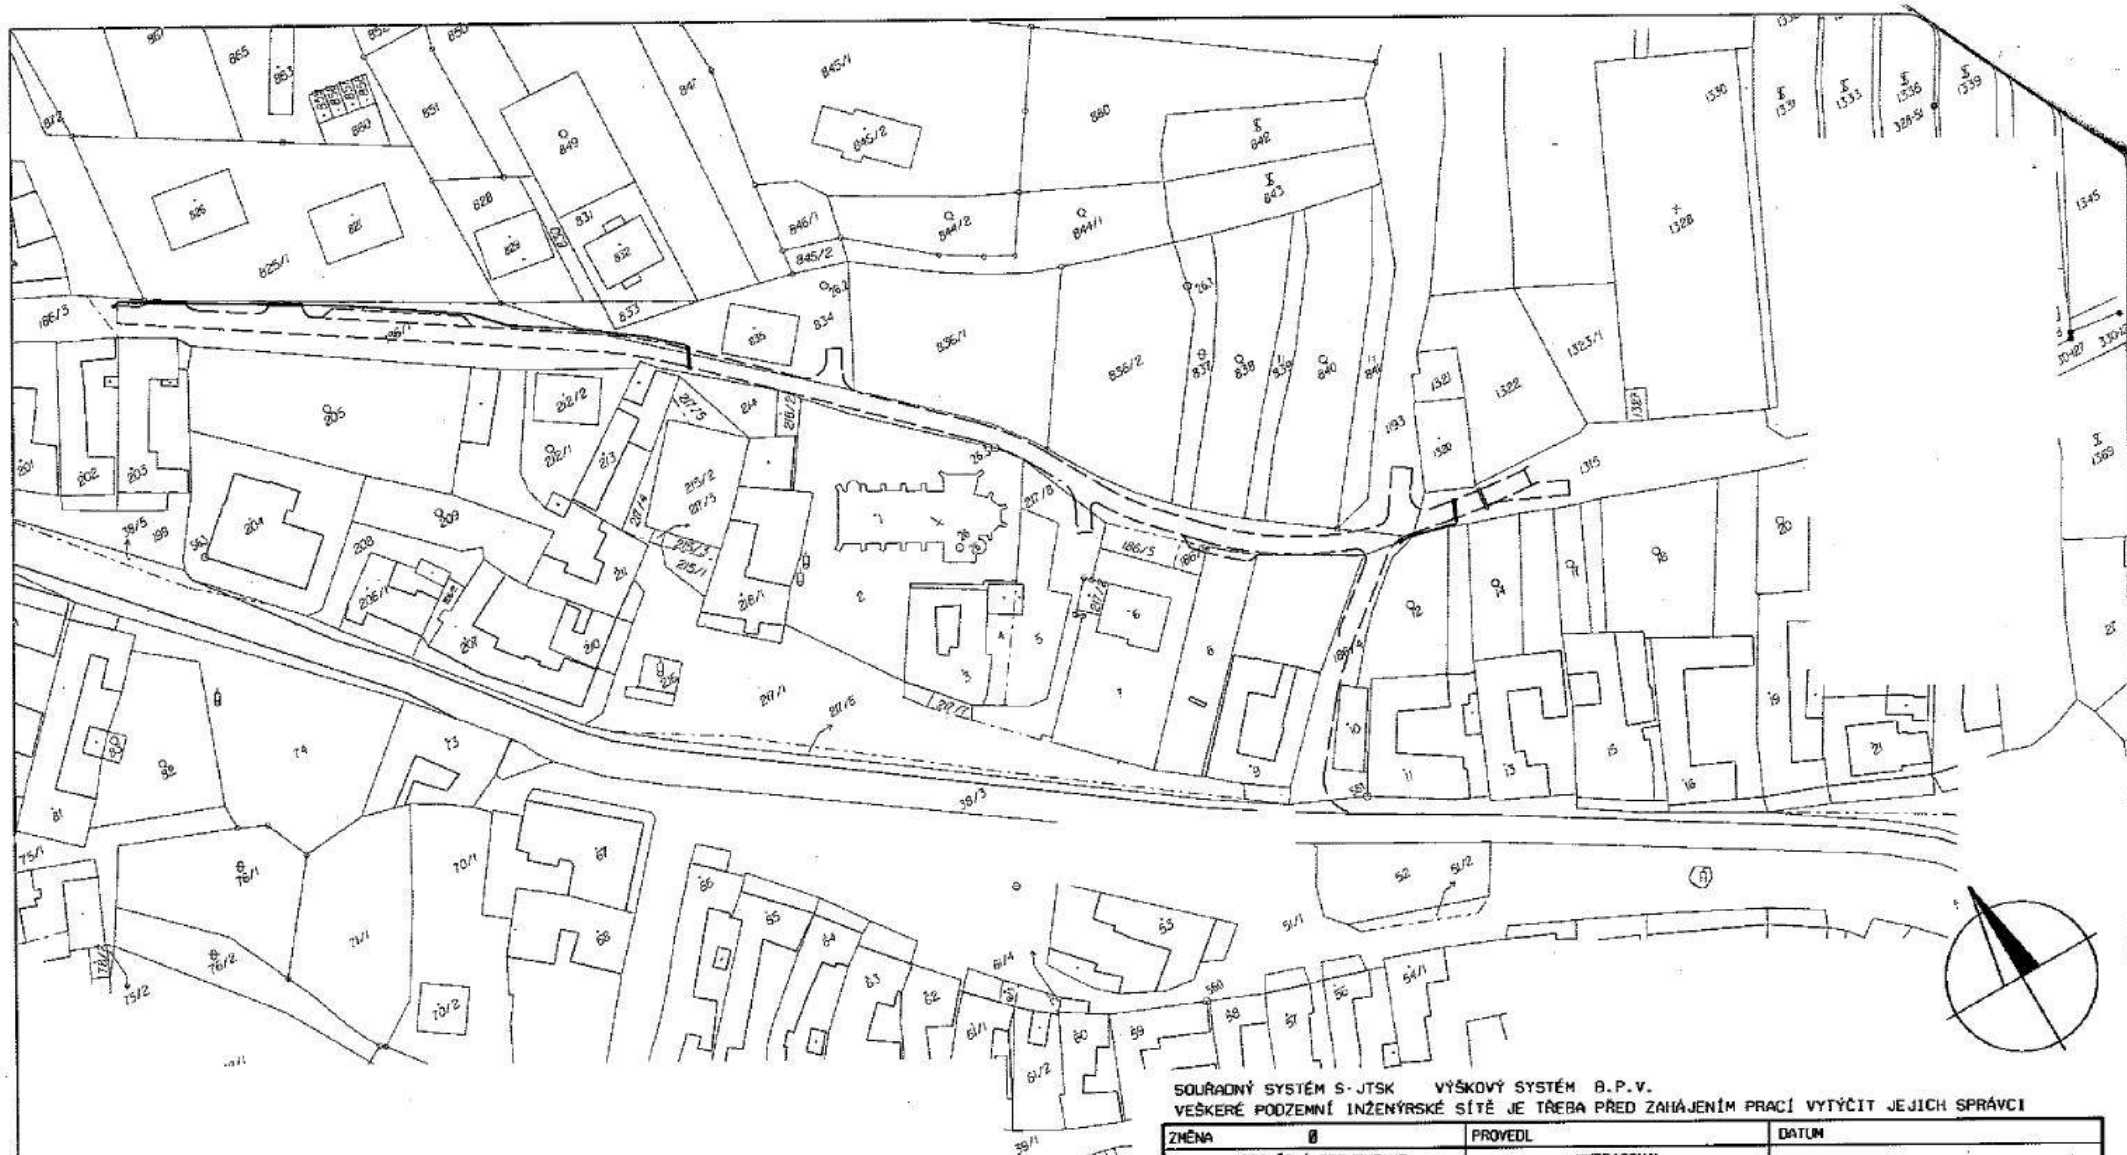


SOUŘADNÝ SYSTÉM S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.
 VEŠKERÉ PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JE TŘEBA PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ VYTÝČIT JEJICH SPRÁVCI


ZMĚNA	0	PROVEDL	DATUM
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. LEBOR PIVNÍČKA	VYPRACOVAL	MIROSLAVA ZEDNÍKOVÁ
INVESTOR	MĚSTO ZNOJMO		
AKCE	MÍSTNÍ KOMUNIKACE - TRASA "C" - "D" - 2. ČÁST KONICE SO PŘELOŽKA KEBELŮ SEK		
PRÍLOHA	ZÁKRES DO KN		
			SILNIČNÍ A MOSTNÍ INŽENÝRSTVÍ S.R.O. RUDOLFEKÉHO 25, 669 02 ZNOJMO TEL/FAX: 515 268 839, M: 603 325 894 IČ: 27699927 DIČ: CZ27699927
		KRAJ	JIHOHMORAVSKÝ
		DATUM	LEDEN 2017
		STUPEŇ	DŮR
		FORMÁT	2 A4
		MĚŘÍTKO	1:1000
		ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO PŘE

04

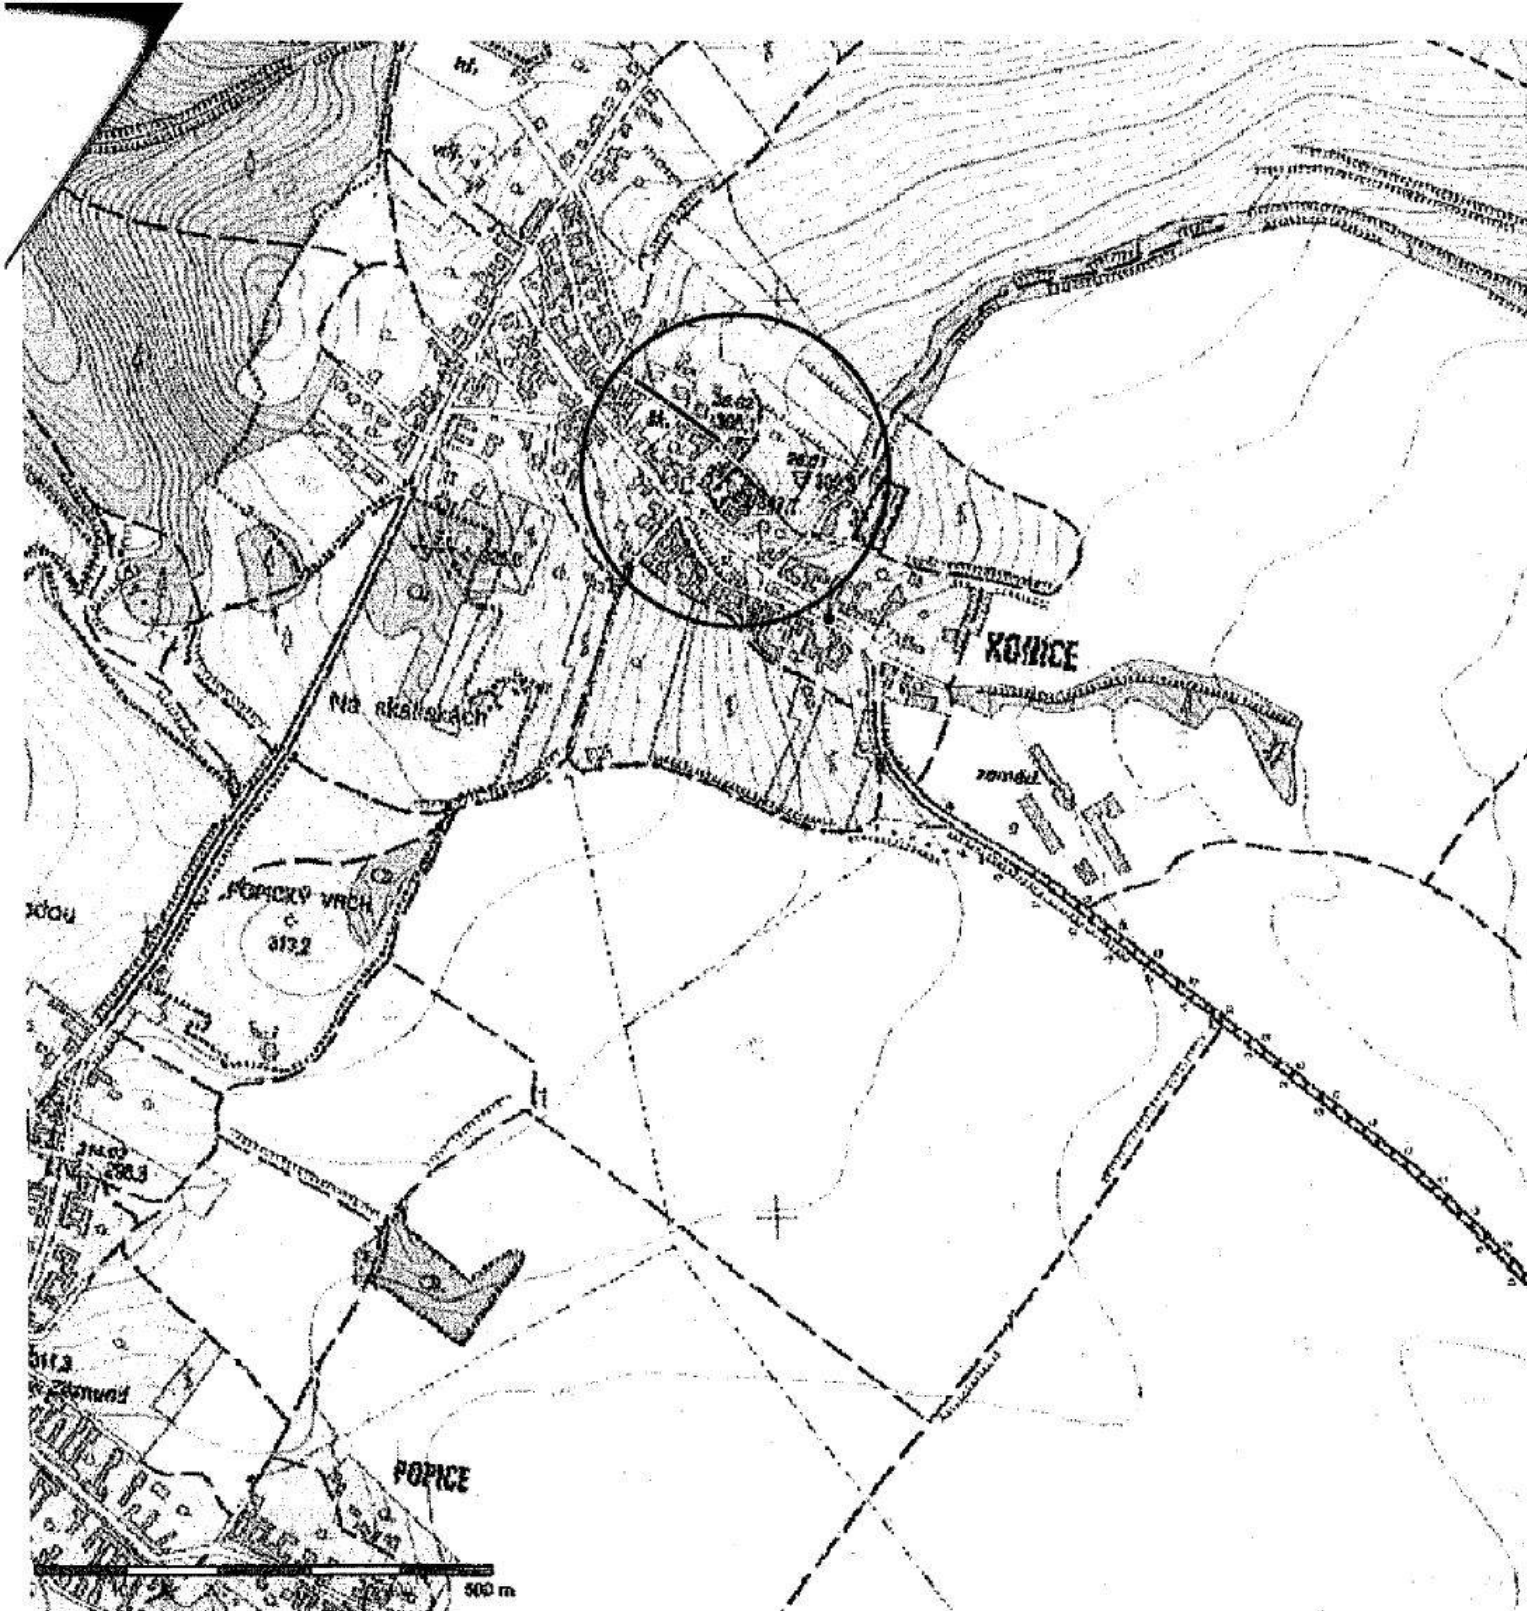



ZMĚNA	0	PROVEDL	DATUM
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
ING. LIBOR PIVNÍČKA		MIROSLAVA ZEDNÍKOVÁ	
INVESTOR	MĚSTO ZNOJMO		
AKCE	MÍSTNÍ KOMUNIKACE - TRASA 'C' + 'D' - 2. ČÁST, PŘELOŽKA KEBELŮ SEK KONICE		
PŘÍLOHA	PŘEHLEDNÁ SITUACE		
			SILNIČNÍ A MOSTNÍ INŽENÝRSTVÍ s.r.o. RUDOLECKÉHO 25, 669 02 ZNOJMO TEL/FAX: 515 260 839 M: 603 325 894 IČ: 27699927 DIČ: CZ27699927
			KRAJ JIHOHRANSKÝ
			DATUM LEDEN 2017
			STUPEŇ DŮR
			FORMÁT 1 A4
			MĚŘITKO 1:8000
			ČÍSLO PŘÍLOHY ČÍSLO PARÉ
			02

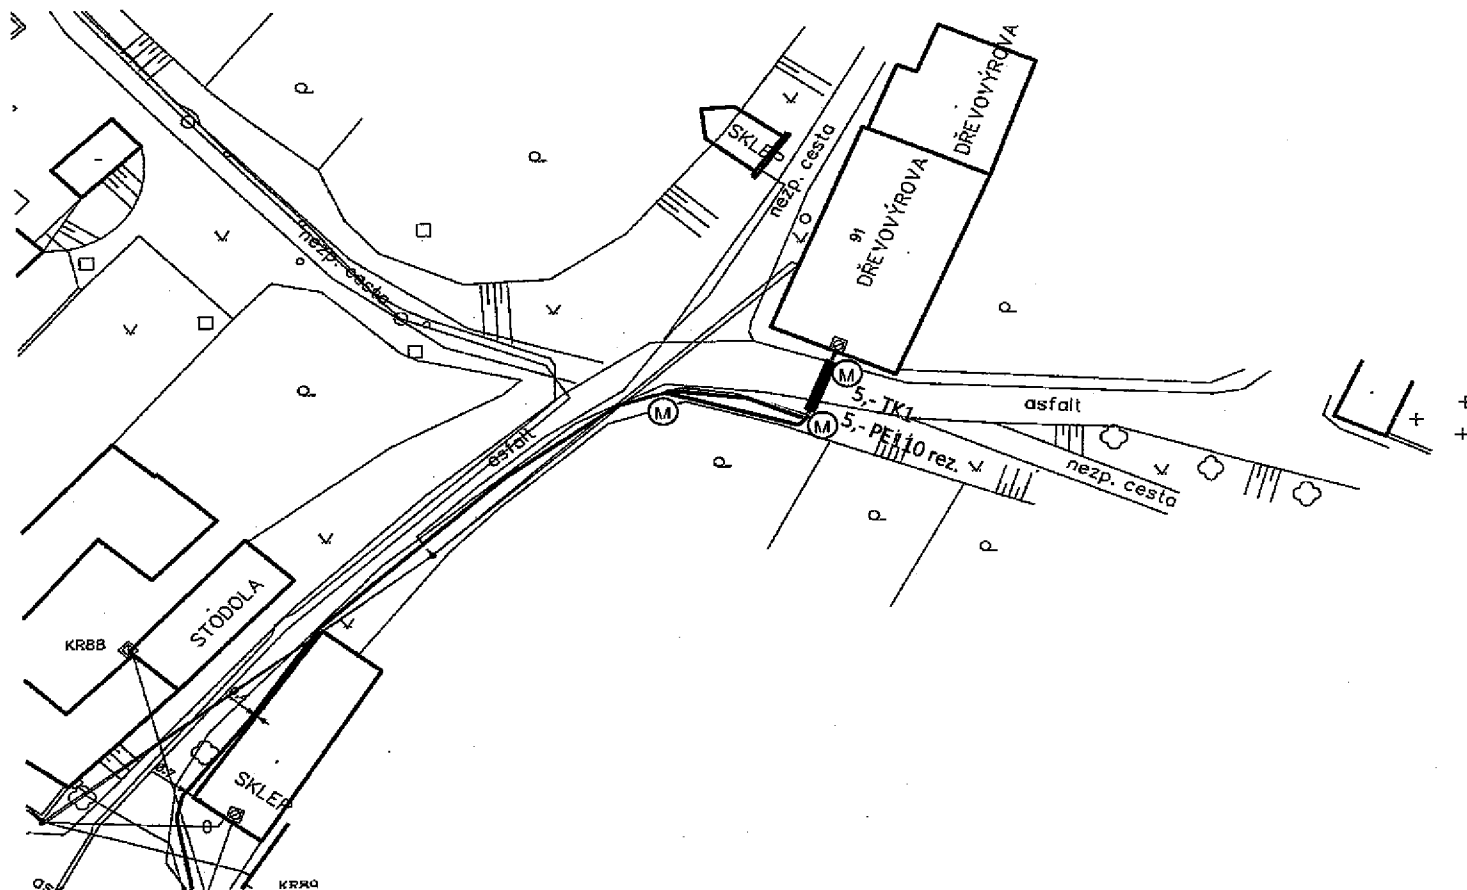

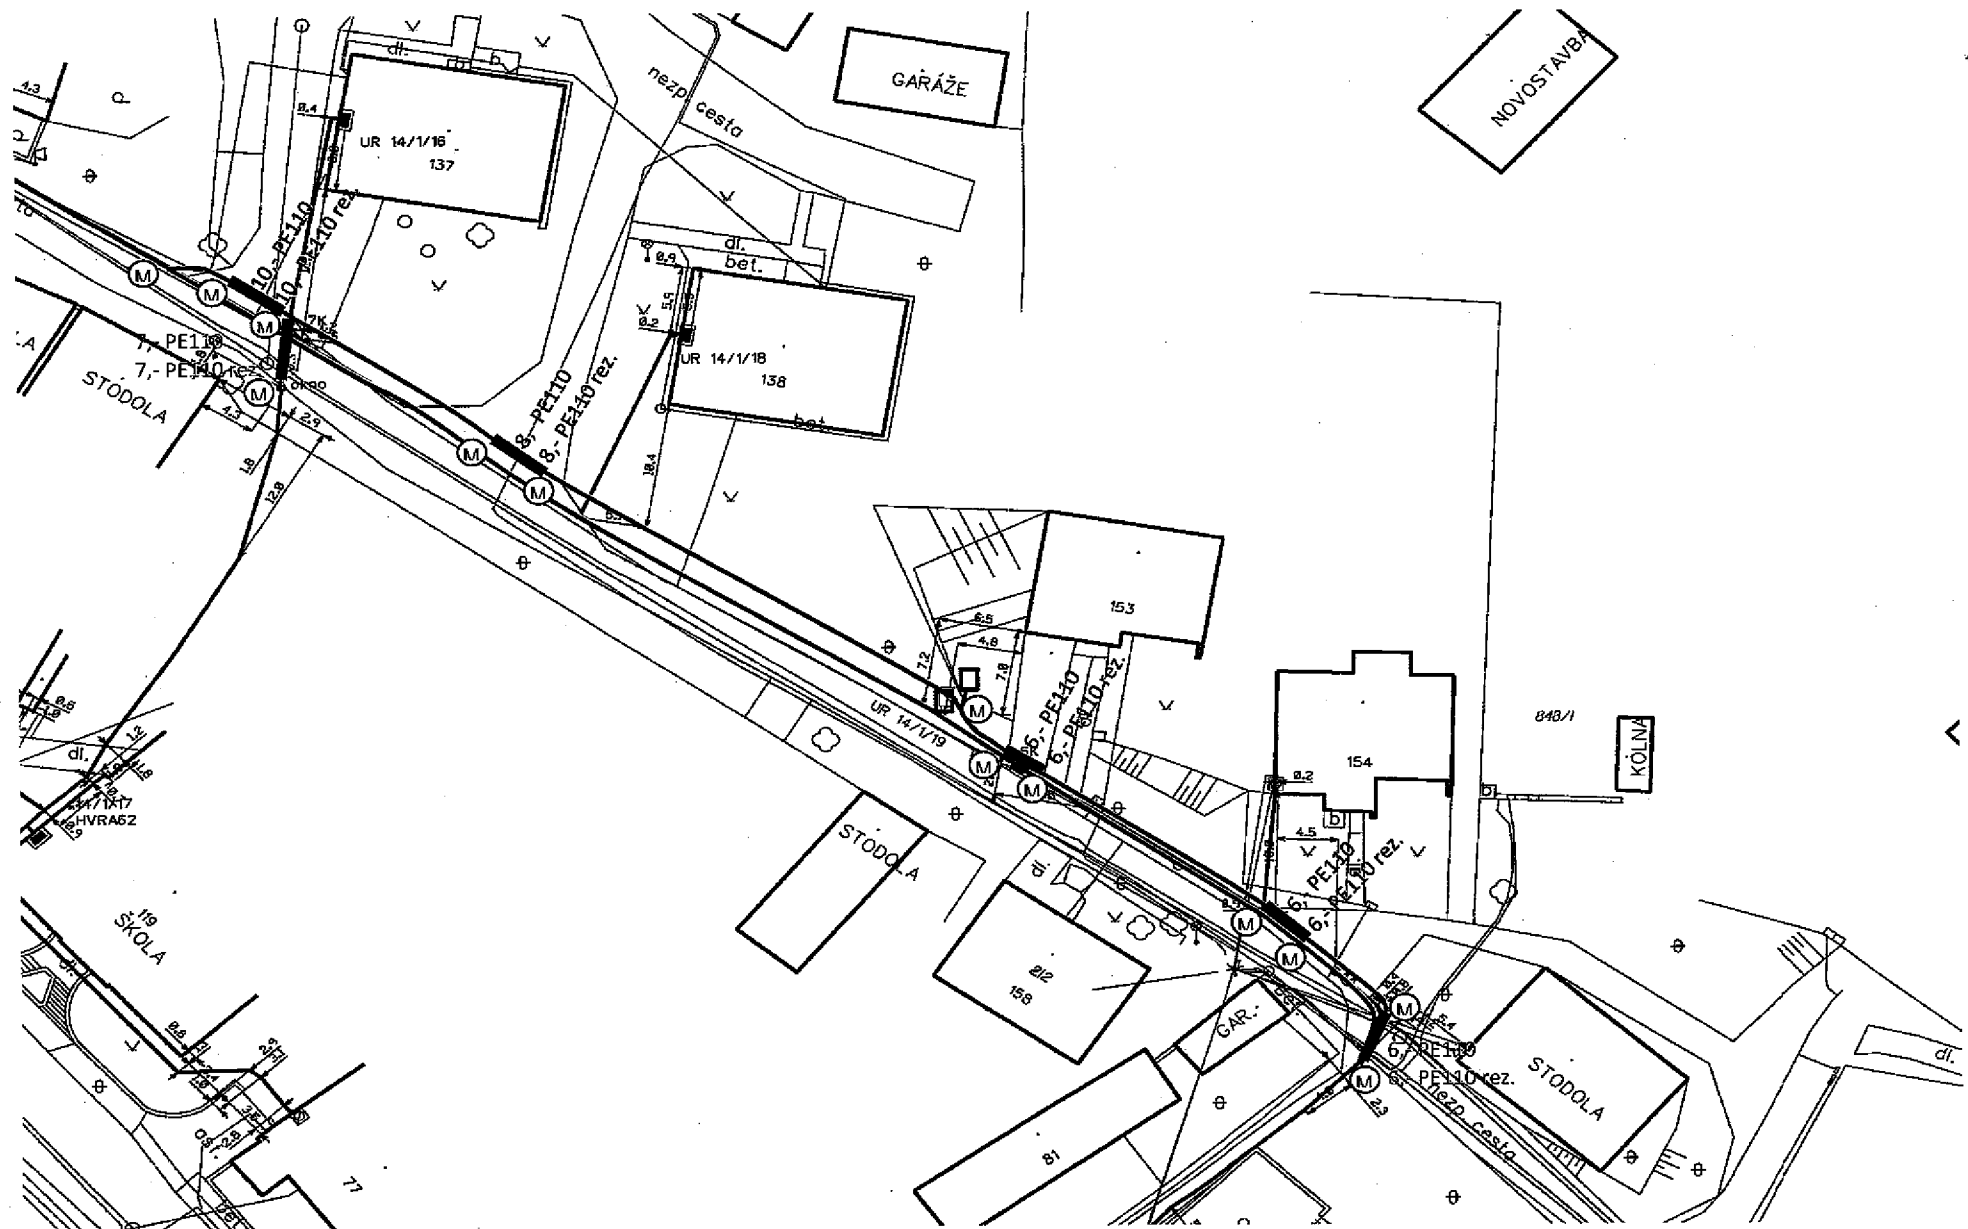


68203/17/0016 VPIC Znojmo Konice MK trasa C,D

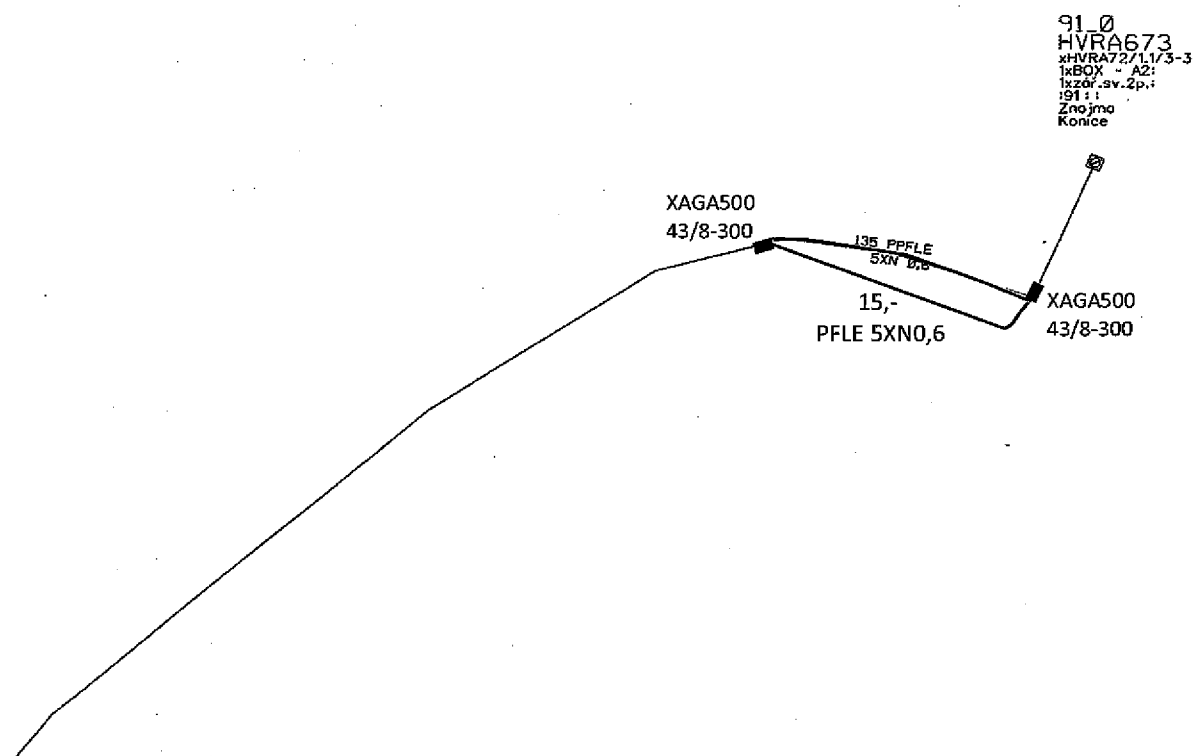

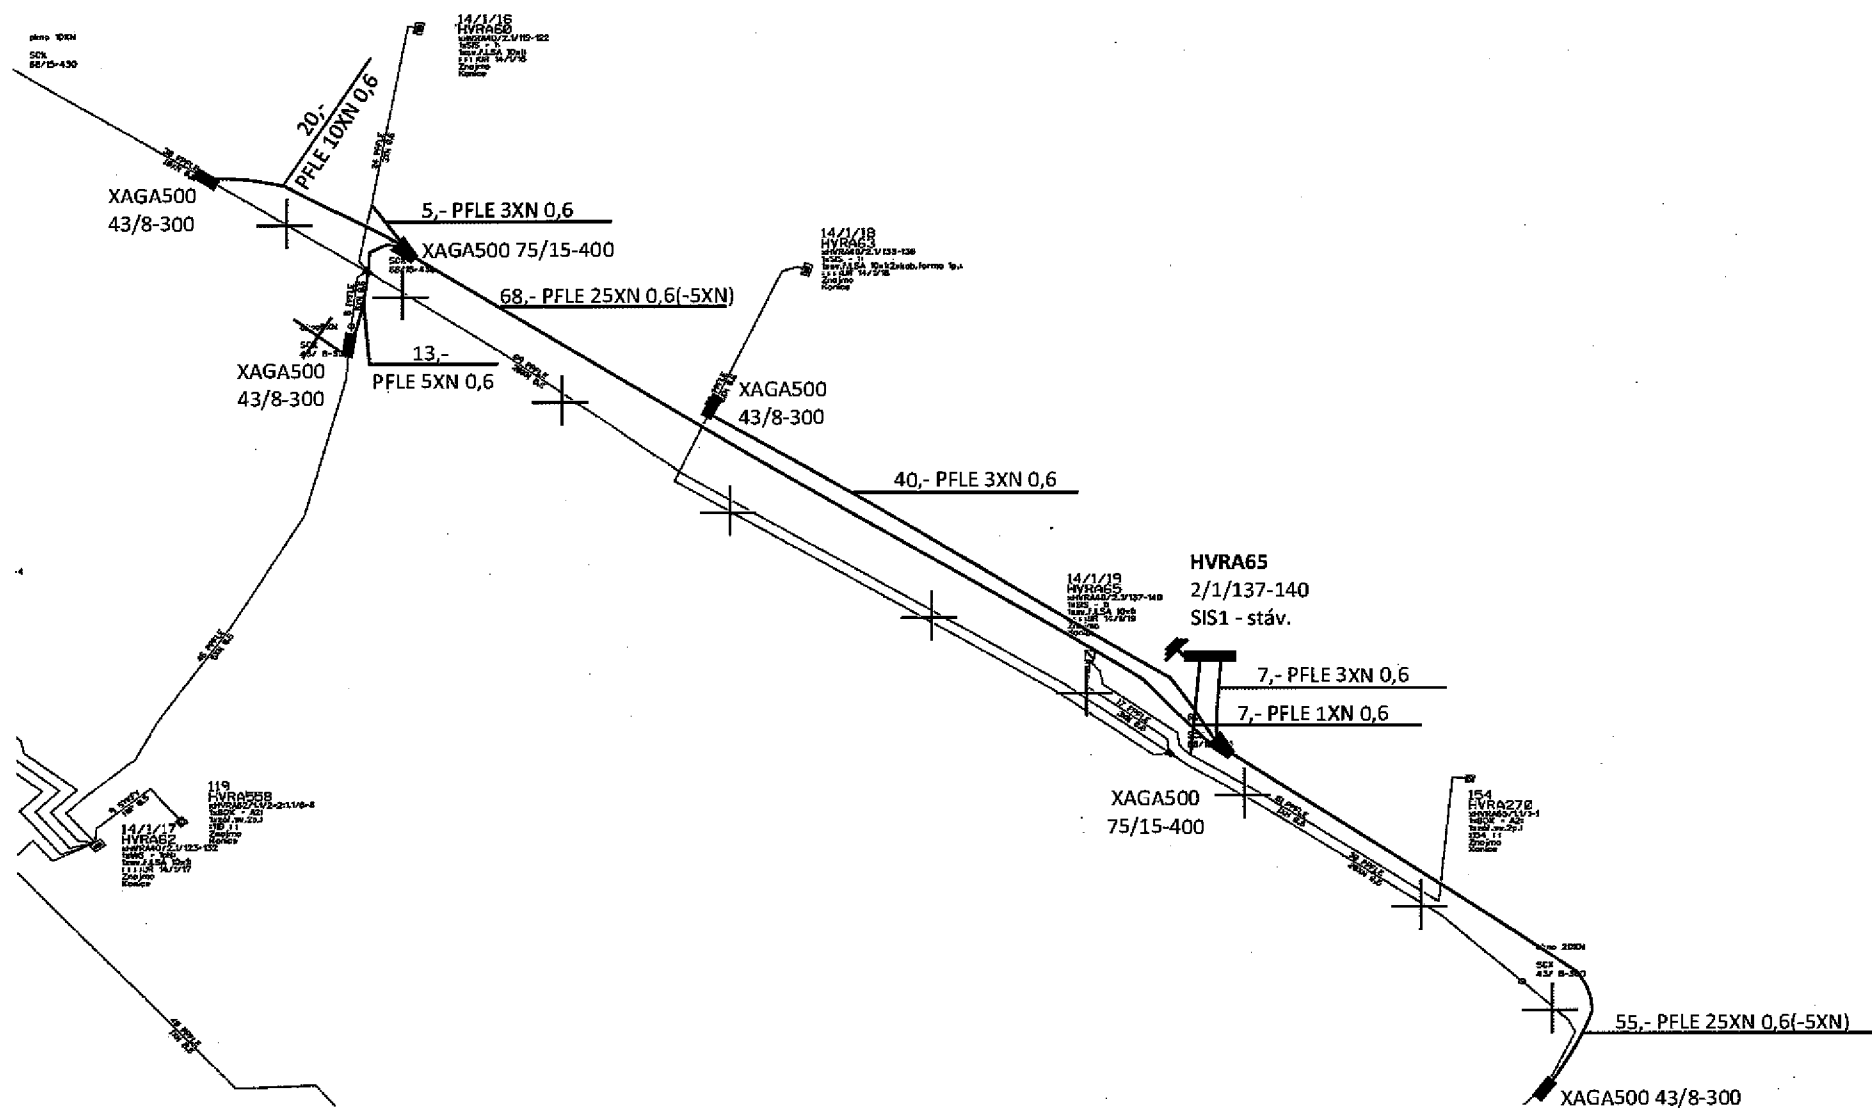

68203/17/0016 VPIC Znojmo Konice MK trasa C,D

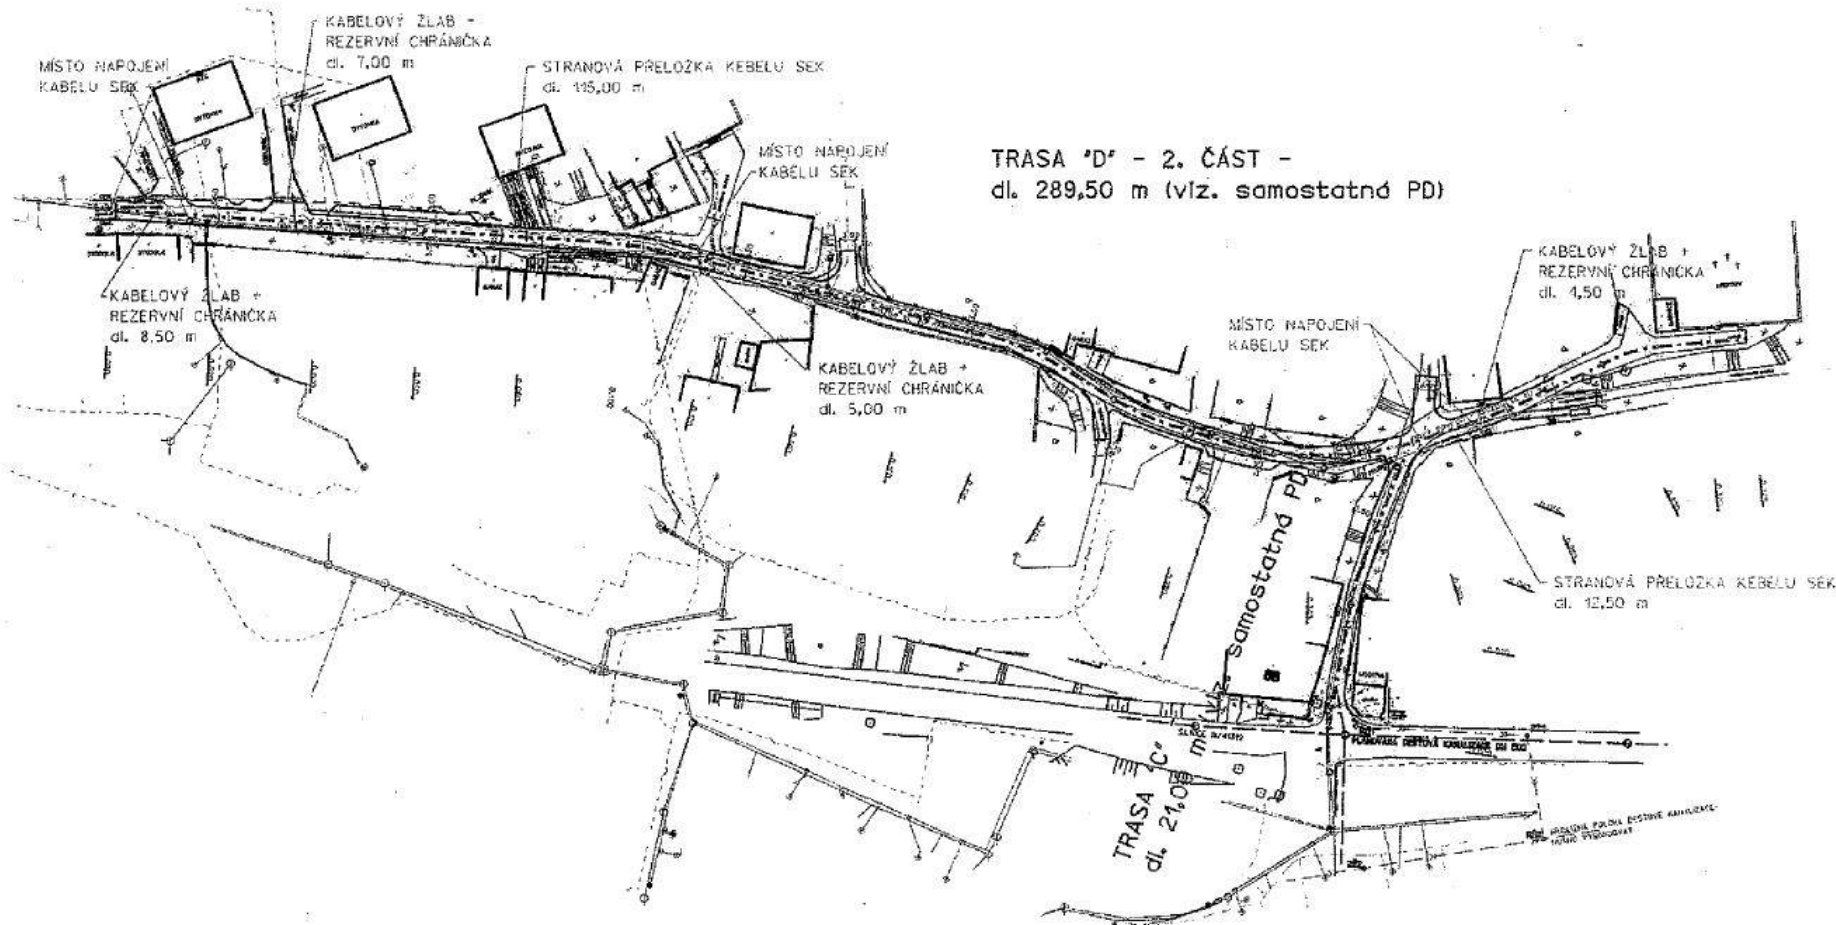

TRASA 'D' - 2. ČÁST -
dl. 289,50 m (viz. samostatná PD)

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ KABEL SEK
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ NN
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD
- ===== OBRUBA 100/15/15 - PŘEVÝŠENÍ 50 mm
- ===== OBRUBA 100/10/25 - ZAPUŠTĚNÁ
- ===== OBRUBA 100/15/25 - PŘEVÝŠENÍ 120 mm

SOUŘADNÝ SYSTÉM S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM 6.p.v.
VŠEČERÉ PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JE TREBA PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ VYTÝČIT JEJICH SPRÁVCI

ZMĚNA	0	PROVEDL	DATUM
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. LIBOR PAVČKA	VYPRACOVAL	MROSLAVA ZEDNÍKOVÁ
INVESTOR	MĚSTO ZNOJMO		
AKCE	MÍSTNÍ KOMUNIKACE - TRASA 'C' + 'D' - 2. ČÁST, PŘELOŽKA KABELU SEK KONICE		
PŘÍLOHA	SITUACE		
			03

SILNIČNÍ A MOSTNÍ INŽENÝRSTVÍ s.r.o.
RUDOLFEKÉHO 25, 669 02 ZNOJMO
TEL/FAX: 515 260 839 M: 603 325 894
IK: 27699927 DIČ: CZ27699927

KRAJ JIHOVÝSKÝ
DATUM LEDEN 2017
STUPEŇ DŮR
FORMÁT A4
MĚŘÍTKO 1:1000

ČÍSLO PŘÍLOHY ČÍSLO PŘE

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP - Morava - VEG - STAND. - 2017.03

Položková

databáze: 2017.03

Název stavby: 68203/17/0016 VPIC Znojmo Konice MK trasa C,D_celkem

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: Vegacom a.s., [REDACTED]

KPO: JMO

HOST: Znojmo

VUJ: Konice

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	4 887,83 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	9 051,87 Kč
MONTÁŽ	39 012,88 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	10 905,22 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 851,45 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	4 283,14 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	161,95 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	41 398,88 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 111 553,22 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 100 530,80 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 11 022,42 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 887,83 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	91.00 m	1 348,62 Kč
952367	S	Pokládka žlabů TK1	5.00 m	296,25 Kč
956266	S	Rýha bez výkopových prací, bez zřízení kabelového lože	150.00 m	7 407,00 Kč
MONTÁŽ				
955093	S	Demontáž objektu samost. SIS do 50 čtyř.	1.00 ks	740,58 Kč
955029	S	Demontáž úložných kabelů do 15 XN	32.00 m	474,24 Kč
952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	14.00 ks	1 797,18 Kč
952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	45.00 ks	1 333,35 Kč

952644	S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	33.00 ks	651,75 Kč
952643	S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	7.00 ks	483,91 Kč
952647	S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	7.00 ks	898,59 Kč
954999	S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	48.00 ks	948,00 Kč
955000	S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	40.00 ks	987,60 Kč
955299	S	Montáž objektu samost. SIS do 50 čtyřek	1.00 ks	851,18 Kč
955268	S	Montáž podzemní tratě síťové metalické rozpočtová mín. rezerva	1.00 ks	6 200,00 Kč
955282	S	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	2.00 ks	2 764,84 Kč
955281	S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	6.00 ks	5 628,42 Kč
954990	S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	112.00 m	1 880,48 Kč
954991	S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	123.00 m	2 551,02 Kč
955303	S	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	900,55 Kč
955298	S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	4.00 ks	79,00 Kč
955259	S	Ukončení kabelu v rozvaděči	2.00 ks	572,72 Kč
958469	S	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	3 720,00 Kč
náklady na kolaudaci				
955630	S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	2.00 ks	1 761,60 Kč
958556	S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 221,74 Kč
955066	S	Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř.	1.00 ks	651,72 Kč
955081	S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	4.00 ks	55,32 Kč
955083	S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	2.00 ks	237,00 Kč
955097	S	Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	622,09 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE				
955198	S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	5 159,38 Kč
956286	S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	50.00 m	1 055,50 Kč
956285	S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	4 690,34 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	1 851,45 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
954830		Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene náhrada za VBř odhadovaná	1.00 ks	500,00 Kč
Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.				
955315		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 110,66 Kč
958085		Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	1 672,48 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE				
955204	S	Zrušení převodu v rozvaděci - 1.pár	1.00 ks	137,26 Kč
955205	S	Zrušení převodu v rozvaděci - další pár	1.00 ks	24,69 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				

303918	S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	150.00 ks	5 496,00 Kč
305833	S	Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m	3.00 kg	143,28 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	150.00 m	639,00 Kč
300118	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,6	20.00 m	908,40 Kč
300120	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,6	123.00 m	12 100,74 Kč
300116	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,6	47.00 m	990,76 Kč
300117	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,6	28.00 m	796,60 Kč
302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball	16.00 ks	3 789,12 Kč
312425	S	Modul konektor. 9700-10P	18.00 ks	399,96 Kč
309931	S	Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m	25.00 kg	1 040,25 Kč
305338	S	Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1	10.00 ks	477,60 Kč
320312	S	Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	4.00 ks	596,92 Kč
312863	S	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ	6.00 ks	3 146,58 Kč
312889	S	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	2.00 ks	1 461,88 Kč
303501	S	Spojka plastová 110/94 mm	6.00 ks	201,00 Kč
309992	S	Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm	1.00 ks	47,24 Kč
302655	S	Trubka PE 110/3,5/6000mm	16.00 ks	7 912,96 Kč
303465	S	Víčko plastové trubky 110/100 mm	14.00 ks	285,88 Kč
303222	S	Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35	2.00 ks	179,66 Kč
305195	S	Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1	5.00 ks	785,05 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267	S	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	10.00 ks	0,00 Kč
314473	S	Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY)	3.00 m	0,00 Kč

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ Z ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623

Zastoupená [REDAKCE], specialistou pro výstavbu sítě dle pověření

na straně jedné

(dále jen „Nabyvatel“)

a

IČ:, DIČ:

se sídlem

zapsaná v obchodním rejstříku, odd., vložce

zastoupena jednatelem

na straně druhé

(dále jen „Převodce“)

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby („dále jen „tato dohoda“).

čl. I.

Převodce je na základě rozhodnutí o umístění stavby „.....“, kteréžto bylo vydáno dne , (kým) pod čj. a nabylo právní moci dne (dále jen „Rozhodnutí o umístění stavby“) oprávněn k umístění (dále jen „Stavba“/ event. „Stavební objekt“).

Předmětem převodu jsou některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby a to právo k umístění Stavby (event. „Stavebního objektu“) za podmínek v citovaném rozhodnutí stanovených, a dále s ním související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby (event. „Stavebního objektu“), tak jak jsou stanoveny v Rozhodnutí o umístění stavby.

čl. II.

Převodce ke dni podpisu této dohody převádí na Nabyvatele některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to toliko právo k umístění Stavby (event. „Stavebního objektu“) za podmínek v Rozhodnutí

o umístění stavby stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto Rozhodnutí o umístění stavby stanoveny.

čl. III.

Převodce a Nabyvatel prohlašují, že si celý text této dohody pozorně přečetli, plně mu rozumějí a bezvýhradně s ním souhlasí. Připojením svých vlastnoručních podpisů stvrzují, že text této dohody věrně vyjadřuje jejich pravou, vážnou a svobodnou vůli a že tato dohoda není uzavírána za nápadně nevýhodných podmínek pro kteréhokoliv z nich.

čl. IV.

- (1) Tato dohoda byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží Převodce a po jednom Nabyvatel.
- (2) Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Převodcem a Nabyvatelem.

V Brně dne

V dne

za společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Specialista pro výstavbu sítě
