

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004741

Číslo smlouvy zhotovitele: 2022/0430

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: „Stavba D1 01171 MÚK Kývalka – Brno západ, mosty D1-219, D1-220, D1-222 – DUSP + IČ vč. MPV“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944
zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
vedoucí společnosti

Link projekt s.r.o.

se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno
IČO: 27678032
DIČ: CZ27678032
zápis v obchodním rejstříku: OR u Kraiského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304
zastoupen:
společník

GEOtest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699
zastoupen:

společník

tvořící společnost nazvanou: **HBH / LINK / GEOtest**

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - zpracování projektové dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení (DUSP),
 - výkon inženýrské činnosti (IČ) k zajištění společného povolení
 - příprava pro MPVPodrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764, uzavřenou dne 23.9.2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
10 401 100,00	2 184 231,00	12 585 331,00

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří přílohy této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: na základě výzvy objednatele

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Koncept DUSP	do 5 měsíců od zahájení prací a ne dříve než do 2 měsíců od předání konceptu podrobného GTP pro mosty
Čistopis DUSP	do 1 měsíce od projednání všech připomínek Objednatele a rozhodnutí Objednatele o způsobu jejich zpracování
IČ k DUSP	- podání úplné žádosti o vydání společného povolení do 3 měsíců po odevzdání čistopisu DUSP
Majetkoprávní příprava (MPV)	- zahájení po odevzdání čistopisu DUSP - dokončení do 4 měsíců od nabytí právní moci společného povolení
Aktualizace biologického průzkumu	Do 8 měsíců od zahájení prací

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihomoravský kraj

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: viz. příloha č. 1. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nejsou stanoveny
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).
6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: ŘSD ČR, Závod Brno, Šumavská 31, 602 00 Brno.
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele
za zhotovitele
8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: viz. příloha č. 1, které zhotovitel objednateli předá v termínu: viz. příloha č. 1.
9. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně čteně prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé:
 - a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a

- b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
- c) k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy, zejména pak, že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu písm. a) až b). Dozví-li se zhotovitel o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen objednatele okamžitě informovat. Jestliže nastane střet zájmů, musí se smluvní strany v dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení takového střetu.
10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR Závod Brno

adresa: Šumavská 31, 602 00 Brno

k rukám:

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

e-mail:

k rukám:

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Nepoužije se,
 3. Soupis prací
 4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Předávací protokol
 7. Společné čestné prohlášení
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.07.07
10:23:21 +02'00'

Podrobný popis předmětu plnění**Předmět plnění**

Předmětem plnění zakázky je zpracování projektové dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení (dále jen DUSP) dle přílohy č. 11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, výkon inženýrské činnosti (IČ) k vydání Společného povolení (včetně nabytí právní moci) a přípravy pro majetkoprávní vypořádání (viz část B v soupisu prací k DUSP a majetkoprávní projednání pro mosty D1-219, D1-220 a D1-222.

Projektová dokumentace DUSP bude realizována v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnici, ČSN, TKP, SPK a TP a dle podmínek a požadavků Objednatele.

Technické podmínky jsou veřejně dostupné na stránkách www.pjpk.cz.

Dokumentace DUSP bude zpracována včetně přílehlých úseků dálnice a stavebních objektů dotčených výstavbou mostů.

Úseky dálnice dotčené výstavbou mostů (viz Přílohy - situace mostů):

- pro most D1-219: km 184,150 – km 184,250
- pro most D1-220: km 185,707 – km 185,775
- pro most D1-222: km 186,680 – km 186,750

Seznam dotčených stavebních objektů:

- pro most D1-219: SO 003, SO 101, SO 116, SO 151, SO 171, SO 201, SO 301, SO 401, SO 451, SO 49x
- pro most D1-220: SO 004, SO 036, SO 037, SO 101, SO 122, SO 134, SO 135, SO 202, SO 251, SO 252, SO 302, SO 330, SO 331, SO 341, SO 432, SO 435, SO 443, SO 451, SO 461, SO 462, SO 521, SO 760, SO 761
- pro most D1-222: SO 011, SO 101, SO 141, SO 144, SO 204, SO 303, SO 322, SO 362, SO 451, SO 456, SO 49x, SO 761, SO 763, SO 782

Zhotovitel zajistí vzájemnou koordinaci řešených mostů v oblastech DIO, POV aj.

Zhotovitel zajistí koordinaci s dotčenými stavbami v území (D1 rozšíření stavba D1 01171, obchvat Bosonoh, MÚK Troubsko aj.).


POV bude zpracován pro realizaci každého mostu samostatně a variantně pro společnou realizaci všech mostů.

Položka Plán BOZP v sobě zahrnuje i činnost koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby, který je odpovědný za zpracování plánu BOZP ve fázi přípravy stavby dle metodiky uvedené v příloze č. 6 k NV 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dále dle vnitřních předpisů Zadavatele. Zejména dle bezpečnostních standardů uvedených v příloze č. 6 Směrnice GR č. 7/2008 v aktuálním znění.

V rámci zakázky bude:

- zpracovaná aktualizace biologického průzkumu pro stavbu rozšíření dálnice D101171 MÚK Kývalka – Brno západ.
- zpracovány podklady dle §67 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (ZOPK), včetně žádosti o stanovisko dle § 82a ZOPK pro potřeby inženýrské činnosti pro stavbu rozšíření dálnice D101171 MÚK Kývalka – Brno západ a pro jednotlivé mosty D1-219, D1-220 a D1-222.

V rámci návrhu mostu D1 – 222 upozorňujeme na problematický pozemek p.č. 1283/1 v k.ú. Troubsko, na kterém jsou na hranici s pozemkem ŘSD p.č. 1479 v k.ú. Troubsko (částečně i na pozemku ŘSD) postaveny plechové haly (viz situace z KN).

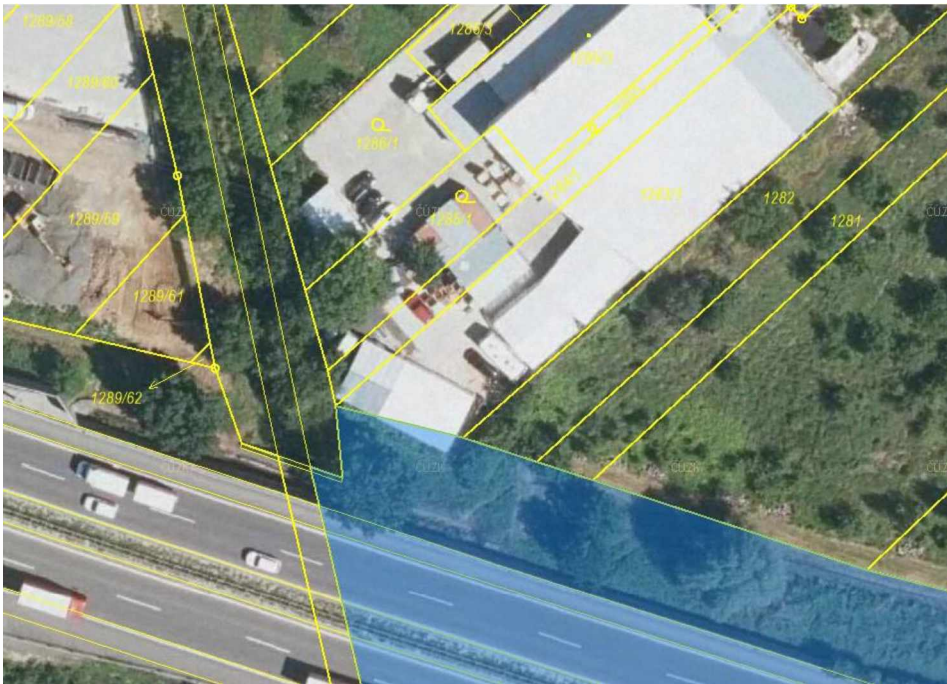

Požadavky na zpracování

1) Zhotovitel je povinen nejpozději do 1 měsíce od zahájení prací na předmětu díla svolat a uskutečnit první výrobní výbor, na kterém budou upřesněny požadavky Objednatele, stanoven postup realizace předmětu díla – harmonogram plnění a odsouhlasena koncepce technického řešení..

2) Zhotovitel je povinen svolávat výrobní výbory k průběžnému informování Objednatele o postupu prací a plnění stanoveného harmonogramu. Zároveň Objednatel poskytne maximální součinnost v rámci své účasti na jednáních svolaných Zhotovitelem ve vztahu k předmětu plnění.

3) Společně s čistopisem DUSP, Zhotovitel odevzdá projednaný přehledný protokol o vypořádání připomínek, které vzejdou z interní expertizy ŘSD ČR, s reakcí projektanta o způsobu projednání a vypořádání a rozhodnutí Objednatele o konečném zpracování připomínek. Protokol bude veden dle předepsaného vzoru předaného Objednatelem. Protokol o vypořádání připomínek bude také přiložen do dokladové části dokumentace.

4) Zhotovitel je ve fázi IČ k DUSP povinen využívat systém PPS (Postup přípravy staveb), což je on-line webová aplikace (nástroj) pro vytváření harmonogramů procesů staveb. Systém je dostupný na adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne Zhotoviteli Objednatel a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost v systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem a bezodkladně do systému PPS zadávat změny. Systém PPS umožňuje pracovníkům Objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.

Vedení údajů v systému PPS zahrnuje seznámení s metodikou, zajištění VPN, jednání s IT, prvotní zanesení dat, případně migrace, průběžné vedení IČ v PPS.

5) Zhotovitel je povinen ukládat do on-line aplikace MPV veškeré úkony související s majetkoprávní přípravou a to v okamžiku jejich uskutečnění. Přístup do on-line aplikace včetně návodu na její použití předá Objednatel nejpozději na prvním výrobním výboru týkající se výkonu IČ ke společnému povolení.

V případě, že Objednatel nebude mít on-line aplikaci k dispozici v termínu prvního kontrolního výboru týkajícího se výkonu IČ ke společnému povolení a přístup do aplikace zajistí dodatečně, Zhotovitel zajistí doplnění aktuálních dat do aplikace.

Termíny plnění

Zahájení prací: na pokyn Objednatele

Ukončení prací: dle dílčích termínů plnění veřejné zakázky

Dílčí termíny plnění veřejné zakázky:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Koncept DUSP	do 5 měsíců od zahájení prací a ne dříve než do 2 měsíců od předání konceptu podrobného GTP pro mosty
Čistopis DUSP	do 1 měsíce od projednání všech připomínek Objednatele a rozhodnutí Objednatele o způsobu jejich zpracování
IČ k DUSP	- podání úplné žádosti o vydání společného povolení do 3 měsíců po odevzdání čistopisu DUSP
Majetkoprávní příprava (MPV)	- zahájení po odevzdání čistopisu DUSP - dokončení do 4 měsíců od nabytí právní moci společného povolení
Aktualizace biologického průzkumu	Do 8 měsíců od zahájení prací

Podklady poskytované objednatelem:

- Podrobný GTP pro mosty D1-219, D1-220 a D1-222
- Koncept dokumentace DÚR stavby D1 01171 MÚK Kývalka – Brno západ, zpracovatel HBH Projekt spol. s r.o., 11/2020
- Biologický průzkum, 11/2019
- Migrační studie, 11/2019
- Účelový diagnostický průzkum mostních objektů, 04/2020

Místo předání plnění a adresa pro zaslání faktur:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 31, 602 00 Brno

Výstupy plnění

Pro každý most bude zpracována samostatná dokumentace vč. IČ v rozsahu:

- Koncept DUSP – 1x v listinné podobě + 2x elektronicky na datovém nosiči
- Čistopis DUSP – 3x v listinné podobě (1x s ověřením stavebních úřadů) + 3x elektronicky na datovém nosiči. Navíc 2x přehledná a koordinační situace.
- Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu C3 - 3x v listinné podobě + 3x elektronicky na datovém nosiči
- CD s otevřenými formáty dat dle datových předpisů 2x (CD/DVD)
- IČ k zajištění společného povolení
 - pravomocná společná povolení 2 x originál s doložkou o nabytí právní moci
 - stanoviska a vyjádření 1x originál, 1x kopie, 1x elektronicky na datovém nosiči budou dodány ke dni podání žádosti o společné povolení
- Majetkoprávní vypořádání
 - geodetická dokumentace, geometrické plány, výpisy z LV, smlouvy, průběžné dodání dle dohody se zástupcem objednatele, v počtu potřebném pro majetkoprávní úkony + 1x originál pro potřeby archivace Objednatele

Ustanovení k platbám a platebním podmínkám se doplňuje:

Popis části díla (služeb)	Výše fakturačního plnění
Odsouhlasení koncepce technického řešení DUSP	15 % z částky za DUSP
Koncept DUSP	60 % z částky za DUSP
Čistopis DUSP	25 % z částky za DUSP
Doklad, že byly osloveny všechny DOSS, jejichž stanovisko je vyžadováno	20 % z částky za IČ bez části B (MPV)
Podání úplné žádosti o Společné povolení ÚR+SP	60 % z částky za IČ bez části B (MPV)
Vydání společného povolení	10 % z částky za IČ bez části B (MPV)
Získání pravomocného společného povolení	10 % z částky za IČ bez části B (MPV)
Majetkoprávní vypořádání	30 % z částky za IČ části B (MPV) po odeslání návrhu smluv (kupní, nájemní, věcná břemena) na všechny vlastníky dle ZE 50 % z částky za IČ části B (MPV) po uzavření smluv (kupní, nájemní, věcná břemena) a příp. úplném návrhu na vyvlastnění na všechny vlastníky dle ZE 20 % z částky za IČ části B (MPV) po zajištění kompletního majetkoprávního vypořádání stavby (kupní a nájemní smlouvy, věcná břemena) v rozsahu dle ZE

Fakturace:

Fakturace bude provedena pro jednotlivé mosty samostatně. Přílohou faktur bude přehledná tabulka, která bude specifikovat průběh fakturace (rozdělení ceny na dosud fakturovanou, aktuálně fakturovanou částku a zbývající částku k fakturaci).

Přílohy:

Situace mostu D1-219

Situace mostu D1-220

Situace mostu D1-222

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost **HBH Projekt spol. s r.o.**

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

IČO: 44961944

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996

jako vedoucí společník společnosti: **HBH / LINK / GEOtest,**

jakožto zhotovitel služby „Stavba D1 01171 MÚK Kývalka – Brno západ, mosty D1-219, D1-220, D1-222 – DUSP + IČ vč. MPV“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
Arrano Group s.r.o.	IČO: 26792303 Střední novosadská 7/10 779 00 Olomouc	Koordinátor BOZP
GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář	IČO: 7974460 tř. Kosmonautů 1143/8b 779 00 Olomouc	Výkon zeměměřických činností

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **HBH Projekt spol. s r.o.**

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

IČO: 44961944

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996

jako vedoucí společník společnosti: **HBH / LINK / GEOTest,**

jakožto zhotovitel služby „Stavba D1 01171 MÚK Kývalka – Brno západ, mosty D1-219, D1-220, D1-222 – DUSP + IČ vč. MPV“, (dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „Stavba D1 01171 MÚK Kývalka – Brno západ, mosty D1-219, D1-220, D1-222 – DUSP + IČ vč. MPV“.

Funkce ¹	Příjmení ¹	Jméno ¹
Osoba provádějící koordinaci celého projektu - HIP akce		
Zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby		
Zodpovědný projektant v oboru pozemní stavby		
Zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce		
Zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb		
Zodpovědný projektant v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství		
Zodpovědný projektant v oboru geotechnika		
Osoba provádějící zeměměřické činnosti		
Osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí		
Hlavní koordinátor inženýrských činností		
Osoba zajišťující inženýrskou činnost		
Osoba poskytující právní poradenství		

1) Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764.

Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 03PT-004741 objednatele

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: [bude doplněno]

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: [bude doplněno]

Název související veřejné zakázky: [bude doplněno]

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]

(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
3. Objednatel uvádí, že:
 - a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
 - b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V [Praxe] dne _____

V [Praxe] dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]

VZOR

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004741

Číslo smlouvy zhotovitele: 2022/0430

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: Stavba D1 01171 MÚK Kývka – Brno západ, mosty D1-219, D1-220, D1-222 – DUSP + IČ vč. MPV

(dále jen „Smlouva“)

Společnost **HBH Projekt spol. s r.o.**

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

IČO: 44961944

Společnost **Link projekt s.r.o.**

se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno

IČO: 27678032

Společnost **GEOtest, a.s.**

se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

IČO: 46344942

jakožto dodavatelé **HBH / LINK / GEOtest,**

tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich subdodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
- c) k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy, zejména pak, že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu písm. a) až b). Dozví-li se zhotovitel o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen objednatele okamžitě informovat. Jestliže nastane střet zájmů, musí se smluvní strany v dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení takového střetu.

Digitálně podepsal:

Datum: 11.07.2022 10:07:40 +02:00

Digitálně podepsal

Datum: 2022.07.07

10:28:21 +02'00'
