

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00177
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030003508
Registr smluv: ANO

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. VPI/MJ/2022/00177**

mezi

CETIN a.s.

a

Město Náměšť nad Oslavou

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00177

SAP S/4 Hana: 8030003508

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená Janem Žďárským, Ředitelem divize Výstavby a údržby sítí, dle pověření ev.č.

PŘ/3386/2022

bankovní spojení:

číslo účtu:

datová schránka: qa7425t

(dále jen „CETIN“)

a

Město Náměšť nad Oslavou

Město Náměšť nad Oslavou

se sídlem Masarykovo nám. 104

IČO: 00289965

DIČ: CZ00289965

zastoupená panem Vladimírem Měrkou – starostou města

datová schránka: s72bqcj

(dále jen „Stavebník“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Náměšť nad Oslavou spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00177

SAP S/4 Hana: 8030003508

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 27.5.2022 vydané pod čj. 656028/22, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Náměšť n.O. TR oprava ul. Palackého**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickým) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00177
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030003508
Registr smluv: ANO

- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektu,
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však čtyři (4) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník se zavazuje, nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, jejíž vzor je uveden v Příloze č. 2 Smlouvy a převést na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky. Ve lhůtě dle předchozího odstavce je Stavebník povinen předat společnosti CETIN územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
- (c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 bodu(i) Smlouvy;

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00177

SAP S/4 Hana: 8030003508

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

(d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).

- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.
- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **2.816.261,- Kč** (slovy: dva miliony osm set šestnáct tisíc dvě stě šedesát jedna korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do tří (3) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00177
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030003508
Registr smluv: ANO

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníků Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „Faktura“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00177

SAP S/4 Hana: 8030003508

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

- (a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši **61.440,- Kč** (slovy: šedesát jedna tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy,
 - (b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.
- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních:

funkce: specialista pro výstavbu sítě - překládky SEK

e-mail:

ve věcech technických:

funkce: senior specialista pro výstavbu sítě

e-mail:

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Vladimír Měrka

funkce: starosta města

e-mail: :

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00177

SAP S/4 Hana: 8030003508

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

ve věcech technických:

funkce:

e-mail: †

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.
- 9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. Rozvazovací podmínka

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00177

SAP S/4 Hana: 8030003508

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00177

SAP S/4 Hana: 8030003508

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společností CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- (a) v listinné podobě;
- (b) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zaručený elektronický podpis**“);
- (c) e-mailovou zprávou opatřenou Zaručeným elektronickým podpisem;
- (d) e-mailovou zprávou zaslou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy, věta první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem (c) a (d).

12.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.

12.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

12.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

12.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.

12.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00177

SAP S/4 Hana: 8030003508

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

- § 557;
- § 1767 odst. 2;
- § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
- § 1743.

12.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.

12.10 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

12.11 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

12.12 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

12.13 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoliv souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.14 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.

12.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00177

SAP S/4 Hana: 8030003508

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

Příloha č. 2 - Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby – vzor

Doložka

Smlouva byla schválena Radou města Město Náměšť nad Oslavou na schůzi č. č.13/2022 dne 11.7.2022.

CETIN:

V Praze

Jan

Žďárský

Digitálně
podepsal Jan
Žďárský

Datum: 2022.07.19
10:13:25 +02'00'

CETIN a.s.

Jan Žďárský

Ředitel divize Výstavby a údržby sítí

Stavebník:

V Náměšti nad Oslavou

Vladimír Měrka

Digitálně podepsal Vladimír
Měrka
Datum: 2022.07.26 11:20:49
+02'00'

Město Náměšť nad Oslavou

Vladimír Měrka

starosta města

TECHNICKÁ ZPRÁVA CTN

VPIC Náměšť n.O. TR oprava ul. Palackého

CTN řeší situaci vyvolanou stavbou *OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V ULICI PALACKÉHO, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU.*

V místě stavby dojde ke kolizi s metalickým a optickým vedením SEK CETIN a.s. ve čtyřech úsecích.

První úsek je před telefonní ústřednou č.p.705 v rozsahu mezi domy č.p.251 a č.p.612. Jedná se o přeložení všech zde nacházejících se vedení SEK CETIN.

Druhý úsek směrem dolů od telefonní ústředny mezi č.p.660 a č.p.245. Jedná se o přeložení starší trasy metalického vedení mimo komunikaci.

Třetí úsek je mezi domy č.p.81 a č.p.83, jedná se o nový přechod křižovatky s ulicí Ant. Dvořáka.

Čtvrtý úsek je mezi č.p.140 a č.p.144, jedná se o přeložení vedení podél rekonstruované komunikace.

Vedení bude přeloženo do nových tras vedených dle projektu hlavní stavby.

PRVNÍ ÚSEK:

Přeložení metalických kabelů bude provedeno kabelovými vložkami položenými v nových trasách, mezi spojovacími 1 a 2. Dále bude nutné přeložit rozvaděč NANO67.

Přeložení optických kabelů bude provedeno odpojením kabelu z RSU, sfouknutím kabelu do spojovacího 2, propojení nových HDPE trubek v nových trasách, znovu zafouknutí do RSU a zakončení na ODF.

Popis řešení překládky metalických kabelů:

Kabel č.1 - DCKOPV5RP1,3+42DM0,9 – bude zrušen, nebude se překládat

Kabel č.2 - DCKOPV5RP1,3+42DM0,9 – bude zrušen, nebude se překládat

Kabel č.3 - EZE 50P 0,8 – kabelová vložka 25XN0,8 mezi spojovacími 1 a 2 položená v trase x

Kabel č.4 E 600P 0,5 – ve spojovací 1 přerušen a napojen na kabelové vložky 4b a 4c

Kabel č.4a - E150P0,5 – bude zrušen, nebude se překládat

Kabel č.4b - E300P0,5 – kabelová vložka 150XN0,6 mezi spojovacími 1 a 2 položená v trase

Kabel č.4c - E150P0,5 – kabelová vložka 75XN0,6 mezi spojovacími 1 a 2 položená v trase

Kabel č.5 - OPV50XN0,8 – bude zrušen bez náhrady

Kabel č.6 - E200P0,5 – bude zrušen, nebude se překládat

Kabel č.7 - EY20P0,5 – bude zrušen, nebude se překládat

Kabel č.8 - E200P0,6 – kabelová vložka 100XN0,6 mezi spojovacími 1 a 2 položená v trase

Kabel č.9 - OPV200P0,6 – bude zrušen, služba v NANO55 bude přepojena na vazbu z NANO217

Kabel č.10 - EY20P0,5 – bude zrušen, nebude se překládat

Kabel č.11 - OPV300P0,6 – kabelová vložka 150XN0,6 mezi spojovacími 1 a 2 položená v trase

Kabel č.12 - E10P0,5 – bude zrušen, nebude se překládat

Kabel č.13 - PPFLE50XN0,4 - kabelová vložka 50XN0,4 mezi spojovacími 1 a přeloženým NANO67 položená v trase A

Kabel č.14 - PPFLE150XN0,8 – kabelová vložka 150XN0,8 mezi spojovacími 1 a 2 položená v trase

Kabel č.15 - PPFLE150XN0,8 – kabelová vložka 150XN0,8 mezi spojovacími 1 a 2 položená v trase

Kabel č.16 - PPFLE100XN0,6 - kabelová vložka 100XN0,6 mezi spojovacími 1 a 2 položená v trase

Kabel č.17 - PPFLE50XN0,8 – kabelová vložka 50XN0,8 mezi spojovacími 1 a 2 položená v trase

Kabel č.18 - PPFLE50XN0,8 - kabelová vložka 50XN0,8 mezi spojovacími 1 a 2 položená v trase

Kabel č.19 - PPFLE400XN0,4 - kabelová vložka 400XN0,4 mezi spojovacími 1 a 2 položená v trase

Kabel č.20 - PPFLE400XN0,4 – kabelová vložka 400XN0,4 mezi spojovacími 1 a 2 položená v trase

Kabel č.21 - PPFLE600XN0,4 – kabelová vložka 600XN0,4 mezi spojovacími 1 a 2 položená v trase

Kabel č.22 – PPFLE50XN0,4 – kabelová vložka 50XN0,4 mezi přeloženým NANO67 a spojovacími 2

Kabel č.23 – PPFLE15XN0,4 – kabelová vložka 15XN0,4 mezi přeloženým NANO67 a spojovacími 2

Rozvaděč NANO67 bude přeložen do zeleného pásu mezi parkovací stání a vjezd do č.p.603. Přívod viz kabel č.13.

Odchody do č.p.229,230,251,601,620,603,522,612 budou přeloženy do nové trasy A.

Odchody do č.p.586,441,895 – kabelové vložky 3XN0,4 mezi přeloženým NANO67, trasou A do spojovacího 2, dále trasou B k jednotlivým KR.

Popis řešení překládky HDPE trubek a optických kabelů:

Trubka č.1 O/BB – prázdná, mezi spojovacími 1 a 2 bude v nové trase položena nová trubka O/BB a napojena na stávající.

Trubka č.2 C/BB – TS (4x7+3x10), OK 24f, 648 ELE 001, mikrokabel bude odpojen z RSU, sfouknut do spojovacího 2.

Mezi spojovacími 1 a 2 bude v nové trase položena nová trubka C/BB, do ní zafouknut nový TS (4x7+3x10), po propojení trubiček znovu zafouknut mikrokabel a zakončen na ODF v RSU. Rezerva kabelu v RSU je 31 m.

Trubka č.3 B – OK 20f, 648 EAA 001, optický kabel bude odpojen z RSU, sfouknut do spojovacího 2. Mezi spojovacími 1 a 2 bude v nové trase položena nová trubka O/B, do ní znovu zafouknut optický kabel a zakončen na ODF v RSU. Rezerva kabelu v RSU je 57 m.

Trubka č.4 Z – prázdná, mezi spojovacími 1 a 2 bude v nové trase položena nová trubka C/B a napojena na stávající.

Trubka č.5 C – prázdná, mezi spojovacími 1 a 2 bude v nové trase položena nová trubka C a napojena na stávající.

Trubka č.6 O – OK 24f, 648 016 003, optický kabel bude odpojen z RSU, sfouknut do spojovacího 2. Mezi spojovacími 1 a 2 bude v nové trase položena nová trubka O, do ní znovu zafouknut optický kabel a zakončen na ODF v RSU. Rezerva kabelu v RSU je 12 m.

Všechny překládané HDPE trubky budou položeny v nové trase B.

DRUHÝ ÚSEK

Zde se nachází dvě trasy SEK CETIN. Novější trasa vede blíže k domům a neměla by být stavbou dotčena. Starší trasa vede blíže k silnici a musí být přeložena. Jedná se o kabel č.24 E150P0,5 a kabel č.25 E15P0,5.

Kabel č.24 bude odkryt a bez přerušení přeložen k novější trase, blíže k domům.

Kabel č.25 bude odkryt a přeložen k novější trase až k místu, kde kříží ulici Palackého. Bude proveden nové křížení, nový překop komunikace a kabelová vložka 10XN0,6.

TŘETÍ ÚSEK

Metalické kabely, procházející křižovatkou ul. Palackého s ul. Ant. Dvořáka, bude třeba v důsledku rozšíření vozovky přeložit do nové trasy, samostatně křížící ulice Palackého a Ant. Dvořáka. Jedná se o kabely č.2, č.3, č.5, č.9 a č.10.

Kabel č.3 - EZE 50P 0,8 – kabelová vložka 25XN0,8 mezi spojovacími 3 a spojovacími 4.


Kabely č.2,5,9,10 budou zrušeny, nebudou se překládat.

ČTVRTÝ ÚSEK

Podél rekonstruované komunikace ulice Palackého mezi č.p.140 a č.p.144 prochází metalické kabely č.6, č.7,č.8, č.11, č.21, č.22, č.23.

Dále zde prochází dvě HDPE trubky O/BB a C/BB, z nichž C/BB je obsazena optickým kabelem 648 ELE 002.

Metalické kabely č.8, č.11, č.21, č.22, č.23 a HDPE trubky budou odkryty a bez přerušení přeneseny do nové trasy, dál od osy komunikace. Metalické kabely č.6, č.7 budou zrušeny, nebudou se překládat.

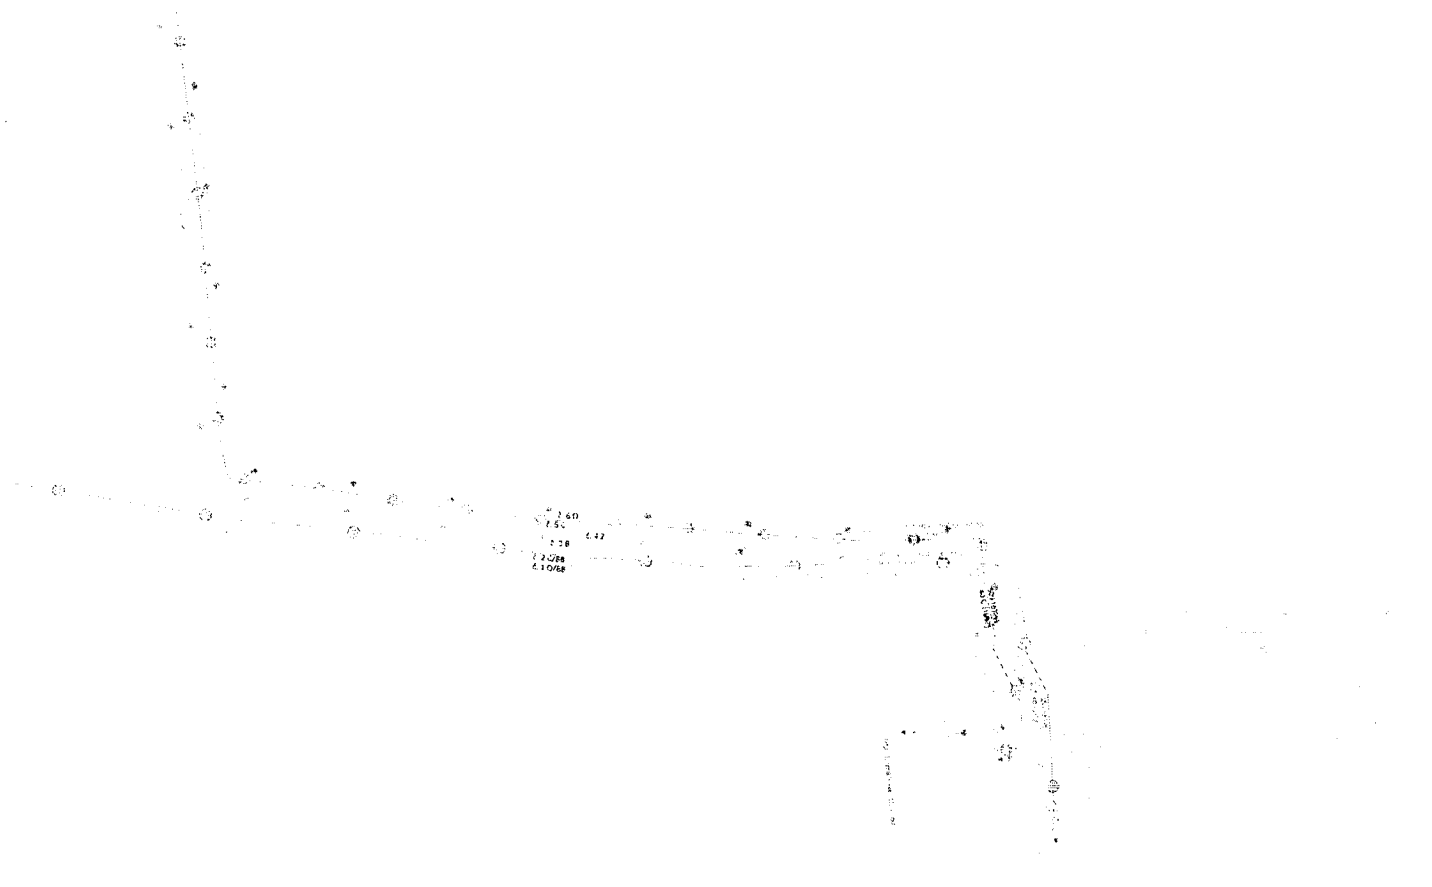


100 mm
100 mm
100 mm
100 mm

SCHÉMA MET+HDPE - druhý úsek



SCHÉMA MET - třetí a čtvrtý úsek

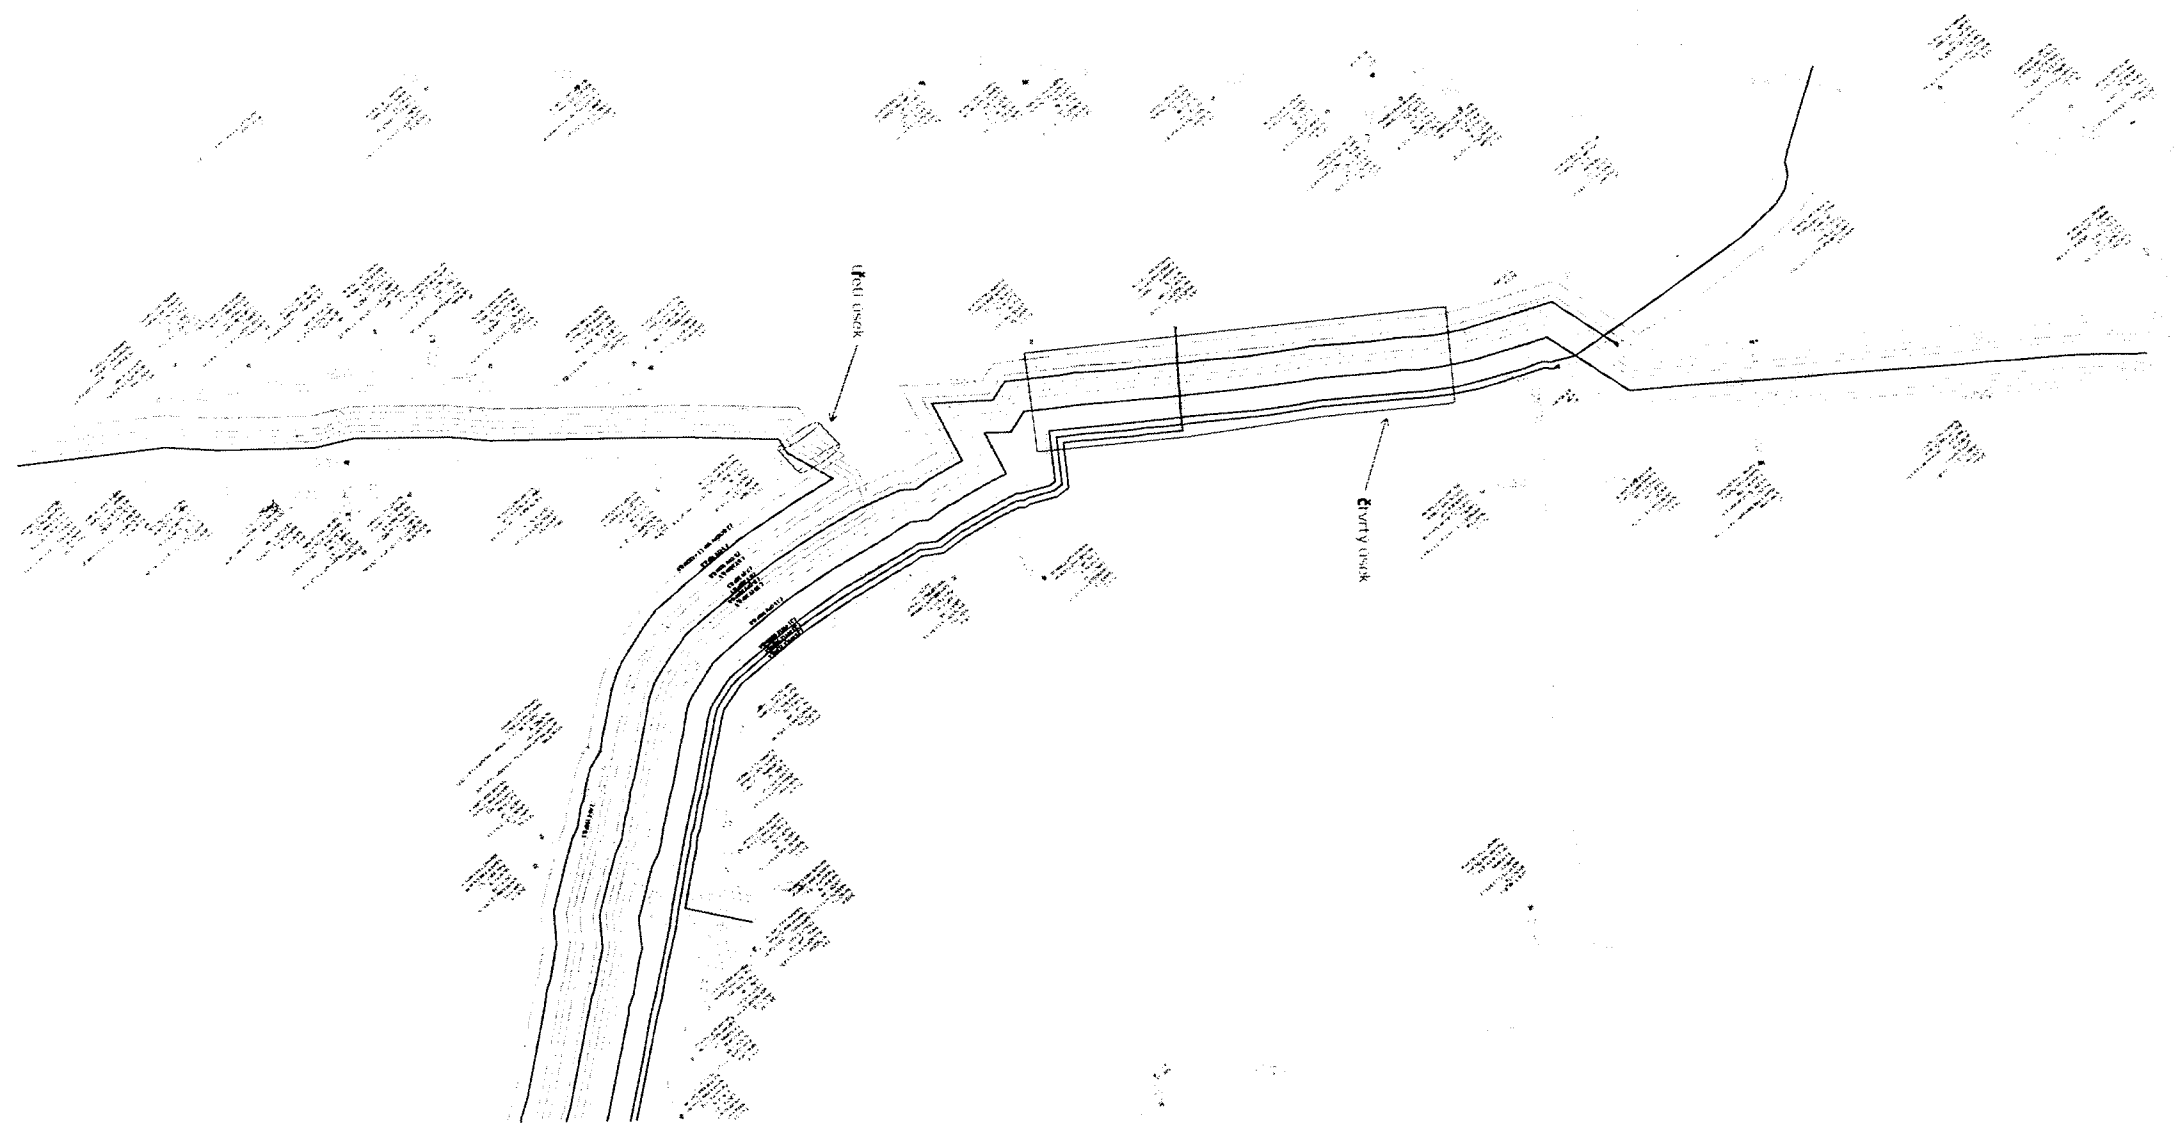

VPIC Náměšť n.O. TR oprava ul. Palackého - specifikace nákladů

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: x VP TEMO 2021 - STAND. - 2022.06

Název stavby: **VPIC Náměšť n.O. TR oprava ul. Palackého**

Číslo SPP prvku:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	57 984,32 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	658 756,78 Kč
MONTÁŽ	867 889,64 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	12 016,79 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	12 016,79 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	3 456,04 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	14 344,02 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE	1 189 796,62 Kč

Celkové náklady:**2 816 261,00 Kč**

Číslo SAP	Seznam položek Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA			
958084	Návrh cenový a technický	1.00 ks	10 861,84 Kč
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě	24636.32 JV	24 636,32 Kč
953635	Projekt tlkm liniové optické sítě	22486.16 JV	22 486,16 Kč
ZEMNÍ PRÁCE			
954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	370.00 m	7 681,20 Kč
952368	Pokládka žlabů TK2,T2N	85.00 m	8 983,65 Kč
955265	Práce zemní pro podzemní tratě síťové zvětšení spojovišť , výkop po stávající trase	49600.00 JV	49 600,00 Kč
955551	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	59.00 m	3 593,69 Kč
955552	Rozšíření prohloubení výk.hl.10cm,š.10cm	103.50 m	1 863,00 Kč
955577	Rýha v chodníku bosém 35/50-70	263.00 m	159 115,00 Kč
952359	Rýha v chodníku betonové desky 35/50-70	349.00 m	263 351,91 Kč
955578	Rýha v chodníku bosém rozšíření o10cm	514.50 m	89 034,23 Kč
955571	Rýha ve vozovce l.asf.50/100rozš.o 10 cm	10.00 m	3 214,50 Kč
955570	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	30.00 m	48 172,80 Kč
954957	Rýha vjezd litý beton 35/70-90	20.00 m	24 146,80 Kč
MONTÁŽ			
958294	Demontáž kab. v rozv. nebo OCEF skříní	3.00 ks	692,31 Kč
955094	Demontáž objektu samost.SIS nad 50 čtyř.	1.00 ks	1 736,18 Kč
955010	Demontáž úložné trubky	120.00 m	1 424,40 Kč
955031	Demontáž úložných kabelů do 300 XN	272.00 m	9 702,24 Kč
955030	Demontáž úložných kabelů do 50 XN	60.00 m	1 481,40 Kč
955029	Demontáž úložných kabelů do15 XN	210.00 m	4 321,80 Kč
958310	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm)	68.00 ks	28 098,28 Kč
958314	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm)	68.00 ks	6 487,88 Kč
952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	21.00 ks	3 745,56 Kč
952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	2538.00 ks	104 438,70 Kč

955000	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	5004.00 ks	171 587,16 Kč
955300	Montáž objektu samost. SIS nad 50 čtyř.	1.00 ks	2 310,31 Kč
955268	Montáž podzemní tratě síťové metalické	148800.09 JV	148 800,09 Kč
955282	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	24.00 ks	46 098,72 Kč
955281	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	13.00 ks	16 943,94 Kč
955945	Montáž spojky T (Y) (I)	2.00 ks	814,64 Kč
955946	Montáž spojky, koncov., průchod., reduk.	14.00 ks	469,14 Kč
955284	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	10.00 ks	542,00 Kč
952602	Montáž trubky úložné	600.00 m	11 100,00 Kč
954990	Montáž úložných kabelů do 15 XN	500.00 m	11 660,00 Kč
954992	Montáž úložných kabelů do 300 XN	937.00 m	39 260,30 Kč
954991	Montáž úložných kabelů do 50 XN	495.00 m	14 260,95 Kč
954993	Montáž úložných kabelů nad 300 XN	285.00 m	16 720,95 Kč
955303	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	1 251,25 Kč
958592	Provádění PEW v maintenance window	3.00 ks	83 315,25 Kč
955257	Připevnění kab. v rozv. nebo OCEF skříní	3.00 ks	786,60 Kč
958557	Realizace optické akce-ostatní činnosti	3.00 ks	46 656,54 Kč
958331	Svaření jednotlivého vlákna v transp. a metrop. síti	68.00 ks	29 066,60 Kč
955298	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	133.00 ks	3 612,28 Kč
955259	Ukončení kabelu v rozvaděči	6.00 ks	2 387,16 Kč
958469	Uvedení stavby do provozu	5262.56 JV	5 262,56 Kč
955630	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	15.00 ks	16 848,15 Kč
955942	Zafukování svazku trubiček	80.00 m	3 860,80 Kč
955952	Zafukování/vyfukování mikrokabelu	200.00 m	5 110,00 Kč
958336	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	400.00 m	11 400,00 Kč
958558	Zkouška trhací	3.00 ks	5 724,90 Kč
958556	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	2.00 ks	5 677,78 Kč
955081	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	133.00 ks	2 380,70 Kč
955083	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	6.00 ks	987,78 Kč
955097	Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	864,34 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA			
956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km	300.00 m	5 907,00 Kč
956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	6 109,79 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE			
956283	Doměření trasy nad 100 m do 1km	300.00 m	5 907,00 Kč
956282	Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	6 109,79 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	3 456,04 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
958749	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	3.00 ks	7 820,52 Kč
954830	Projednáni Smlouvy o zřízení věcného břemene	1000.00 JV	1 000,00 Kč
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 283,46 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	3 240,04 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			

303918	Deska krycí plast. 300x1000 mm	570.00 ks	22 822,80 Kč
303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	50.00 m	203,00 Kč
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	600.00 m	2 790,00 Kč
300122	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,6	190.00 m	96 664,40 Kč
300118	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,6	35.00 m	2 145,15 Kč
300272	Kabel plastový TCEPKPFLE 150x4x0,6	190.00 m	145 661,60 Kč
300132	Kabel plastový TCEPKPFLE 150x4x0,8	190.00 m	256 655,80 Kč
300107	Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,4	50.00 m	2 363,00 Kč
300129	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,8	145.00 m	34 336,00 Kč
300000	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	205.00 m	3 474,75 Kč
300113	Kabel plastový TCEPKPFLE 400x4x0,4	190.00 m	175 932,40 Kč
300109	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4	100.00 m	12 495,00 Kč
300130	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,8	190.00 m	85 313,80 Kč
300114	Kabel plastový TCEPKPFLE 600x4x0,4	95.00 m	136 828,50 Kč
300552	Kabel plastový TCEPKPFLE 75x4x0,6	95.00 m	36 860,95 Kč
302550	Mini Marker 1401 3M Ball	2.00 ks	426,54 Kč
312425	Modul konektor. 9700-10P	996.00 ks	23 655,00 Kč
323050	Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm	68.00 ks	356,32 Kč
318806	Spojka I trubky rozšíř.40SRV-M 40 vodot	2.00 ks	2 870,54 Kč
312863	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLE CZ	7.00 ks	3 833,83 Kč
312881	Spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FLE	6.00 ks	4 555,74 Kč
312889	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	8.00 ks	6 107,84 Kč
320295	Spojka smršťovací XAGA 500-125/30-460	16.00 ks	20 225,28 Kč
301783	Spojka trubičky HDPE 10mm s pojistkami	6.00 ks	184,50 Kč
301801	Spojka trubičky HDPE 7mm s pojistkami	8.00 ks	193,68 Kč
325454	Spojka trubky HDPE 40mm Plassim	10.00 ks	1 007,50 Kč
319184	Spona trubkySYSPRO	510.00 ks	18 018,30 Kč
300633	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.1 červená	80.00 m	322,40 Kč
300634	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.2 zelená	80.00 m	322,40 Kč
300635	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.3 žlutá	80.00 m	322,40 Kč
300623	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.1 červená	80.00 m	208,80 Kč
300624	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.2 zelená	80.00 m	208,80 Kč
300625	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.3 žlutá	80.00 m	208,80 Kč
300626	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.4 modrá	80.00 m	208,80 Kč
319209	Trubka dělená SYSPRO 160/110	50.00 m	27 999,00 Kč
319210	Trubka dělená SYSPRO 200/160	35.00 m	29 124,20 Kč
300027	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	80.00 m	2 514,40 Kč
300024	Trubka HDPE 40/33 černá -bílý pruh	80.00 m	2 514,40 Kč
300023	Trubka HDPE 40/33 černá	80.00 m	2 514,40 Kč
300036	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	80.00 m	2 514,40 Kč
300032	Trubka HDPE 40/33 oranžová -bílý pruh	80.00 m	2 514,40 Kč
300030	Trubka HDPE 40/33 oranžová	80.00 m	2 514,40 Kč
302423	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	370.00 m	19 802,40 Kč

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
IČO: 04084063
zastoupená [•]
(„CETIN“)

a

[•]
(„Partner“)

(CETIN a Partner dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“).

uzavírají dne, měsíce a roku níže uvedeného dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**“) tuto

**DOHODU O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO
ROZHODNUTÍ
(„Dohoda“)**

**Čl. I
PŘEDMĚT DOHODY**

1. Partner má dle správního rozhodnutí vydaného [KÝM] („**Správní orgán**“) dne [•], pod čj. [•], které nabylo právní moci dne [•] („**Správní rozhodnutí**“) povoleno umístit stavbu [•] („**Stavba**“); Stavba zahrnuje rovněž stavbu vedení a zařízení sítě elektronických komunikací („**Stavba telekomunikačního vedení a zařízení**“). Správní rozhodnutí je Přílohou č. 1 Dohody.
2. Předmětem Dohody je převod některých práv a povinností ze Správního rozhodnutí Partnerem na společnost CETIN, a to (i) převod práva umístit Stavbu telekomunikačního vedení a zařízení za podmínek určených Správním rozhodnutím, (ii) převod těch práv a povinností, která jsou určena stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků či správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, vztahují-li se ke Stavbě telekomunikačního vedení a zařízení.

**Čl. II
PŘEVOD PRÁV**

1. Partner s účinností ke dni uzavření Dohody, na společnost CETIN převádí:
 - a) právo umístit Stavbu telekomunikačního vedení a zařízení za podmínek určených Správním rozhodnutím,
 - b) práva a povinnosti, která jsou určena stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků či správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, vztahují-li se ke Stavbě telekomunikačního vedení a zařízení.
2. Partner se zavazuje převod práv a povinností dle čl. II odst. 1 Dohody písemně oznámit Správnímu orgánu nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne

uzavření Dohody.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
2. Dohoda může být změněna pouze dohodou Smluvních stran, formou písemného dodatku podepsaného oběma Smluvními stranami; změna jinou formou je vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv, byť opatřených zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatky k Dohodě musí být písemně číslovány a vstupují v platnost a nabývají účinnosti dle čl. III odst. 1 Dohody.
3. Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Dohody rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
 - a) v listinné podobě;
 - b) e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Partner bere na vědomí a souhlasí, že nad rámec ustanovení Dohody nebudou jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak.
5. Vztahy z Dohody vyplývající i vztahy Dohodou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Dohody nebo v souvislosti s Dohodou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
6. Dohoda obsahuje úplné ujednání o předmětu Dohody a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Dohodě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Dohody. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani projev učiněný po uzavření Dohody nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. V případě rozporu mezi ustanoveními Dohody a jejími přílohami, převáží text Dohody.
7. Smluvní strany se dohodly, že Dohodu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; (i) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zaručený elektronický podpis“); (ii) Dohoda je uzavřena doručením Dohody opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.

8. Nedílnou součástí Dohody jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Správní rozhodnutí

CETIN:

Partner:

V Praze dne _____ 20[•]

V _____ dne _____ 20[•]

za **CETIN a.s.**

Jméno: [•]

Funkce: [•]

za [•]

Jméno: [•]

Funkce: [•]
