

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00171
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030003501
Registr smluv: ANO

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. VPI/MJ/2022/00171**

mezi

CETIN a.s.

a

Statutární město Brno, ÚMČ Brno-Ivanovice

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00171

SAP S/4 Hana: 8030003501

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená na základě pověření Ludmilou Uhrovou, specialistou pro výstavbu sítě –
překládky SEK

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2019160003/6000

datová schránka : qa7425t

(dále jen „**CETIN**“)

a

Statutární město Brno, Městská část Brno-Ivanovice

se sídlem Máčova 37/3, 621 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

zastoupené Ing. Janou Bohušovou, starostkou Městské části Brno-Ivanovice

datová schránka: e4gbwnv

(dále jen „**Stavebník**“)CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tutoSmlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)**DEFINICE**

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh a současně realizační dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;**Překládka** je stavba v k.ú. Ivanovice; Jinačovice spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;**Příprava Překládky** jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;**Předpoklady pro realizaci Překládky** mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00171

SAP S/4 Hana: 8030003501

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 13.3.2022 vydané pod čj. 577461/22, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Brno - MŠ Hatě, přístavba**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastněním takového práva.(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00171

SAP S/4 Hana: 8030003501

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování CTN;
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však dva (2) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník se zavazuje, nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, jejíž vzor je uveden v Příloze č. 2 Smlouvy a převést na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky. Ve lhůtě dle předchozího odstavce je Stavebník povinen předat společnosti CETIN územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do tří (3) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
- (c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 bodu (i) Smlouvy;
- (d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00171

SAP S/4 Hana: 8030003501

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **76.124,- Kč** (slovy: sedmdesát šest tisíc jedno sto dvacet čtyři korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN.
- 5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00171

SAP S/4 Hana: 8030003501

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku stanovené na základě CTN se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:
- (a) Faktura za CTN Překládky ve výši **6.172,- Kč** (slovy: šest tisíc jedno sto sedmdesát dva korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od uzavření této Smlouvy,
 - (b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.
- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00171

SAP S/4 Hana: 8030003501

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: Ludmila Uhrová
funkce: specialista pro výstavbu sítě - překládky SEK
e-mail: ludmila.uhrova@cetin.cz ,tel.: 238 462 454

ve věcech technických: Ing. Pavel Vašák
funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: pavel.vasak@cetin.cz, tel.: 606 894 181

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Ing. Jana Bohuňovská
funkce: starostka Městské části Brno-Ivanovice
e-mail: starosta@ivanovice.brno.cz, tel.: 541226695

ve věcech technických: Ing. Pavel Sedlák
funkce: místostarosta Městské části Brno-Ivanovice
e-mail: info@ivanovice.brno.cz, tel.: 541226695

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.

9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.

9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00171

SAP S/4 Hana: 8030003501

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

- 9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marré uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- (a) v listinné podobě;
- (b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;
- (c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy, věta první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem (b) a (c).

12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00171

SAP S/4 Hana: 8030003501

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

- 12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).
- Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.
- Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis. Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00171

SAP S/4 Hana: 8030003501

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13 Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby – vzor

Doložka


Smlouva byla schválena Zastupitelstvem Městské části Brno-Ivanovice na XXV. mimořádném zasedání dne 4. 7.2022.

CETIN: 14 -07- 2022


V Brně dne _____

Stavebník:

V Brně dne 1. 8. 2022



CETIN a.s.
Ludmila Uhrová
specialista pro výstavbu sítě - překládky SEK



Statutární město Brno
Městská část Brno-Ivanovice
Máčkova 3, 621 00 Brno
Městská část Brno-Ivanovice
Ing. Jana Bohuňovská
starostka

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

212

CETIN a.s.

Startovací dokumentace

INVESTIČNÍ AKCE

Kategorie

Podkategorie

Číslo SAP

Číslo interní 69356/22/0016

Název

VPIC Brno - MŠ Hatě, přístavba

Budoucí uživatel

GMO-BO Vašák Pavel
Manažer/KPO

Zpracoval

Vedoucí
Manažer

Michal Novotný
Petr Švestka
Petr Švestka

Schváleno

Obsah:

1 Souhrnná zpráva

- 1.1 Základní údaje
- 1.2 Účel stavby

2 Technická zpráva

- 2.1 Vstupní podklady
- 2.2 Navrhované řešení
- 2.3 Popis tras
- 2.4 Použitá technologie
- 2.5 Použité předpisy
- 2.6 Koordinace
- 2.7 Ostatní

3 Podmiňující a související stavby

4 Vyjádření a záznamy

5 Přílohy

1. Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

Identifikační údaje

Název:	VPIC Brno - MŠ Hatě, přístavba
Kategorie:	
Podkategorie:	
Typ investice:	Vynucená překládka s inženýringem CAPEX
Důvod 1:	Bez určení
Číslo interní:	69356/22/0016
Prvek SPP:	
ABC:	B
HOST:	
ATÚ:	VÚJ 2 - Brno(Řečkovice)-RSU903

Kapacitní údaje

		Průměrný náklad na:	
100800_Délka HDPE trubek pro OK	0 km	kmp mk	722.222 tis. Kč
100200_Délka metalických kabelů	0.015 km	kkm mk	4333.333 tis. Kč
100700_Délka nadzemní tratě	0 km	km vyk	6500 tis. Kč
100100_Délka párů v metalických kabelech	0.090 km	km kv	0 tis. Kč
100300_Délka výkopů vč.podvrtů a přechodů	0.010 km	kmo kv	0 tis. Kč
Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř.	0 pár	b.j.	0 tis. Kč
100400_Páry zakončené v účast. rozvaděčích	0 pár		
100900_Počet bytových domů	0 BD		
101100_Počet bytových jednotek v bytových domech	0 bj		
100500_Počet rodinných domů	0 RD		
100600_Počet bytových jednotek v rodinných domech	0 bj		
nástavba skříně SIS 2, 3 pro rDSLAM Micos	0 ks		
Skříně SIS 900-A s nást. rDSLAM HD 180	0 ks		
Skříně SIS 900 B HD180	0 ks		
Skříně SIS 900 C HD180	0 ks		
Skříně SIS 900 D HD180	0 ks		
Sloupek nn měření pro DSLAM 350 vč. zák.	0 ks		
Nástavba Micos rDSLAM pod omítku	0 ks		
Skříně mDSLAM 450 HD180 s ventilátorem	0 ks		
Nástavba Micos rDSLAM	0 ks		
Skříně SIS 1350 D HD 180	0 ks		
Délka HDPE trubek pro OK	0 km		
Sloupek rozdělovací ODF rDSLAM hl.240	0 ks		
Sloupek rozdělovací ODF rDSLAM hl.350	0 ks		
Sloupek nn měř.DSLAM350 s rozvad.vč.zák.	0 ks		
Sestava 900D + měření vč. základny	0 ks		
Sestava mDSLAM 450 + měření vč. základny	0 ks		
Sloupek nn měř.DSLAM240 s rozvad.vč.zák.	0 ks		

Termíny:

Platnost ÚR od:	
Platnost ÚR do:	
Plánované zahájení přípravy:	09.06.2022
Plánované ukončení přípravy:	15.07.2022
Plánované zahájení realizace:	15.03.2023
Plánované ukončení realizace:	15.06.2023
Nabídka k příjemce (Plán):	15.05.2023

1.2 Účel stavby:

Požadavek IPMS int.č. 69356/22/0016 na zpracování CTN: VPIC Brno - MŠ Hatě, přístavba

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady:

Požadavek IPMS int.č. 69356/22/0016 na zpracování CTN: VPIC Brno - MŠ Hatě, přístavba

2.2 Navrhované řešení:

Z důvodu přístavby nové logopedické třídy v MŠ Hatě v Brně, m. č. Ivanovice, dojde k přeložení stávající SEK spol. CETIN. Jedná se o podzemní kabel typu PFLE 3XN0,6 a rozvaděč BORE3851_BOX - A6.

Na začátku překládky bude kabel přerušen. Pomocí spojky XAGA500 43/8-300 se naspojkuje na nový prvek SEK stejného typu i kapacity. Kabel bude novou trasou přiveden k nově umístěnému rozvaděči BORE3851. Bude použito nové skříňe typu MRK20_LSA. Skříň bude umístěna v nice na fasádě objektu MŠ. Niku nachystá investor.

Vnitřní vedení k nově umístěnému rozvaděči nachystá rovněž investor stavby.

Stávající zrušená SEK se překládat nemusí. V případě potřeby bude na vhodném místě ukončena kabelovou koncovkou SKH.

Kabelová spojka bude umístěna v nepojízdných plochách a bude opatřena detekčním markerem miniBall.

Měření:

MK = před realizací překládky bude na metalickém kabelu provedeno kontrolní stejnosměrné měření. Po realizaci překládky bude provedeno standardní měření.

2.3 Popis tras

viz. přiložené podklady

VVN: ne

El. trakce: ne

Vodní toky: ne

2.4 Použitá technologie:

Kabel typu TCEPKPFLE 0,6

XAGA500

Mini Markér Ball

MRK 20 LSA

2.5 Použité předpisy:

TPP 2001-1 (TP 69a) - Výstavba přístupových sítí -

Metalické kabely (část I.)

TPP 2001-2 (TP 69b) - Výstavba přístupových sítí -

Metalické kabely (část II.)

TPP 2001-3 (TP 69c) - Výstavba přístupových sítí -

Metalické kabely (část III.)

TA 10 (I.-III.) - Výstavba nadzemních sítí

ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 334050 - Podzemní sdělovací vedení

ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení

Výkop, položení a obsazení chráničky je v souladu s ČSN 73 6005

2.6 Koordinace:

Stavebník: Statutární město Brno, ÚMČ Brno-Ivanovice; Mácova 37/3, 621 00 Brno. V zastoupení - Bc. Kateřina Zemanová; tajemnice ÚMČ, tel..541226695, mobil: 778726073, e-mail: tajemnice@ivanovice.brno.cz
Žadatelka o překládku: Hana Kocourková; PROJECT building s.r.o.; Erbenova 375/8, 602 00 Brno; tel.: 739203688; e-mail: kocourkova.hanka@centrum.cz

Michal Novotný, MT: 725 743 505 _ zpracovatel CTN

2.7 Ostatní:

PD: NE

ÚR: stavební titul zajistí stavebník

VBŘ: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom

GP: ANO (zakresleno v KM) _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom

GEO zaměření: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom

GEO vytyčení hranic pozemků, vč. nové trasy SEK: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom

SoUZ: NE

PEW: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom

Staniční vedení: nachystá investor.

Před vlastním zahájením prací je nutno zajistit PEW (přerušení metalického kabelu) - min. 40 dnů předem.

RZ je povinný oznámit PC a pracovníkovi provozní složky spol. CETIN časové období realizace stavby, termíny provedení záhozů a termín závěrečných měření.

Technické řešení navržené v CTN zohledňuje pouze podklady dodané k vytvoření CTN.

Případné další podmínky správců sítí, majitelů pozemků a jiné, které nebyly předány ke zpracování CTN, nejsou zohledněny.

3. Podmiňující, související a navazující stavby:

Podmiňující akce - vložené:

Interní číslo	SAP	Název projektu	Stav
---------------	-----	----------------	------

Navazující akce - vložené:

Interní číslo	SAP	Název projektu	Stav
---------------	-----	----------------	------

4. Vyjádření a záznamy

5. Přílohy

Název přílohy	Stupeň
Podklady od stavebníka.zip	SD
Zadávací podklady.xlsx	SD
Vyjádření o existenci SEK včetně DP POS.zip	SD

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	536
Obec:	Brno [582786]
Katastrální území:	Ivanovice [655856]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	5062
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	zahrada



Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	535
Obec:	Brno [582786]
Katastrální území:	Ivanovice [655856]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	577
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří



Součástí je stavba

Budova s číslem popisným:	Ivanovice [55859] ; č. p. 81; stavba občanského vybavení
Stavba stojí na pozemku:	p. č. 535
Stavební objekt:	č. p. 81
Ulice:	Hatě
Adresní místa:	Hatě 81/19

Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno



Λ
540/1

540/13

534/3

534/4

535

Q
536

537/40

537/61

Nivy

Q
537/27

112/1


112/2

112/3

111

114

116/4

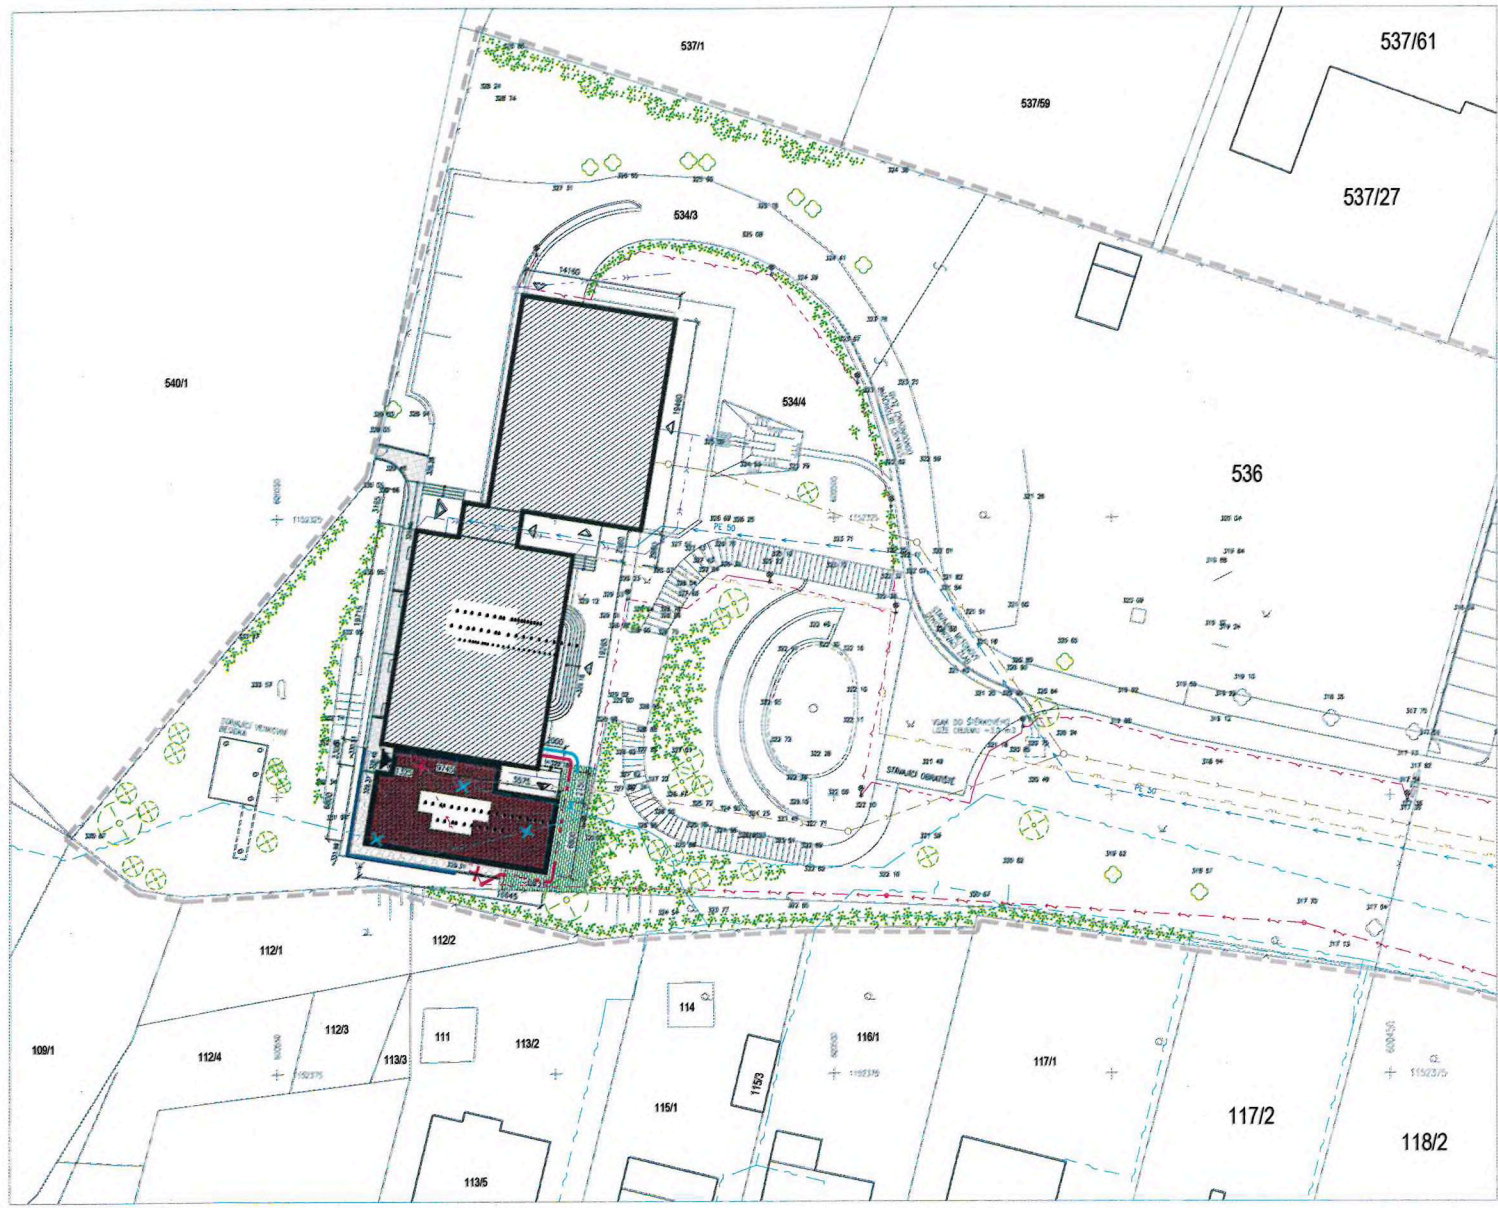

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- — — ELEKTRICKÉ VEDENÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ PROSTŘEDÍ – EGD
- — — ELEKTRICKÉ VEDENÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ NADZEMÍ – EGD
- — — ELEKTRICKÉ VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ PROSTŘEDÍ – EGD
- — — ELEKTRICKÉ VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ NADZEMÍ – EGD
- — — ELEKTRICKÉ VEDENÍ VĚRTELÉHO ODVĚTLÉNÍ – FOD
- — — PLYNOVOD NÁVTLAK – GVN 6.0.0.
- — — SÍŤ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ – CETN a.s.
- — — VODNOD – SVAK
- — — KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- — — KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- — — STÁVAJÍCÍ ODTOKOVÁ KANALIZACE – NEVĚRĚNÝ PŘÍPAD (REALIZOVANÁ V L. ÚP. 1974)

LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH

- SO 001 – PŘÍSTAVBA LOGOPEDICKÉ TRÍDY MŠ HATĚ BRNO – NANOVICĚ, HATĚ 81/19
- STÁVAJÍCÍ OBJEKT MATERSKÉ ŠKOLY
- NOVÁ ŽE. ÚPŮSNÁ STĚNA
- NOVÉ ÚPŮSNÉ ODVĚRHOVÉ ŽLAB
- NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA Z BETONOVÉ DLAŽE
- NOVÁ PLOCHA Z KAMNŮ
- STÁVAJÍCÍ PŘELÁČNÉ PLOCHY Z BETONOVÉ DLAŽE
- BETONOVÉ SVADOVÉ ZAHRADKOVÉ PÁRKYTY
- STÁVAJÍCÍ ŠKOLNÍ ZAHRADKA

LEGENDA ZNAČEK

- — — HRANICE PARCELY
- ▼ HLAVNÍ VSTUP DO NOVÉHO OBJEKTU PŘÍSTAVBY
- ▼ VĚTLÉŽ VSTUP DO NOVÉHO OBJEKTU PŘÍSTAVBY
- ▼ HLAVNÍ VSTUPY DO STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU MŠ
- ▼ VĚTLÉŽ VSTUPY DO STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU MŠ
- STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ SÁCHA
- ... NOVÁ AREÁLOVÁ KANALIZAČNÍ SÁCHA
- ⊗ STÁVAJÍCÍ STĚŽNÝ VĚRTELÉHO ODVĚTLÉNÍ
- STÁVAJÍCÍ SLUP NADZEMNÍHO ELEKTRICKÉHO VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ
- ⊕ STÁVAJÍCÍ POZEMNÝ VÝHRANT
- ⊕ STÁVAJÍCÍ ÚPŮSNĚNÍ
- 536 ○ ČÍSLO PARCELY
- ⊗ STÁVAJÍCÍ VODNÍKA ŽELEŽNÁ
- ⊗ STÁVAJÍCÍ NÁDESNÁ ŽELEŽNÁ (KOP)

LEGENDA NOVÝCH AREÁLOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- — — PŘELÁČNÁ POZEMNÍHO AREÁLOVÉHO VEDENÍ MŠ (MŠ 10 001)
- — — PŘELÁČNÁ SÍŤ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ ZAHRADKOVÉ ŽELEŽNÁ – CETN a.s.

LEGENDA RUŠENÝCH AREÁLOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- ✗ RUŠENÁ AREÁLOVÁ SÍŤ ELEKTRICKÉHO VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ POZEMNÍ – EGD
- ✗ RUŠENÁ AREÁLOVÁ SÍŤ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ – CETN a.s.

±0,000 = ~329,910 (ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU)

VÝKRES SYSTÉM B.Ú. MĚŘNÝ SOUBOROVÝ SYSTÉM
 ARCHITECTONICKÉ ŘEŠENÍ ING. JIŘÍM JAN POŠTOLÁ


HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MICHAL ŠPILKA		FORMÁT	B. A4
ZOUP. PROJEKTANT	ING. MICHAL ŠPILKA		DATA	04.2022
SPROJEKTOVATEL	ING. MICHAL ŠPILKA	STAVĚNÍ	OBJEDIP	
KONTROLNÍK	ING. MICHAL ŠPILKA	ČÍSLO ZKAMKY	ES02	
INVESTOR	STAVITELNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO – NANOVICĚ, MÍSTNOST 3, 621 00 BRNO	ODVĚRHOVÉ		
NÁZEV AKCE		SPECIALIZACE		
PŘÍSTAVBA LOGOPEDICKÉ TRÍDY MŠ HATĚ BRNO – NANOVICĚ, HATĚ 81/19		ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU	SO 001	ČÍSLO VÝKRESU
		NÁZEV VÝKRESU	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	1:250
		MĚŘÍTKO		C.4



místo překládky
SEK spol. CETIN

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ TRASA SEK
- NOVÁ TRASA SEK
- RUŠENÁ TRASA SEK
- STÁVAJÍCÍ ZRUŠENÁ SEK

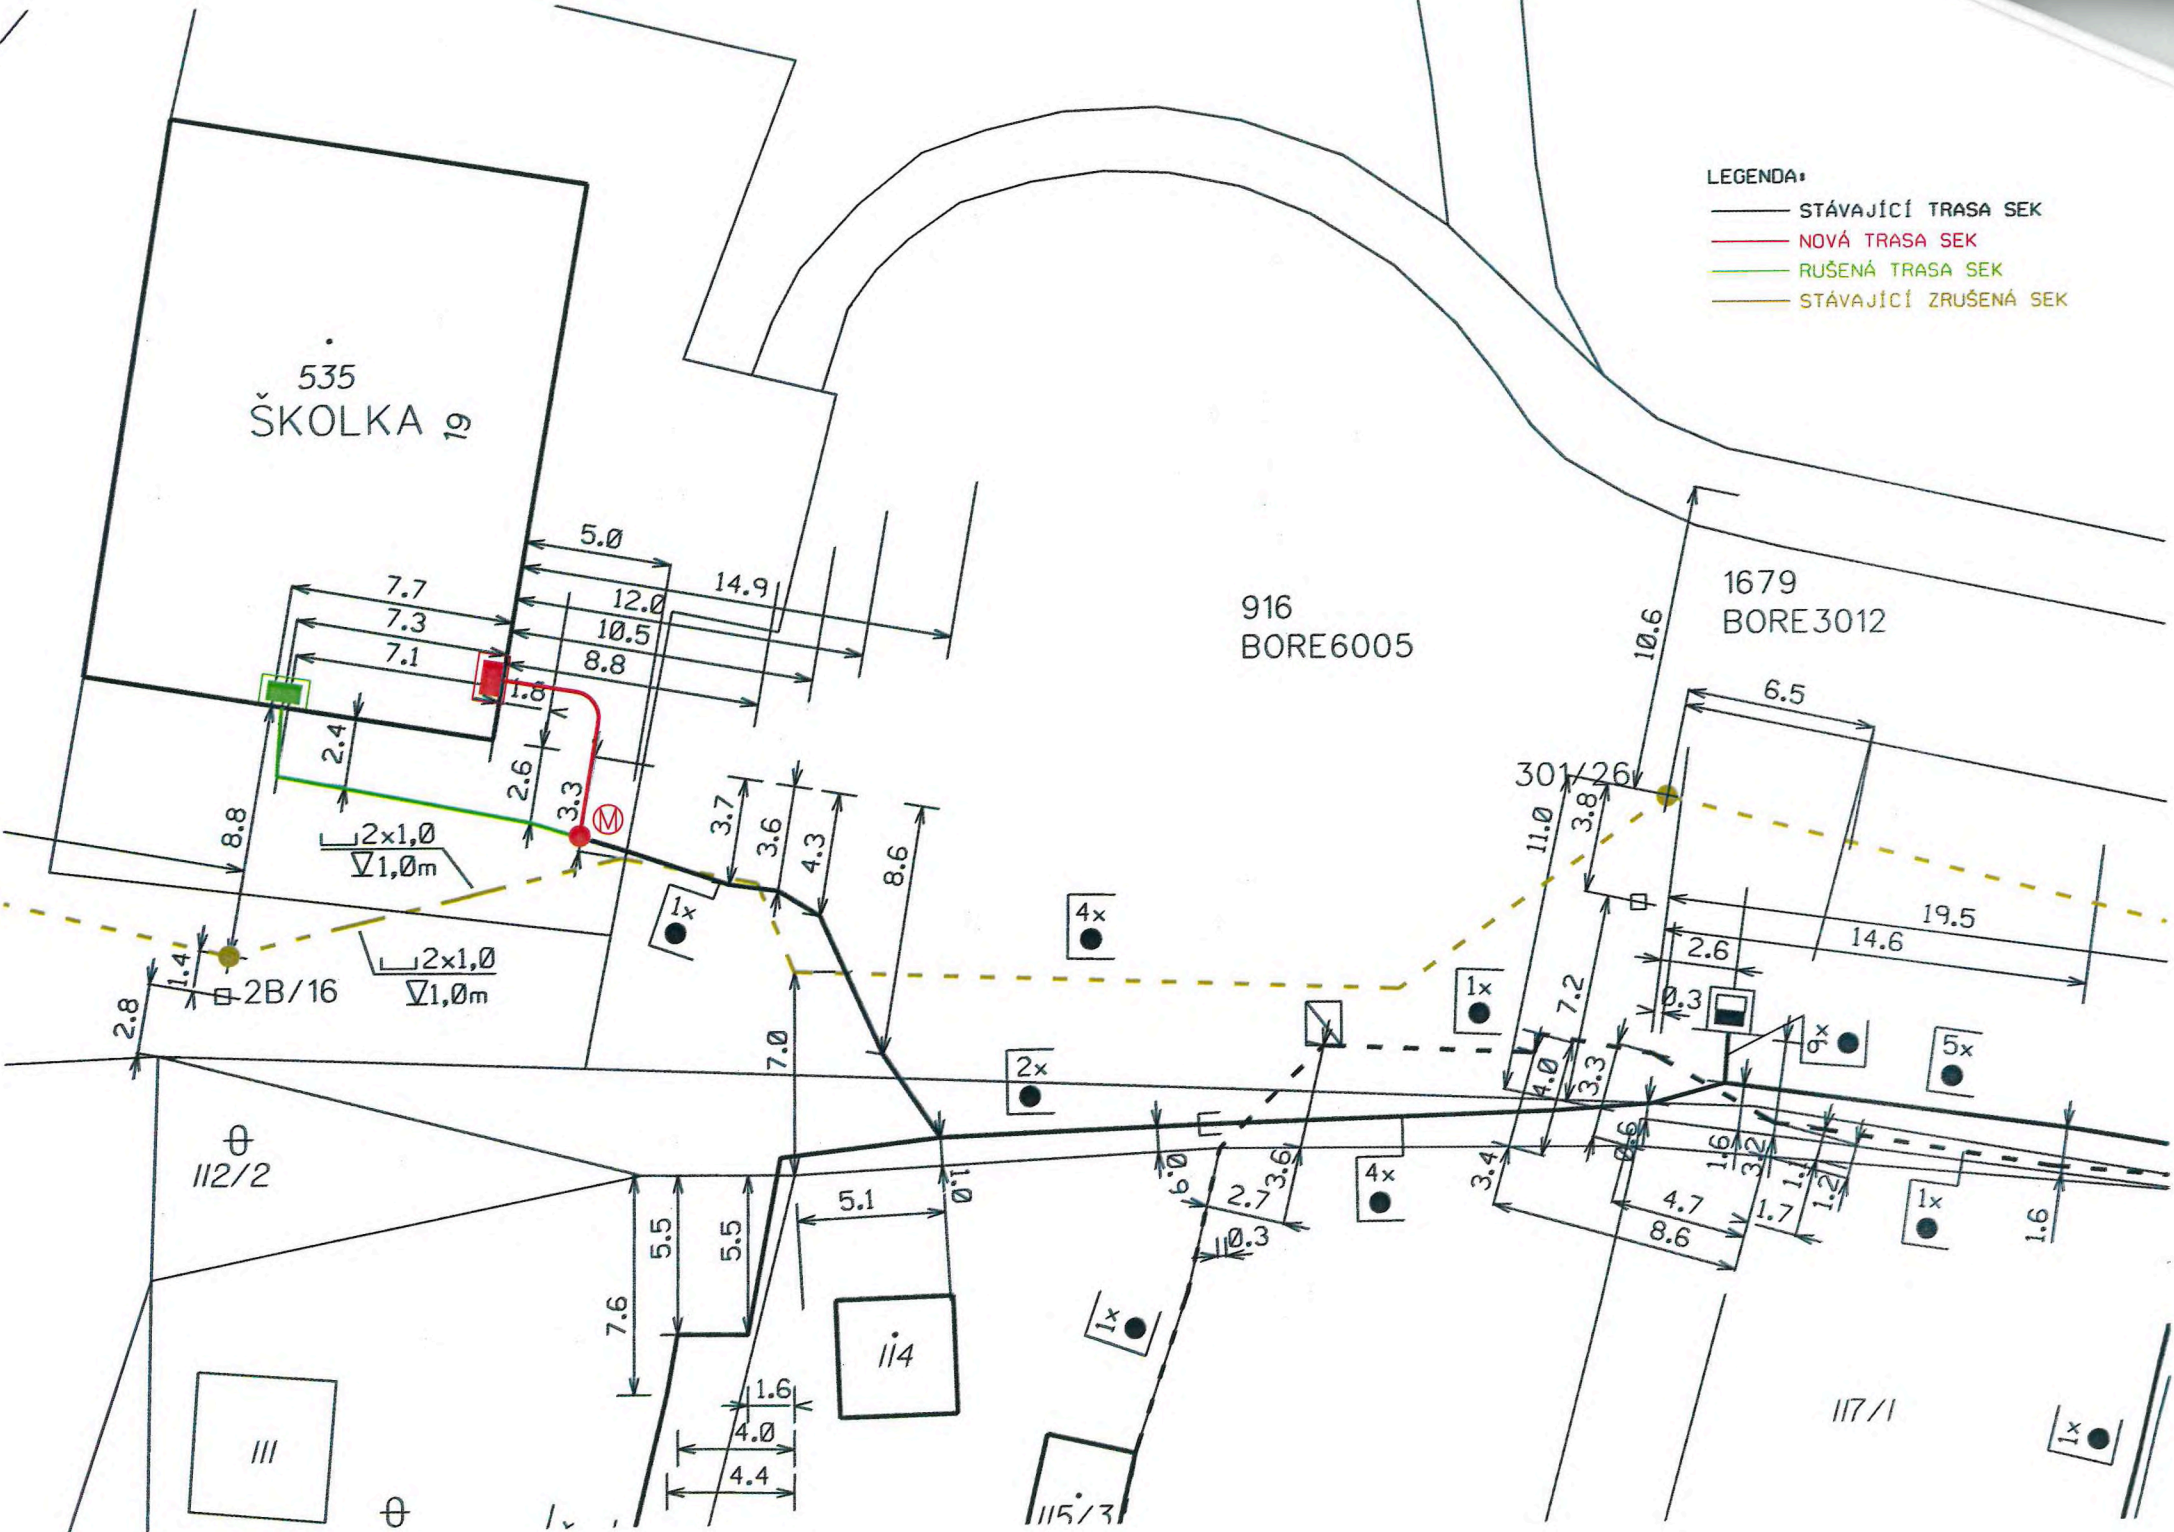

Specifikace nákladů dle CTN VPIC Brno - MŠ Hatě, přístavba

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: x VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. - 2022.06

Položková | 2022.06

Název stavby: **69356/22/0016 VPIC Brno - MŠ Hatě, přístavba**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: Vegacom a.s., Michal Novotný

KPO: JMO

HOST: Brno - Kr. Pole

VUJ: Ivanovice

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	6 171,50 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	16 657,69 Kč
MONTÁŽ	22 391,73 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	12 080,39 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	3 332,61 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	11 936,12 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	3 554,16 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 76 124,20 KčSTAVEBNÍ ČINNOST 58 633,73 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST 17 490,47 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	6 171,50 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
958554 S		Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks	5 647,08 Kč
955265 S		Práce zemní pro podzemní tratě síťové	1922.00 JV	1 922,00 Kč
Kontrola průtočnosti vpustí				
954959 S		Rýha v chodn.zám.dlaž.35/50-70rozš.o10cm	6.00 m	1 270,86 Kč
952362 S		Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70	10.00 m	7 562,60 Kč
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	10.00 m	120,70 Kč
951349 S		Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	1.00 ks	134,45 Kč
MONTÁŽ				
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	2.00 ks	355,92 Kč
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	3.00 ks	123,21 Kč
952644 S		Měření střídavé během stavby - další čtyřka	2.00 ks	54,76 Kč
952643 S		Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1.00 ks	95,82 Kč
952647 S		Měření útlumu během stavby- první čtyřka	1.00 ks	177,96 Kč

954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	3.00 ks	82,14 Kč	
955288 S	Montáž koncovky SKH	2.00 ks	109,50 Kč	
955267 S	Montáž nadzemní tratě síťové	1240.00 JV	1 240,00 Kč	
	montáž kabelového krytu			
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	8680.00 JV	8 680,00 Kč	
	rozpočtová rezerva			
955310 S	Montáž skříň.rozv.na omítku do 10 čtyř.	1.00 ks	221,83 Kč	
955281 S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	1.00 ks	1 300,53 Kč	
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	15.00 m	349,95 Kč	
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	3.00 ks	82,14 Kč	
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	1.00 ks	397,00 Kč	
955987 S	Ukončení kabelu vnitřního v rozvaděči	1.00 ks	297,12 Kč	
958469 S	Uvedení stavby do provozu	5262.56 JV	5 262,56 Kč	
958555 S	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	1.00 ks	3 105,50 Kč	
955312 S	Zrušení skříň.rozv.na omítku do 10 čtyř.	1.00 ks	136,90 Kč	
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	3.00 ks	57,39 Kč	
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	1.00 ks	164,27 Kč	
955988 S	Zrušení ukončení kabelu vnitř. v rozvad.	1.00 ks	97,23 Kč	
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE				
955278 S	Provedení geodetického měření pro tratě síťové	5970.60 JV	5 970,60 Kč	
	Vytyčení nové trasy SEK, EZA			
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	6 109,79 Kč	
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	3 332,61 Kč	
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
958747 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	3 949,76 Kč	
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	2000.00 JV	2 000,00 Kč	
	náhrada za VBř odhadovaná			
	Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníkы dotčených nemovitostí.			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 592,03 Kč	
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	3 394,33 Kč	
	Limitka materiálu			
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		12.00 ks	498,60 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		12.00 m	57,84 Kč
300116 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,6		15.00 m	433,05 Kč
316547 S	Koncovka smršť. SKH 4 25/55 mm		2.00 ks	330,72 Kč
307675 S	Kryt plechový 1500 mm kabelový		1.00 ks	122,20 Kč
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball		1.00 ks	221,31 Kč
312425 S	Modul konektor. 9700-10P		1.00 ks	24,65 Kč
325644 S	Skříň rozvaděče MRK20-QT10-20p-na o. LSA		1.00 ks	733,18 Kč
312863 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ		1.00 ks	568,36 Kč
309290 S	Svorkovnice LSA zář. rozp. 2/10 60891121-02		2.00 ks	245,70 Kč
303222 S	Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35		1.00 ks	85,02 Kč
306188 S	Zámek skříňe 1370 L2 Morava-42113		1.00 ks	233,53 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267 S	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá		2.00 ks	0,00 Kč

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
IČO: 04084063
zastoupená [•]
(„CETIN“)

a

[•]

(„Partner“)

(CETIN a Partner dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“).

uzavírají dne, měsíce a roku níže uvedeného dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**“) tuto

**DOHODU O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO
ROZHODNUTÍ
(„Dohoda“)**

**ČI. I
PŘEDMĚT DOHODY**

1. Partner má dle správního rozhodnutí vydaného [KÝM] („**Správní orgán**“) dne [•], pod čj. [•], které nabylo právní moci dne [•] („**Správní rozhodnutí**“) povoleno umístit stavbu [•] („**Stavba**“); Stavba zahrnuje rovněž stavbu vedení a zařízení sítě elektronických komunikací („**Stavba telekomunikačního vedení a zařízení**“). Správní rozhodnutí je Přílohou č. 1 Dohody.
2. Předmětem Dohody je převod některých práv a povinností ze Správního rozhodnutí Partnerem na společnost CETIN, a to (i) převod práva umístit Stavbu telekomunikačního vedení a zařízení za podmínek určených Správním rozhodnutím, (ii) převod těch práv a povinností, která jsou určena stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků či správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, vztahují-li se ke Stavbě telekomunikačního vedení a zařízení.

**ČI. II
PŘEVOD PRÁV**

1. Partner s účinností ke dni uzavření Dohody, na společnost CETIN převádí:
 - a) právo umístit Stavbu telekomunikačního vedení a zařízení za podmínek určených Správním rozhodnutím,
 - b) práva a povinnosti, která jsou určena stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků či správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, vztahují-li se ke Stavbě telekomunikačního vedení a zařízení.
2. Partner se zavazuje převod práv a povinností dle čl. II odst. 1 Dohody písemně oznámit Správnímu orgánu nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne

uzavření Dohody.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
2. Dohoda může být změněna pouze dohodou Smluvních stran, formou písemného dodatku podepsaného oběma Smluvními stranami; změna jinou formou je vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv, byť opatřených zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatky k Dohodě musí být písemně číslovány a vstupují v platnost a nabývají účinnosti dle čl. III odst. 1 Dohody.
3. Písemným stykem či pojmem „*písemně*“ se pro účely Dohody rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
 - a) v listinné podobě;
 - b) e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Partner bere na vědomí a souhlasí, že nad rámec ustanovení Dohody nebudou jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak.
5. Vztahy z Dohody vyplývající i vztahy Dohodou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Dohody nebo v souvislosti s Dohodou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
6. Dohoda obsahuje úplné ujednání o předmětu Dohody a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Dohodě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Dohody. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani projev učiněný po uzavření Dohody nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. V případě rozporu mezi ustanoveními Dohody a jejími přílohami, převáží text Dohody.
7. Dohoda je sepsána ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, každá Smluvní strana obdrží po jednom (1).
8. Nedílnou součástí Dohody jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Správní rozhodnutí

CETIN:

V Praze dne _____ 20[•]

za **CETIN a.s.**

Jméno: [•]

Funkce: [•]

Partner:

V _____ dne _____ 20[•]

za [•]

Jméno: [•]

Funkce: [•]
