

RÁMCOVÁ DOHODA O DÍLO

„Úprava a servis technologií pro výdej, příjem a skladování PHL“

Čl. 1. Smluvní strany

DĚKUJEME ZA ZASLÁNÍ
PODEPSANÉHO
DOKUMENTU
ZPĚT

Objednatel: ČEPRO, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
spisová značka: B 2341, vedená Městským soudem v Praze
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11 902931/0100
IČO: 601 93 531
DIČ: CZ601 93 531
Zastoupen: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. František Todt, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené rámcové dohody a dílčích smluv ve věcech:

a/ smluvních (vyjma změny a/nebo zániku rámcové dohody), technických a realizace díla:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: VAE CONTROLS, s.r.o.

se sídlem: Náměstí Jurije Gagarina 233/1, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
spisová značka: C 6037, vedená Krajským soudem v Ostravě
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 1387680905/2700
IČO: 483 90 470
DIČ: CZ48390470
Zastoupen: Ing. Martin Pecina, MBA, jednatel

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené rámcové dohody a dílčích smluv ve věcech:

a/ smluvních:

b/ technických a realizace díla:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel (společně též „Smluvní strany“) níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají na základě výběrového řízení č. 135/22/OCN tuto rámcovou dohodu o dílo s názvem „Úprava a servis technologií pro výdej, příjem a skladování PHL“ (dále jen též jen „**Smlouva**“) v souladu s platnou a účinnou legislativou v následujícím znění.

Čl. 2. Základní údaje

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Smlouvy v souladu s platnou legislativou, zejména dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení.

- 2.2. Tato Smlouva je výsledkem zadávacího řízení č. 135/22/OCN „Úprava a servis technologií pro výdej, příjem a skladování PHL“ zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení.
- 2.3. Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek při provádění dílčích zakázek na služby spočívající v provádění díla specifikovaného zejména v čl. 3 této Smlouvy, zadávaného Objednatelem v souladu a na základě této Smlouvy po dobu její účinnosti, a úprava vzájemných vztahů, práv a povinností Smluvních stran.
- 2.4. Účelem této Smlouvy je potřeba Objednatele zajistit profylaktické kontroly výdejních lávek, operativní servis, opravy technologií výdejních lávek a dále úpravy, popřípadě rozšíření, technologie výdejních lávek a souvisejících technologií pro přepravu a skladování PHL na skladech ČEPRO, a.s. a případných dalších pracích specifikovaných v příloze č. 3 Technická specifikace. Pro výše zmiňované účely vypracování projektových dokumentací, a souvisejícího V-P projednání v souladu s platnou legislativou.
- 2.5. Objednatel je vlastníkem skladů pohonných hmot umístěných na území České republiky, jejichž seznam je dostupný na www.ceproas.cz (dále též jen „**Sklady**“). V objektech Skladů ČEPRO, a.s. Hájek, Třemošná, Litvínov, Hněvice, Mstětice, Bělčice, Včelná, Smyslov, Nové Město, Potěhy, Šlapanov, Cerekvice, Velká Bíteš, Střelice, Klobouky, Sedlnice a Loukov se nachází technologie pro výdej, příjem a skladování PHL, jejichž technický popis je uveden v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení č. 135/22/OCN „Úprava a servis technologií pro výdej, příjem a skladování PHL“.
- 2.6. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu, jakož i dílčí smlouvy a plnit závazky, dluhy z nich plynoucí.
- 2.7. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické a personální vybavení potřebné k řádnému plnění této Smlouvy, resp. k plnění dílčích smluv uzavřených na základě a v souladu s touto Smlouvou.
- 2.8. Zadávatel dále stanovuje jako projev zásady odpovědného zadávání (zásady environmentálně odpovědného zadávání a zásady sociálně odpovědného zadávání) následující podmínky plnění předmětu dílčích zakázek:
 - a) dodavatel se zavazuje provádět dílo tak, aby při úpravách, rekonstrukcích, modernizacích, popřípadě rozšířeních technologie VL a souvisejících technologií pro přepravu a skladování PHL byla zvolena taková inovativní řešení, která omezí dopad zhotovení stavby a/nebo jejího provozování na životní prostředí při zachování účely stavby a ekonomiky jejího zhotovení a provozování, Řešení podle předchozí věty podléhají odsouhlasení zadavatele a dodavatel je předloží ke schválení včetně zevrubné ekonomické analýzy jejich dopadu (nákladovosti);
 - b) Zadavatel bude po vybraném dodavateli vyžadovat, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet;
 - c) všechny platby poddodavatelům, pokud se budou podílet na realizaci veřejné zakázky, budou hrazeny řádně a včas.

Čl. 3. Předmět Smlouvy, dílčí smlouvy

- 3.1. Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek při poskytování služby spočívající v provedení činností souhrnně nazvaných „Úprava a servis technologií pro výdej, příjem a skladování PHL“, přičemž se Zhotovitel touto Smlouvou zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou a jejími nedílnými součástmi a v souladu s dokumenty, na které odkazuje, na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas poskytovat službu spočívající v profylaktických kontrolách výdejních lávek, operativním servisu, opravách technologií výdejních lávek a dále v úpravách, rekonstrukcích, modernizacích, popřípadě rozšíření, technologie výdejních lávek a souvisejících technologií pro přepravu a skladování PHL na skladech ČEPRO, a.s. a to v rozsahu:
 - 3.1.1. Činnosti uvedené v příloze č. 2 Technická specifikace.

- 3.1.2. Zajištění náhradních dílů.
- 3.1.3. Dodávka a implementace Měření a regulace (dále též jen „MaR“) systémů do řídicích systémů (dále též jen „ŘS“)
- 3.1.4. Vypracování technické dokumentace zahrnující:
 - technologický postup pro opravy a úpravy technologie, profylaktické prohlídky a jiné práce definované v příloze č. 2 Technická specifikace a rizika vyplývající z dané činnosti,
 - vypracování časového harmonogramu pro provádění prací na konkrétních technologiích,
 - zajištění a předání nezbytných dokladů k použitým komponentům a materiálům v souladu s platnými obecně závaznými předpisy a dle požadavků Objednatele,
- 3.1.5. Ekologická likvidace a uložení všech hmot a odpadů včetně nebezpečných odpadů vzniklých při realizaci v souladu s obecně závaznými předpisy včetně doložení příslušných dokladů,
- 3.1.6. Zajištění a předložení dokladů uvedených v článku 10. odst. 10.4 této Smlouvy,
- 3.1.7. Vyzkoušení funkčnosti zařízení po provedení profylaktické kontroly a operativního servisu, po opravách technologií výdejních lávek a dále v úpravách, rekonstrukcích, modernizacích, popřípadě rozšíření, technologie výdejních lávek a souvisejících technologií pro přepravu a skladování PHL a zajištění oprav a dodávky náhradních dílů a dalších servisních činností.

(souhrnně dále též jen „Činnosti“ anebo „Dílo“)

- 3.2. Dílo bude Zhotovitelem prováděno na základě této Smlouvy a v souladu s dílčí smlouvou uzavřenou postupem uvedeným v této Smlouvě:
 - 3.2.1. Dílčí smlouvu na plnění předmětu dílčí zakázky na služby, tj. dílčí smlouvu (dále a výše jen „**dílčí smlouva**“) Objednatel uzavře na základě písemné výzvy Objednatele k poskytnutí plnění a písemného potvrzení této výzvy Objednatele Zhotovitelem.
 - 3.2.2. Dílčí smlouva musí odpovídat podmínkám a požadavkům Objednatele uvedených v této Smlouvě a v písemné výzvě zadavatele k poskytnutí plnění.
 - 3.2.3. Nejsou-li požadované práce nebo dodávky materiálu a komponent uvedeny v příloze č. 1 Cenová nabídka (dále též „Výkaz výměr“) nebo v příloze č. 2 – Technická specifikace, vypracuje zhotovitel samostatnou nabídku, kterou Objednatel posoudí s ohledem na ceny v místě a čase přiměřené a na základě vzájemného odsouhlasení mezi Zhotovitelem a Objednatelem vystaví Objednatel objednávku.
- 3.3. Písemná výzva Objednatele k poskytnutí plnění (dále a výše též jen „**výzva Objednatele**“) bude obsahovat vždy:
 - 3.3.1. Specifikaci Činností pro danou technologii,
 - 3.3.2. Specifikaci konkrétního místa plnění, resp. umístění konkrétní technologie na skladu pohonných hmot, ve kterém se technologie nachází,
 - 3.3.3. specifikaci jednotlivých požadovaných činností oprav/profylaktických kontrol, dodávky náhradních dílů s výkazem výměr,
 - 3.3.4. Údaje o termínu realizace Díla (termín zahájení, předání pracoviště, ukončení a předání Díla Zhotovitelem Objednateli),
 - 3.3.5. Další požadavky Objednatele příp. další skutečnosti nezbytné pro provedení Díla Zhotovitelem.
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že dílčí smlouva bude uzavřena jedním z následujících postupů v rozlišení, které Činnosti se týká.
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že písemnou výzvou k poskytnutí plnění Zhotovitele spočívající v provedení Činností se považuje zadání takové dílčí zakázky na služby jednou z následujících možností:
 - 3.5.1. e-mailem ze systému Objednatele na adresu Zhotovitele: info@vaecontrols.cz
 - 3.5.2. v listinné podobě na adresu sídla Zhotovitele VAE CONTROLS, s.r.o., náměstí Jurije Gagarina 233/1, 710 00 Ostrava

- 3.5.3. telefonicky na tel. číslo 556 204 701 s tím, že telefonické hlášení musí být bezodkladně potvrzeno faxem či e-mailem
- 3.5.4. či jiným vhodným způsobem výslovně písemně mezi Smluvními stranami dohodnutým
- 3.6. Výzva Objednatele bude vždy písemně e-mailem či faxem z adresy Zhotovitele potvrzena, přičemž potvrzením výzvy Objednatele Zhotovitelem je dílčí smlouva uzavřena.
- 3.6.1. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu písemně potvrdit objednávku Objednatele, a zároveň doručí Objednateli oceněný výkaz výměr Díla a časový harmonogram plnění Díla odpovídající objednávce, tj. Harmonogram prací.
- 3.6.2. Smluvní strany konstatují, že v případě, kdy Zhotovitel potvrdí objednávku Objednatele s dodatkem nebo odchylkou proti požadavkům Objednatele, nezakládá takové potvrzení objednávky Zhotovitelem povinnost Objednatele takovou odchylku či dodatek akceptovat a dílčí smlouva mezi Smluvními stranami uzavřena není.
- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že výzvy Objednatele k poskytnutí Činností Smlouvy budou některým ze způsobů uvedených výše Zhotovitelem přijímány NONSTOP, tj. v režimu 24/7.
- 3.8. Činnosti Zhotovitele budou probíhat na základě písemné výzvy Objednatele k poskytnutí plnění a její potvrzení ze strany Zhotovitele ve smyslu výše uvedeném. Zhotovitel se zavazuje Dílo (či jeho část vyplývá-li možnost provést a předat Dílo po částech z výzvy Objednatele) dokončit a předat v Objednatelem určeném termínu, nebude-li písemně dohodou výslovně stanoveno jinak. Práce Zhotovitele na Díle v případě rozsáhlejších služeb Zhotovitele budou probíhat dle předem sjednaného a oběma Smluvními stranami odsouhlaseného Harmonogramu prací. V případě požadavku Objednatele vypracuje Zhotovitel podrobný Harmonogram prací se zapracováním požadavků uvedených Objednatelem v písemné výzvě Objednatele (požadavky na postupové termíny, maximální doba odstávky objektu atd.), který bude následně předložen Objednateli. Objednatel bez zbytečného odkladu písemně schválí předložený podrobný Harmonogram prací a/nebo předá zpět Zhotoviteli k zapracování připomínek. Konečný a závazný Harmonogram prací schvaluje Objednatel vždy dle svých obchodních a provozních priorit.
- 3.9. K podmínkám dílčích smluv Smluvní strany dále sjednávají, že pokud budou v rámci provádění Díla nutné odstávky provozu některého objektu či některého dotčeného a souvisejících zařízení, v místě, kde bude Dílo prováděno, budou tyto odstávky zahrnuty v Harmonogramu periodických činností a/nebo v Harmonogramu prací a Smluvní strany předpokládají, že odstávky proběhnou v předem stanoveném termínu. Sjednané termíny odstávek však musí být vždy před jejich zahájením písemně schváleny Objednatelem (zástupcem Objednatele) a teprve po tomto potvrzení může Dodavatel přistoupit k započetí činností plánovaných v rámci doby odstávky.
- 3.9.1. Délku jednotlivých naplánovaných odstávek nelze překročit. Nebude-li Zhotovitel schopen zajistit dokončení potřebných prací během naplánované odstávky, je povinen vyklidit a připravit pracoviště a dotčená zařízení tak, aby bylo možno odstávku řádně ukončit. Dokončení potřebných prací proběhne v další odstávce, která bude dohodnutá a schválená Objednatelem. Takové nesplnění původního termínu odstávky nelze považovat za přerušení prací z provozních důvodů na straně Objednatele a nezprošťuje tedy Zhotovitele odpovědnosti za splnění Díla v řádné lhůtě, a to ani po dobu mezi původní plánovanou odstávkou a odstávkou nově dohodnutou.
- 3.10. V případě, že výzvu Objednatele učiní osoba, jež není určena touto Smlouvou jako osoba, jež je oprávněna požadavek Objednatele zadat, či taková osoba jiným způsobem neprokáže pověření Objednatele činit za Objednatele výzvu k poskytnutí plnění Zhotovitele na základě a dle této Smlouvy, nebude na takové požadavky brán zřetel a nebudou řešeny způsobem dle této Smlouvy.

Čl. 4. Dílo

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v rozsahu a dle podmínek uvedených v této Smlouvě a na jejím základě. Podkladem pro provádění Díla dle této Smlouvy a v souladu s dílčí smlouvou je níže uvedená dokumentace (dále též jen „Závazné podklady“).
- 4.1.1. Zhotoviteli předaná a jím převzatá zadávací dokumentace K zakázce č. 135/22/OCN „Úprava a servis technologií pro výdej, příjem a skladování PHL“ včetně jejích příloh (výše a dále také jen „Zadávací dokumentace“)

- 4.1.2. nabídka Zhotovitele č. 3PRO2200235-vesmir-220701 ze dne 1. 7. 2022 podané k zakázce č. 135/22/OCN (dále jen „Nabídka“).
- 4.1.3. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závacných podkladů má přednost Zadávací dokumentace.
- 4.1.4. Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provádění Díla podle Závacných podkladů.
- 4.2. Předmět Díla je specifikován touto Smlouvou, zejména v odst. 3.1 Smlouvy, konkrétní požadavky Objednatele vychází z aktuálních potřeb Objednatele a budou vždy specifikovány ve výzvě Objednatele.
- 4.3. Součástí předmětu Díla jsou kromě povinnosti Zhotovitele spočívající v provedení vlastních prací na Díle též služby, práce a jiné výkony Zhotovitele s prováděním Díla související, tj. zejména dodávka materiálů, komponentů či výrobků a zařízení potřebných pro řádnou realizaci Díla a příp. provedení vyzkoušení Díla. Zhotovitel je povinen Dílo uvést do provozu a předat nejpozději při převzetí Díla Objednateli veškerou dokumentaci potřebnou k užívání Díla a/nebo nutnou dle platné legislativy a dále sjednanou mezi Smluvními stranami.

Zhotovitel je povinen provádět a při provádění Díla postupovat v souladu se závazným podrobným technologickým postupem prací, který předloží nejpozději 3 dny před zahájením prací na Díle.
- 4.4. Při provádění Díla budou přednostně využívány náhradní díly, kterými disponuje Objednatel. Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele na nevhodnost takových náhradních dílů včetně jejího odůvodnění. Neučiní-li tak, pak užitím takových náhradních dílů není jakkoliv dotčena záruka na Dílo podle Smlouvy.

Čl. 5. Práva a povinnosti Smluvních stran

- 5.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo jako celek a jeho jednotlivé součásti v souladu a za podmínek stanovených touto Smlouvou, dalšími dokumenty uvedenými ve Smlouvě a dílčí smlouvou.
- 5.2. Realizace Díla – všechny práce a dodávky musí odpovídat ČSN normám a platným obecně závazným předpisům a požadavkům Objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo plně vyhoví podmínkám, stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v této Smlouvě. Zhotovitel je povinen provést Dílo ve vysoké kvalitě odpovídající charakteru a významu Díla.
- 5.3. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je potřeba trvale nebo dočasně k řádnému zahájení, provedení, dokončení, vyzkoušení a předání Díla a uvedení Díla do řádného provozu v souladu s právními předpisy a platnými normami (ČSN, EN nebo jinými), bez ohledu na to, zda tyto práce, dodávky, služby a výkony nutné pro provedení, byly obsaženy výslovně v této Smlouvě a podkladech pro provedení Díla.
- 5.4. Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN nebo EN v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené údaje normy ČSN nebo EN se pro předmět Díla dle této Smlouvy považují za normy závazné. Při rozdílu v ustanoveních normy platí ustanovení normy výhodnější pro Objednatele.
- 5.5. Zhotovitel je povinen pro provádění Díla používat pouze nové a nepoužité materiály, výrobky potřebné pro realizaci Díla.
- 5.6. Zhotovitel zajistí a dodá veškerý potřebný materiál a práce k provedení Díla.
- 5.7. Zhotovitel předloží Objednateli k písemnému schválení vzorky předem dohodnutých a Objednatelům označených materiálů, výrobků nebo jiných náležitostí potřebných k provedení Díla před jejich prvním použitím pro provedení Díla. Jejich záměnu pak smí Zhotovitel provést pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele. Stejně tak musí být předem Objednatelům písemně odsouhlaseny veškeré materiály, díly, povrchové úpravy, výrobky apod., které neodpovídají Závacným podkladům, nebo které ovlivňují vzhled, životnost, jakost a provozování Díla.
- 5.8. Zhotovitel se zavazuje při provádění činností brát zřetel na potřeby a požadavky Objednatele a jednotlivé činnosti se Zhotovitel zavazuje provádět v úzké součinnosti s Objednatelům.
- 5.9. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla platnou legislativu (v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo při poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - „BOZP“), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy, v oblasti ochrany životního prostředí zejména platné právní předpisy týkající se nakládání s odpady apod.).

- 5.10. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen předat a předá vždy před zahájením prací písemnou informaci o rizicích vyplývajících z jeho pracovní činnosti a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením (viz § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů).
- 5.11. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat rovněž vnitřní předpisy Objednatele, se kterými byl prokazatelně seznámen.
- 5.12. Zhotovitel je povinen provádět zásahy na zařízení tak, aby při provozu těchto zařízení byly splněny veškeré požadavky a povinnosti kladené na objednatele při provozování dotčených technologií vyplývajících z obecně závazných právních předpisů českého právního řádu, tj. zejména:
- 5.12.1. platné české technické normy anebo EN normy,
 - 5.12.2. požární předpisy,
 - 5.12.3. veškeré bezpečnostní předpisy, zejména:
 - Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 433/1991 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví v stavebnictví (č. 167),
 - zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
 - vyhlášku Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů,
 - 5.12.4. právní předpisy v oblasti nakládání s odpady (Zhotovitel je povinen vést evidenci a v případě potřeby na vyžádání Objednatele doložit, že plní právní předpisy v oblasti nakládání s odpady),
 - 5.12.5. vnitřní předpisy Objednatele, s nimiž byl seznámen,
 - 5.12.6. podmínky stanovené touto Smlouvou a jejími přílohami a dokumenty, na které odkazuje,
 - 5.12.7. stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních orgánů),
 - 5.12.8. podklady předané Objednatel.
- 5.13. Zhotovitel je povinen provádět Dílo pouze prostřednictvím osob kvalifikovaných, odborně způsobilých k provádění jednotlivých činností.
- 5.13.1. Zhotovitel odpovídá za chování osob provádějících Dílo a za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění Díla. Zhotovitel zaměstnávající zahraniční pracovníky je povinen pro tyto pracovníky vyřídit a mít v pořádku veškeré legislativní náležitosti dle právních předpisů ČR pro pobyt a práci na území ČR a doložit na vyžádání veškeré doklady Objednateli. Zhotovitel je rovněž povinen prokázat, že tyto osoby zcela porozuměly vnitřním předpisům Objednatele platným ohledně vstupu, pohybu a provádění činnosti v areálu skladu pohonných hmot Objednatele, v němž se za provozu skladu provádí Dílo. Na vyžádání je povinen vyloučit osoby, které porušily právní, technické anebo vnitřní předpisy Objednatele platné v areálu skladu pohonných hmot a platné na Pracovišti
 - 5.13.2. Zhotovitel prohlašuje, že je dostatečně vybaven k plnění této Smlouvy a dílčích smluv. Zhotovitel prohlašuje, že se zavazuje zajistit dostatečnou personální i technickou kapacitu pro provádění Díla dle a na základě této Smlouvy a v souladu s dílčí smlouvou, a zavazuje se, že bude mít vždy pro plnění dílčí smlouvy uzavřené s Objednatel potřebnou techniku a pomůcky požadované Objednatel a platnou legislativou. Zejména se Zhotovitel v této souvislosti zavazuje, že bude mít k dispozici ruční nářadí v provedení Ex, tester CIVACON a uzemnění, ostatní potřebné přípravy, osobní analyzátor plynů s detekcí LEL, O₂, CO.
- 5.14. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle až do předání Díla Objednateli.
- 5.15. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je potřeba trvale nebo dočasně k řádnému zahájení, provedení, dokončení, vyzkoušení a předání Díla a uvedení Díla

do řádného provozu v souladu s právními předpisy a platnými normami (ČSN, EN nebo jinými), bez ohledu na to, zda tyto práce, dodávky, služby a výkony nutné pro provedení, byly obsaženy výslovně v této Smlouvě a podkladech pro provedení Díla.

- 5.16. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s technologickým postupem, jež je nedílnou součástí dokumentace předkládané před nástupem provedení Díla.
- 5.17. Zhotovitel je povinen předložit analýzu rizik prací a přijatých opatření k ochraně před jejich působením před nástupem provedení Díla.
- 5.18. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat za plného provozu skladů, a zavazuje se před zahájením Díla informovat a seznámit se všemi skutečnostmi vztahujícími se k provozu Skladů tak, aby mohl Dílo řádně a bezpečně pro Objednatele provést s tím, že v okamžiku, kdy Zhotovitel zahájí provádění Díla, platí, že Zhotovitel je s podmínkami provozu Skladů seznámen.
- 5.19. Zhotovitel bere na vědomí, že:
- 5.19.1. Pracoviště bude umístěno a Dílo bude prováděno za provozu Skladu, ve kterém se předmětné technologie nachází a že Sklad, v němž je provozován daňový sklad, podléhá právním předpisům o prevenci závažných havárií, přičemž Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů vzniklých opatřeními směřujícími k dodržování předpisů spojených s uvedenou skutečností,
- 5.19.2. práce na Díle budou prováděny v prostředí s vysokým požárním nebezpečím a prostory v okolí technologií jsou klasifikovány jako prostředí s nebezpečím výbuchu (ZÓNA 1 a ZÓNA 2), a zavazuje se přizpůsobit tomu veškeré zařízení a strojní vybavení použité k realizaci Díla a také vybavení osob realizujících Dílo z hlediska bezpečnosti práce
- 5.20. Objednatel se zavazuje k řádnému provedení Díla Zhotovitelem poskytnout svou součinnost. Objednatel pro realizaci Díla zajistí:
- 5.20.1. Vstupy do areálu skladu pohonných hmot pro pracovníky a techniku Zhotovitele do místa plnění;
- 5.20.2. Součinnost při přípravě a schvalování Harmonogramu prací (dále také jen „HMG“);
- 5.20.3. Seznámení s vnitřními předpisy Objednatele zejména vnitřních předpisů týkajících se prevence závažných havárií, požární bezpečnosti, daňového skladu, propustkového řádu apod;
- 5.20.4. Proškolení pracovníků dodavatele v BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a PO (požární ochrana) a PZH (prevence závažných havárií) na Skladech.
- 5.21. Za dodržování a plnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění Díla dle této Smlouvy je za Objednatele pověřen zaměstnanec Objednatele jmenovaný Objednatel a uvedený v protokolu o předání jednotlivého pracoviště Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců Objednatele a Zhotovitele a postupů k jejich splnění.
- 5.22. Za Zhotovitele je pověřen a zmocněn k plnění povinností plynoucích z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci p. [REDAKCE]
- 5.23. Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, navrhnout Zhotoviteli změnu rozsahu předmětu Díla (zejména omezení nebo rozšíření rozsahu Díla o další dodávky a práce, které se mohou během realizace vyskytnout a které nejsou zahrnuty do předmětu Díla) v souladu s postupem uvedeným ve VOP.
- 5.24. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením Díla nebo jeho části jen takové poddodavatele, kteří byli předem písemně schváleni Objednatel, nebo jejichž jména byla uvedena v písemné Nabídce Zhotovitele doručené Objednateli v zadávacím řízení č. 135/22/OCN. Při provádění Díla nebo jeho části poddodavateli je Zhotovitel odpovědný Objednateli stejným způsobem, jako kdyby Dílo nebo jeho část prováděl sám.
- 5.25. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za dodržování platného znění předpisů uvedených v této Smlouvě a místních podmínek osobami realizujícími Dílo na straně Zhotovitele. Za tímto účelem je povinen jmenovat odpovědnou osobu, která bude organizovat a řídit pracovníky Zhotovitele a osoby realizující Dílo na straně Zhotovitele a jméno a příjmení této osoby sdělí Objednateli v dostatečném časovém předstihu. Jmenování odpovědné osoby je povinností i v případě, že se jedná o dvoučlennou pracovní skupinu.

- 5.26. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla.
- 5.27. Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím jím pověřených osob provádět kontrolu plnění smluvních povinností Zhotovitele kdykoli v průběhu provádění Díla Zhotovitelem.
- 5.28. Komunikačním jazykem pro zadání dílčích zakázek, jakož i pro plnění dílčích smluv, je stanoven český jazyk, nebude-li dohodnuto výslovně jinak. V případě, že nějaká část dokumentace sepsaná ve více než jednom jazyce, bude mít vždy přednost verze vyhotovená v českém jazyce.
- 5.29. V případě, že by Zhotovitel potřeboval pro komunikaci v českém jazyce tlumočníka, zajistí si jej na své náklady.

Čl. 6. Změny rozsahu Díla

- 6.1. Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů (zejména zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění), požadovat či odsouhlasit po uzavření dílčí smlouvy (objednávky) a v průběhu provádění Díla včetně realizačních prací změny v kvalitě, množství či druhu dodávky, a to uzavřením dodatku k dané dílčí smlouvě nebo rozšířením objednávky.
- 6.2. Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů (zejména zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění), navrhnout zhotoviteli změnu rozsahu předmětu Díla (zejména omezení nebo rozšíření rozsahu Díla o další dodávky a práce, které se mohou během realizace vyskytnout a které nejsou zahrnuty do předmětu Díla). Smluvní strany sjednávají, že za Vícepráce budou považovat pouze práce nad rámec předmětu Díla, které však s prováděným předmětem Díla souvisí s tím, že růst cen materiálů a prací po dobu trvání této Smlouvy není považován za Vícepráce, ale je rizikem Zhotovitele, které jde k jeho tíži. Za Méněpráce Smluvní strany považují práce a dodávky v předmětu Díla předvídané, avšak neuskutečněné nebo práce a dodávky sice uskutečněné, avšak v menším rozsahu než se předpokládalo.
- 6.3. Není-li to v rozporu s obecně závaznými předpisy českého právního řádu, může být rozsah Díla naopak zúžen, a to vždy na základě požadavků Objednatele.
- 6.4. V případě změny rozsahu Díla a s tím spojené změně Ceně díla budou Smluvní strany postupovat výslovně v souladu s ustanovením VOP, není-li to v rozporu s obecně závaznými předpisy českého právního řádu a nebude-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

Čl. 7. Místo a doba plnění

- 7.1. Dílo bude vždy prováděno v níže uvedených Skladech Objednatele:

Sklad:	Adresa Skladu
Hájek	363 01, Hájek 118
Třemošná	330 11, Třemošná 1057
Hněvice	411 08, Štětí, Hněvice 62
Mstětice	250 91, Zeleneč, Mstětice 3
Bělčice	387 43, Bělčice 297
Včelná	373 82, Včelná, Čtyři chalupy 459
Smyslov	390 02, Tábor, Smyslov 23
Šlapanov	582 51, Šlapanov 162
Cerekvice	507 77, Cerekvice nad Bystřicí 72
Střelice	664 47, Střelice, Brněnská 729/25
Klobouky	691 72, Klobouky u Brna 860
Loukov	768 75, Loukov 166

Sedlnice	742 56, Sedlnice 503
Litvínov	435 14, Litvínov 7
Potěhy	286 01, Horky u Čáslavi
Nové Město	280 02, Kolín 2
Velká Bíteš	595 01, Velká Bíteš, č.p. 288

- 7.1.1. Místo plnění Díla se vždy nachází v areálu Skladu Objednatele a Dílo bude prováděno za provozu a případné náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu této skutečnosti, např. z důvodu opatření k dodržování předpisů Objednatele platných v místě plnění a veškerém dotčeném okolí místa plnění, kde je Dílo Zhotovitelem prováděno, jsou zahrnuty v Ceně díla.
- 7.2. Ve výzvě Objednatele bude specifikováno konkrétní místo plnění.
- 7.3. Místo uvedené v předcházejícím ustanovení, tj. konkrétní místo plnění Díla je taktéž místem předání a převzetí Díla. Zhotovitel se zavazuje dodržet místo plnění Díla v souladu se Smlouvou a dílčí smlouvou.
- 7.4. Doba plnění Díla bude sjednána v dílčí smlouvě, jejíž nedílnou součástí bude, v případě potřeby Harmonogram prací odsouhlasený ze strany Objednatele. Objednatel schvaluje Harmonogram prací dle svých obchodních a provozních priorit. Termín zahájení Díla bude uveden ve výzvě Objednatele.
- 7.5. Konečný a ze strany Objednatele schválený Harmonogram prací ve vztahu ke každé dílčí smlouvě je pro Zhotovitele závazným podkladem pro realizaci Díla.

Čl. 8. Podmínky poskytování služeb – pro provádění Díla, pracoviště

- 8.1. Zhotovitel souhlasí, že dílčí zakázky na služby dle této Smlouvy budou Objednatelem zadány postupem sjednaným v čl. 3 této Smlouvy.
- 8.2. Osobami oprávněnými činit za Objednatele výzvy jsou osoby oprávněné jednat za Objednatele ve věcech smluvních uvedené v záhlaví Smlouvy.
- 8.2.1. V případě, že výzvu Objednatele učiní osoba, jež není určena touto Smlouvou jako osoba, jež je oprávněna požadavek Objednatele zadat, či taková osoba jiným způsobem neprokáže pověření Objednatele činit za Objednatele výzvu k poskytnutí plnění Zhotovitele dle této Smlouvy, nebude na takové požadavky brán zřetel a nebudou řešeny způsobem dle této Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn na základě výzvy Objednatele učiněné neoprávněnou osobou plnit a Objednatel není jakékoliv takové plnění uhradit.
- 8.3. Přejímka pracoviště/staveniště
- 8.3.1. Smluvní strany sjednávají, že pracoviště/staveniště bude vždy Objednatelem Zhotoviteli předáno jednorázově a podmínky uvedené v čl. 8 VOP se užijí přiměřeně.
- 8.3.2. O předání pracoviště/staveniště bude vždy vyhotoven a oprávněnými osobami Smluvních stran podepsán protokol. Pokud se Zhotovitel k přejímce pracoviště nedostaví ve stanoveném termínu, nemá právo uplatňovat posunutí termínu plnění z titulu pozdního předání pracoviště/staveniště.
- 8.4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré náklady na zařízení pracoviště/staveniště včetně jeho střežení, hradí Zhotovitel, nedohodnou-li se strany písemně jinak.
- 8.5. Uzavřený sklad Objednatel nezajišťuje, poskytne Zhotoviteli pouze možnost umístění materiálu a techniky v areálu skladu dle možností Objednatele v době provádění Díla Zhotovitelem.
- 8.6. V místech, kde je zdroj el. energie a vody, poskytne Objednatel Zhotoviteli napojení na tyto zdroje za předpokladu zřízení podružného měření (na náklad Zhotovitele) a úhrady spotřeby.
- 8.7. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli sociální zařízení, umožní Zhotoviteli přístup na WC v prostorách příslušného skladu.
- 8.8. Zhotovitel je povinen provádět práce pouze na jemu určeném místě.

- 8.9. Zhotovitel zabezpečí na své vlastní náklady dopravu a skladování strojů, zařízení a materiálu nezbytného k řádnému provádění Díla, jakož i bezpečnost a ochranu zdraví osob na pracovišti/staveništi.
- 8.10. Zhotovitel zodpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě pracoviště/staveniště a na sousedních plochách. Poškozenou nebo zničenou zeleň je Zhotovitel povinen nahradit.
- 8.11. Zhotovitel zodpovídá za udržení pořádku na vlastním pracovišti/staveništi. V případě, že Zhotovitel nezajistí likvidaci vlastního odpadu a zbytků materiálu, odstraní je Objednatel sám na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit náklady, které mu byly v této souvislosti Objednatelům vyúčtovány, a to ve lhůtě uvedené ve výzvě k zaplacení zaslané Objednatelům Zhotoviteli.
- 8.12. Zhotovitel je povinen předat vyklizené pracoviště/staveniště Objednateli nejpozději v den přejímky Díla.
- 8.13. V souladu s termíny a ve lhůtách sjednaných touto Smlouvou či uvedených ve výzvě Objednatelů a sjednaných v dílčí smlouvě je Zhotovitel povinen zahájit činnosti, Dílo včas a řádně dokončit a předat Objednateli.
- 8.14. Zhotovitel je povinen provádět Činnosti dle odst. 3.1 Smlouvy ve sjednaných termínech a lhůtách.
- 8.15. O každé činnosti prováděné Zhotovitelem v rámci periodických činností (o každé kontrole, revizi apod.) bude Zhotovitelem proveden záznam. Tento záznam včetně všech protokolů, zpráv a osvědčení o provedené činnosti (tj. doklady nezbytné dle platné legislativy a požadované Objednatelům) bude předán Objednateli nejpozději v den předání Díla.
- 8.16. Zhotovitel je povinen při provádění Díla vést stavební/pracovní deník/pracovní výkaz/montážní zprávu/protokol dle charakteru Díla (souhrnně dále též jen záznam o provádění Díla). Pro náležitosti stavebního/pracovního/montážního deníku se užijí příslušná ustanovení čl. 8.6 VOP. Do stavebního/pracovního/montážního deníku jsou za Zhotovitele oprávnění zapisovat:
- Ing. Viktor Stuchlík, Ing. Novák Ivo, Michal Pop, Ing. Václav Polanka a dále Vedoucí údržby a správy majetku jednotlivých skladů a Střediska I Produktovody a Vedoucí projektů.
- 8.17. Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel je povinen pro každé prováděné Dílo vést záznam o provádění Díla a je povinen vypracovat a nechat si oprávněnou osobou Objednatelů, tj. osobou sdělenou Objednatelům Zhotoviteli v rámci výzvy Objednatelů nebo písemně v průběhu provádění Díla, potvrdit (podpis) údaje uvedené v takovém záznamu (stavební/pracovní deník/ pracovní výkaz/montážní zpráva dle charakteru Díla) a tato osoba rovněž připojí potvrzení o převzetí Díla včetně všech dokladů nezbytných k užití Díla a požadovaných Objednatelům k záznamu či uvede připomínky, poznámky a důvody, proč Dílo nepřijímá (dále také jen „Protokol o předání a převzetí“). Tato osoba Objednatelů musí být oprávněna k převzetí díla Objednatelům. Zhotovitel je povinen předat záznam o provádění Díla Objednateli ve dvou vyhotoveních (1 originálu a v 1 kopii).
- 8.18. Předání a převzetí Díla probíhá dle ustanovení čl. 11 VOP, není-li mezi Smluvními stranami sjednáno výslovně jinak.

Čl. 9. Cena díla a platební podmínky

- 9.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla (dále jen „**Cena díla**“) bude uvedena v dílčí smlouvě, resp. v písemné výzvě Objednatelů potvrzené ze strany Zhotovitele dle této Smlouvy.
- 9.2. Cena díla je stanovena dohodou jako cena smluvní, bez DPH, a bude vždy vypočtena na základě součtu jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy a bude účtována dle skutečně provedených Činností Zhotovitele.
- 9.3. Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy jsou stanoveny jako konečné, neměnné a nejvýše přípustné.
- 9.4. Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (DPH). DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude připočtena k Ceně díla.
- 9.5. Cena za dopravu je Objednateli účtována formou paušální jednotkové ceny. V případě provádění činností na několika místech plnění v průběhu jednoho dne (bez ohledu, zda se jedná o periodické činnosti či činnosti dle pododstavce 3.1.2 Smlouvy) bude Zhotovitelem účtována pouze jedna paušální částka, nebude-li písemně dohodnuto jinak.

9.6. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách sloužícího pro výpočet Ceny díla zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele spojené s plněním této Smlouvy a dílčí smlouvy, zejména:

- 9.6.1. náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi/pracovišti;
- 9.6.2. náklady na postavení, udržování a odstranění lešení, pokud je ho potřeba;
- 9.6.3. náklady na zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí;
- 9.6.4. náklady na vyklizení staveniště/pracoviště, odvoz zbytků materiálu(ů), včetně souvisejících nákladů;
- 9.6.5. náklady na veškerá opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k zajištění požární ochrany a prevence závažných havárií;
- 9.6.6. náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a podobně;
- 9.6.7. náklady na opatření na ochranu konstrukcí před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty a podobně;
- 9.6.8. náklady na provádění zkoušek a atestů během realizace Díla, jsou-li vyžadovány Objednatel a/nebo platnými právními předpisy;
- 9.6.9. náklady na platby za požadované záruky a pojištění;
- 9.6.10. náklady na veškeré práce, dodávky či výkony potřebné k řádnému provedení kompletního Díla, jímž se má zabezpečit plná funkčnost a bezpečnost Díla, jakož i náklady na veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a pomocné práce, výkony či přímoci;
- 9.6.11. náklady spojené s vypracováním veškerých technologických předpisů a postupů a jiných dokladů nutných k provedení Díla;
- 9.6.12. náklady a poplatky související s plněním Díla včetně daní, poplatků dle platných právních předpisů (včetně celních) a bankovních výloh;
- 9.6.13. náklady na veškeré práce, dodávky či výkony potřebné k řádnému provedení kompletního díla, jímž se má zabezpečit plná funkčnost a bezpečnost technologie, a to i když nejsou výslovně ve smlouvě o dílo či jejích přílohách (např. výkazu výměr) uvedeny.

9.7. Cena za Zhotovitelem užitá náhradní díla a komponenty bude Zhotovitelem účtována v čase a místě obvyklá a v případě požadavku Objednatele bude výše této ceny Zhotovitelem doložena před užitím takových náhradních dílů či komponentů a ze strany Objednatele schválena. Objednatel je oprávněn si případně zajistit náhradní díly a komponenty od jiného dodavatele či z vlastních zdrojů.

9.8. Cena za provedené plnění bude Objednatel hrazena vždy po řádném a úplném dokončení Díla na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených po předání a převzetí Díla, o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí. Faktura bude vystavena Zhotovitelem, nebude-li mezi Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, vždy po předání a převzetí Díla stvrzeného podpisem Protokolu o předání a převzetí zástupci obou Smluvních stran. V případě periodické činnosti bude faktura Zhotovitelem vystavena vždy po každé jednotlivé činnosti (části Díla) provedené Zhotovitelem v jednom místě plnění dle Harmonogramu prací.

9.9. Adresy pro doručení faktur:

- v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí;
- v případě, že Zhotovitel bude mít zájem vystavit a doručit Objednateli fakturu v elektronické verzi, bude mezi stranami uzavřena samostatná dohoda o elektronické fakturaci, kde Smluvní strany ujednají bližší náležitosti veškerých tím dotčených dokumentů.

Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli.

9.10. Smluvní strany si nesjednávají zádržné.

Čl. 10. Předání a převzetí Díla

10.1. Předání a převzetí Díla se uskuteční ihned po řádném dokončení Díla, v souladu a způsobem dle VOP či výslovně dohodnutým v dílčí smlouvě.

10.2. Zhotovitel je povinen po dokončení Díla či dotčené části vyzvat Objednatele předem k převzetí Díla či části Díla uvedené v dílčí smlouvě, potažmo v Harmonogramu prací.

10.2.1. Objednatel je povinen převzít Dílo a/nebo část Díla uvedené v Harmonogramu prací pouze, bude-li toto Dílo a/nebo část Díla provedena řádně, tj. bez jakýchkoli vad a nedodělků. Vadami a nedodělkami se rozumí rovněž nedodání některého z dokladů požadovaných Objednatелеm.

10.3. O předání a převzetí Díla a/nebo části Díla uvedené v Harmonogramu prací bude sepsán Protokol o předání a převzetí, který bude podepsán oprávněnými osobami obou Smluvních stran.

10.4. Pro účely přejímky a před přejímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce kromě veškerých dokladů sjednaných jinde ve Smlouvě a plynoucích z obecně závazných právních a technických předpisů i následující doklady:

- protokol o provedené profylaktické prohlídce a jejím výsledku v českém jazyce,
- doklady o ekologické likvidaci veškerých odpadů, vzniklých prováděním Díla,
- montážní/stavební deník – originál a kopii pro archivaci Objednatele, kde bude zapsán postup realizace Díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu,
- veškeré doklady o provedených zkouškách dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů,
- protokol o provedené kontrole,
- veškeré doklady k použitým komponentům a materiálům v souladu s platnými předpisy
- záruční listy,
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- doklady o úředních přejímkách, atestech a prohlášením o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
- veškeré návody k obsluze a záruční listy,
- výkresovou dokumentaci aktuálního stavu v případě technologické změny v rozsahu této změny – aktualizace technologických schémat (PID) v důsledku provedených úprav/změn,
- projektovou dokumentaci byla-li vyžadována,
- případně další doklady požadované úřady k přejímacímu řízení nebo doklady požadované Objednatелеm.

10.5. Veškerá dokumentace musí být Objednateli předána v českém jazyce. Bez výše uvedených dokumentů, předaných Objednateli, nelze považovat závazek Zhotovitele za splněný, tj. nebude-li Zhotovitelem spolu s Dílem předána i výše uvedená dokumentace, má se za to, že plnění Zhotovitele nebylo řádné, tj. bez vad.

10.6. Veškerá dokumentace, kromě stavebního/montážního deníku, budou předány 2 x originál a budou členěny dle jednotlivých prací a výkonů a budou evidovány v přehledném soupisu a dále budou předány 1 x v elektronické podobě v PDF a výkresová dokumentace v DWG, je-li požadována. Bez těchto dokladů nebude Dílo považováno pro účely předání a převzetí za bezvadné.

10.7. Zaměstnancem pověřeným za předání a převzetí řádně provedeného Díla jsou:
Za Zhotovitele: [redacted]

Za Objednatele: osoba oprávněná zapisovat do stavebního/pracovního/montážního deníku.

Čl. 11. Práva z vadného plnění, záruka

11.1. Práva zadavatele z vadného plnění a záruka na Dílo se řídí dle podmínek uvedených v této Smlouvě v souladu s platnou legislativou (českým právem).

11.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za Dílo, a případné dodávky realizované v rámci Díla. Záruční lhůta na dodávky dodané v rámci plnění Díla (např. materiál použitý při servisní činnosti) je stanovena na 24 měsíců a počíná běžet dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí pro dané Dílo oběma Smluvními stranami. Záruka se nevztahuje na bezporuchovost zařízení technologií v intervalu mezi provedením jednotlivých činností (např. kontrol či revizí) s výjimkou případů, kdy je porucha způsobena zásahem a/nebo opomenutím Zhotovitele a/nebo vadou jím provedeného Díla (včetně dodaných náhradních dílů).

11.3. Zhotovitel přejímá zejména záruku za to, že Dílo (včetně všech jeho případných změn), jakož i jeho části, bude během záruční doby:

- a) bez jakýchkoliv vad,

- b) splňovat všechny stanovené požadavky,
- c) mít vlastnosti Smlouvou vymíněné nebo, pokud tato Smlouva takové vlastnosti nestanoví, vlastností obvyklé k účelu sjednanému v této Smlouvě či dílčí smlouvě,
- d) splňovat všechny požadavky stanovené platnými zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy, a bude odpovídat platným technickým pravidlům, normám a předpisům,
- e) způsobilé k účelu sjednanému dle Smlouvy, a
- f) nebude obsahovat chyby a nedostatky.

- 11.4. Vady plnění, které zjistí Objednatel v záruční době, oznámí Objednatel Zhotoviteli do konce záruční doby.
- 11.5. Zhotovitel je povinen vady Díla druhu HAVÁRIE odstranit nejpozději do 48 hodin od přijetí oznámení na e-mailovou adresu uvedenou v čl. 11.6 níže, pokud to povaha vady umožňuje a ostatní vady odstranit nejpozději do termínu sjednaného po dohodě s objednatelem.
- 11.6. Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese: VAE CONTROLS, s.r.o., náměstí Jurije Gagarina 233/1, 710 00 Ostrava nebo na e-mailové adrese: [REDACTED]
- 11.7. Kromě povinností Zhotovitele vyplývajících z vadného plnění Zhotovitele a záruky je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklé prokázané škody, které Objednateli vzniknou v souvislosti s vadným plněním Zhotovitele.

Čl. 12. Pojištění Zhotovitele

- 12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění
- pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 30 000 000,- Kč.
 - pro případ odpovědnosti za škodu na životním prostředí (za únik znečišťujících látek) s pojistným plněním ve výši min. 30 000 000,- Kč.
- a zavazuje se jej mít uzavřené po celou dobu trvání Smlouvy
- 12.2. Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy.
- 12.3. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržité trvání pojištění v dohodnutém rozsahu a po dohodnutou dobu. V případě snížení výše pojistného plnění pod minimální stanovenou výši či ukončení pojistné smlouvy během doby trvání této Smlouvy, je Zhotovitel povinen informovat Objednatele nejpozději ke dni účinnosti změny pojistného plnění či ke dni ukončení pojistné smlouvy.
- 12.4. Pokud nebude mít Zhotovitel sjednáno pojištění nebo nebude mít sjednáno pojištění s odpovídajícím pojistným plněním, je Objednatel oprávněn pozastavit provádění Díla. O tuto dobu se však neprodlužuje dohodnutý termín pro předání Díla.
- 12.5. V případě výše uvedené změny pojistné smlouvy nebo jejího nového sjednání je Zhotovitel povinen a Objednatel oprávněn postupovat obdobně podle odst. 12.2. Smlouvy.

Čl. 13. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 13.1. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních předpisů.
- 13.2. Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí pracoviště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč.
- 13.3. V případě, že Zhotovitel nepředloží Objednateli dokumenty požadované Objednatelem na základě této Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy před zahájením vlastních prací na Díle (analýza rizik, seznam techniků, technologické postupy, harmonogram plnění apod.) ve sjednané době před zahájením prací na Díle a/nebo takové dokumenty nepředloží vůbec a započne s prováděním Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč jednorázově za každé takové porušení.

- 13.4. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání Díla či části Díla z důvodu na své straně, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 13.5. Bude-li Zhotovitel v prodlení s odstraněním vady Díla druhu HAVÁRIE, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000,-Kč za každou započatou hodinu prodlení.
- 13.6. Bude-li Zhotovitel v prodlení s postupovými termíny sjednanými v harmonogramu plnění, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé prodlení s postupovým termínem. Postupovými termíny se rozumí dílčí termíny sjednané v harmonogramu plnění schváleném ze strany Objednatele, včetně termínů sjednaných pro případné odstávky provozu ČS a/nebo skladu
- 13.7. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při převjímacím řízení v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 10 000,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý započatý den prodlení.
- 13.8. Pokud Zhotovitel nevyklidí pracoviště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 13.9. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době
- 13.9.1. Při prodlení se splněním stanoveného termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení.
- 13.9.2. Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady ve stanovených lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelem vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou reklamaci.
- 13.9.3. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích a v reklamaci je vada Objednatelem oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání Díla, nebo že v důsledku vady hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích.
- 13.10. V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši stanovené v Registru bezpečnostních požadavků ČEPRO, a.s. (dále jen „**Registr**“), který tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Nestanoví-li Registr podle předchozí věty smluvní pokutu za příslušné porušení právních předpisů k zajištění BOZP a požární ochrany upravujících nakládání s odpady a/nebo vnitřních předpisů Objednatele, pak činí smluvní pokuta částku 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno v deníku oprávněným Zástupcem Objednatele.
- 13.11. V případě, že Zhotovitel postoupí tuto Smlouvu, dílčí smlouvu či jednotlivé části třetí osobě bez souhlasu Objednatele, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.
- 13.12. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.
- 13.13. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
- 13.14. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 13.15. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu.
- 13.16. Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty stanovené touto Smlouvou považuje za přiměřené, a to s ohledem na povinnosti, ke kterým se vztahují.

Čl. 14. Další ujednání

- 14.1. Zhotovitel se zavazuje řádně plnit veškeré své finanční závazky a chovat se tak, aby vůči němu nebyl podán návrh dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění, a zavazuje se, že nevstoupí po dobu plnění Smlouvy a dílčích smluv do likvidace. Rovněž se zavazuje chovat se tak, aby nepozbyl příslušného oprávnění potřebného pro řádné plnění Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy.
- 14.2. Vznikne-li Objednateli v důsledku porušení smluvních povinností či v důsledku porušení povinností vyplývajících z obecně závazných předpisů ze strany Zhotovitele újma (majetková a nemajetková), je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli újmu, včetně újm na jmění v souladu s platnými právními předpisy. Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu, nepožádá-li Objednatel o náhradu škody uvedením v penězích.
- 14.3. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření ze spáchání trestného činu či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), které by mohlo být jakékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona č. 40/2009 Sb., případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze Smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů. Příslušná Smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem pro obchodní partnery společnosti ČEPRO, a.s. a veřejnost v platném znění (dále jen „**Etický kodex**“) a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této Smlouvy. Etický kodex v platném znění je uveřejněn na webových stránkách ČEPRO, a.s. www.ceproas.cz.
- 14.4. Objednatel je oprávněno Etický kodex jednostranně měnit k 31. 12. příslušného kalendářního roku, přičemž Etický kodex v aktuálním znění v případě změny vždy k tomuto datu zveřejní na shora uvedených webových stránkách. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
- 14.5. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
- 14.6. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje a prohlašuje, že naplňuje a bude po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a.s. v obchodním styku, specifikované a Objednatelem uveřejněné na adrese <https://www.ceproas.cz/vyberova-řízení> a etické zásady, obsažené v Etickém kodexu.
- 14.7. Objednatel pro účely plnění Smlouvy se Zhotovitelem, případně pro účely ochrany oprávněných zájmů Objednatele zpracovává osobní údaje Zhotovitele, je-li tento fyzickou osobou, případně jeho zástupců/zaměstnanců. Bližší informace o tomto zpracování včetně práv Zhotovitele jako subjektu údajů jsou uveřejněny na www.ceproas.cz v sekci Ochrana osobních údajů.
- 14.8. Zhotovitel odpovídá Objednateli za splnění veškerých povinností plynoucích z této Smlouvy a veškeré důsledky vzniklé porušením některé povinnosti Zhotovitele jdou k tíži Zhotovitele a Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti vůči Objednateli poukazem na případné nesplnění povinností třetí osobou.
- 14.9. Zhotovitel je povinen Objednateli nahradit újmu vzniklou při plnění této Smlouvy a v souvislosti s ní nesplněním závazku či porušením povinností plynoucích z této Smlouvy. Pro náhradu majetkové a nemajetkové újmy se užijí příslušná ustanovení platných právních předpisů, nebude-li mezi Smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak.
- 14.10. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které budou označeny za důvěrné informace.

- 14.11. Smluvní strany se zavazují nesdělovat žádné třetí osobě žádné informace o existenci anebo obsahu této Smlouvy a informace, které o druhé smluvní straně získala při jednáních o této Smlouvě, během její platnosti i po jejím skončení bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, s výjimkou případů, kdy tak vyžaduje tato Smlouva, zákon či jiný obecně závazný předpis, zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 14.12. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ, nebo jím ovládaná osoba ve Zhotoviteli nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. Zhotovitel současně prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v žádné z osob, jejichž prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci.
- 14.13. Pokud po uzavření této smlouvy veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nabude do vlastnictví podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v Zhotoviteli nebo v osobě, jejímž prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, zavazuje se Zhotovitel o této skutečnosti písemně vyrozumět Objednatele bez zbytečného odkladu po jejím vzniku, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejím vzniku.
- 14.14. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu účinnosti této smlouvy budou zapsané údaje o jeho skutečném majiteli odpovídat skutečnému stavu. Zhotovitel se současně zavazuje písemně vyrozumět Objednatele o každé změně v údajích o jeho skutečném majiteli a rovněž o každé změně v údajích o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, uvedených v evidenci skutečných majitelů bez zbytečného odkladu po jejich změně, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejich změně.
- 14.15. Zhotovitel prohlašuje, že má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“). Zhotovitel současně prohlašuje, že jeho skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.
- 14.16. Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům ZESM, přičemž jeho skutečným majitelem zapsaným v této evidenci z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.
- 14.17. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel uvedl nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, které je přílohou č. 3 této smlouvy.
- 14.18. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotovitel ve lhůtě dle odst. 10.12 této Smlouvy nevyrozuměl Objednatele o takové změně v zápisu údajů o jeho skutečném majiteli nebo o změně v zápisu údajů o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, při které byl jako skutečný majitel Zhotovitele nebo poddodavatele do evidence zapsán veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.
- 14.19. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotovitel dle odst. 12.3. této Smlouvy nevyrozuměl Objednatele o snížení výše pojistného plnění pod minimální stanovenou výši nebo o ukončení pojistné smlouvy a se splněním této povinnosti je v prodlení alespoň 10 pracovních dnů.
Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotoviteli bude pozastaveno provádění Díla dle odst. 12.4. Smlouvy.

Čl. 15. Doba trvání Smlouvy, způsoby ukončení

- 15.1. Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou v délce trvání 48 měsíců ode dne nabytí účinnosti.

- 15.2. Účinnost Smlouvy nastane dnem, kdy bude uzavřena Smlouva, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak. Dnem uzavření je dne uvedený u podpisů Smluvních stran, je-li uvedeno více dní, pak je dnem uzavření den pozdější.
- 15.3. Zánik této Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy je upraven ve VOP a této Smlouvě.
- 15.4. Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva, jakož i dílčí smlouva uzavřená na základě této Smlouvy zaniká písemnou dohodou Smluvních stran či jednostranným právním jednáním jedné ze Smluvních stran v souladu s platnou legislativou.
- 15.5. Pro účely odstoupení od Smlouvy a odstoupení od dílčí smlouvy jednou ze Smluvních stran platí příslušná ustanovení č. 15 VOP.
- 15.6. Smluvní strany se dohodly, že kterákoli ze Smluvních stran může tuto Smlouvu vypovědět bez udání důvodu ve výpovědní lhůtě dvou (2) měsíců. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď druhé Smluvní straně doručena.
- 15.7. Odstoupení od Smlouvy/dílčí smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
- 15.8. Výpověď nebo odstoupení od Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy musí být písemné a musí být doručeno osobním doručením a předáním druhé Smluvní straně nebo doporučenou poštou na adresu druhé Smluvní strany uvedené v této Smlouvě nebo v dílčí smlouvě na adresu Smluvní stranou později písemně sdělenou s tím, že třetí den od uložení zásilky na poště se má za den doručení. Smluvní strany jsou povinny se pro tento účel navzájem vyrozumět o jakýchkoliv změnách jejich adres nejpozději do tří (3) dnů od vzniku takové změny.
- 15.9. Výpověď se tato Smlouva ruší s výjimkou ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení této Smlouvy.

Čl. 16. Závěrečná ustanovení

- 16.1. Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy.
- 16.2. Tato Smlouva a/nebo dílčí smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se na vztah založený touto Smlouvou a/nebo dílčí smlouvou nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy a dílčích smluv dohodly, že Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevéde svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části třetí osobě podle ust. §§ 1895-1900 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 16.3. Tato Smlouva není převoditelná rubopisem.
- 16.4. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za porušení Smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s Dílem ujednány, jsou obsaženy v textu této Smlouvy včetně jejích příloh, Závazných podkladech a dokumentech, na které Smlouva výslovně odkazuje. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této Smlouvy se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této Smlouvě, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto Smlouvu doplňovalo nebo měnilo.
- 16.5. Jakékoliv jednání předvídané v této Smlouvě a/nebo dílčí smlouvy, musí být učiněno, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 566 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.
- 16.6. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině.

16.7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

16.7.1. příloha č. 1 - Jednotkové ceny – „Výkaz výměr“

16.7.2. příloha č. 2 – Technická specifikace

16.7.3. příloha č. 4 – Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli

16.8. Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

16.9. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak.

16.10. Pro případ, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, Smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy včetně jejich případných dodatků v registru smluv zajistí Objednatel v souladu se zákonem o registru smluv. V této souvislosti Zhotovitel prohlašuje a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s podmínkami zákona o registru smluv. V případě, že Smlouva nebude v registru smluv ze strany Objednatele uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, Zhotovitel vyzve písemně Objednatele emailovou zprávou odeslanou na ceproas@ceproas.cz ke zjednání nápravy. Zhotovitel se tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv uveřejnit Smlouvu v registru smluv či již uveřejněnou Smlouvu opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy Smlouvy v registru smluv ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč, která je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení Zhotoviteli. V případě, že Zhotovitel požaduje anonymizovat ve Smlouvě údaje, které naplňují výjimku z povinnosti uveřejnění ve smyslu zákona o registru smluv, pak je povinen tyto údaje písemně specifikovat a odůvodnit nejpozději současně s podpisem této Smlouvy. V opačném případě Zhotovitel podpisem této Smlouvy souhlasí s uveřejněním Smlouvy v plném rozsahu po anonymizaci údajů, které dle názoru Objednatele naplňují zákonnou výjimku z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv.

16.11. Smluvní strany vedeny dobrou vírou v nabytí účinnosti Smlouvy se dohodly, že poskytnou-li si s odkazem na Smlouvu od okamžiku jeho platnosti do okamžiku jeho účinnosti jakékoliv vzájemné plnění odpovídající předmětu Smlouvy, pak se na toto plnění uplatní podmínky, zejména práva a povinnosti Smluvních stran, stanovené Smlouvou. Toto ujednání se vztahuje výlučně na plnění poskytnuté s výslovným odkazem na tuto Smlouvu a/nebo, je-li bez jakýchkoliv pochybností zřejmé, že je takové plnění poskytováno smluvní stranou na základě této Smlouvy.

16.12. Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními **Všeobecných obchodních podmínek** (dále a výše také jen „VOP“), které tvoří nedílnou součást této Smlouvy. V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění.

16.12.1. VOP jsou uveřejněna na adrese
<https://www.ceproas.cz/public/files/userfiles/V%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A11%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD/VOP-M-2020-02-01.pdf>

16.13. Nedílnou součástí Smlouvy jsou podmínky uvedené v „Registru vymezující seznam povinností souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci, ochranou před požárem a ochranou životního prostředí při plnění Smlouvy na pracovištích Objednatele, které jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy a/nebo vnitřním předpisem Objednatele. V případě rozdílu mezi ustanovením v Registru a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě.

16.14. Registr je uveřejněn na internetových stránkách
[https://www.ceproas.cz/public/files/userfiles/V%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A11%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD/Registr bezpecnostnich pozadavku 2020-02-01.pdf](https://www.ceproas.cz/public/files/userfiles/V%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A11%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD/Registr%20bezpecnostnich%20pozadavku%2020-02-01.pdf)

16.15. Objednatel je oprávněn aktualizovat Registr, a to i v průběhu realizace Díla. O každé takové změně je Objednatel povinen Zhotovitele písemně informovat. Písemná podmínka je splněna i tehdy, je-li dané oznámení učiněno emailem s odkazem na platné znění Registru.

16.15.1. V případě porušení povinností stanovených v Registru je Objednatel oprávněn ukládat Zhotoviteli nápravná opatření, včetně přerušení prací, a udělit sankce stanovené v Registru.


16.16. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s VOP a Registrem a právům a povinnostem v nich obsažených porozuměl.

V Praze dne: **08-08-2022**

V Ostravě. dne:

Objednatel: ČEPRO, a.s.

Zhotovitel: VAE CONTROLS, s.r.o.



Příloha č. 1

Jednotkové ceny

Cena za každou odpracovanou hodinu technická pro montáž, zapojení, čištění a otestování prvku MMR									
Cena za každou odpracovanou hodinu programátora PLC/SCADA pro implementaci pilotních prvků MMR do řídícího systému									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									
Technické řešení pro řízení výroby									

Ing. Martin Pecina,
MBA

Digitálně
podepsal Ing.
Martin Pecina,
MBA

Datum:
2022.07.01
15:32:02 +02'00'

Příloha č. 2

Technická specifikace



Příloha č. 2 smlouvy

**ZÁKLADNÍ/OBECNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU A OBJEKTŮ PLNĚNÍ PRO DÍLČÍ ZAKÁZKY
ZADÁVANÉ NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ DOHODY**

POPIS VÝDEJNÍCH LÁVEK

Objednatel provozuje 13 výdejních skladů pohonných hmot po celé ČR. Pohonné hmoty jsou vydávány na tzv. výdejních lávkách, které sestávají zpravidla z více stop, na kterých je možné vydávat motorovou naftu (dále jen NM) a/nebo automobilový benzín (dále jen BA) s různými druhy aditiv, včetně BIO složek (FAME, ETOH a HVO). Pohonné hmoty jsou na výdejních lávkách vydávány do automobilových cisteren pomocí plnicích ramen v úpravě pro spodní a horní plnění. Odtah odplynu vznikajícího při plnění je v případě NM a BA zpravidla řešen propojením parního ramene do hlavního rekuperačního okruhu skladu. Stávající technologie výdejních lávek na všech skladech je postavena na komponentech výrobce FMC Technip. Nové komponenty a náhradní díly mohou být i od jiných dodavatelů, ale zhotovitel musí zaručit kompatibilitu a stejné technické parametry ve stávající a nové technologii. Hlavní technologické části výdejních lávek a aditivace je možné specifikovat následovně:


- Odlučovač hlavní produkt
- Odlučovač BIO produkt
- Průtokoměr hlavní produkt
- Průtokoměr BIO produkt
- Teploměr průměr 8mm, 6mm
- Tlakoměr
- Ventil hlavní produkt
- Ventil BIO produkt
- Solenoidové ovládací ventily
- Pneuventily multirameno
- Zpětná klapka
- Výdejní rameno spodního plnění
- Výdejní rameno horního plnění
- Čidlo polohy ramene
- Limitní spínač zaplavení kondenzátem
- AccuLoad
- Bezkontaktní čtečka karet
- Uzemňovací člen
- Aditivační jednotka
- Regulační ventil aditivačního potrubí
- Pojišťovací ventil aditivačního potrubí
- Filtry na sání aditivačních čerpadel
- Filtry na výtlačku aditivačních čerpadel
- Filtry aditivačních jednotek
- Čerpadla aditiv
- Cirkulační ventil BIO tratí
- CIVACON
- Schůdky horního plnění

Příloha č. 3 zadávací dokumentace VZ „Rámcová smlouva – Úprava a servis technologií pro výdej, příjem a skladování PHM“

- Semafory
- Závory

Všichni zaměstnanci, kteří se na pracích budou podílet, musí být proškoleni pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, musí používat pouze certifikované nástroje a nářadí, OOPP do výbušného prostředí (zóna 1).

Seznam činností definující minimální rozsah jednotlivých profylaktických prohlídek a dalších souvisejících služeb je definován v samostatném dokumentu.

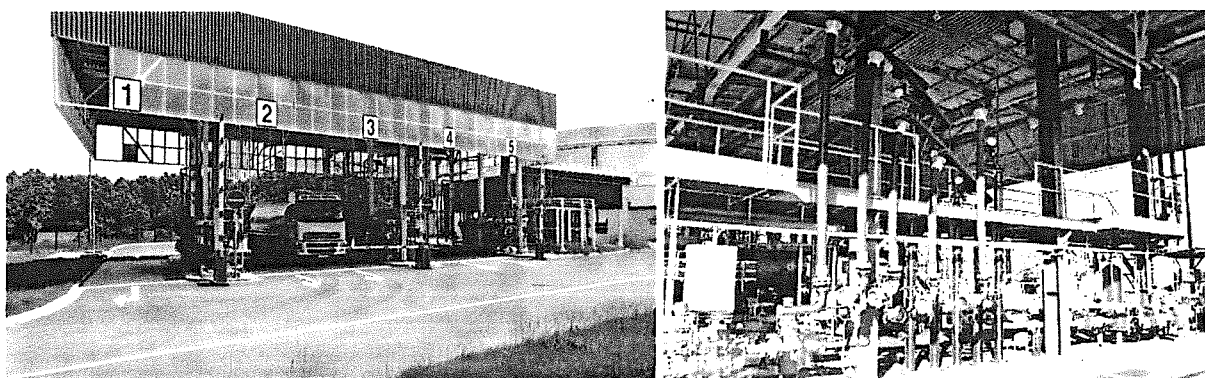

Obr. 1 – Výdejní lávky


Lokality jednotlivých skladů jsou uvedeny níže, nebo na: <https://www.ceproas.cz/kontakty/sklady>

Příloha č. 3 zadávací dokumentace VZ „Rámcová smlouva – Úprava a servis technologií pro výdej, příjem a skladování PHM“

POPIS SKLADOVACÍCH OBJEKTŮ:

Skladovací objekty v areálech ČEPRO jsou dva druhy, nadzemní a podzemní. Nadzemní skladovací objekty jsou tvořeny skladovacími nádržemi, odkalovací nádrží, strojovnou, elektrorozvodnou a podzemní objekty mají navíc manipulační chodbou, šoupátkovou síň a měřicí chodbu. Nádrže mohou být typu ležatý válec, stojatý válec, krabice. Nádrže jsou osazeny bezkontaktním měřením hladiny, teploměrem a tlakoměrem v paroplynovém prostoru nádrže a jsou přístupné přímo na nádrži nebo v měřících chodbách. Strojovny jsou vybaveny čerpadly, které mohou být osazeny měřením. Dále automatickými ventily (elektro), čidly tlaků na potrubí a čidla zaplavení jak v potrubí, tak hlídání zaplavení strojovny. Všechny elektrické prvky v objektu jsou řízeny z jednotlivých rozvodů. Podzemní objekty jsou navíc vybaveny vzduchotechnikou pro výměnu vzduchu. Hlavní technologické části skladovacích objektů je možné specifikovat následovně:

- Nádrž
- Čerpadlo
- Uzavírací armatura ruční/automatická
- Zpětná klapka
- Pojišťovací ventily
- Hladinomě
- Teploměr
- Tlakoměr diferenční/absolutní
- Limitní spínač

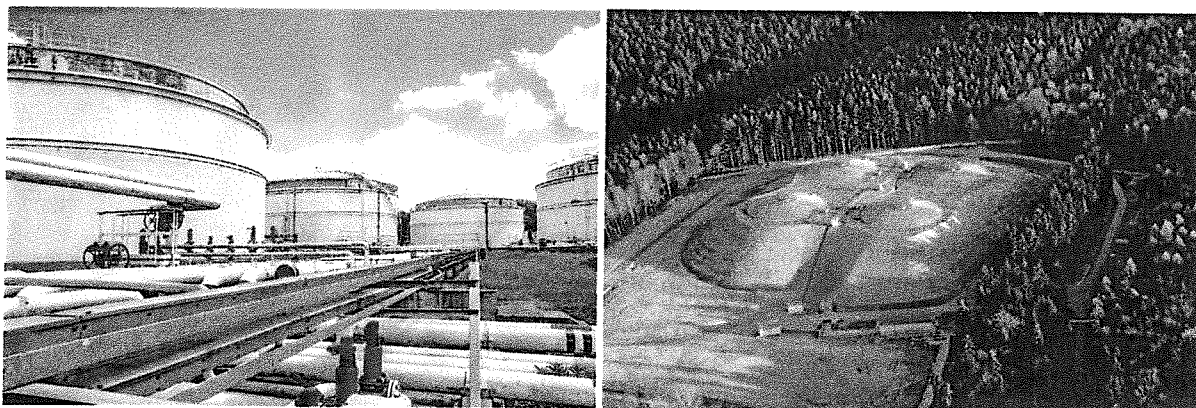

Obr. 2 – Skladovací objekty ČEPRO, a.s.



Lokality jednotlivých skladů jsou uvedeny níže, nebo na: <https://www.ceproas.cz/kontakty/sklady>

Příloha č. 3 zadávací dokumentace VZ „Rámcová smlouva – Úprava a servis technologií pro výdej, příjem a skladování PHM“

POPIS PRODUKTOVODŮ S KONCOVÝM ZAŘÍZENÍM A DRA:

Produktovod je potrubní systém, který propojuje 17 skladů společnosti ČEPRO, a.s. a zároveň je spojuje s rafineriemi Litvínov, Kralupy nad Vltavou a Bratislava. Systém umožňuje přepravu motorové nafty, automobilových benzínů a jiných ropných produktů jako např. hydrogenovaný petrolej, reformát a primární benzín. Na skladech jsou produktovody zakončeny tzv. koncovými zařízeními, kde je umístěna soustava měření průtoku, teploty a tlaku. Chod produktovodů řídí centrální dispečink, který sleduje základní technické parametry provozu jako je stav zásob na skladech, čerpací režimy atd. Na skladech Klobouky, Nové Město, Šlapanov a Třemošná je na koncových zařízeních připojena technologie zlepšovače toku DRA (drag reducing agent). Jedná se o technologii vstřikování kapaliny do potrubí k usměrnění toku produktu a tím zvýšení průtoku. Základní technologické části produktovodu jsou:

- Čerpadlo dávkovací
- Čerpadlo homogenizační
- Regulační armatura
- Hmotnostní průtokoměr
- Teploměr
- Tlakoměr
- Filtr

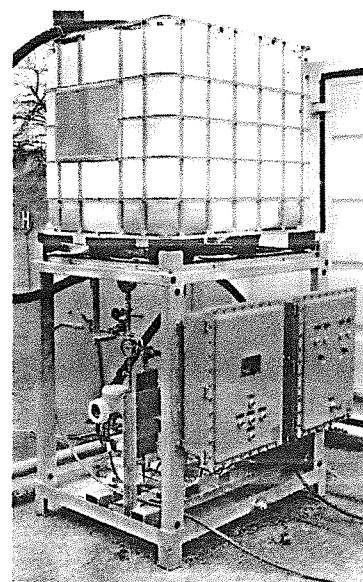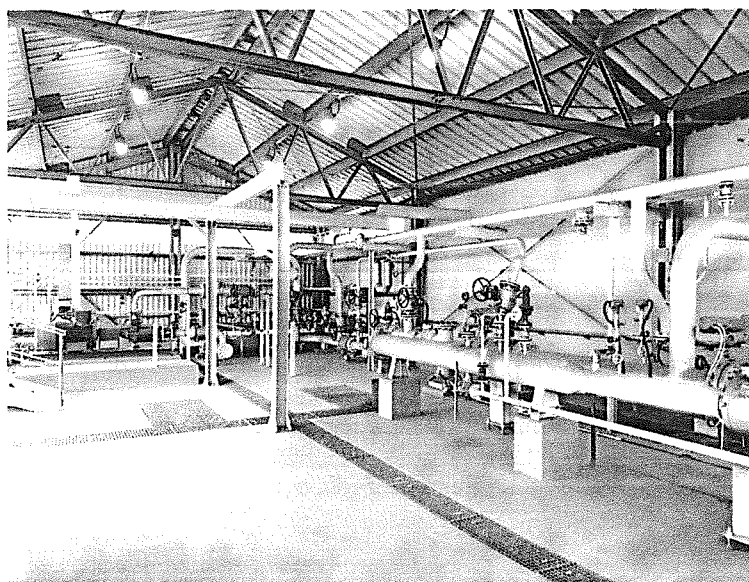

Lokality jednotlivých skladů jsou uvedeny níže, nebo na: <https://www.ceproas.cz/kontakty/sklady>

Příloha č. 3 zadávací dokumentace VZ „Rámcová smlouva – Úprava a servis technologií pro výdej, příjem a skladování PHM“

ZÁKLADNÍ MOŽNÉ POŽADAVKY NA PŘEDMĚT DÍLA:

- Operativní servis,
- Profylaktické kontroly výdejních lávek,
- Profylaktické kontroly DRA,
- Dodávka náhradních dílů,
- Dodávka a implementace MaR systémů do ASŘ a s ním související úprava SCADA SCX v.6,
- Úpravy stávajících potrubních technologií (prodloužení potrubních vedení, osazení ručních armatur, osazení servoarmatur včetně nutné elektroinstalace a prvků regulace),
- Úprava/rozšíření/výstavba technologií výdeje PHL a aditivace (nezbytné strojní práce, elektro práce, stavební práce včetně dodávek),
- Dodávky a implementace ASŘ čerpací technologie související s aditivací, BIO (FAME, MEŘO, ETOH), popřípadě hlavní technologií PHL (BA, NM, HVO, JET-A1),
- Vypracování projektové dokumentace včetně aktualizace technologických schémat (PID),

ODSTRANĚNÍ ZÁVAD TYPU:

- porucha AccuLoad,
- porucha dávkování DRA,
- porucha výdejního nebo parního ramene (netěsnost, nehybnost, parkovací poloha, API spojka, zpětná klapka, odtah par, čidlo přeplnění, ...),
- závada kontroleru přeplnění CIVACON,
- závada na uzemňovacím členu,
- závada aditivačních jednotek EVA (řídící jednotka, průtokoměr, filtr, regulační a dávkovací ventil, ...),
- závada na SMITH ventilech, průtokoměru, odlučovači vzduchu (měřící tratě hlavní a BIO),
- závada na cirkulačním ventilu BIO tratí,
- a další.

Přesná specifikace rozsahu prací a dodávek pro konkrétní technologie bude provedena na základě objednávky zadavatele.

Příloha č. 3 zadávací dokumentace VZ „Rámcová smlouva – Úprava a servis technologií pro výdej, příjem a skladování PHM“

DETAILNÍ POPIS PŘEDMĚTU DÍLA:

1. Operativní servis

Operativní záruční i pozáruční servis bude probíhat na všech zařízeních v rozsahu a parametrech stanovených zadávací dokumentací, ustanovení platných norem, či jiných obecně závazných předpisů. Zadavatel objednává a dodavatel se zavazuje za podmínek výše, že zadavateli zajistí jednorázové opravy a servisní zásahy dle konkrétních požadavků zadavatele. Oznámení požadavku provede zadavatel přes elektronickou evidenci zhotovitele a telefonicky.

Odstranění závady bude vždy sestávat z následujících kroků:

- Elektronická a telefonická specifikace poruchy ze strany Zadavatele
- Analýza závady ze strany Zhotovitele
- Navržení postupu odstranění závady ze strany Zhotovitele
- Odsouhlasení postupu odstranění závady ze strany Zadavatele
- Fyzický nástup Zhotovitele na odstranění závady dle požadavku a dohody se Zadavatelem

2. Profylaktické kontroly výdejních lávek

Zhotovitel bude povinen 1x ročně na vybraných skladech provádět tzv. profylaktické prohlídky (dále jen „Zarážky“), ve kterých budou provedeny funkční zkoušky veškerých komponent výdejních lávek specifikovaných v příloze a) – Seznam komponent – kontrolní checklist. Termín zarážek bude oznamovat Objednatel s dostatečným předstihem min. 60 dní předem pro možnost sjednocení termínů všech dotčených firem a nahlášení omezení výdeje na probíhajících skladech. Délka trvání Zarážek bude stanovena dle rozsahu stanoveného a odsouhlaseného mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

Zarážky budou probíhat dle stanoveného rozsahu uvedeného v příloze a) a dále formou zkušebních odběrů, kde se budou sledovat mimo jiné průběhy plnění, míchání biopaliv, přidávání aditiv a funkčnost všech prvků, včetně bezpečnostních a dále bude provedena vnitřní kontrola elektro zařízení výdejních lávek. Pokud se během Zarážek zjistí závada na zařízení nebo jeho nefunkčnost, bude na místě mezi Objednatelem a Zhotovitelem rozhodnuto o dalším postupu. Náhradní díly budou primárně čerpány ze skladu náhradních dílů MTZ Objednatele. Nebudou-li k dispozici ve skladu MTZ, zajistí jejich dostupnost Zhotovitel po dohodě se Objednatelem. Pravidelné profylaktické kontroly jednotlivých komponent výdejních lávek budou prováděny na základě specifikovaných kódů a jim přidělených popisů činností. Tyto činnosti jsou uvedeny v tab. 1. Na každém skladě a při každé pravidelné profylaktické kontrole budou tyto činnosti dodrženy s ohledem na technologickou vybavenost místních výdejních lávek. Výdejní lávky jsou obvykle složeny z 1 až 5 výdejních lávek, které se dále dělí na výdejní stopy, resp. výdejní místa.

Všechny výsledky provedených činností v rámci profylaktické kontroly budou předány Zhotovitelem Objednateli formou závěrečné zprávy. Závěrečná zpráva musí obsahovat souhrn celkového technického stavu výdejních lávek, souhrn nalezených a odstraněných závažných závad a souhrn závad méně závažných, které neohrožují bezpečnost provozu, souhrn technických doporučení pro zaplánování oprav/obnovy zařízení. Dále zpráva musí obsahovat protokoly dle přílohy a).

Příloha č. 3 zadávací dokumentace VZ „Rámcová smlouva – Úprava a servis technologií pro výdej, příjem a skladování PHM“

Tab. 1 – Příkazy a kódy prací prováděných při pravidelné profylaktické kontrole

Kódy prací a jejich význam		
Kod	Zkrácený popis	Popis
A1	Metrologické ověření	Metrologické ověření za asistence akreditované autority. Probíhá obvykle s finálním produktem.
E1	Kontrola kabelů	Kontrola neporušenosti a celistvosti všech kabelů a vývodků. Je třeba zkontrolovat, zda se neuvolnily vývodky, resp. nesmí být možno kabel posunout vytážením.
E2	Kontrola svorek - dotažení	Obvykle se zpřístupní výstupní svorky čidel a šroubovákem se zkontroluje dotažení šroubových nebo pérových spojů.
K1	Kontrola signálů	Kontrola komunikace a přenosu signálu do ASŘ za asistence dispečera.
K2	Kontrola parametrů	Kontrola nastavených parametrů podle naposledy nastavených údajů. U vidliček je to nastavení logika min/max. U tlakoměrů rozsahy, Adresy. U Acculoadu základní parametry.
K3	Simulace signálu	Simulace signálu do ASŘ za pomoci externích zařízení a/nebo jiných pomůcek.
M1	Mechanická kontrola	Kontrola pevnosti montáže, kontrola šroubových a svarových spojů
M2	Kontrola úniku	Kontrola úniku pracovních kapalin pohledem. Provozovatel rozhodne, jak bude s únikem naloženo.
M3	Kontrola stavu	Kontrola stavu patřičného komponentu např. filtru, obsahuje obvykle rozebrání, kontrola, vyčištění a sestavení zpět.
M4	Nastavení ventilu	Nastavení ventilu SMITH 210 dle protokolu výrobce viz. dokument MN03010
S1	Komplexní zkouška	Komplexní zkouška celku při normálním nebo simulovaném provozu.
T1	Zkouška funkce	Lokální zkouška funkce předepsaným testerem či simulací.

PŘÍLOHA a) – Checklist pravidelné profylaktické kontroly pro jednu měřicí trať na výdejních lávkách

Příloha č. 3 zadávací dokumentace VZ „Rámcová smlouva – Úprava a servis technologií pro výdej, příjem a skladování PHM“

Checklist pravidelných profylaktických prohlídek, sklad Cerekvice, dne 15. až 18.6.2020

Lávka 6, Stopa 6, Měřicí trat' 13

MT06/06/13 NMBIO

ID	Zařízení	Výrobce	Typ	Příkaz	Typ Prohlídky	OK	Z	Výsledek prohlídky
1	Odlučovač hl.	Poličské strojírný	N178.100	M1	Mechanická kontrola			
				M2	Kontrola úniku			
				M3	Kontrola stavu			
2	Filtr hl.	Poličské strojírný	F104.100/200	M1	Mechanická kontrola			
				M2	Kontrola úniku			
				M3	Kontrola stavu			
3	Průtokoměr hl.	Smith Meter	F4-S1	M1	Mechanická kontrola			
				M2	Kontrola úniku			
				E1	Kontrola kabelů			
				T1	Zkouška funkce			
4	Teploměr hl.	ZPA Nová Paka	112 690 639	M1	Mechanická kontrola			
				M2	Kontrola úniku			
				E1	Kontrola kabelů			
5	Tlakoměr hl.	Siemens	SITRANS P300	M1	Mechanická kontrola			
				M2	Kontrola úniku			
				E1	Kontrola kabelů			
				E3	Kontrola svorek - dotažení			
6	Řídicí ventily hl.	Smith Meter	4" Typ 210 8dér	M1	Mechanická kontrola			
				M2	Kontrola úniku			
				M3	Kontrola stavu			
				M4	Nastavení ventilu			
				E1	Kontrola kabelů			
7	Odlučovač bio	Smith Meter	AVD - 1	M1	Mechanická kontrola			
				M2	Kontrola úniku			
				M3	Kontrola stavu			
	Spínač	Smith Meter	SG5/43	E1	Kontrola kabelů			
8	Průtokoměr bio	Smith Meter	ST-40-DI	K1	Kontrola signálů			
				M1	Mechanická kontrola			
				M2	Kontrola úniku			
				E1	Kontrola kabelů			
9	Teploměr bio	JSP Nová Paka	T10013	T1	Zkouška funkce			
				M1	Mechanická kontrola			
				M2	Kontrola úniku			
				E1	Kontrola kabelů			
10	Tlakoměr bio	Siemens	SITRANS P300	M1	Mechanická kontrola			
				M2	Kontrola úniku			
				E1	Kontrola kabelů			
				E3	Kontrola svorek - dotažení			
11	Řídicí ventily bio	OCV Tulsa	2" Typ 65	M1	Mechanická kontrola			
				M2	Kontrola úniku			
				M3	Kontrola stavu			
				M4	Nastavení ventilu			
				E1	Kontrola kabelů			
12	Accuload	FMC Technologies	ACL III	M1	Mechanická kontrola			
				E1	Kontrola kabelů			
				K1	Kontrola kabelů			
13	Výdejní rameno	Liquip	MK2 VNBL-I4	M1	Mechanická kontrola			
				M2	Kontrola úniku			
				E1	Kontrola kabelů			
				K1	Kontrola signálů			
14	Rekupační rameno	Neznámý	Neznámý	M1	Mechanická kontrola			
				M2	Kontrola úniku			
				E1	Kontrola kabelů			
				K1	Kontrola signálů			
15	Tester uzemnění	ELOK Opava	UZCL 2	M1	Mechanická kontrola			
				E1	Kontrola kabelů			
				T1	Zkouška funkce			
				K1	Kontrola signálů			

Příloha č. 3 zadávací dokumentace VZ „Rámcová smlouva – Úprava a servis technologií pro výdej, příjem a skladování PHM“

16	Aditivační jednotky	ELOK Opava	EVAPLUS-MC	M1	Mechanická kontrola			
				M2	Kontrola úniku			
				M3	Kontrola stavu			
				K1	Kontrola signálů			
17	Dávkovací jednotka	Technip FMC	ACCUPLUS	V1	KOAX MK10 NC			
				V2	KOAX MK10 NC			
				V3	KOAX MK10 NC			
				BV	Schiedrum Hydraulic			
18	Adit. Filtr potrubí	HYDAC	0160 D010 0280 D010	M1	Mechanická kontrola			
				M2	Kontrola úniku			
				M3	Kontrola stavu			
19	Adit. Filtr průtok.	Technip FMC	ACCUPLUS	M1	Mechanická kontrola			
				M2	Kontrola úniku			
				M3	Kontrola stavu			
20	Čtečka karet	ELOK Opava	ELDH 3.1	M1	Mechanická kontrola			
				E1	Kontrola kabelů			
				K1	Kontrola signálů			
21	Ochrana proti přeplnění	OPW	CIVACON 8800E	M1	Mechanická kontrola			
				E1	Kontrola kabelů			
				T1	Zkouška funkce			
				K1	Kontrola signálů			
22	VAPOUR limitní spínač -čidlo kondenzátu	Rosemount	2120	M1	Mechanická kontrola			
				M2	Kontrola úniku			
				E1	Kontrola kabelů			
				E3	Kontrola svorek - dotažení			
				K1	Kontrola signálů			

Příloha č. 3 zadávací dokumentace VZ „Rámcová smlouva – Úprava a servis technologií pro výdej, příjem a skladování PHM“

3. Profylaktické kontroly DRA

Zhotovitel bude povinen 1x za 6 měsíců na skladech Klobouky, Nové Město, Šlapanov a Třemošná provádět tzv. profylaktické prohlídky, ve kterých budou provedeny funkční zkoušky veškerých komponent DRA. Termín profylaxí bude oznamovat Objednatel s dostatečným předstihem min. 30 dní předem pro možnost sjednocení termínů všech dotčených firem a nahlášení omezení výdeje na probíhajících skladech. Délka trvání profylaxí bude stanovena dle rozsahu stanoveného a odsouhlaseného mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

Profylaxe budou probíhat dle předem stanoveného rozsahu, který stanoví zadavatel. Dále budou formou odstříků do odměrného válce probíhat kalibrace průtokového měřidla, budou otestovány bezpečnostní prvky a provedena vnitřní kontrola všech elektrozařízení. Pokud se během Profylaxe zjistí závada na zařízení nebo jeho nefunkčnost, bude na místě mezi Objednatelem a Zhotovitelem rozhodnuto o dalším postupu. Náhradní díly budou primárně čerpány ze skladu náhradních dílů MTZ Objednatele. Nebudou-li k dispozici ve skladu MTZ, zajistí jejich dostupnost Zhotovitel po dohodě s Objednatelem.

Všechny výsledky provedených činností v rámci profylaktické kontroly budou předány Zadavateli Objednatelem formou závěrečné zprávy. Závěrečná zpráva musí obsahovat souhrn celkového technického stavu DRA, souhrn nalezených a odstraněných závažných závad a souhrn závad méně závažných, které neohrožují bezpečnost provozu, souhrn technických doporučení pro zaplánování oprav/obnov zařízení.

4. Dodávka náhradních dílů

Seznam náhradních dílů je uveden v příloze b) a je součástí výkazu výměr. Zhotovitel je povinen držet aktuální seznam náhradních dílů po dobu účinnosti smlouvy.

PŘÍLOHA b) – seznam náhradních dílů pro výdejní lávky

Zařízení	Výrobce	Typ	ND	Part No.
Odlučovač	FMC Technologies	APS-25-2-4D-B-40-T1-B-D2	Filtr APS-25	514892-060
			Koš APS-25/AVD-1	502374-001
			Plovák APS-25/AVD-1	538428-001
			Limitní spínač SG5/43-MS1 APS-25/AVD-1	30/0246-620010M10
			Planžeta APS-25/AVD-1	550002-001
			Repair kit RB Head buna	RPKFMCRRBB
			Repair kit RB Head viton	RPKFMCRRBV
			Těsnění filtru	
	AVD-1	AVD-1	Repair kit RB Head buna	RPKFMCRRBB
			Repair kit RB Head viton	RPKFMCRRBV
			Filtr AVD-1	
	Poličské strojírný	N 178.100	Kontrolní hledítko	
Průtokoměr hlavní produkt	Smith Meters	F4-S1, PRIME 4, VF-60 SF-60	vysílač pulzů Prime 4	554571002
			vysílač pulzů UPT	UPT-XU-500-STD-07
			vysílač pulzů GPST	GPST-XP-100-12
Průtokoměr BIO produkt	Smith Meters	ST-40-DI	vysílač pulzů GPST 227 pulzů/otáčka	GPST-XP-250-12
		GSC-2	deska průtokoměru GSC-2	
Teploměr průměr 8mm, 6mm	ZPA Nová Paka, JSP Nová Paka	PT 100	ZPA PT 100 8mm 112 690 632	
			ZPA PT 100 8mm 112 693 639/ZP9943	
			JSP PT 100 6mm T10013 061 116	
Ventil hlavní produkt	FMC Technologies Smith Meters GMBH	200 4" Styl A 8, Styl B 10 děr	Opravná sada Styl A 8 děr Buna	RPKFMC2104AB
			Opravná sada Styl A 8 děr Viton	RPKFMC2104AV
			Opravná sada Styl B 10 děr Buna	RPKFMC2104BB
			Opravná sada Styl B 10 děr Viton	RPKFMC2104BV
			Seat	528432-003
			Bearing, Seat-Ni-Resist	529531-003
			Bearing, Cover-Ni-Resist	529531-003
			Stem	528658-001
Ventil BIO produkt	OCV,FMC 2"	OCV 65 2"	Opravná sada Buna OCV	904000
			Opravná sada Viton OCV	904100
			Teflonové uložení stemu dolní OCV	
			Teflonové uložení stemu horní OCV	

Příloha č. 3 zadávací dokumentace VZ „Rámcová smlouva – Úprava a servis technologií pro výdej, příjem a skladování PHM“

			Bronzové uložení stemu horní OCV	
			Závlačka stemu OCV	
			Sada teflonového uložení stemu horní, dolní OCV	
			Stem OCV	
			Seat OCV	
		FMC 210 2"	Opravná sada Buna FMC	RPKFMC2102B
			Opravná sada Viton FMC	RPKFMC2102V
			Bearing, Seat-Ni-Resist	529531-003
			Bearing, Cover-Ni-Resist	529531-003
			Seat FMC	
			Stem FMC	528658-001
Solenoidové ovládací ventily	ASCO, Norgren	ASCO NO, ASCO NC	Opravná sada NF E210C034 230V/AC (buna verze)	Sada ND NF C302334
			Opravná sadn NF E210D002 230V/AC (buna verze)	Sada ND NF C302273
			Opravná sada NF E210C034V 230V/AC	Sada ND NF C302334V
			Opravná sadn NF E210D002V 230V/AC	Sada ND NF C302273V
		IMI HERION	IMI HERION 46XX NO	
			IMI HERION 46XX NC	
Pneu ventily multirameno			kostky Herion na těle pneuventilu	9710000306323050
			regulační ventil	11-818-993
Výdejní rameno spodního plnění	OPW, EMCO WHEATON		Hadice OIL GENOVA LL 100x116 v metráži 20m	IV-GENOVA-LL-EN-100
			Spojky na hadice s přírubou 4" TTMA	
			Rekuperační spojka KAMLOK 633CPP 4" vnitřní závit	4" CPP Vapour coupler 3" BSP-F threaded
			TTMA příruba > 4" VENKOVNÍ závit	TTMA 4" to BSP-M adapter
			zajišťovací páčky recup. Spojky 633CPP (krátké)	
			OPW horní kloub s pružinou a ramenem DN100	3457-ST40-VG-FDFT
			Otočný kloub OPW rameno/hadice	3640-AL40-VG-FT
			Otočný kloub s přírubami 4" styl 35, hliníkový, dvouřadý, pro API	3635H-AL40-VG-FT
			Průhledítko pro API	4" TTMA flanged PMMA sightglass ring
			zpětná klapka pro API	4" TTMA flanged check valve
			OPW 4"/dn100 swivel seal replacement kit, Viton® GFL	3002K-40-VG
			OPW API coupler seal replacement kit Fluorocarbon	1004D3SRK-0402
			Otočný kloub EMCO D2000 DN100	
			Otočný modul pro EMCO D2000 DN100	
			Těsnění pro otočný modul EMCO D2000 DN100	
			O kroužky pro modul EMCO D2000 DN100	
			API spojka OPW 1004D3 – manuál	J0451-051 4" TTMA, Viton
			API spojka OPW LYNX – poloautomat	LYNX850VG
			Sada těsnění API LYNX850 All Seal Kit	API850SKZ
			Sada těsnění API EMCO/OPW	
			Opravná sada těsnění ramene	
Výdejní rameno horního plnění	EMCO WHEATON			

tisk formuláře požadavky

Příloha č. 3 zadávací dokumentace VZ „Rámcová smlouva – Úprava a servis technologií pro výdej, příjem a skladování PHM“

Čidlo polohy ramene	Pepperl + Fuchs	NJ10-30GKK-N	čidlo NJ10-30GKK-N	106475
			čidlo NJ4-12GK-N	08633
			Bariéra KFD2-SR2-EX2.W	KFD2-SR2-Ex2.W
Limitní spínač	Endress + Hauser	Liquiphant M	Liquiphant M FEL56	FTL 50 KGR2AA4G5A
			Bariéra FTL325N	FTL 325N-H3B3
Accuload	FMC Technologies Smith Meters GMBH	ACL III 0-XP-ALX2-A40000	KDC.NET	236060-150-001
			EAAI	236046150N
			BSE	236077150N
			PIB	236062-101
			RTD	235562101
			SSR DI a DO	644695410/644695419
			DISPLAY	236068102
			KEYBOARD	235964102
			RIBBON CABLES	236031105
Uzemňovací člen	ELOK Opava	EGT 4	Náhradní elektronika EGT 4	
Aditivační jednoka	ELOK Opava	EVAPLUS-MC	Deska EVAPLUS-MC	
	FMC Technologies Smith Meters GMBH	ACCUPLUS	Deska průtokoměru ACCUPLUS	
	Koax Valves	MK 10 Ex	Průtokoměr ACCUPLUS	
			Ventil KOAX MK 10 Ex NC pro EVPLUS-MC	526658
	Schiedrum Hydraulic	108 BXA	Ventil KOAX MK 10 Ex NC pro EVA 5	550055
Pojistný ventil Aditivačního potrubí	HYDAC	DB12120A-01X-030V	Schiedrum Hydraulic nerez	7651
			Pojistný ventil HYDAC	555785
	Poličské strojírny	P16 217 540 DN25	Tělo pojistného ventilu HYDAC	
Filtry na sání aditivačních čerpadel	Poličské strojírny	F105.25/31	pojistný ventil	P16 217 540 DN25
	HYDAC	0160 D 010 BN4HC	Vložka filtru F105.25/31	38155F
		0280 D 010 ON	Vložka filtru 0160 D 010 BN4HC	
Filtry aditivačních jednotek	FMC Technologies	ACCUPLUS	Vložka filtru 0280 D 010 ON	
Čerpadla aditiv	ROTAN PUMP	HD26EMFR-1U5B2	Filtr pro EVA 7	
	SIGMA PUMPY	1"-ZOP-20-25-LO-10	Samostatné aditivační čerpadlo HD26EMFR	
	SIGMA PUMPY	1"-ZOP-20-25-LO-10 NEREZ	Samostatné aditivační čerpadlo SIGMA ZOP	
	VIKING PUMP	SG40782GOV	Samostatné aditivační čerpadlo nerezové SIGMA ZOP	
	VIKING PUMP	SG40758GOV	Samostatné aditivační čerpadlo VIKING Verva STŘ	
	VIKING PUMP	SG41026GOV	Samostatné aditivační čerpadlo VIKING	
	Wanner	Hydra-Cell G13-M2M	Samostatné aditivační čerpadlo VIKING Verva LOU	
Cirkulační ventil BIO stratí	FMC Technologies	201/60A 3"	Samostatné aditivační čerpadlo Wanner (CDKA)	
			Pressure Control, Model 60A, 63A, 64A Buna	RPKPMC06XAB
			Pressure Control, Model 60A, 63A, 64A Viton	RPKPMC06XAV
			Sada teflonového uložení stemu horní	Bearing, sleeve, Ni-Resist (009971-400)
			Sada teflonového uložení stemu dolní	Bearing, seat, 3" (529675-001)
			Stem	STEM-3'200 SERIES VALVE

Příloha č. 3 zadávací dokumentace VZ „Rámcová smlouva – Úprava a servis technologií pro výdej, příjem a skladování PHM“

			Opravná sada pro FMC SMITH 200/3" Buna	RPKFMC2103B
			Opravná sada pro FMC SMITH 200/3" Viton	RPKFMC2103V
Civacon	OPW	8800E	Zelená koncovka a 6m kroucený kabel 10pin	7300E
			Modrá koncovka a 6 m kroucený kabel 6pin	7100E
			Náhradní elektronika model 8800	EL00203-REP
Čerpadlo DRA	MILROYAL	MD93G12XV60	Vnitřní výstroj výtlačného ventilu čerpadla	3051306781F
			Kompletní výtlačný ventil	3051306752F
			Vnitřní výstroj sacího ventilu čerpadla	3051306771F
			Kompletní sací ventil	3051306751F
			Membrána	09804550281N
			Pojistný ventil 6ti funkční	306006921F



Příloha č. 2 smlouvy

5. Dodávka a implementace MaR systémů do ŘS

Implementace MaR systémů do ŘS bude probíhat na skladech ČEPRO, a.s., a to nejen na objektech výdejních lávek a v objektech jim přilehlých, ale také v objektech čerpadloven, strojoven, stáčení ŽC a jiných objektů v rozsahu a parametrech stanovených zadávací dokumentací, ustanovení platných norem, či jiných obecně závazných předpisů. Položkový rozpočet možných implementovaných prvků je součástí výkazu výměr. Pokud požadované práce nebo dodávky materiálu a komponent nejsou součástí přílohy č. 2 výkaz výměr, bude cena v nabídce odsouhlasena mezi Objednatelem a Zhotovitelem v cenách, v místě a čase obvyklých.

Implementace MaR systémů do ŘS bude vždy sestávat z následujících kroků:

- Elektronická a telefonická specifikace díla ze strany Zadavatele
- Navržení technického řešení a předložení cenové nabídky dle konkrétních požadavků ze strany Zhotovitele
- Odsouhlasení technického řešení a navrhované ceny za dílo ze strany Zadavatele
- Vytvoření objednávky ze strany Zadavatele
- Vypracování projektové dokumentace a technologického postupu ze strany Zhotovitele
- Fyzický nástup Zhotovitele na implementaci dle požadavku a dohody se Zadavatelem
- Vypracování dokumentace skutečného stavu
- Zajištění revizí a posouzení TIČR, pokud je zapotřebí
- Předání díla

Lokality jednotlivých skladů jsou uvedeny níže, nebo na: <https://www.ceproas.cz/kontakty/sklady>

Příloha č. 3 zadávací dokumentace VZ „Rámcová smlouva – Úprava a servis technologií pro výdej, příjem a skladování PHM“

6. Úpravy/rekonstrukce/modernizace/rozšíření/výstavba technologií výdeje PHL a aditivace

Úpravy/rekonstrukce/modernizace/rozšíření/výstavba technologií budou probíhat na skladech ČEPRO, a.s., na objektech, kde se vyskytuje technologie pro příjem, výdej a skladování pohonných hmot a jim přidružené objekty v rozsahu a parametrech stanovených zadávací dokumentací, ustanovení platných norem, či jiných obecně závazných předpisů. Položkový rozpočet možných úprav je součástí výkazu výměr. Pokud požadované práce nebo dodávky materiálu a komponent nejsou součástí přílohy č. 2 Výkaz výměr, bude cena v nabídce odsouhlasena mezi Objednatelem a Zhotovitelem v cenách, v místě a čase obvyklých. Základní možné požadavky na úpravy/rekonstrukce/modernizace/rozšíření/výstavby technologií se mohou týkat:

- Montážních prací ve výbušném prostředí
- Elektromontážních prací v rozvodnách a ve výbušném prostředí
- Úpravy stávající technologie např. přesun technologií na jiný sklad
- Ukončení provozu stávajících technologií
- Zpracování všech stupňů projektové dokumentace a případné zajištění potřebných povolení
- Inženýrské činnosti související s technologií
- Stavební práce
- Výstavba technologií
- Uvádění technologií do provozu
- Získání kolaudačního rozhodnutí

Lokality jednotlivých skladů jsou uvedeny níže, nebo na: <https://www.ceproas.cz/kontakty/sklady>

Příloha č. 3 zadávací dokumentace VZ „Rámcová smlouva – Úprava a servis technologií pro výdej, příjem a skladování PHM“

7. Vypracování projektové dokumentace

Zpracování projektové dokumentace ve všech úrovních, která bude soužit jako podklad pro výběr zhotovitele, projektová dokumentace pro realizace úprav/rekonstrukce/modernizace/rozšíření/výstavby technologií pro výdej příjem a skladování PHL dle požadavků zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zpracování technické dokumentace skutečného stavu. Aktualizace technologických schémat PID.

Po definitivním odsouhlasení objednatelem bude následně projektová dokumentace předána objednateli 3x v tištěné podobě a 1x na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) ve formátu PDF, DOC, XLS, DWG, SHP.

Lokality jednotlivých skladů jsou uvedeny níže, nebo na: <https://www.ceproas.cz/kontakty/sklady>

Příloha č. 3

**Čestné prohlášení o neexistenci
střetu zájmů a pravdivosti údajů o
skutečném majiteli**

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ A PRAVDIVOSTI ÚDAJŮ O SKUTEČNÉM MAJITELI¹

Pro účely podání nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku č. 135/22/OCN s názvem „Rámcová dohoda – Úprava a servis technologií pro výdej, příjem a skladování PHM“, vyhlášenou obchodní společností **ČEPRO, a.s.**, IČO: 601 93 531, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, ve smyslu ust. § 4 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Čestné prohlášení

Obchodní firma: **VAE CONTROLS, s.r.o.**,

IČO: 48390470,

se sídlem náměstí Jurije Gagarina 233/1, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

pod sp. zn. C6037,

zastoupená Ing. Martin Pecina, MBA, jednatelem,

tímto čestně prohlašuje, že

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSZ“), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- žádná z osob, jejichž prostřednictvím dodavatel ve výše uvedeném zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;²
- má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“); a současně
- jeho skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ;
- osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel ve výše uvedeném zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům ZESM; a současně
- jejím skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.

¹ Čestné prohlášení bude přílohou uzavírané smlouvy.

² Dodavatel vždy prohlašuje skutečnosti uvedené v prvních dvou odrážkách; následně vybere/zachová alternativní variantu odpovídající jeho konkrétním poměrům, resp. poměrům jeho poddodavatele.

Příloha č. 7 - Vzor ČP o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli

V Ostravě dne 01. 07. 2022

Podpis osoby oprávněné zastupovat účastníka zadávacího řízení
