

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00187

SAP S/4 Hana: 8030003587

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO



S009P00WNXF9

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. VPI/MJ/2022/00187**

mezi

CETIN a.s.

a

město Blansko

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená Janem Žďárským, Ředitelem divize Výstavby a údržby sítí, dle pověření ev.č.
PŘ/3386/2022
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „**CETIN**“)

a

město Blansko

se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
IČO: 00279943
DIČ: CZ00279943
zastoupené Ing. Jiřím Crhou, starostem města
(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Blansko spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní,

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00187

SAP S/4 Hana: 8030003587

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 29.9.2021 vydané pod čj. 772559/21, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Blansko úprava kom. Těchovská**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00187

SAP S/4 Hana: 8030003587

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektu,
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však pět (5) měsíců od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná výzva“).

Stavebník se zavazuje, nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, jejíž vzor je uveden v Příloze č. 2 Smlouvy a převést na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky. Ve lhůtě dle předchozího odstavce je Stavebník povinen předat společnosti CETIN územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
- (c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 bodu (i) Smlouvy;
- (d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00187

SAP S/4 Hana: 8030003587

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **1.198.445,- Kč** (slovy jeden milion jedno sto devadesát osm tisíc čtyři sta čtyřicet pět korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do čtyř (4) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00187

SAP S/4 Hana: 8030003587

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:
- (a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši **32.915,- Kč** (slovy: třicet dva tisíc devět set patnáct korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy,
 - (b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.
- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00187

SAP S/4 Hana: 8030003587

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: Ludmila Uhrová
funkce: specialista pro výstavbu sítě - překládky SEK
e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: Petr Bílek
funkce: senior specialista pro výstavbu sítě
e-mail: [REDACTED]

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Ing. Jiří Crha
funkce: starosta města
e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: Ing. Jiří Svoboda
funkce: investiční referent
e-mail: [REDACTED]

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00187

SAP S/4 Hana: 8030003587

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle Čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.
- 9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00187

SAP S/4 Hana: 8030003587

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- (a) v listinné podobě;
 - (b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;
 - (c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00187

SAP S/4 Hana: 8030003587

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy, věta první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem (b) a (c).

- 12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00187
 Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030003587
 Registr smluv: ANO

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv delikt ní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoliv souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13 Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby – vzor

Doložka

Tato Smlouva se uzavírá na základě rozhodnutí starosty města Blansko ve věci mu svěřené Radou města Blansko na její 14. schůzi dne 28. 06. 2011 usnesením č. 109.

CETIN:

25 -08- 2022

V Praze dne



CETIN a.s.

Jan Žďárský

Ředitel divize Výstavby a údržby sítí



Stavebník:

V Blansku dne 02.09.2022



město Blansko

Ing. Jiří Crha
starosta města

VPIC Blansko úprava kom. Těchovská

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady:

Požadavek IPMS int.č. 20725/22/0025 na zpracování CTN: VPIC Blansko úprava kom. Těchovská

2.2 Navrhované řešení:

Požadavek na CTN. Vynucená překládka SEK v majetku CETIN z důvodu rekonstrukce komunikace ul. Těchovská v Blansku.

Stávající stav:

Ul. Těchovská.

V ul. Těchovská vedou po severní straně dvě trasy

První trasa zrušená – nebude řešeno.

Druhá trasa s MET kabely a HDPE s MT.

MET:

V místě se nachází DSLAM BLAN 89 (SIS3-1050 + rDslam)

S kabely:

1. PPFLEZE 15XN0,4 směr BLAN 561 a BLAN 537
2. PPFLE 100XN0,4 (PFLEZE) (V kabelu vede dálkové napájení!)
3. PPFLEZE 75XN0,4
4. PPFLEZE 5XN0,4
5. PPFLEZE 35XN0,4
6. PPFLEZE 50XN0,4
7. PPFLEZE 10XN0,4
8. PPFLEZE 5XN0,4

Kabel mimo DSLAM

9. PPFLE 1XN0,4 z BLAN561 do BLAN1512

HDPE:

1. HDPE40 B/C (T 658 013 62 a T 658 013 64)
2. HDPE Z (T 658 DLB 03 a prázdné)

OK:

658 DLB:

- 01 – OFS 24f 4x6 RB D (TS 658 DLM MT 7/5,5 CV) z RSU do SOR 01 Coyote Runt in Line
- 64 – OFS 24f 4x6 RB D (TS 658 013 MT 7/5,5 m) ze SOR 01 Coyote Runt in Line do BLAN BS 50
- 61 – OFS 12f 2x6 RB XT (TS 658 013 MT 7/5,5 CV) ze SOR 01 Coyote Runt in Line do BLAN BS 13
- 62 – OFS 12f 2x6 RB XT (TS 658 DLM MT 7/5,5 M) ze SOR 01 Coyote Runt in Line do BLAN BS 42

V ulici Masarykova se nachází trasa s MET kabely:

1. DCKOPV 4RP 1,3 + 38DM 0,9
2. Asi PMbc 400XN0,5
3. DCKOPV 7RP 1,3 + 46DM 0,9

Návrh řešení:

BLAN89 bude demontován – vedle něj bude postaven nový rozvaděč- SIS900D . Bude ponecháno dálkové napájení.

Uzemnění bude provedeno nové.

Kabely a HDPE budou stranově posunuty, tak aby nebyly pod budoucím obrubníkem o 30-40cm.

V místě původního DSLAM je navržen nový PKOR (umístění T Matrix bude s ohledem na stranovou překládku).

V místě vjezdů bude přesunuto se stávající chráničkou (v případě poškození bude demontováno a nahrazeno SYSPRO.)

Kabely 1-9 budou stranově posunuty blíže k domům o cca 30-40cm.

Kabely:

1. PPFLEZE 15XN0,4 – kabel bude demontován z SIS3, přeložen do nové trasy a napojen do SIS 900D.
2. PPFLE 100XN0,4 (PFLEZE)- kabel bude demontován z SIS3, přeložen do nové trasy a napojen do SIS 900D (v SIS900D nutno vyvést dálkové napájení na první pásy dle standardu Cetin!)
3. PPFLEZE 75XN0,4 - kabel bude demontován z SIS3, přeložen do nové trasy a napojen do SIS 900D.
4. PPFLEZE 5XN0,4 - kabel bude demontován z SIS3, přeložen do nové trasy a přes spojku a vložku PPFLEZE

- 5XN0,4 napojen do SIS 900D.
5. PPFLEZE 35XN0,4- kabel bude demontován z SIS3, přeložen do nové trasy a přes spojku a vložku PPFLEZE 50XN0,4 napojen do SIS 900D.
 6. PPFLEZE 50XN0,4- kabel bude demontován z SIS3, přeložen do nové trasy a přes spojku a vložku PPFLEZE 50XN0,4 napojen do SIS 900D.
 7. PPFLEZE 10XN0,4 - kabel bude demontován z SIS3, přeložen do nové trasy a přes spojku a vložku PPFLEZE 10XN0,4 napojen do SIS 900D.
 8. PPFLEZE 5XN0,4 - kabel bude demontován z SIS3, přeložen do nové trasy a přes spojku a vložku PPFLEZE 5XN0,4 napojen do SIS 900D.
 9. PPFLE 1XN0,4 – kabel bude stranově přesunut blíže k domům.

V ulici Masarykova:

1. DCKOPV 4RP 1,3 + 38DM 0,9 – v nové trase bude instalována kabelová vložka s kabely PPFLE 50XN0,8 a spojkami XAGA
2. Asi PMbc 400XN0,5– v nové trase bude instalována kabelová vložka s kabely PPFLE 400XN0,6 a spojkami XAGA
3. DCKOPV 7RP 1,3 + 46DM 0,9– v nové trase bude instalována kabelová vložka s kabely PPFLE 50XN0,8 a spojkami XAGA.

HDPE:

Bude provedena stranová překládka v délce cca 75m. Pokud HDPE nevyjde – bude nastaveno HDPE 40C/BB a 40 O/BB. TS budou popřípadě nadstaveny MT 10/8 a 7/5,5.

OK – stávající spojky Coyote Runt in line bude demontována a umístěna do nové PKOR. Vlákna provařena dle původního.

Technické řešení navržené v CTN zohledňuje pouze podklady dodané k vytvoření CTN. Případné další podmínky správců sítí, majitelů pozemků, a další, které nebyly předány ke zpracování CTN nebyly zohledněny.

Výkopy budou zasypány původní zemínou – jiné hloubky a výměna zeminy není rozpočtována!

Minimálně 42 dní dopředu je nutné požádat o PEW!

2.3 Popis tras

viz. přiložené podklady

VVN: ne

El. trakce: ne

Vodní toky: ano

2.4 Použitá technologie:

HDPE40,

Minimarker Ball

2.5 Použité předpisy:

TPP 2001-1 (TP 69a) - Výstavba přístupových sítí -

Metalické kabely (část I.)

TPP 2001-2 (TP 69b) - Výstavba přístupových sítí -

Metalické kabely (část II.)

TPP 2001-3 (TP 69c) - Výstavba přístupových sítí -

Metalické kabely (část III.)

TA 10 (I.-III.) - Výstavba nadzemních sítí

ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 334050 - Podzemní sdělovací vedení

ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení

Výkop, položení a obsazení chráničky je v souladu s ČSN 73 6005

2.6 Koordinace:

Stavebník: Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

ÚR - zajistí stavebník

Kontakt na projektanta: Miroslav Patočka, Ústav pozemních komunikací, Fakulta stavební, VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V BRNĚ, M: [REDACTED]

Kontakt na stavebníka: Ing. Marek Štefan, vedoucí oddělení investic, odbor správy a rozvoje města
[REDACTED]

2.7 Ostatní:

PD: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom

ÚR: stavební titul zajistí investor

GEO zaměření: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom

GEO vytyčení hranic pozemků, vč. nové trasy SEK: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom

VBŘ: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom

GP: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom

SoUZ: Ne

PEW: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom

Před vlastním zahájením prací je nutno zajistit PEW (přerušení optických) - min. 42 dnů

RZ je povinný oznámit zahájení výkopových prací a pozvat ke kontrole před záhozem výkopů PC a pracovníka provozní složky spol. CETIN.

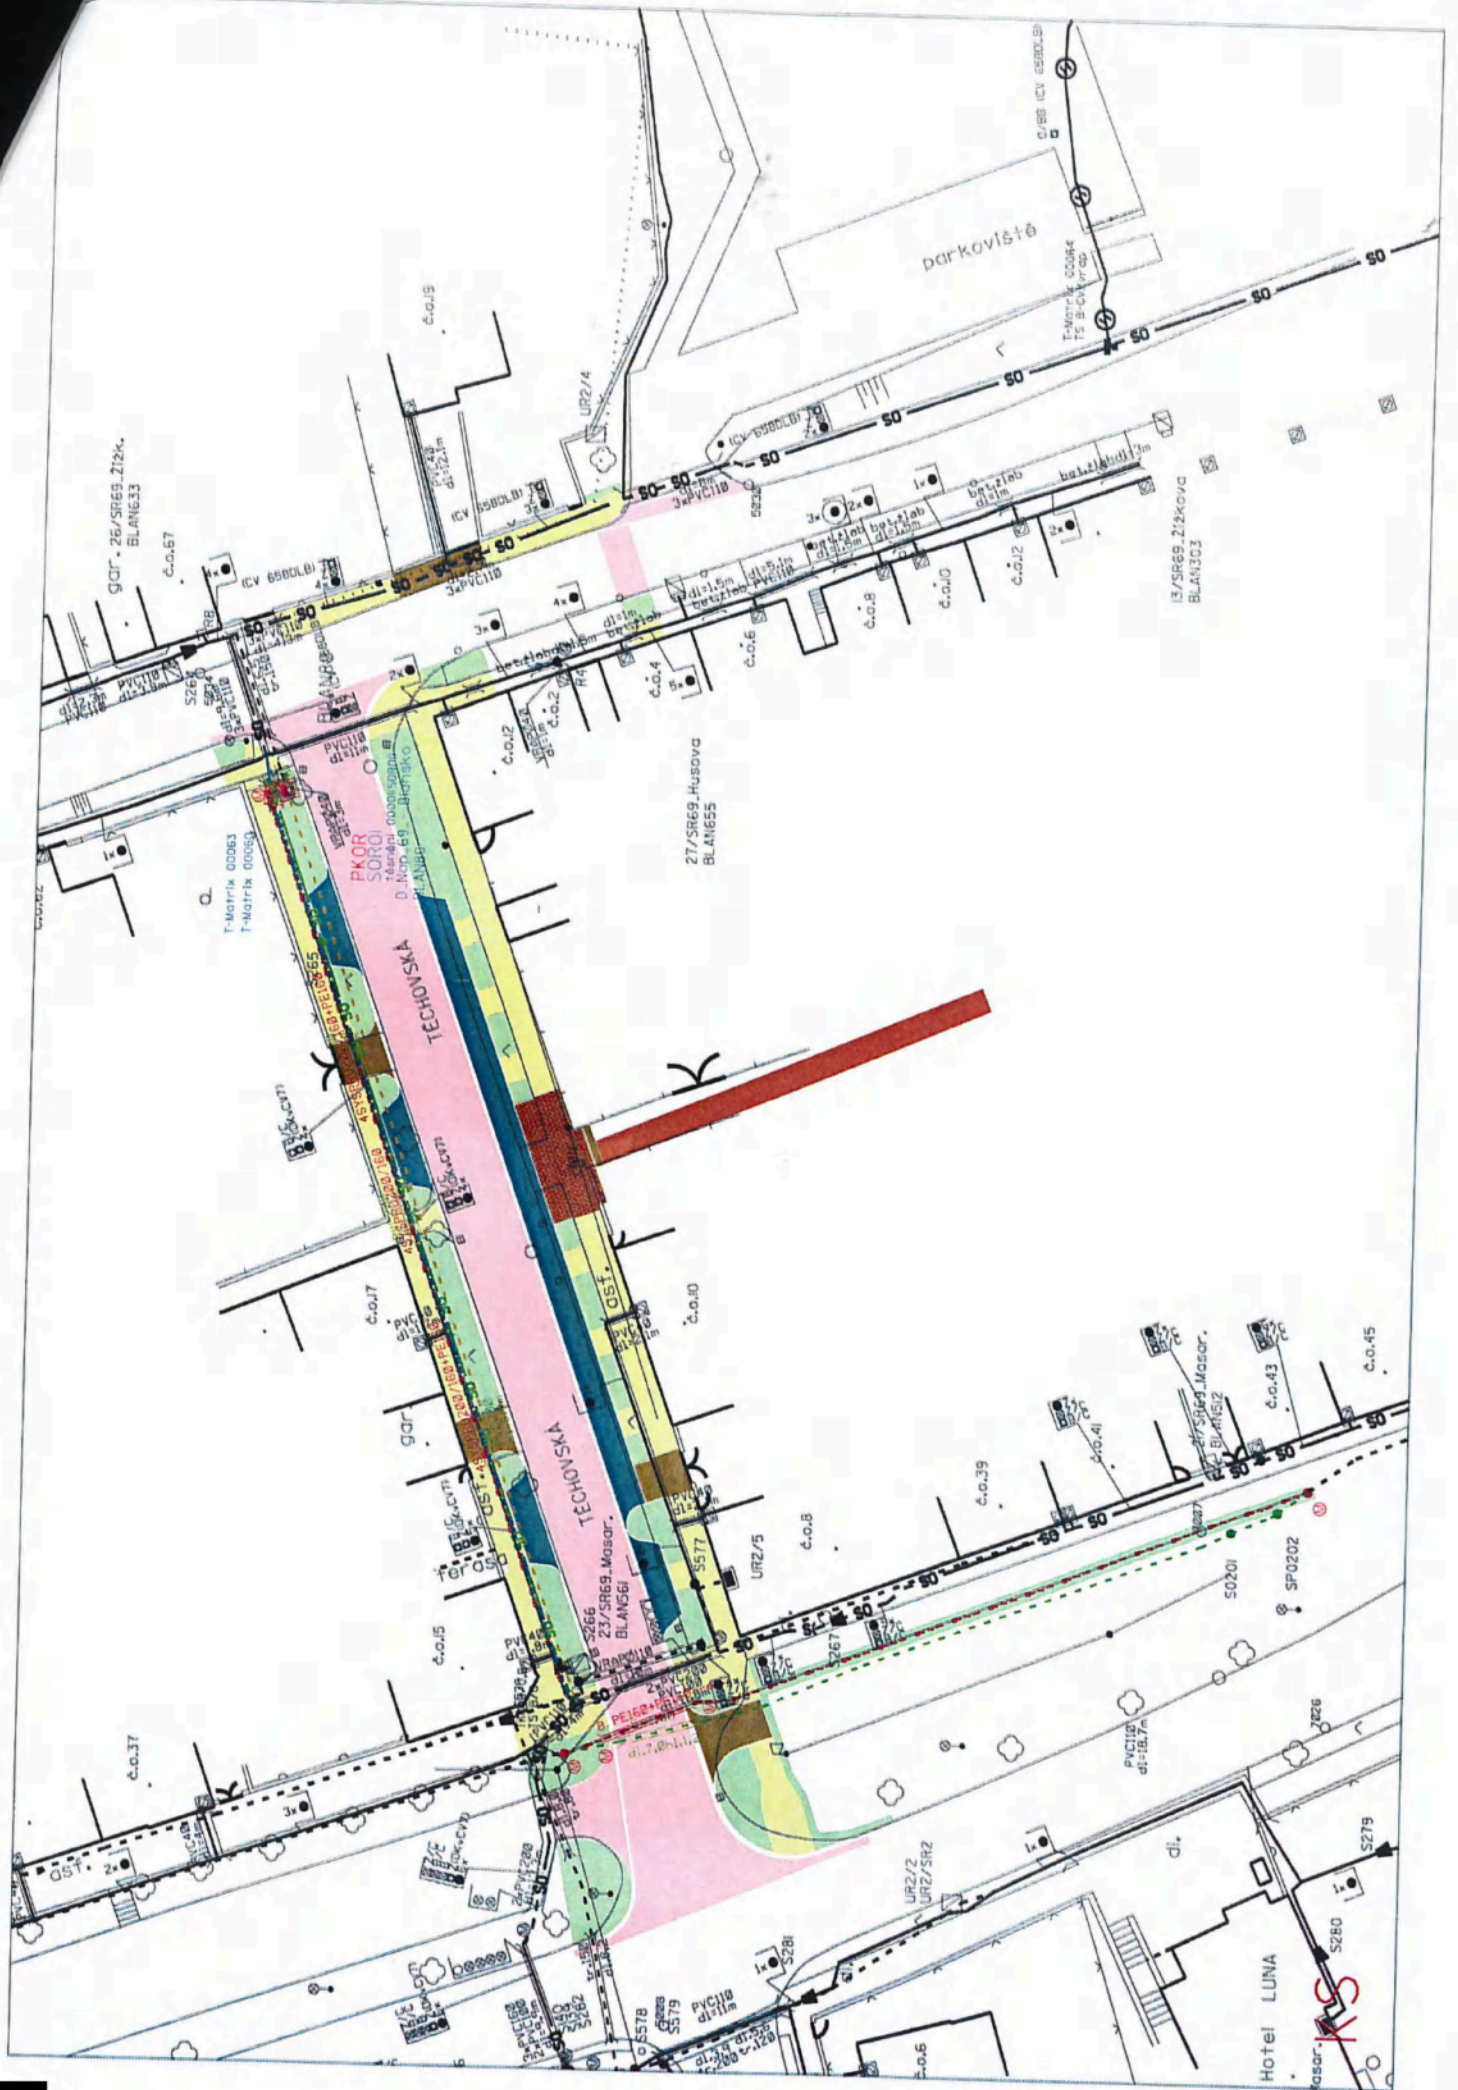
Kabelové spojky budou umístěny v nepojízdných plochách a budou opatřeny detekčními markery miniBall.

Technické řešení navržené v CTN zohledňuje pouze podklady dodané k vytvoření CTN.

Případné další podmínky správců sítí, majitelů pozemků a jiné, které nebyly předány ke zpracování CTN, nejsou zohledněny.

Měření:

optické kabely = před provedením překládek bude na optických kabelech provedeno kontrolní měření vybraných vláken (cca 10%). Po provedení překládky bude provedeno standardní měření na celém profilu vláken kabelů.









VPIC Blansko úprava kom. Těchovská - specifikace nákladů
 PPD - Propočet projektové dokumentace
 Ceník: VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. - 2022.08

Název stavby: VPIC Blansko úprava kom. Těchovská

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel CTN Vegacom a.s. A.Péťa, M.Novotný

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	29 582,35 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	297 698,96 Kč
MONTÁŽ	454 767,51 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	14 854,59 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	3 332,61 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	14 385,88 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	10 162,20 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	266,12 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE	373 394,78 Kč

Celkové náklady: 1 198 445,00 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA			
958084	Návrh cenový a technický	1.00 ks	12 960,15 Kč
953635	Projekt tlkm liniové optické sítě PD zóna I /(do - 0,100 km)	16622.20 JV	16 622,20 Kč
ZEMNÍ PRÁCE			
954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	32.00 m	764,80 Kč
954959	Rýha v chodn.zám.dlaž.35/50-70rozš.o10cm	6.00 m	1 270,86 Kč
955577	Rýha v chodníku bosém 35/50-70	120.00 m	70 513,20 Kč
952346	Rýha v chodníku l.asf.35/50-70rozš.o10cm	170.00 m	44 081,00 Kč
954951	Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70	85.00 m	86 555,50 Kč
955578	Rýha v chodníku bosém rozšíření o10cm	154.00 m	25 881,24 Kč
952362	Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70	3.00 m	2 268,78 Kč
954962	Rýha ve vozovce l.asf.50/130rozš.o 10 cm	9.00 m	3 723,84 Kč
954952	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130	19.00 m	40 337,00 Kč
955053	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	227.00 m	2 739,89 Kč
954972	Znovuosazení obrubníků chodníkových	75.00 m	19 159,50 Kč
951349	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	3.00 ks	403,35 Kč
MONTÁŽ			
955094	Demontáž objektu samost.SIS nad 50 čtyř.	1.00 ks	1 642,78 Kč
955079	Demontáž spojky bez demontáže vláken	1.00 ks	997,43 Kč
955031	Demontáž úložných kabelů do 300 XN	150.00 m	5 341,50 Kč
955029	Demontáž úložných kabelů do15 XN	107.00 m	2 196,71 Kč
958303	Kalibrace a tlaková zkouška trubiček - stavba	280.00 m	436,80 Kč
958306	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	40.00 m	158,80 Kč
958308	Měření jednostranné OTDR (1625 nm) - stavba	22.00 ks	3 801,60 Kč
958310	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm)	22.00 ks	10 427,34 Kč

958314	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm)	22.00 ks	1 865,16 Kč
952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	22.00 ks	3 915,12 Kč
952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	880.00 ks	36 141,60 Kč
952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	800.00 ks	21 904,00 Kč
952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	11.00 ks	1 054,02 Kč
952647	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	11.00 ks	1 957,56 Kč
954999	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	500.00 ks	13 690,00 Kč
955000	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	620.00 ks	21 216,40 Kč
955300	Montáž objektu samost. SIS nad 50 čtyř.	1.00 ks	1 864,62 Kč
955003	Montáž ochranného boxu pro spojku	1.00 ks	777,23 Kč
955268	Montáž podzemní tratě síťové metalické	136400.77 JV	136 400,77 Kč
955269	Montáž podzemní tratě síťové optické	18600.00 JV	18 600,00 Kč
	Montáž Syspro , manipulace s OK, koordinace na stavbě		
955286	Montáž spojky bez montáže vláken	1.00 ks	1 127,36 Kč
955279	Montáž spojky smršt.dvoupl.do 50 čtyř.	3.00 ks	5 339,07 Kč
955280	Montáž spojky smršt.dvoupl.nad 50 čtyř.	2.00 ks	5 202,16 Kč
955282	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	6.00 ks	11 499,48 Kč
955945	Montáž spojky T (Y) (I)	2.00 ks	320,78 Kč
955946	Montáž spojky, koncov., průchod.,reduk.	30.00 ks	868,20 Kč
955284	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	2.00 ks	104,24 Kč
952602	Montáž trubky úložné	40.00 m	716,00 Kč
954990	Montáž úložných kabelů do 15 XN	157.00 m	3 662,81 Kč
954992	Montáž úložných kabelů do 300 XN	150.00 m	6 160,50 Kč
954991	Montáž úložných kabelů do 50 XN	170.00 m	4 890,90 Kč
954993	Montáž úložných kabelů nad 300 XN	75.00 m	4 315,50 Kč
955303	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	1 248,57 Kč
956049	Pokládka tlustostěnné trubičky	15.00 m	170,40 Kč
958592	Provádění PEW v maintenance window	2.00 ks	58 012,10 Kč
954980	Překládka trubky úložné	160.00 m	2 764,80 Kč
958557	Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks	18 088,26 Kč
957753	Realizace tratě síťové dohodou	1562.40 JV	1 562,40 Kč
	Doprava betonu		
958331	Svaření jednotlivého vlákna v transp. a metrop. síti	18.00 ks	7 630,74 Kč
955298	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	295.00 ks	8 077,10 Kč
955258	Ukončení kabelu armovaného v rozvaděči	8.00 ks	3 942,64 Kč
958469	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	5 262,56 Kč
955630	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	1.00 ks	1 221,19 Kč
955942	Zafukování svazku trubiček	40.00 m	1 234,40 Kč
958558	Zkouška trhací	1.00 ks	2 838,89 Kč
958556	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	5 749,37 Kč
955082	Zrušení ukončení armov. kab. v rozvaděči	8.00 ks	1 861,84 Kč
955081	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	295.00 ks	5 643,35 Kč
955097	Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	862,46 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE			
955278	Provedení geodetického měření pro tratě síťové GEO vytyčení nové trasy SEK	6572.00 JV	6 572,00 Kč
956286	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	80.00 m	2 172,80 Kč
956285	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pev.č.	1.00 ks	6 109,79 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	3 332,61 Kč

CENÁ BŘEMENA REALIZACE

958747	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	7 899,52 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene náhrada za VBř odhadovaná	500.00 JV	500,00 Kč

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.

955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 592,03 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	3 394,33 Kč

PROVOZNÍ PRÁCE

955206	Zrušení převodu na HR - 1.pár	1.00 ks	185,65 Kč
955207	Zrušení převodu na HR - další pár	41.00 ks	1 889,69 Kč
955204	Zrušení převodu v rozvaděči - 1.pár	1.00 ks	188,31 Kč
955205	Zrušení převodu v rozvaděči - další pár	41.00 ks	1 391,54 Kč
955210	Zřízení převodu na HR-Zřízení-1. pár	1.00 ks	191,09 Kč
955211	Zřízení převodu na HR-Zřízení-další pár	41.00 ks	2 835,15 Kč
955208	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	1.00 ks	204,65 Kč
955209	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár	69.00 ks	3 276,12 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP Název položky

Množství Celková cena

MATERIÁL ZHOTOVITELE

303003	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	2.00 ks	266,12 Kč
310684	Adaptér simplexní SC/APC	4.00 ks	14,80 Kč
303918	Deska krycí plast. 300x1000 mm	216.00 ks	8 974,80 Kč
303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	191.00 m	804,11 Kč
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	219.00 m	1 055,58 Kč
300273	Kabel plastový TCEPKPFLE 400x4x0,6	75.00 m	139 829,25 Kč
300130	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,8	150.00 m	61 528,50 Kč
300135	Kabel plastový TCEPKPFLEZE 10x4x0,4	10.00 m	1 001,50 Kč
300138	Kabel plastový TCEPKPFLEZE 50x4x0,4	20.00 m	4 386,40 Kč
300134	Kabel plastový TCEPKPFLEZE 5x4x0,4	20.00 m	1 636,80 Kč
322273	Kryt dálk. napájení DSLAM pásku FK, 30Pp	1.00 ks	200,95 Kč
321714	Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x450	1.00 ks	12 185,63 Kč
320879	Materiál pro tratě síťové	7230.00 ks	7 230,00 Kč
302532	Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	1.00 ks	251,19 Kč
302550	Mini Marker 1401 3M Ball	6.00 ks	1 327,86 Kč
312479	Modul konektor. 4005-25P	72.00 ks	4 299,12 Kč
312425	Modul konektor. 9700-10P	44.00 ks	1 084,60 Kč
322698	Označovač červený 1 pár. HD180	30.00 ks	251,10 Kč
309931	Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m	25.00 kg	1 663,25 Kč
321405	PIGTAIL SANWA SM4f 4xSC/APC(2mm 0,3m)15m	1.00 ks	991,15 Kč
322298	Skříň SIS 900D HD180	1.00 ks	49 828,70 Kč
318806	Spojka I trubky rozšíř.40SRV-M 40 vodot	2.00 ks	2 978,86 Kč
312889	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	4.00 ks	3 169,16 Kč
303607	Spojka plastová 160/137mm	2.00 ks	157,50 Kč
320295	Spojka smršťovací XAGA 500-125/30-460	2.00 ks	2 623,56 Kč
301783	Spojka trubičky HDPE 10mm s pojítkami	12.00 ks	382,92 Kč
301801	Spojka trubičky HDPE 7mm s pojítkami	16.00 ks	401,92 Kč

323828	Spojka trubičky HDPE Gas-bl 10mm s pojis	2.00 ks	112,70 Kč
322269	Spojka XAGA 500-43/8-150/EZE	3.00 ks	10 169,19 Kč
322270	Spojka XAGA 500-75/15-400/EZE	2.00 ks	13 396,90 Kč
319184	Spona trubkySYSPRO	72.00 ks	2 639,52 Kč
309974	Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm	1.00 ks	44,81 Kč
309992	Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm	1.00 ks	46,17 Kč
322692	Svorkovnice HD180 na tyče	90.00 ks	12 231,00 Kč
322695	Štítek sklopný HD180	3.00 ks	244,02 Kč
323235	Trubička HDPE 10/6mm č.1 červená polopr	15.00 m	100,95 Kč
300633	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.1 červená	40.00 m	167,60 Kč
300634	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.2 zelená	40.00 m	167,60 Kč
300635	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.3 žlutá	40.00 m	167,60 Kč
300623	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.1 červená	40.00 m	108,40 Kč
300624	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.2 zelená	40.00 m	108,40 Kč
300625	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.3 žlutá	40.00 m	108,40 Kč
300626	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.4 modrá	40.00 m	108,40 Kč
319210	Trubka dělená SYSPRO 200/160	12.00 m	10 362,24 Kč
300027	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	20.00 m	652,40 Kč
300036	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	20.00 m	652,40 Kč
302699	Trubka PE 160/9,1/6000mm	5.00 ks	9 979,35 Kč
302343	Trubka vrapovaná 40/32 s lankem	2.00 m	36,94 Kč
306260	Vložka speciální 2008/1 Morava-54373	2.00 ks	706,02 Kč
303222	Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35	8.00 ks	760,56 Kč
315502	Vodič sděl. nf U 2x0,5	600.00 m	2 064,00 Kč

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
IČO: 04084063
zastoupená [•]
(„CETIN“)

a

[•]

(„Partner“)

(CETIN a Partner dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“).

uzavírají dne, měsíce a roku níže uvedeného dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**“) tuto

DOHODU O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ („Dohoda“)

Čl. I **PŘEDMĚT DOHODY**

1. Partner má dle správního rozhodnutí vydaného [KÝM] („**Správní orgán**“) dne [•], pod čj. [•], které nabylo právní moci dne [•] („**Správní rozhodnutí**“) povoleno umístit stavbu [•] („**Stavba**“); Stavba zahrnuje rovněž stavbu vedení a zařízení sítě elektronických komunikací („**Stavba telekomunikačního vedení a zařízení**“). Správní rozhodnutí je Přílohou č. 1 Dohody.
2. Předmětem Dohody je převod některých práv a povinností ze Správního rozhodnutí Partnerem na společnost CETIN, a to (i) převod práva umístit Stavbu telekomunikačního vedení a zařízení za podmínek určených Správním rozhodnutím, (ii) převod těch práv a povinností, která jsou určena stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků či správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, vztahují-li se ke Stavbě telekomunikačního vedení a zařízení.

Čl. II **PŘEVOD PRÁV**

1. Partner s účinností ke dni uzavření Dohody, na společnost CETIN převádí:
 - a) právo umístit Stavbu telekomunikačního vedení a zařízení za podmínek určených Správním rozhodnutím,
 - b) práva a povinnosti, která jsou určena stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků či správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, vztahují-li se ke Stavbě telekomunikačního vedení a zařízení.
2. Partner se zavazuje převod práv a povinností dle čl. II odst. 1 Dohody písemně oznámit Správnímu orgánu nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne

uzavření Dohody.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
2. Dohoda může být změněna pouze dohodou Smluvních stran, formou písemného dodatku podepsaného oběma Smluvními stranami; změna jinou formou je vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv, byť opatřených zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatky k Dohodě musí být písemně číslovány a vstupují v platnost a nabývají účinnosti dle čl. III odst. 1 Dohody.
3. Písemným stykem či pojmem „*písemně*“ se pro účely Dohody rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
 - a) v listinné podobě;
 - b) e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Partner bere na vědomí a souhlasí, že nad rámec ustanovení Dohody nebudou jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak.
5. Vztahy z Dohody vyplývající i vztahy Dohodou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Dohody nebo v souvislosti s Dohodou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
6. Dohoda obsahuje úplné ujednání o předmětu Dohody a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Dohodě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Dohody. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani projev učiněný po uzavření Dohody nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. V případě rozporu mezi ustanoveními Dohody a jejími přílohami, převáží text Dohody.
7. Dohoda je sepsána ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, každá Smluvní strana obdrží po jednom (1).
8. Nedílnou součástí Dohody jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Správní rozhodnutí

CETIN:

V Praze dne _____ 20[.]

za CETIN a.s.

Jméno: [.]

Funkce: [.]

Partner:

V _____ dne _____ 20[.]

za [.]

Jméno: [.]

Funkce: [.]



4

5

6

7
