

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIC	CZ 708 89 546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtmán
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	27-2031110287/0100

dále též jako „objednatel“ a

Zhotovitel	Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava (VŠB – TUO)
	Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET)
	Výzkumné energetické centrum (VEC)
se sídlem	17.listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba
IČO	619 89 100
DIC	CZ61989100
zastoupený	doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek, ředitel VEC
bankovní spojení	ČSOB a.s.
číslo účtu	127089559/0300

dále též jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku veřejné zakázky s názvem: **Fotovoltaické elektrárny – technicko - ekonomická studie**, zadané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zakázka“).

Článek 1

Zmocněné osoby

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:

zástupce objednatele ve věcech technických:

Ing. Bořek Dvořáček, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Iva Javůrková, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Ing. Václav Nýč, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:
 - a) ve věcech technických: Jakub Meca
 - b) ve věcech plnění smlouvy: Jakub Meca
3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.
4. Autorizovanou osobou stanoví zhotovitel Ing. Milan Navrátil, číslo autorizace 33189. Tato osoba je oprávněna k výkonu odborných činností ve výstavbě (autorizace) ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v účinném znění, a to **v oboru Technologická zařízení staveb nebo osvědčení o autorizaci (autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik) v oboru Technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení.**

Energetickým specialistou stanoví zhotovitel Ing. Michal Žlebek číslo oprávnění 1150. Tato osoba je oprávněna k výkonu odborných činností na základě oprávnění energetického specialisty vydaném ministerstvem průmyslu a obchodu k provádění energetických auditů a energetických posudků dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 9. 8. 2022 rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.
2. Předmět plnění je mimo jiné vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:
 - a) Příloha č. 1: Kontaktní místa střešní FVE
 - b) Příloha č. 2: OPŽP 2021-2027_verze_1.1 (uloženo mimo smlouvu)
 - c) Příloha č. 3: vybraná vysvětlení zadávací dokumentace
3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky zahrnuty do jeho nabídky.
4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených zadavatelem.
5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění zhotovitel předá objednateli bez zbytečného odkladu po provedení kontroly.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám.
7. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.

Článek 3

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve sjednaných termínech zhotovit dílo dále specifikované a prosté vad a nedodělků je předat objednateli sjednaným způsobem. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu ve výši a za podmínek dále stanovených.
2. Obecným místem výkonu činností, které zahrnuje zpracování díla, jsou organizace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a sídlo dodavatele. Místem předání díla je sídlo zadavatele.
3. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejích příloh, zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními předpisy a příslušným územním plánem a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo upravit závěry vyplývající z předaných podkladů v závislosti na požadavcích objednatele.

Článek 4

Předmět díla

1. Předmětem díla dle této smlouvy je vyhotovení technicko-ekonomické studie dle požadavků objednatele:
 - a) Posoudit stav střechy – zdali je možné provést realizaci bez dalších stavebních úprav.
 - b) Popis řešení, volba fotovoltaických panelů a jejich umístění
 - Typ panelu, hmotnost, počet panelů a v kolika řetězcích bude propojeno, jmenovitý výkon, sklon
 - Zdroje stínu na předpokládaných místech umístění FVE panelů
 - Měření vyrobené elektrické energie, harmonické proudy, rozpadové místo, síťová ochrana, systém ochrany před bleskem a přepětím, uspořádání solárního pole
 - Nosná konstrukce panelů
 - Elektroinstalace v solárním poli, kabely a kabelové trasy, uzemnění

- Posoudit vhodnost instalace akumulční baterie
- c) Produkce el. energie
- Roční produkce elektrické energie FVE panelů po jednotlivých měsících
 - Objednatel dodá spotřeby elektrické energie za měsíc červen v hodinových intervalech a na základě těchto údajů navrhnout řešení, aby byly přetoky do sítě v minimálním množství
- d) Ekonomická kalkulace
- Předpoklady kalkulace
 - Náklady na výstavbu FVE
- e) Závěr

Další požadavky:

- Pro studii je vybráno celkem 20 objektů v majetku 14 organizací Královéhradeckého kraje – viz příloha č. 1 této smlouvy.
- Předmětná studie bude zpracována v takovém rozsahu, který umožní její využití jako zadání pro další fáze projektové přípravy.
- Objednatel předpokládá na předmět díla využít podporu z Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 - viz příloha č. 2 této smlouvy s názvem OPŽP 2021-2027_verze_1.1

2. V rámci plnění bude dílo dodáno v této podobě:

- 3x papírová/listinná podoba,
- 2x v elektronické podobě na USB v otevřeném formátu (textová část je požadována ve formátu MS Word, Excel, výkresové části jsou požadovány ve formátu DWG),
- 2x v elektronické podobě na USB ve formátu PDF.

3. Součástí díla v průběhu zpracování studie jsou **osobní konzultace zpracovatele s objednatelem** v potřebné míře směřující k úspěšnému plnění díla.

4. *Činnosti a podmínky spojené s navazujícím zadávacím řízením na zpracovatele PD*

- a) Zhotovitelem zpracovaná studie bude použita jako podklad k zadávacímu řízení veřejné zakázky na zpracovatele navazujících stupňů PD. Zhotovitel poskytne objednateli součinnost při přípravě zadávacího nebo výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace, včetně případných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a spolupráce při posuzování a hodnocení nabídek při výběru zpracovatele PD.

Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívá zejména v:

- součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky na výběr zpracovatele navazujících dokumentací;

- vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek, v rozsahu předmětu plnění; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě objednatelem určené, **ve lhůtě 2 pracovních dnů** od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma;
5. Součástí předmětu díla jsou dále všechny činnosti výše neuvedené, které vyplývají z charakteru díla a z účelu této smlouvy.
 6. Zhotovitel bude provádět **průběžnou konzultaci** studie s objednatelem, objednatel požaduje v průběhu zpracování studie osobní konzultace zpracovatele se zadavatelem v potřebné míře směřující k úspěšnému plnění díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen se dostavit na konzultaci i častěji. **Zhotovitel se zavazuje zpracovat všechny požadavky objednatele, vyplývající z provedených konzultací, pokud nebudou v rozporu s platnými právními předpisy.** O konečném řešení v případě rozdílných názorů rozhodne objednatel v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami. Konzultace proběhnou v sídle objednatele nebo v příslušném objektu, požadavek na místo konání navrhne objednatel. Objednatel oznámí konání konzultace vždy alespoň jeden týden předem. Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není povinen provést konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel označí její konání za nadbytečné.
 7. K převzetí díla v termínech dle této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální lhůtou 7 kalendářních dnů. Objednatel není povinen po provedené kontrole studii převzít, pokud studie nebo její část vykazuje vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto ustanovení dopadá pouze na části díla, které to svým charakterem umožňují.

Článek 5

Termíny plnění

1. Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy na základě výzvy objednatele, pokud smlouva nestanoví jinak. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických a věcech plnění a musí být učiněna písemnou formou. Za písemnou formu se považuje i e-mail.
2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

Termíny pro zpracování a předání studie:

Zahájení díla: do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele

Dokončení díla: do 10 týdnů od zahájení plnění

3. Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na studii. Zhotovitel je povinen na změnu počátku zpracování studie přistoupit. Termíny plnění dle odst. 2 se v takovém případě stavějí a počínají běžet dnem doručení žádosti objednatele o opětovné zahájení prací.

Článek 6

Cena díla

1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena pevná a nejvýše přípustná a její změny jsou možné pouze způsobem, uvedeným v této smlouvě. Cena díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v čl. 4 smlouvy.
2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu následující:

cena bez DPH	690 000 Kč
DPH samostatně	144 900 Kč
cena s DPH	834 900 Kč

3. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
4. Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých rizik a vlivů během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla (zejména hotových výdajů, nákladů za komunikaci a jízdného, licence, správních poplatků u úřadů). Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.
5. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti.

Článek 7

Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy.
2. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícím způsobem:

Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění předmětu smlouvy, přičemž platí, že:

90 % ceny díla - **technicko – ekonomické studie** - bude zhotoviteli zaplacen po předání příslušného počtu dokumentace v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a 10 % ceny této části díla bude zhotoviteli zaplacen bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy se zhotovitelem navazující projektové dokumentace. Pokud by objednatel nezapočal s výběrem zhotovitele navazující PD do 12 měsíců od předání díla, doplatí objednatel zbylých 10% ceny této části díla bez splnění podmínky podle předchozí věty. Objednatel je oprávněn vyplatit zbylých 10 % ceny této části díla i dříve, rozhodne-li, že ne zahájí realizaci záměru ve lhůtě 12 měsíců od předání studie.

Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK).

3. Zhotovitel je dle odst. 2 oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelům řádně přijaté dle předávacího protokolu, v němž objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na činnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru protokolárně předat.
4. Při předání části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele.
5. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost bude stanovena na **30 dnů** od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název projektu. V případě, že faktury nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti začne běžet nejdříve až po doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v příloze oboustranně podepsané dílčí předávací protokoly.
6. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.
7. Dodavatel dále prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není označen správcem daně za nespolehlivého plátce a současně prohlašuje a zavazuje se za to, že veškeré bankovní účty jím uváděné při smluvním styku s objednatelům, již byly správci daně řádně oznámeny a jsou řádně zveřejněny v Registru plátců DPH v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty (dále jen „spolehlivý bankovní účet“).
8. V případě, že se účet dodavatele ukáže být jiným než spolehlivým bankovním účtem, nejedná se v případě vystavení faktury dle dohody smluvních stran o řádně vystavený daňový doklad ve smyslu této smlouvy a objednatel je oprávněn takový daňový doklad odeslat zpět dodavateli k vystavení nového řádného dokladu.

9. Smluvní strany se dohodly, že pokud nastane jakákoli okolnost zakládající riziko vzniku ručení za nezaplacenou daň dodavatele předpokládaná zákonem o dani z přidané hodnoty, zejména že dodavatel bude označen v Registru plátců DPH správcem daně jako nespolehlivý plátec či dodavatel bude žádat splnění závazku na jiný než spolehlivý bankovní účet, objednatel je oprávněn nikoli však povinen využít institutu zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona o dani z přidané hodnoty (či jakéhokoli jiného shodného či obdobného nahrazujícího institutu obsaženého v budoucích změnách příslušného právního předpisu) a zaplatit část svého závazku odpovídající výši daně z přidané hodnoty z konkrétního zdanitelného plnění na příslušný depozitní účet správce daně dodavatele. Postup dle tohoto odstavce se považuje za řádné splnění závazků objednatele uhradit sjednanou cenu a souvisejících plnění dle této smlouvy.
10. Případné dílčí faktury budou vystavovány samostatně na služby vyplývající z původní smlouvy a samostatně na případné vícepráce vyplývající z dodatků ke smlouvě. Případné méněpráce budou fakturovány vždy v rámci dílčí faktury z původní smlouvy.
11. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením plnění nebo jeho části třetí osobu (**poddodavatele**), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavatel, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatel je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o plnění, anebo vyzvat dodavatele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatel poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatel poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

Článek 8

Splnění a převzetí díla

1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn předáním a převzetím díla.

2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.
3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím.

Článek 9

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla.
2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán.
3. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu bude objednatel vyzván, poskytnout.
4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a projektu včetně účetních dokladů minimálně deset let od skončení realizace plnění. Dodavatel se zavazuje minimálně po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele.
5. V případě, že budou před započítím díla naplněny podmínky zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a NV (nařízení vlády) č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, je Zhotovitel povinen bezvýhradně zákonná ustanovení (§16) dodržet.
6. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
7. Zhotovitel při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet.

8. Zhotovitel vyvine maximální úsilí, aby byly minimalizovány dopady na životní prostředí, bude respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů.

Článek 10

Záruka

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky veřejnoprávních orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo - s tím, že záruka skončí uplynutím **24 měsíců** (slovy dvaceti čtyř) kalendářních měsíců od předání a převezetí díla objednatelem.
4. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.
5. Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku.
6. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem.
7. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr ke zvýšení nákladů vlastního plnění, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném díle.
8. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani ukončením smlouvy, ani odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od smlouvy.

Článek 11

Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části, či plněním povinnosti dle termínů uvedených v článku 5 vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 500 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele.

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle čl. 10 této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že na základě vady studie dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká objednateli právo na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací tohoto plnění oproti nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu studie neobsahovala. Jedná se především o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady spojené s prodloužením realizace díla, případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část díla odstranit aj.) a vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti výhradně v důsledku porušení povinnosti zhotovitele zhotovit studii bez vad apod.
4. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádně vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení objednatele.

Článek 12

Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:

Zhotovitel se zavazuje sjednat s účinností od počátku doby plnění pojištění proti všem škodám, které by mohl způsobit svojí činností, a to minimálně do výše 1 mil. Kč na jednu pojistnou událost.
2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto článku této smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání požadovaného pojištění objednateli kdykoliv za trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění této smlouvy.

Článek 13

Užití díla

1. Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, nebo z této smlouvy vyplývajícimu.
2. Zhotovitel bezúplatně touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou licenci k užití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto ustanovení v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je především oprávněn užít dílo či jeho část jako podklad zadávacích řízení veřejných zakázek ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, a to včetně uveřejnění způsobem umožňujícím přímý a neomezený dálkový přístup. Užití dle předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách.
3. Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do ceny díla.
5. Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu.
6. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu.
7. Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Zhotovitel s tímto podpisem smlouvy výslovně souhlasí.
8. Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou.

Článek 14

Vyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací

1. Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 14 odst. 3. této smlouvy (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání překážky Vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 14 odst. 4 této smlouvy.
2. Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 14 odst. 1 této smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit.
3. Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující znaky:
 - a) objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejich povinností podle této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí);
 - b) tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani předvídat před uzavřením smlouvy;
 - c) tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události zamezit.

Mezi případy Vyšší moci náleží zejména:

- přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, epidemie);
- válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu, mobilizace, zabavení majetku nebo embarga;
- povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská válka;
- nepokoje, sročení, nebo akty či hrozby terorismu.

4. V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případě Vyšší moci neprodleně poté, co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případě Vyšší moci povinná smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila.
5. Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že není schopna svou povinnost splnit.

Článek 15

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy dle předchozí věty zajistí objednatel. Obě strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění.
2. Objednatel je oprávněn **odstoupit od této smlouvy**, kromě výše uvedeného a kromě případů uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě:
 - a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli.
 - b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele opakovaně (nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků může být uveřejněna na profilu objednatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.
5. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
6. Tuto smlouvu lze měnit doplnit nebo zrušit pouze písemnou formou řádně číslovanými dodatky.

7. Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí příslušnými ustanoveními těchto právních předpisů.
8. Tato smlouva, ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, **může být uzavřena elektronicky**. Pakliže bude smlouva uzavřena v listinné podobě, bude vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jeden stejnopis.
9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše uvedeno připojují své podpisy.
10. O uzavření smlouvy rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu se Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek.

Za objednatele v Hradci Králové

Za zhotovitele v Ostravě

.....
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek
ředitel VEC

Pověření

Prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., ředitel vysokoškolského ústavu CEET Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, sídlem 17. listopadu 2172/15, Ostrava-Poruba, IČO 61989100, (dále jen „pověřující“)

tímto pověřuje

doc. Dr. Ing. Tadeáše Ochodka, nar. [REDAKCE], bytem [REDAKCE], ředitele Výzkumného centra VEC (dále jen „pověřený“),

rozhodováním a jednáním jménem VŠB-TUO za pověřujícího, a to v rozsahu tohoto pověření.

Pověřený je oprávněn:

- po předchozím projednání s pověřujícím podepisovat pracovní smlouvy a dohody mimo pracovní poměr, jejich změny nebo skončení, mzdové výměry, mimořádné odměny všech zaměstnanců VEC a útvarů organizačně začleněných do úseků jím řízených,
- podepisovat dokumenty smluvní povahy a písemnosti týkající se veřejných zakázek v oblastech působnosti Výzkumného centra VEC v rozsahu, který je směrnici Zadávání veřejných zakázek stanoven pro jednání za VŠB-TUO pro ředitele vysokoškolského ústavu,
- podepisovat rozhodnutí o škodě a výši náhrady škody způsobené zaměstnanci VEC a útvarů organizačně začleněných do úseků jím řízených.

Pověření uděluji na dobu od 1. 3. 2021 do 29. 2. 2024.

V Ostravě dne 1. 3. 2021

[REDAKCE]

prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.

Pověření přijímám.

V Ostravě dne 1. 3. 2021

[REDAKCE]

doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **701330_000763**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **LENKA KOLÍNKOVÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Ostrava 33**

Česká pošta, s.p. dne **10.03.2021**




136557791-16874-210310105246

Střešní FV elektrárny

Vybrané objekty v organizacích KHK							
Jedná se o předběžný výběr, situaci je třeba ověřit na místě.							
Organizace	Objekt	Adresa	Typ střechy	Orientace střechy	Použitelná plocha půdorys m ²	Poznámka	
Ústavy sociální péče							
1	Domečky Rychnov n. K.	Jiráskova 1612, Rychnov n. K.	mírně šikmá	JZ	160	možná i jiné střechy v areálu	
2	Domov dědina	Nádražní 790, Opočno	mírně šikmá	JV	180		
3	Domov na Stříbrném vrchu Rokytnice	Stříbrný vrch 99, Rokytnice v OH	šikmá	J	150	3 objekty	
Zdravotnictví							
4	Městská nemocnice, a.s.	poliklinika	Rooseveltova 474, Dvůr Králové	rovná	160		
5	Oblastní nemocnice Jičín a.s.	objekt B, C, F, G	Jana Maláta 493, Nový Bydžov	rovná	1 600		
6	Oblastní nemocnice Náchod a.s.	objekt H, K	Purkyňova 446, Náchod	rovná	930		
7	Oblastní nemocnice Trutnov a.s.		Maxima Gorkého 77, Trutnov	rovná	650	na 4 stávajících objektech, nově projektovaný urgentní příjem již v projektu FVE	
Domovy důchodců							
8	Domov důchodců Černožice	nová budova	Revoluční 54, Černožice	rovná	300	nová budova - není památkově chráněna	
9	Domovy na Orlicí	3 budovy	1. máje 104, 51722 Albrechtice nad Orlicí	rovná	210	3 budovy Albrechtice	
10	Domov pro seniory Pilníkov		Trutnovská 176, Pilníkov	rovná	150		
11	Domov pro seniory Vrchlabí	nová budova	Žižkova 590, Vrchlabí	mírně šikmá	J	150	další budovy vč. FVE
12	Domovy Na Třešňovce	nová střecha	Riegrova 837, Česká Skalice	šikmé	JV, JZ	200	na více objektech
13	Domov sociální péče Tmavý Důl	původní objekty	Tmavý Důl 958, Rtyně v P.	šikmá	JV	200	
Kultura							
14	Regionální muzeum a galerie v Jičíně	nová budova	Depozitář Robousy	šikmá	ZZI	200	je potřeba energie i v létě

14

Domečky Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1612, 51601 Rychnov nad Kněžnou

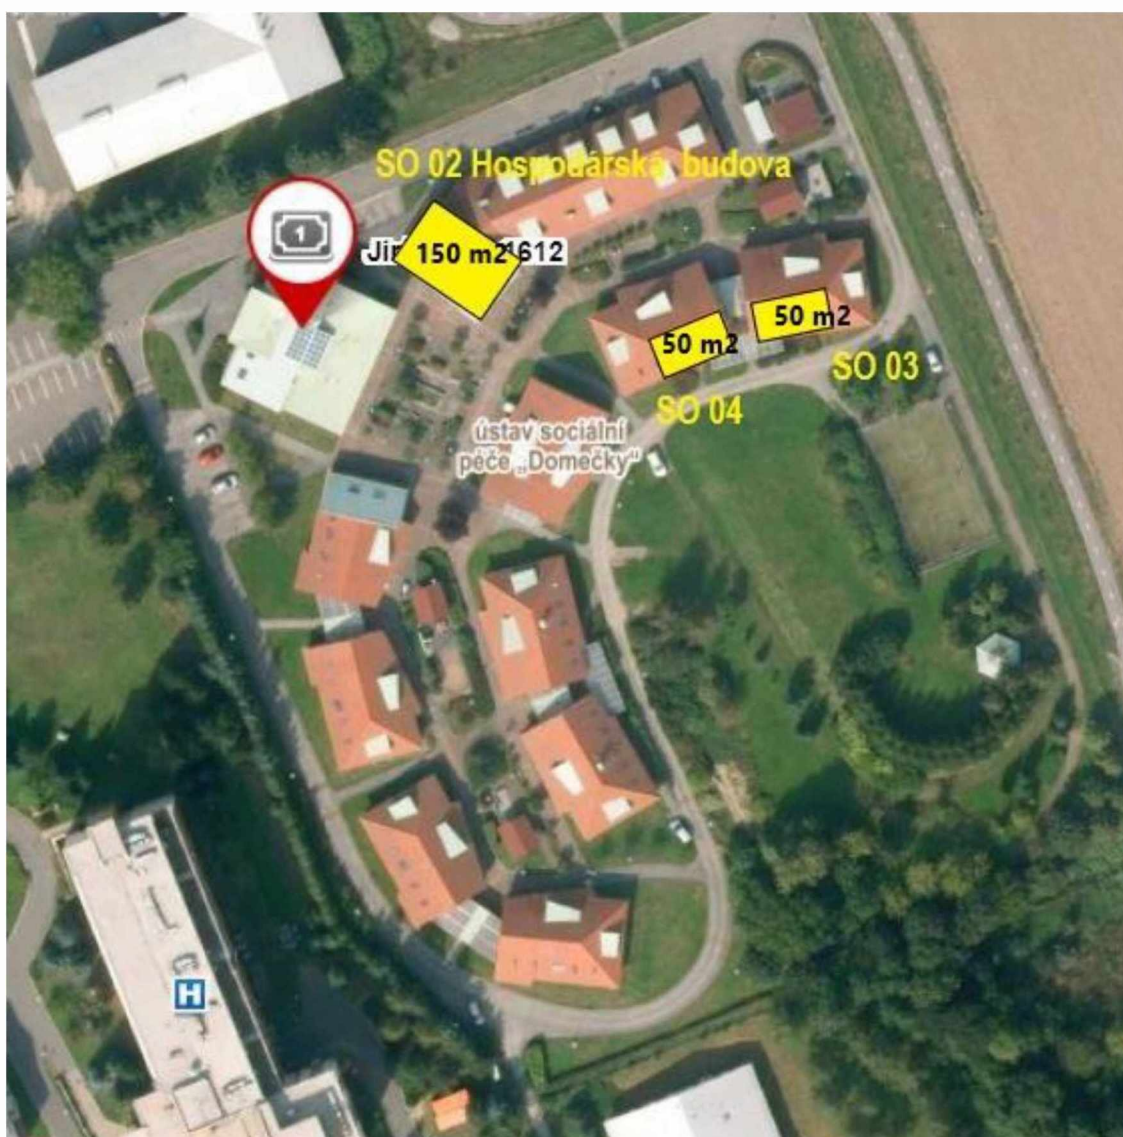

Střechy objektů SO 03, 04 – krovy, latě, tašky, objekt SO 02 – krovy, prkna, plechová krytina

Vhodné jsou střechy na objektech SO 02, SO 03, SO 04


Stínění žádné

Sklon střechy cca 22°


Nepředpokládá se jiné využití areálu



Spotřeba elektrické energie za červen 2022 v hodinových intervalech

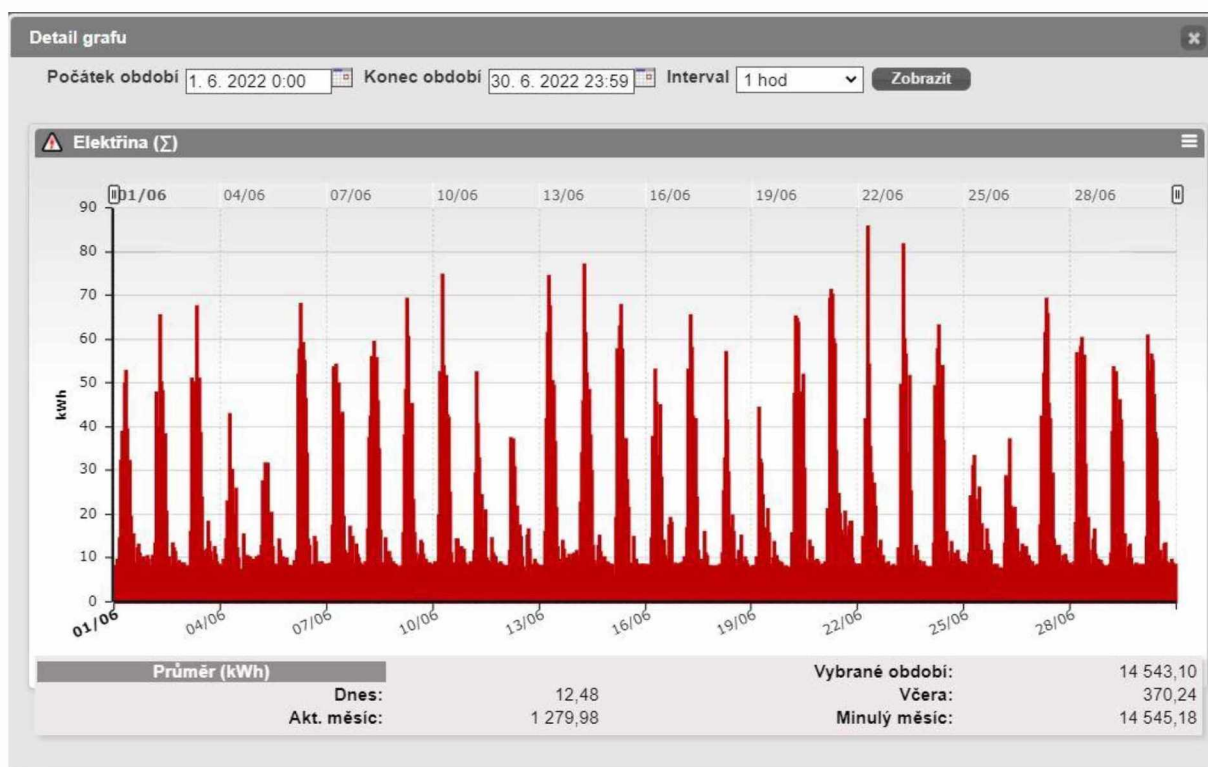

Spotřeba elektrické energie za jeden den v červnu 2022 v hodinových intervalech

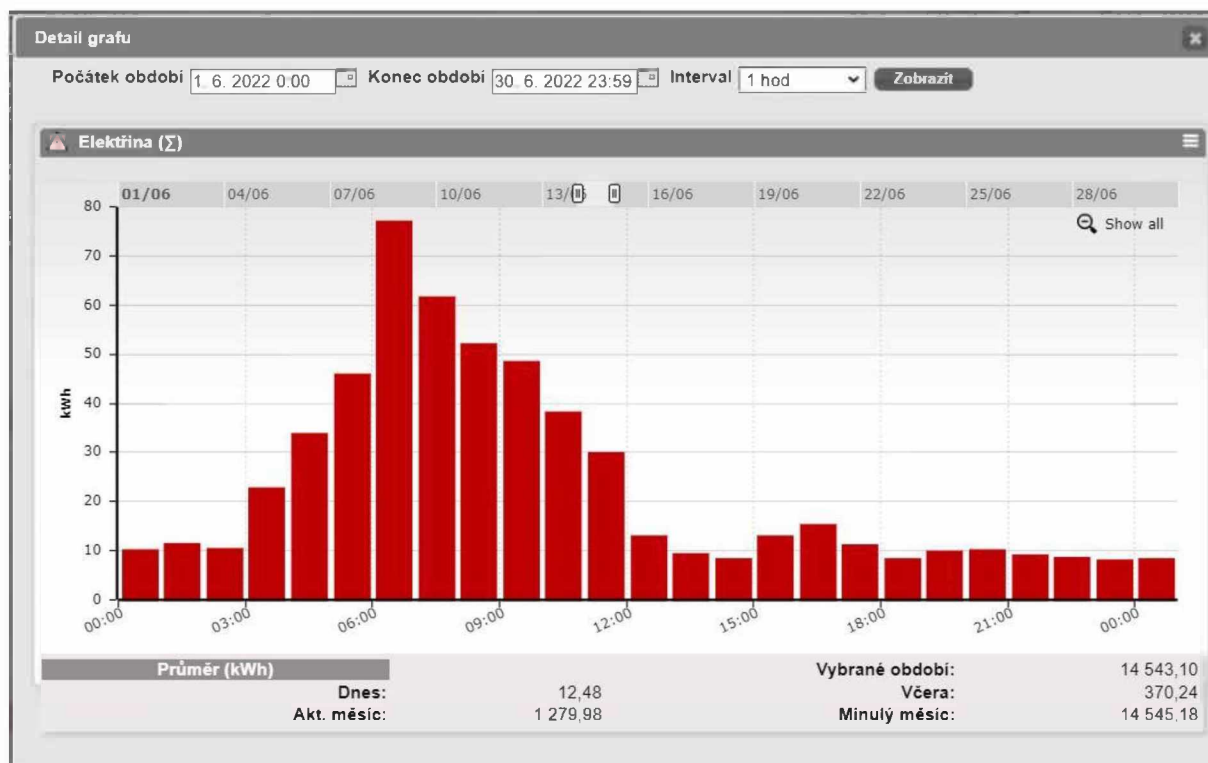

Odběrná místa



ČESKOMORAVSKÁ
KOMODITNÍ BURZA KLADNO

Příloha č. 1 závěrkového listu

Seznam odběrných míst

Poř.	Číslo odb. místa	Adresa odběrného místa	EAN	Rez. příkon [kW]	Roční rez. kapacita [kW]	Sjednávání měsíční rez. kapacity	Napětí hladina [kV]	Sjednávání odběrových diagramů	Typ měř.	Tarif	Adresa pro fakturaci
1	0001202786	Jiráskova 1612, 516 01 Rychnov nad Kněžnou	859182400700935232	140	120	nesjednává se	10	x	B	jednotarif	Jiráskova 1612, 516 01 Rychnov nad Kněžnou


Domov Dědina, Nádražní 709, 51773 Opočno




- Jedná se o plechové střechy z roku 2006
- Sklon šikmé střechy odhadem 20°
- Stínění žádné




Spotřeba elektrické energie za červen 2022 v hodinových intervalech (Nádražní, Opočno)

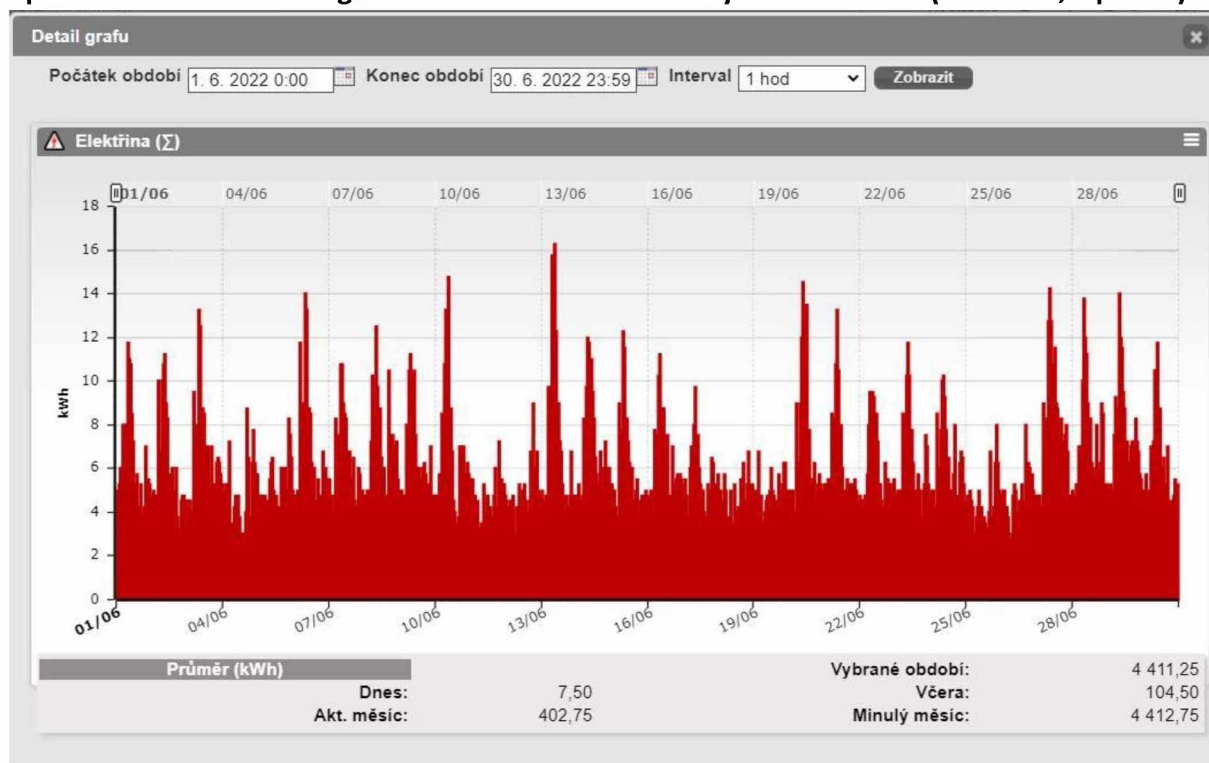


Spotřeba elektrické energie za jeden den v červnu 2022 v hodinových intervalech (Nádražní, Opočno)

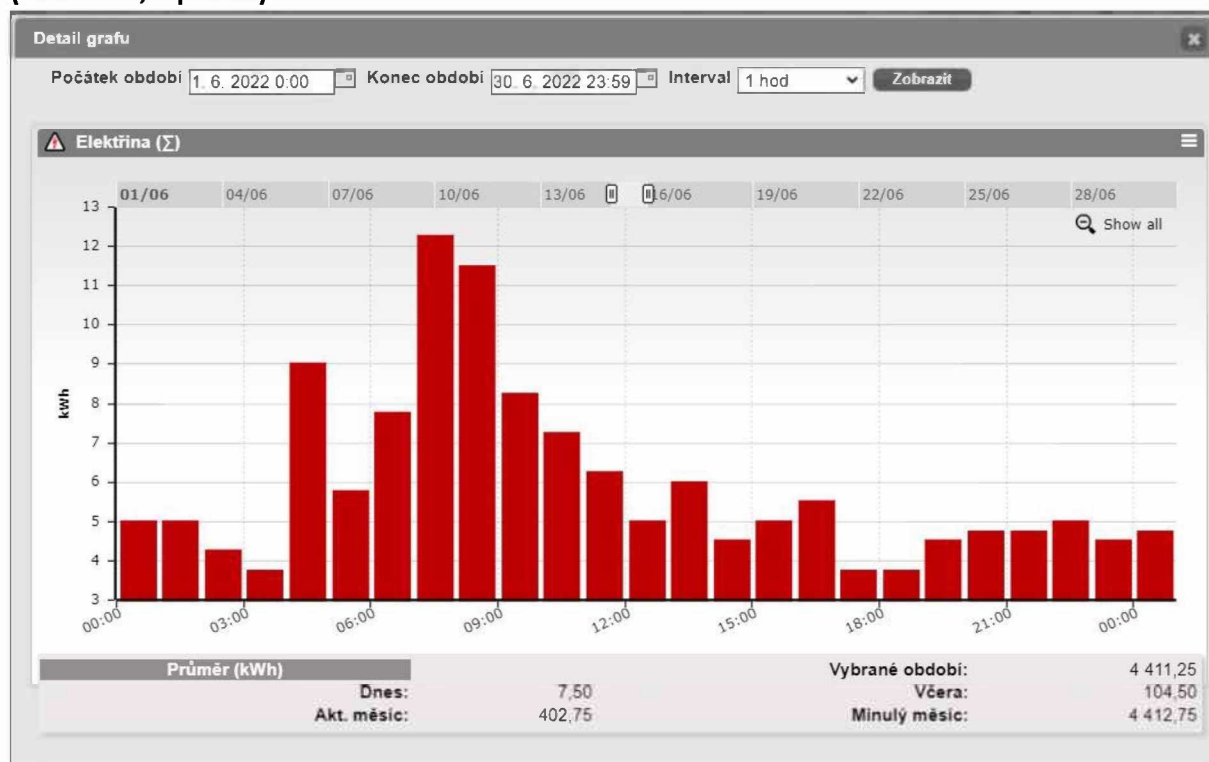


Spotřeba elektrické energie za červen 2022 v hodinových intervalech (Přepychy 213)

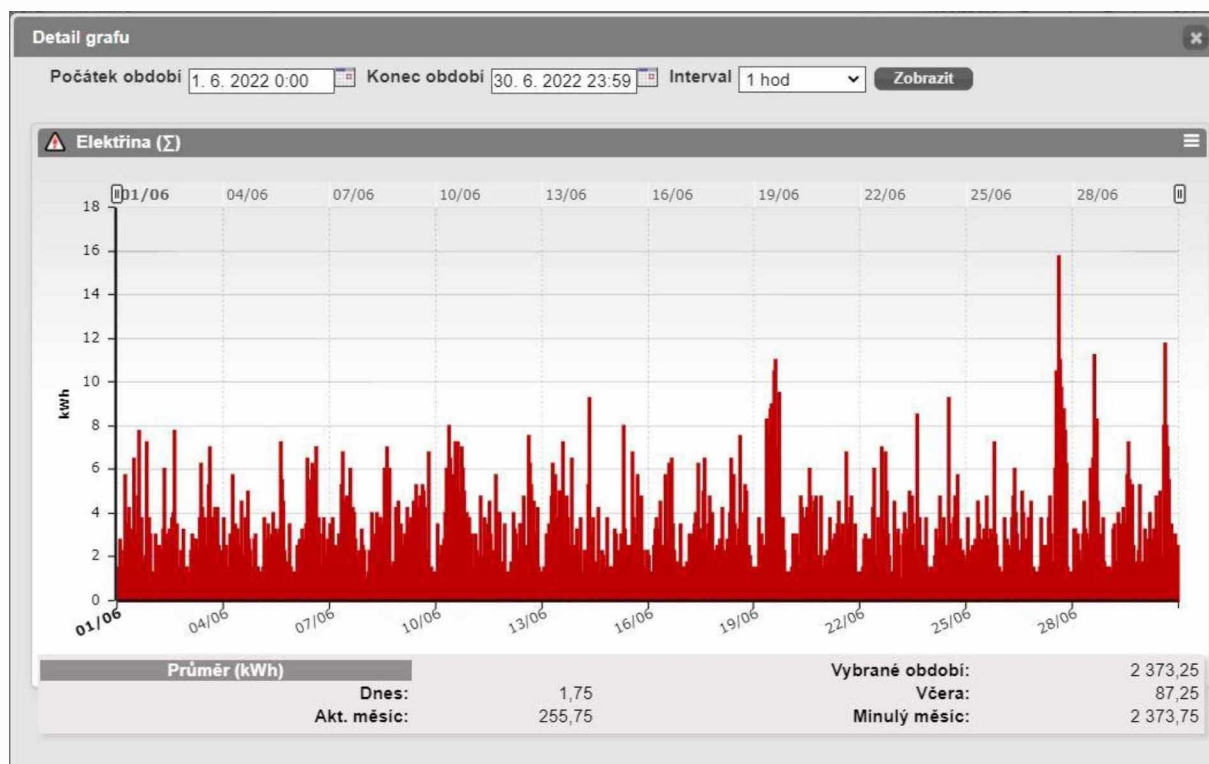


Spotřeba elektrické energie za jeden den v červnu 2022 v hodinových intervalech (Přepychy 213)

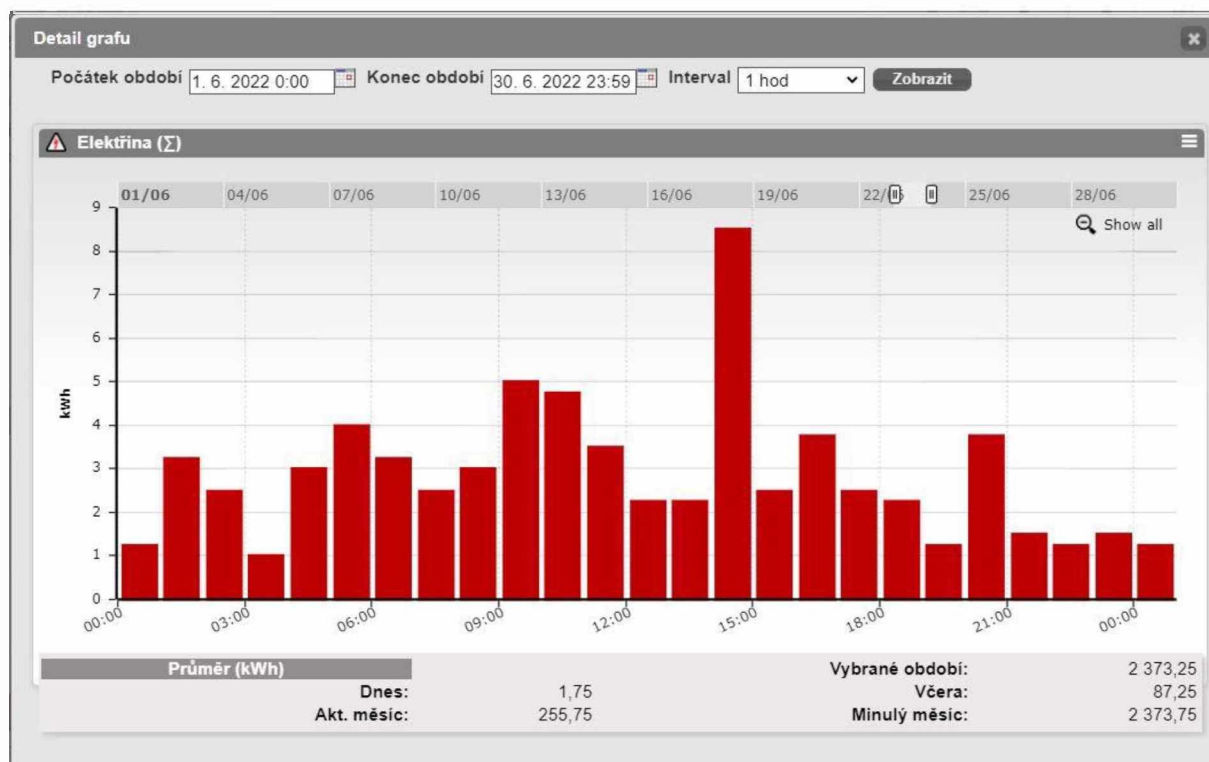

Spotřeba elektrické energie za červen 2022 v hodinových intervalech (Přepychy 220)

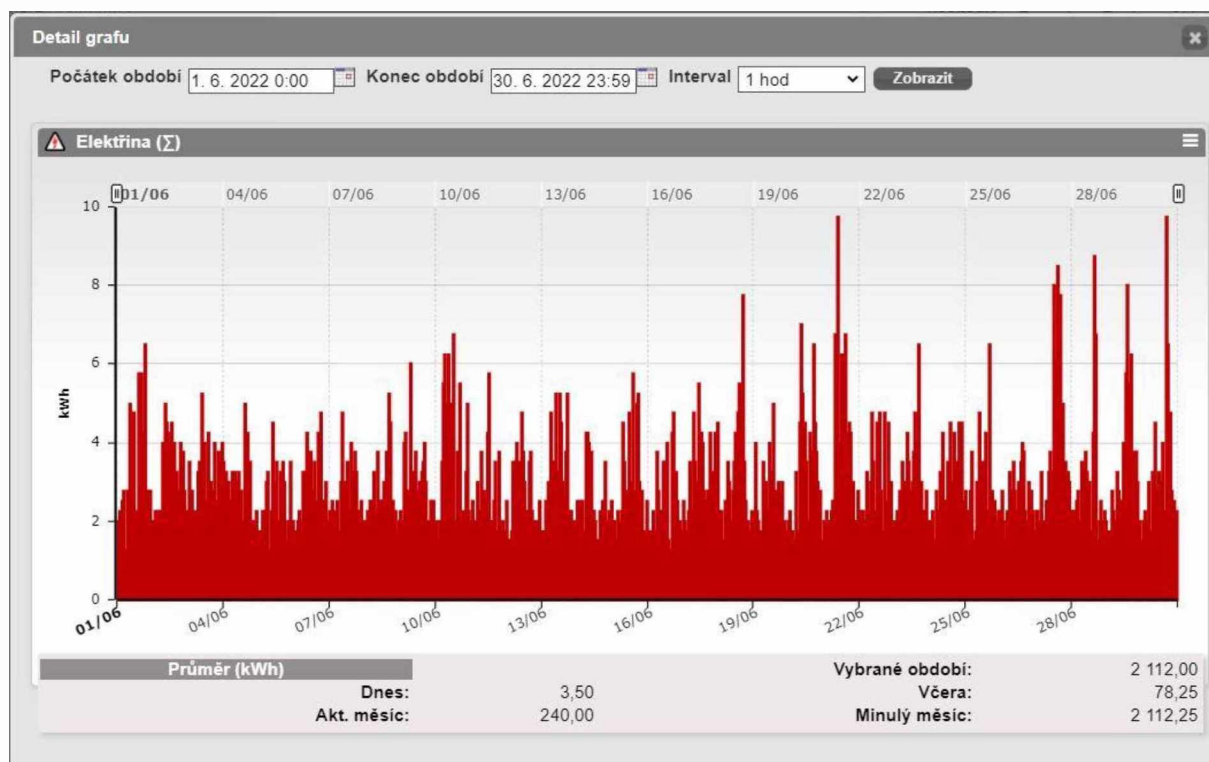

Spotřeba elektrické energie za jeden den v červnu 2022 v hodinových intervalech (Přepychy 220)

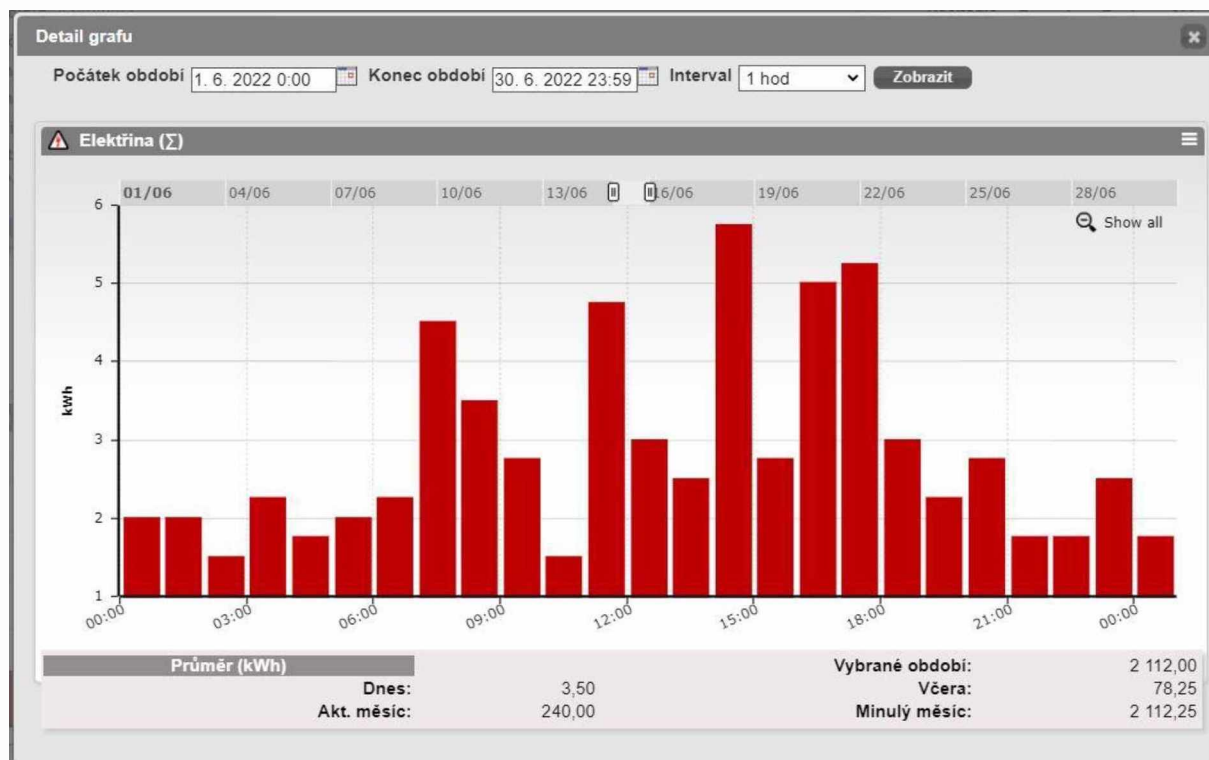

Odběrná místa



Příloha č. 1 závěrkového listu
Soupis odběrných míst

Poř.	Číslo odb. místa	Adresa odběrného místa	EAN	Distr. sazba	Počet fází	Jistič (A)	Adresa pro zaslání faktur	Typ měř.	Zúčt. období	Frekvence záloh
1	0001137177	Kláster nad Dědinou 23, 517 71 České meziříčí	859182400700679297	C02d	3	25	Nádražní 709, 517 73 Opočno	C	měsíc	měsíční
2	1000102113	Na Štěpnici 506, 517 71 České Meziříčí	859182400707178038	C02d	3	80	Nádražní 709, 517 73 Opočno	C	měsíc	měsíční
3	1000119746	Přepychy 220, 517 32 Přepychy	859182400707200685	C02d	3	160	Nádražní 709, 517 73 Opočno	B	měsíc	bez záloh
4	1000119747	Přepychy 213, 517 32 Přepychy	859182400707200692	C02d	3	160	Nádražní 709, 517 73 Opočno	B	měsíc	bez záloh
5	1000132231	Nádražní 709, 517 73 Opočno	859182400707220737	C02d	3	125	Nádražní 709, 517 73 Opočno	B	měsíc	bez záloh
6	765230	Čsl. Legii 125, 503 46 Třebechovice pod Orebem	859182400706278340	C02d	3	25	Nádražní 709, 517 73 Opočno	C	rok	měsíční
7	x	Palackého 220, 551 01 Jaroměř	859182400707324145	C02d	3	25	Nádražní 709, 517 73 Opočno	C	rok	měsíční
8	853134	Havlíčkova 292, 549 01 Nové Město nad Metují	859182400705212383	C02d	3	25	Nádražní 709, 517 73 Opočno	C	rok	měsíční
9	687685	Kostelecká 1107, 547 01 Náchod	859182400705369315	C02d	3	25	Nádražní 709, 517 73 Opočno	C	rok	měsíční
10	961814	Pod Výrovem 1151, 549 01 Nové Město n.M.	859182400705422171	C26d	3	25	Nádražní 709, 517 73 Opočno	C	rok	měsíční
11	x	Dr. Paula 749, 551 01 Jaroměř	859182400704948627	C25d	3	25	Nádražní 709, 517 73 Opočno	C	rok	měsíční

Zvážit FVE na střechy - domy Přepychy, viz spotřeby elektrické energie výše.

Domov na Stříbrném vrchu, Stříbrný vrch 199, 51761 Rokytnice v O.h.




- Rekonstrukce objektů proběhla v roce cca 2008, včetně rekonstrukce střech
- Vhodné jsou střechy na objektech „E“ a „D“.
- Stínění žádné
- Sklon střechy cca 27°
- Další rekonstrukce se neplánují, neplánuje se jiné využití areálu
- Je nový objekt „Za prádelnou 2154, Náchod“
- Lze využít i „stavební buňku“



Spotřeba elektrické energie za červen 2022 v hodinových intervalech



Spotřeba elektrické energie za jeden den v červnu 2022 v hodinových intervalech

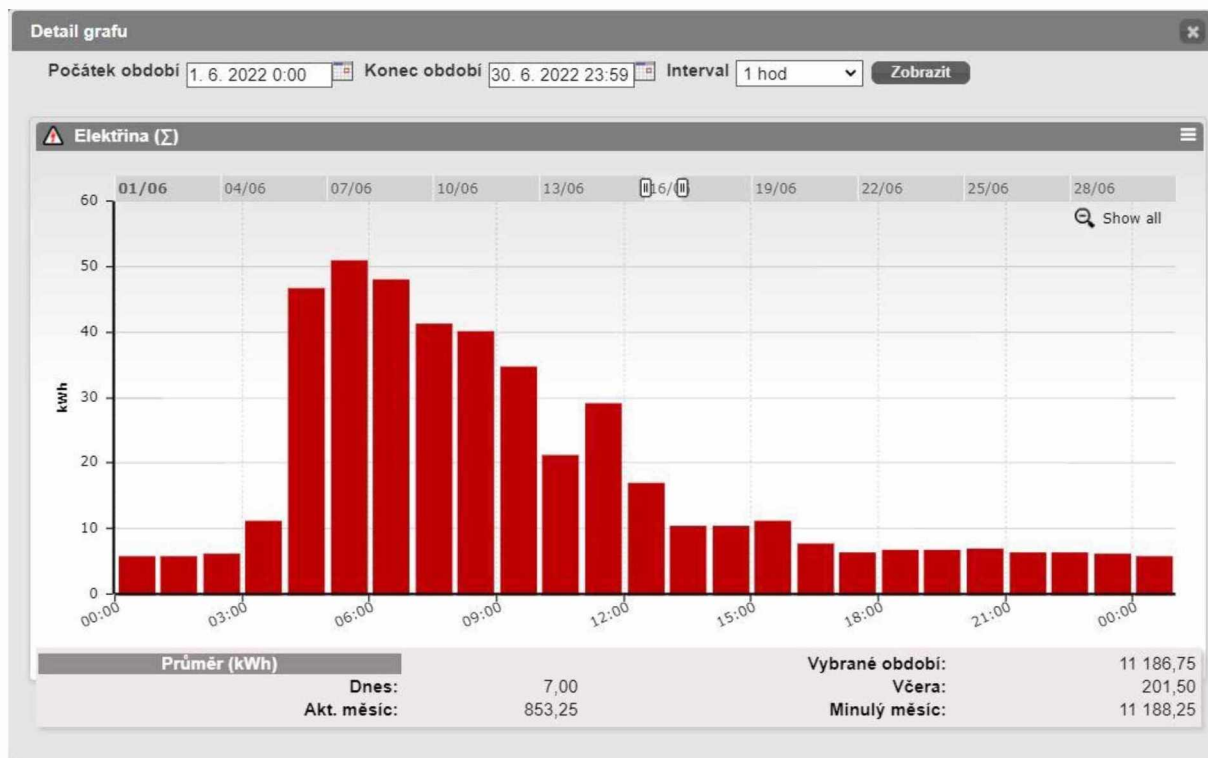

Odběrná místa



Příloha č. 1 závěrkového listu
Seznam odběrných míst

Poř.	Číslo odb. místa	Adresa odběrného místa	EAN	Distr. sazba	Počet fází	Jistič (A)	Adresa pro zaslání faktur	Typ měř.	Zúčt. období	Frekvence záloh
1	0001087848	Stříbrný Vrch 199, 517 61 Rokytnice v Orlických horách	859182400700397580	C25d	3	400	Stříbrný vrch 199, 517 61 Rokytnice v Orlických horách	B	měsíc	měsíční
2	50102491	Sídlíště 1.Máje 241/7, 517 61 Rokytnice v Orlických horách	859182400703737376	C45d	3	25	Stříbrný vrch 199, 517 61 Rokytnice v Orlických horách	C	rok	měsíční
3	50102493	Sídlíště 1.Máje 241/8, 517 61 Rokytnice v Orlických horách	859182400703637195	C25d	3	25	Stříbrný vrch 199, 517 61 Rokytnice v Orlických horách	C	rok	měsíční
4	50074122	Dolní sídlíště 259, 517 61 Rokytnice v Orlických horách	859182400703626649	C25d	3	25	Stříbrný vrch 199, 517 61 Rokytnice v Orlických horách	C	rok	měsíční

Stavební buňku by bylo možné také využít, měla by být stabilně v organizaci.

Pověření

Prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., ředitel vysokoškolského ústavu CEET Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, sídlem 17. listopadu 2172/15, Ostrava-Poruba, IČO 61989100, (dále jen „pověřující“)

tímto pověřuje

doc. Dr. Ing. Tadeáše Ochodka, nar. [REDACTED], bytem [REDACTED], ředitele Výzkumného centra VEC (dále jen „pověřený“),

rozhodováním a jednáním jménem VŠB-TUO za pověřujícího, a to v rozsahu tohoto pověření.

Pověřený je oprávněn:

- po předchozím projednání s pověřujícím podepisovat pracovní smlouvy a dohody mimo pracovní poměr, jejich změny nebo skončení, mzdové výměry, mimořádné odměny všech zaměstnanců VEC a útvarů organizačně začleněných do úseků jím řízených,
- podepisovat dokumenty smluvní povahy a písemnosti týkající se veřejných zakázek v oblastech působnosti Výzkumného centra VEC v rozsahu, který je směrnici Zadávání veřejných zakázek stanoven pro jednání za VŠB-TUO pro ředitele vysokoškolského ústavu,
- podepisovat rozhodnutí o škodě a výši náhrady škody způsobené zaměstnanci VEC a útvarů organizačně začleněných do úseků jím řízených.

Pověření uděluji na dobu od 1. 3. 2021 do 29. 2. 2024.

V Ostravě dne 1. 3. 2021

[REDACTED]

prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.

Pověření přijímám.

V Ostravě dne 1. 3. 2021

[REDACTED]

doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **701330_000763**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **LENKA KOLÍNKOVÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**


Pracoviště: **Ostrava 33**

Česká pošta, s.p. dne **10.03.2021**



136557791-16874-210310105246

Městská nemocnice a. s., Dvůr Králové nad Labem, Vrchlického 1504

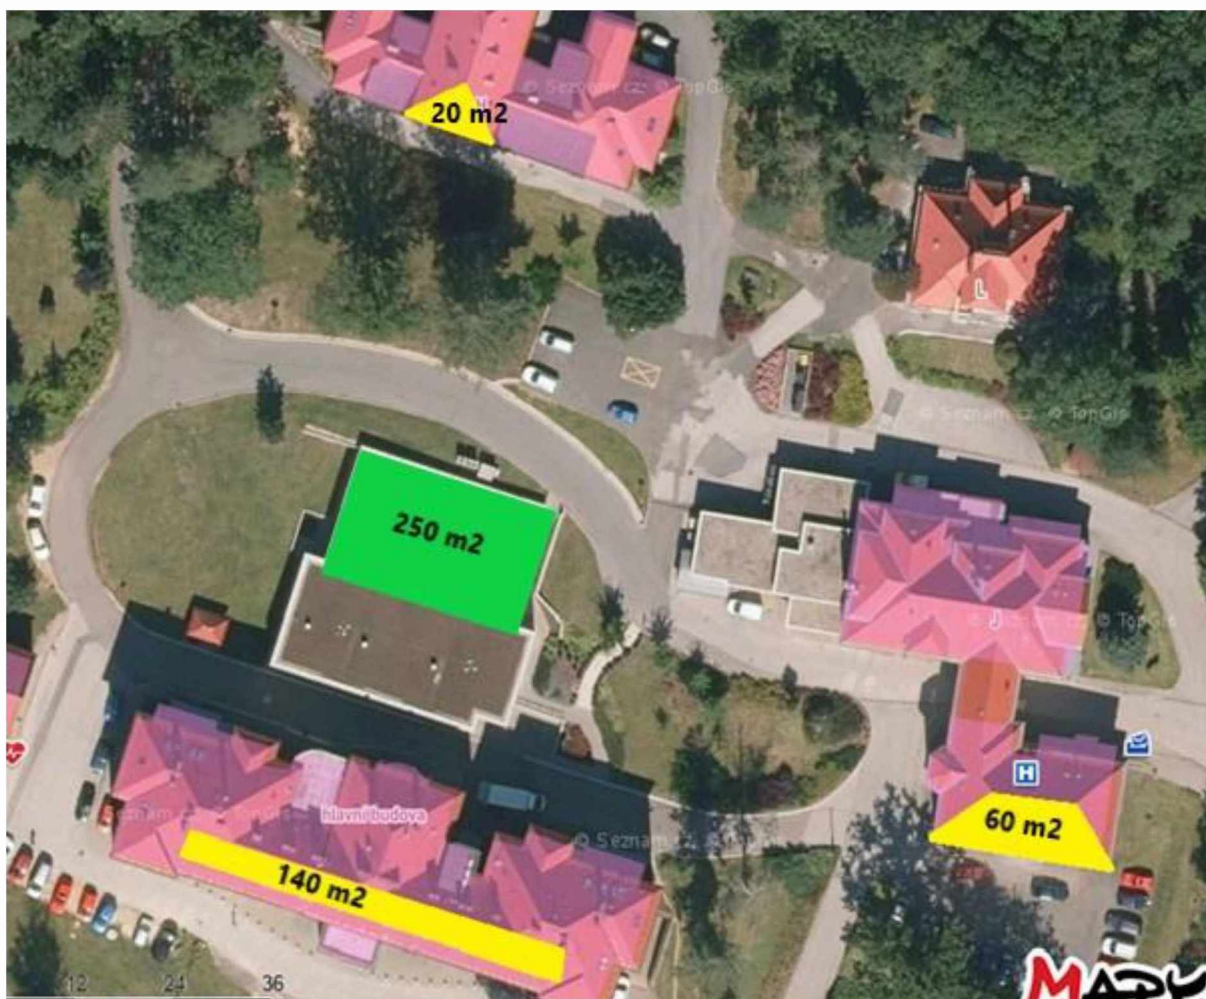


- Pro FVE jsou vhodné části střech administrativní budovy, hlavní budovy a pavilonu následné péče.
- Všechny střechy jsou nové, šikmé cca 35°, pokryté eternitovými šablonami.
- Dle údržbáře jsou všechny uvažované střechy bez vlivu zastínění stromy, toto je ale nutno ověřit.
- Po dokončení dostavby budovy s operačními sály (nad laboratořemi) bude vhodná rovná střecha i na této budově. (zelená barva)






Spotřeba elektrické energie za červen 2022 v hodinových intervalech (Rooseveltova)

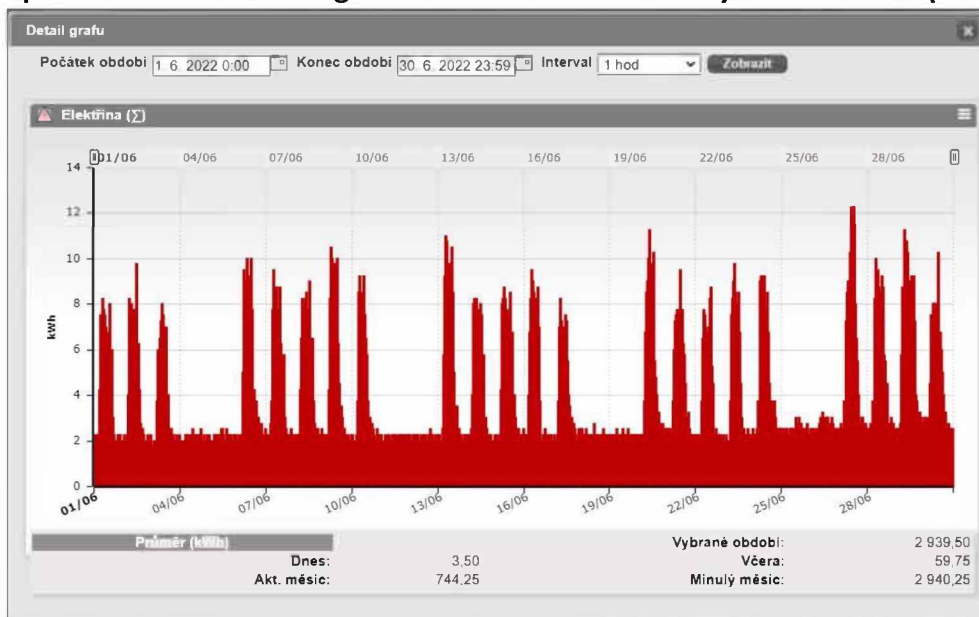


Spotřeba elektrické energie za jeden den v červnu 2022 v hodinových intervalech (Rooseveltova)



Spotřeba elektrické energie za červen 2022 v hodinových intervalech (Vrchlického)

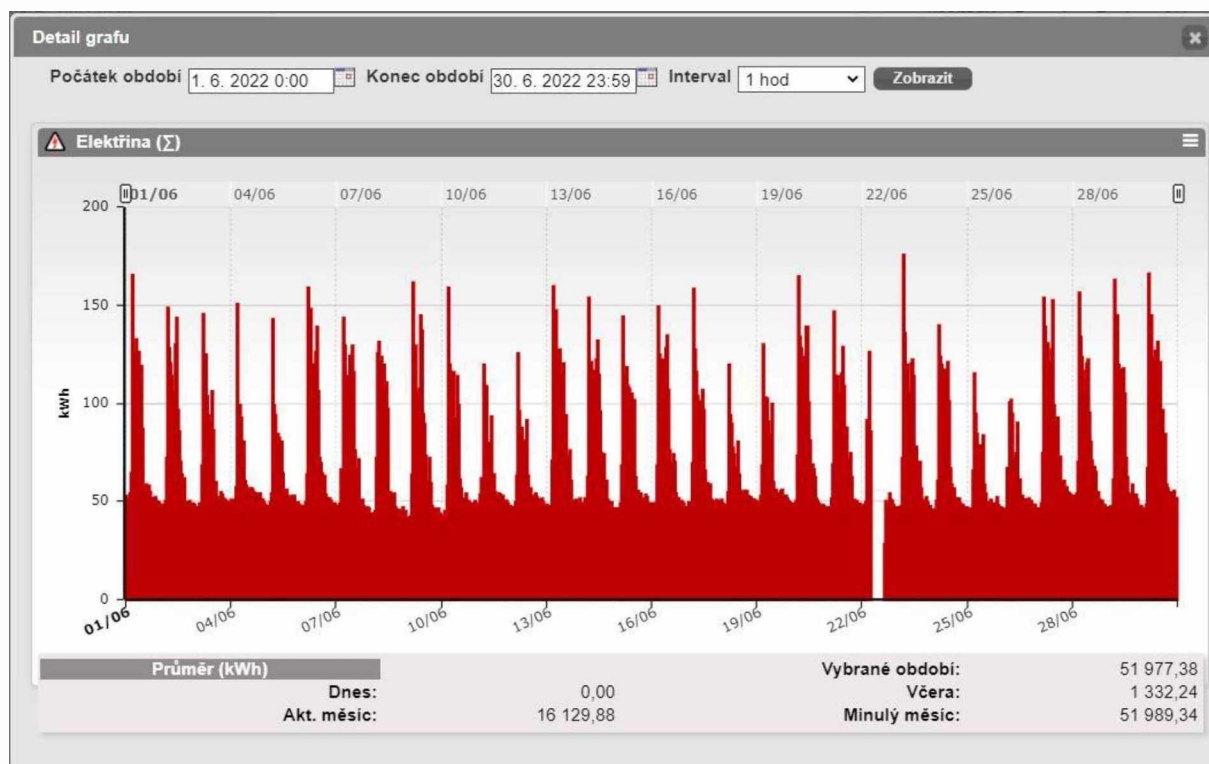

Spotřeba elektrické energie za jeden den v červnu 2022 v hodinových intervalech (Vrchlického)

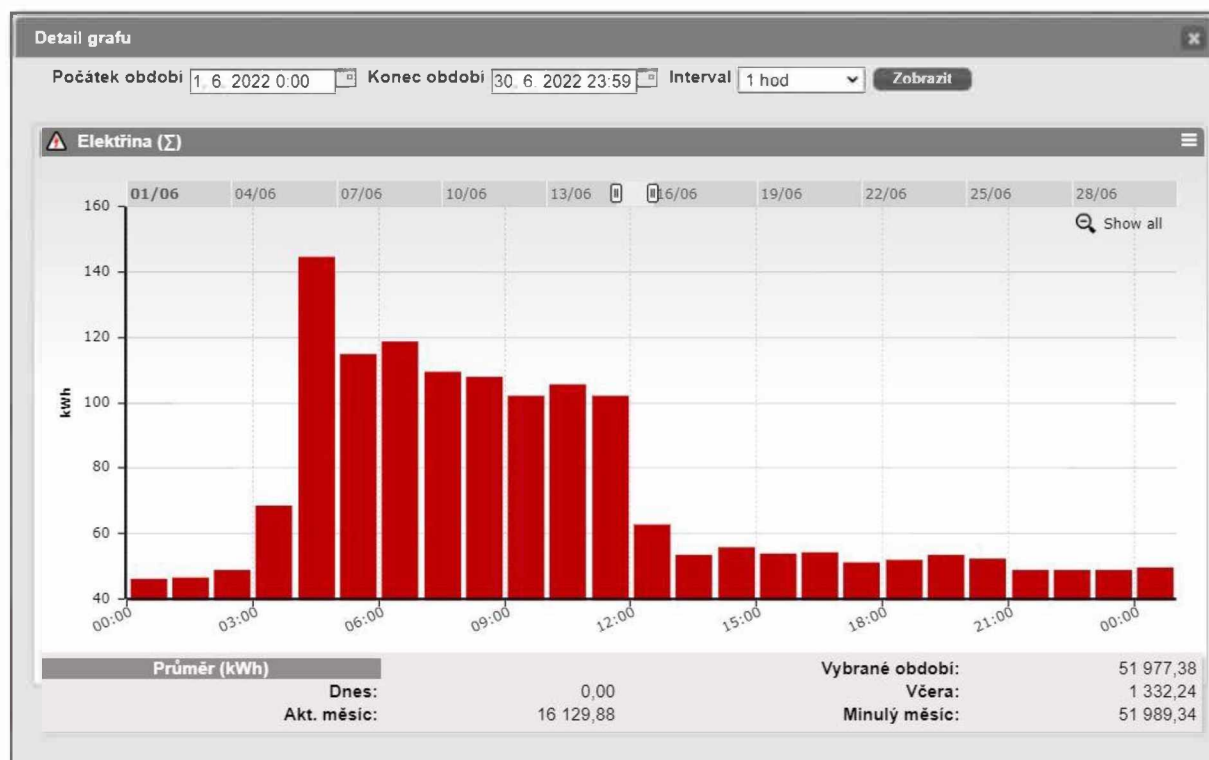

Odběrná místa

Nízké napětí



Příloha č. 1 závěrkového listu
Soupis odběrných míst

Poř.	Číslo odb. místa	Adresa odběrného místa	EAN	Distr. sazba	Počet fází	Jistič (A)	Adresa pro zaslání faktur	Typ měř.	Frekvence záloh
1	0001074407	Rooseveltova 474, 544 01 Dvůr Králové nad Labem	859182400700704999	C02d	3	250	Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem	B	měsíční

Vysoké napětí



Příloha č. 1 závěrkového listu
Soupis odběrných míst

Poř.	Číslo odb. místa	Adresa odběrného místa	EAN	Rez. příkon [kW]	Roční rez. kapacita [kW]	Sjednávání měsíční rez. kapacity	Napět. hladina [kV]	Sjednávání odběrových diagramů	Typ měř.	Tarif	Adresa pro fakturaci
1	1203438	Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem	859182400700937731	320	180	nesjednává se	35	x	A	jednotarif	Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Oblastní nemocnice Jičín, areál v Novém Bydžově, ul. Jana Maláta

Ze všech objektů se jeví jako vhodný k vybudování střešní FVE objekt F (administrativa) a objekt B (LDN B). V budoucnu (po rekonstrukci) by byl velmi vhodný objekt C (interna). Obecně je v celém areálu problém se zastíněním stromy nebo jinými prvky.



Objekt F – administrativní budova

- Střecha je rovná, po rekonstrukci
- Střecha je po část dne zastíněna vzrostlými smrky, dle správce (p. Rásl) by je bylo možno porazit



Objekt K - kotelna


- Střecha je rovná, po rekonstrukci




Objekt B – LDN B (bývalá porodnice)

- Střecha je rovná, z roku 2015
- Celou plochu střechy nelze využít vzhledem k zastínění strojovnou výtahu
- Střecha je pravděpodobně v zimních měsících po část dne zastíněna vzrostlým jasanem

Spotřeba elektrické energie za červen 2022 v hodinových intervalech

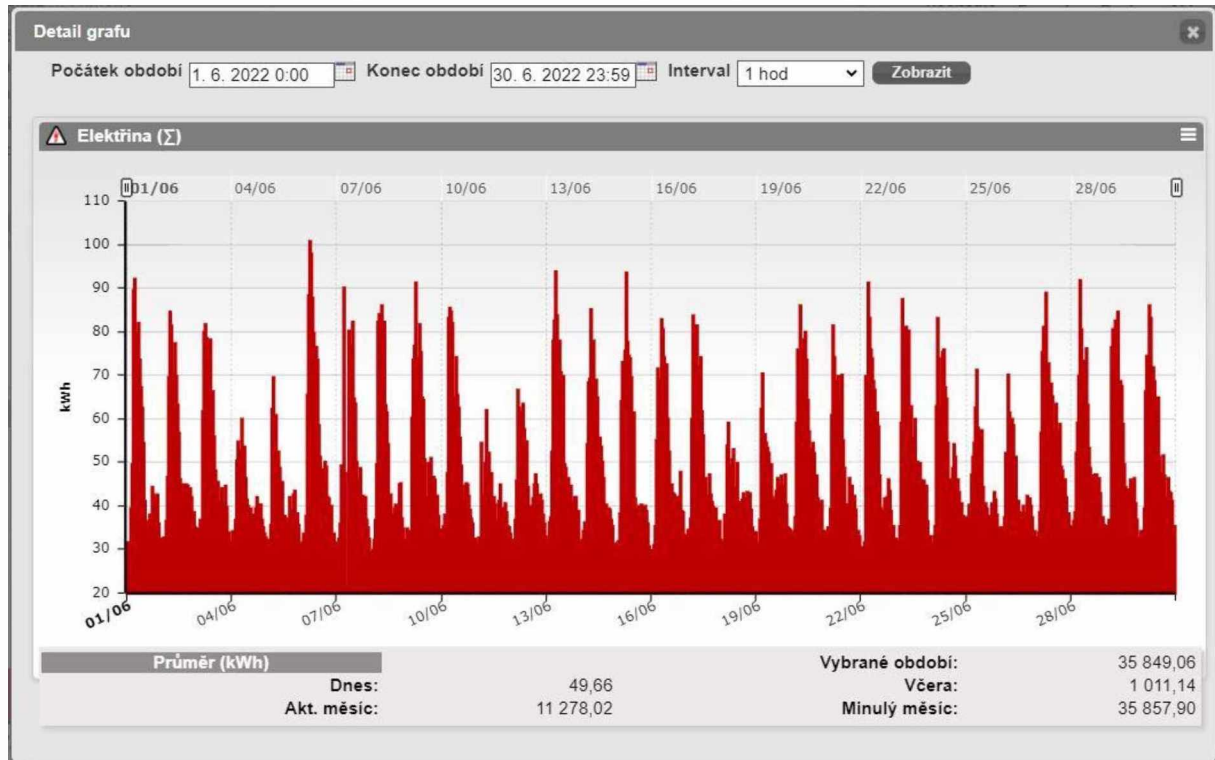

Spotřeba elektrické energie za jeden den v červnu 2022 v hodinových intervalech

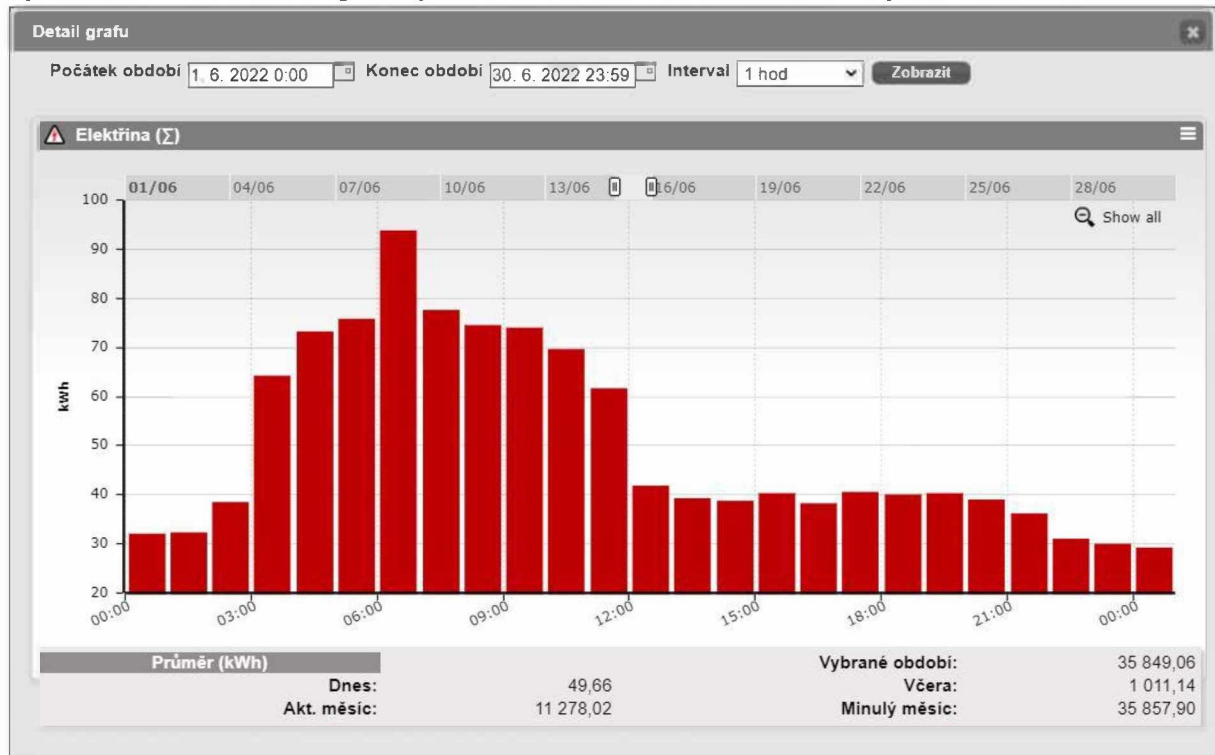

Odběrná místa

Vysoké napětí



Příloha č. 1 závěrkového listu
Soupis odběrných míst

Poř	Číslo odb. místa	Adresa odběrného místa	EAN	Rez. příkon [kW]	Roční rez. kapacita [kW]	Sjednávání měsíční rez. kapacity	Napět. hladina [kV]	Sjednávání odběrových diagramů	Typ měř	Tarif	Adresa pro fakturaci
1	0001202129	Bolzanova 512, 506 01 Jičín	359182400707782105	770	550	sjednává se	10/0,4	x	A	jednotarif	Bolzanova 512, 506 01 Jičín
2	0001203696	Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov	359182400700941714	240	120	sjednává se	35/0,4	x	B	jednotarif	Bolzanova 512, 506 01 Jičín

Oblastní nemocnice Náchod, Purkyňova 446, 547 01 Náchod (dolní)



Pavilon K:

- Rovná střecha
- Část střechy využitelná pro FVE
- Plocha střechy pro FVE cca 400 m²

Pavilon H:

- Rovná střecha
- Využitelná pro FVE
- Plochy střechy pro FVE cca 530 m²

Ostatní:


- Střechy se jeví jako ne zcela vhodné, zastíněné, před rekonstrukcí a v budoucnu bourání pavilonu
- V okolí hodně stromů, není jisté, jestli v nějakém ročním období nebudou bránit část dne plnému osvětlení sluncem.
- Střechy K, H – žádný viditelný problém, není v plánu rekonstrukce (informace - p. Kapucián).

Nemocnice si nechala zpracovat vlastní předběžné posouzení střech z pohledu instalace FVE. Je potřeba toto předběžné posouzení odborně prověřit z hlediska proveditelnosti, zastínění a eventuálních plánovaných stavebních úprav pavilonů.


Obrázek z předběžného posouzení možnosti instalace FVE:



Spotřeba elektrické energie za červen 2022 v hodinových intervalech

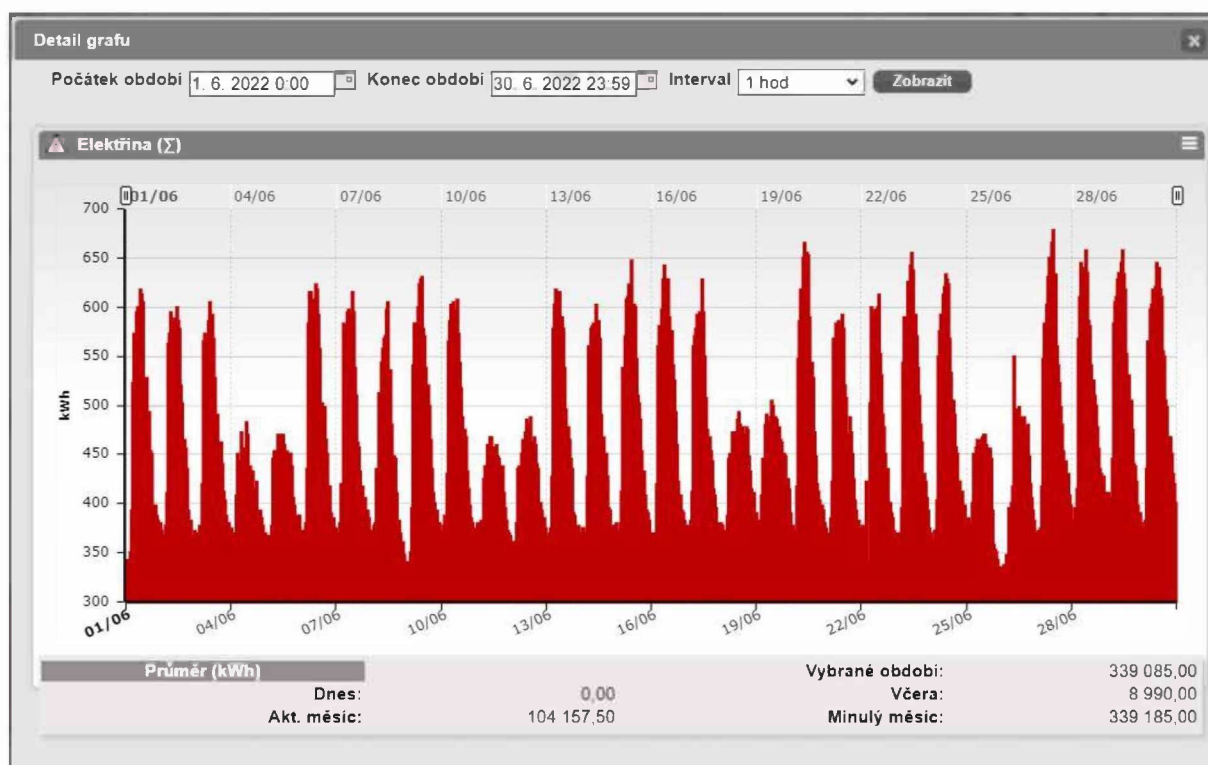

Spotřeba elektrické energie za jeden den v červnu 2022 v hodinových intervalech

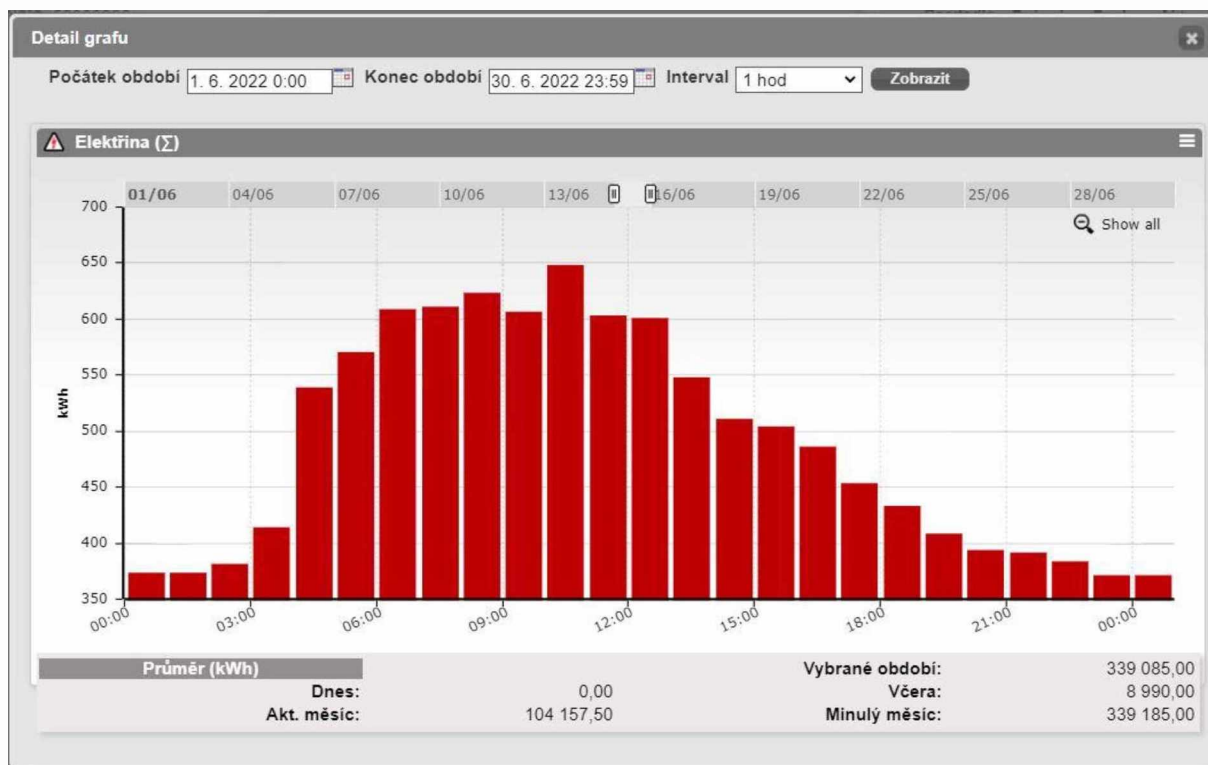

Odběrná místa


Vysoké napětí



Příloha č. 1 závěrkového listu
Soupis odběrných míst

Poř.	Číslo odb. místa	Adresa odběrného místa	EAN	Rez. příkon [kW]	Roční rez. kapacita [kW]	Sjednávání měsíční rez. kapacity	Napětí hladina [kV]	Sjednávání odběrových diagramů	Typ měř.	Tarif	Adresa pro fakturaci
1	x	Purkyňova 446, 547 69 Náchod	359182400700948287	2500	1200	sjednává měsíčně	35	x	A	jednotarif	Purkyňova 446, 547 69 Náchod
2	x	Bartoňova 951, 547 01 Náchod	359182400700950624	150	100	sjednává měsíčně	10	x	B	jednotarif	Purkyňova 446, 547 69 Náchod
3	x	Smetanova 91, 550 01 Broumov	359182400700948249	360	100	sjednává měsíčně	35	x	B	jednotarif	Purkyňova 446, 547 69 Náchod
4	1202784	Jiráskova 506, 516 01 Rychnov nad Kněžnou	359182400700927107	450	330	sjednává měsíčně	10/0,4	x	B	jednotarif	Purkyňova 446, 547 69 Náchod

Oblastní nemocnice Trutnov (Maxima Gorkého 77, Trutnov)

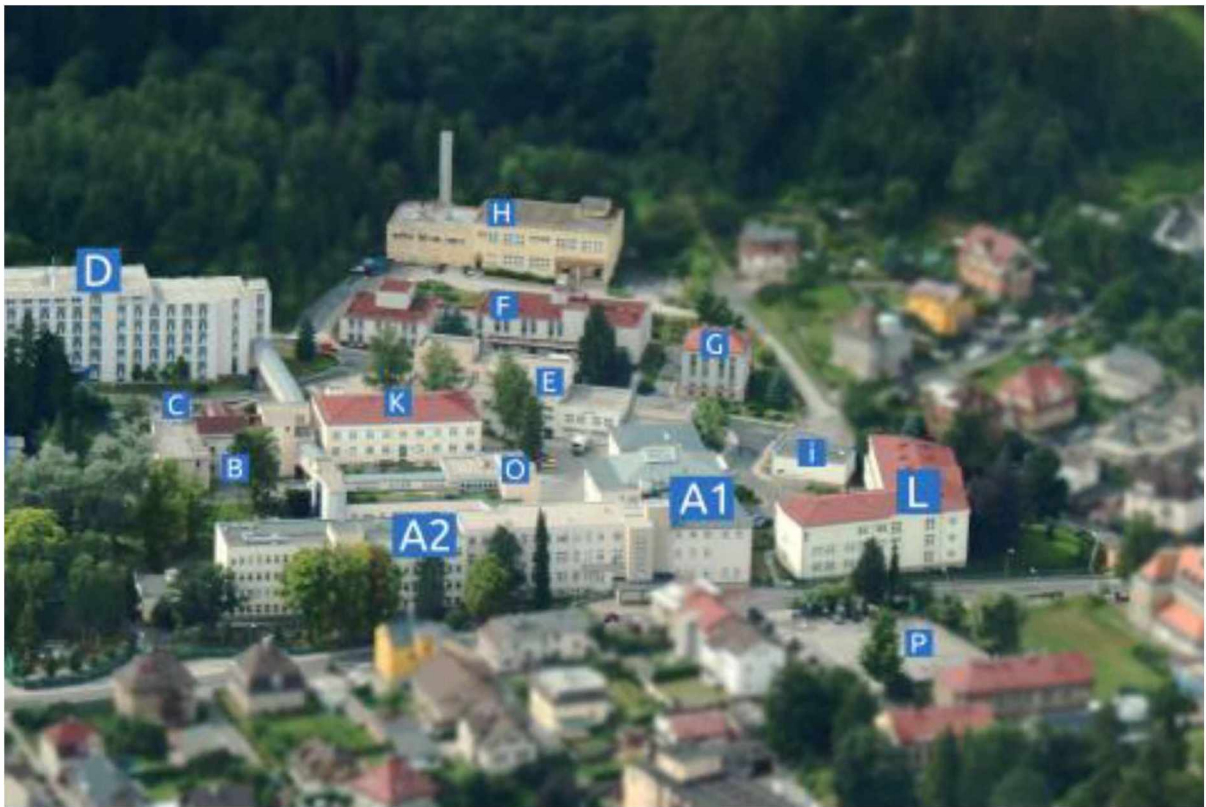

Pavilon D:

- Rovná střecha, pokrytá fólií z měkčeného PVC
- Část střechy využitelná pro FVE, část střechy přes den zastíněna

Pavilon A2:

- Rovná střecha
- ½ střechy pavilonu využitelná pro FVE, ½ střechy nevyužitelná – není prostor (komíny, antény atd.)

Pavilon O:

- Rovná střecha
- Část střechy využitelná pro FVE


Pavilon A1:

- Členitá střecha
- Menší část střechy je využitelná (mírný sklon cca 15°), nakloněná na JZ


Ostatní:

- Nevhodné, zastíněné nebo střechy před rekonstrukcí
- Informace od p. Štancla – v zimním období zapadá slunce za stromy cca v 14:30hod
- V okolí hodně stromů, není jisté, jestli v nějakém ročním období nebudou bránit část dne plnému osvětlení sluncem.
- Střechy D, A2, O, A1 – žádný viditelný problém, není v plánu rekonstrukce (informace - p. Štancl).


Spotřeba elektrické energie za červen 2022 v hodinových intervalech (Gorkého)

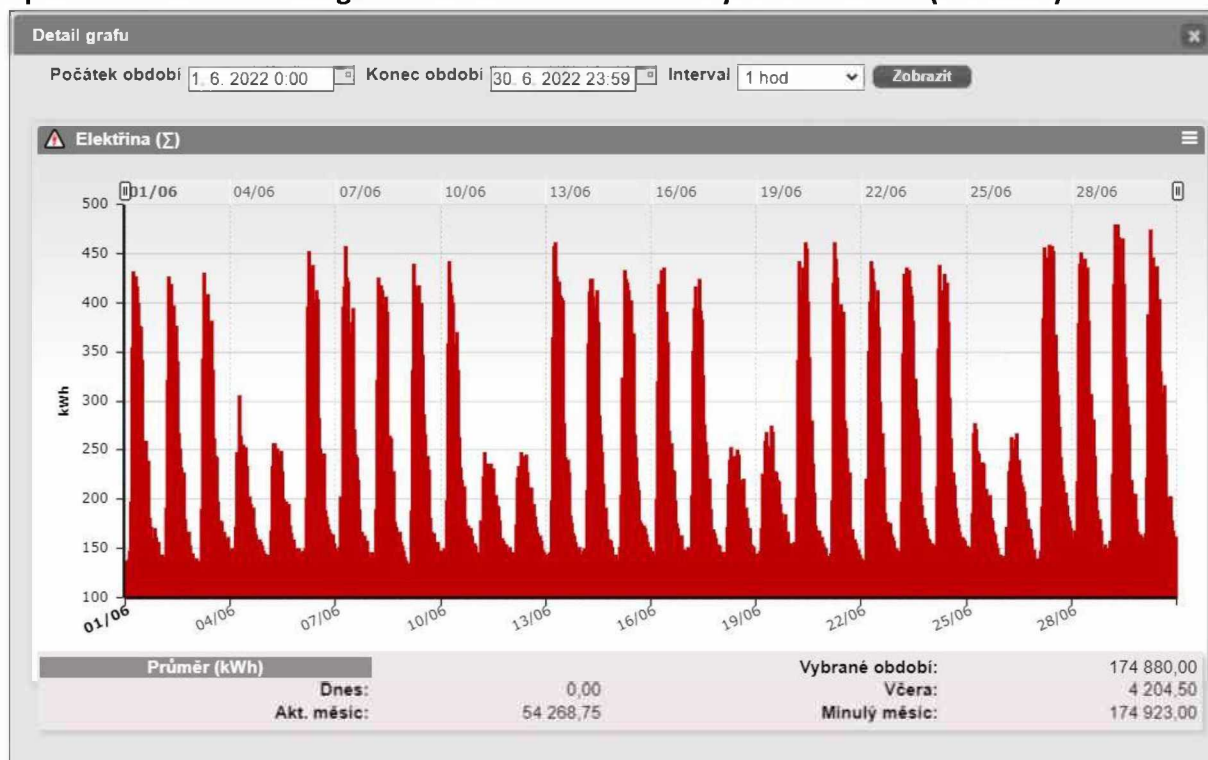


Spotřeba elektrické energie za jeden den v červnu 2022 v hodinových intervalech (Gorkého)

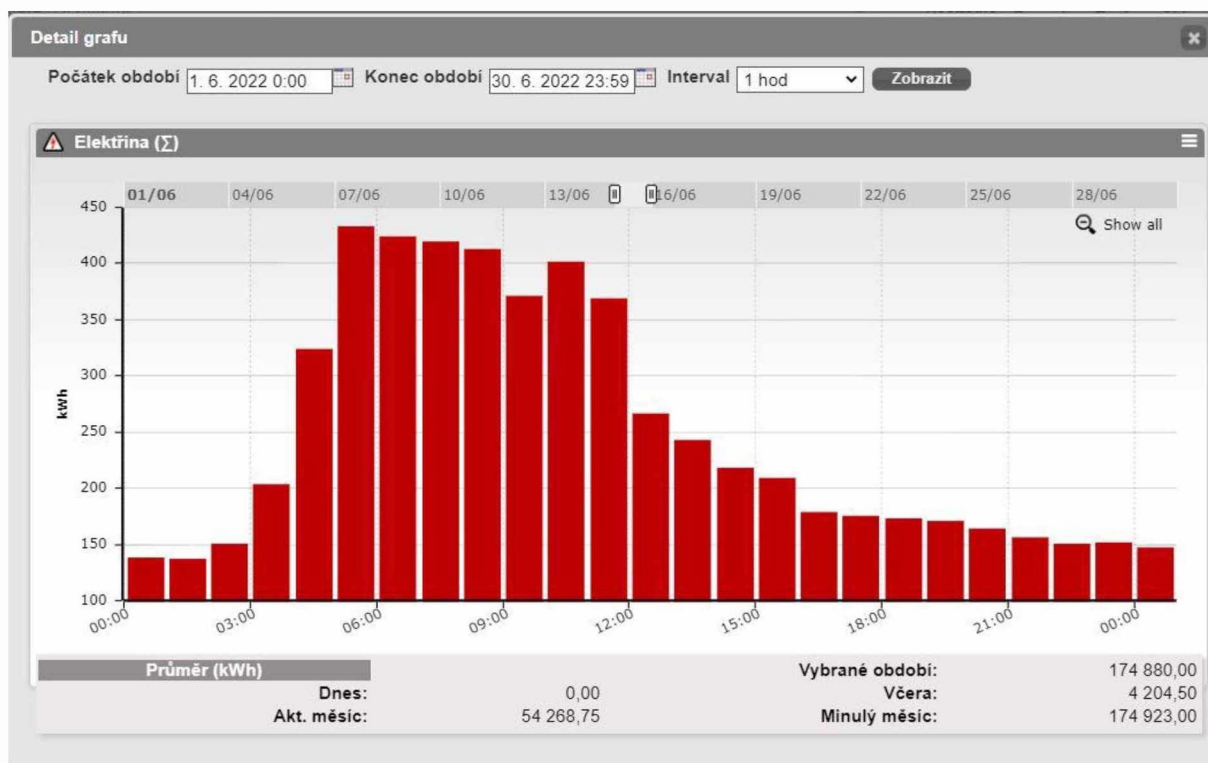

Spotřeba elektrické energie za červen 2022 v hodinových intervalech (Slezská)

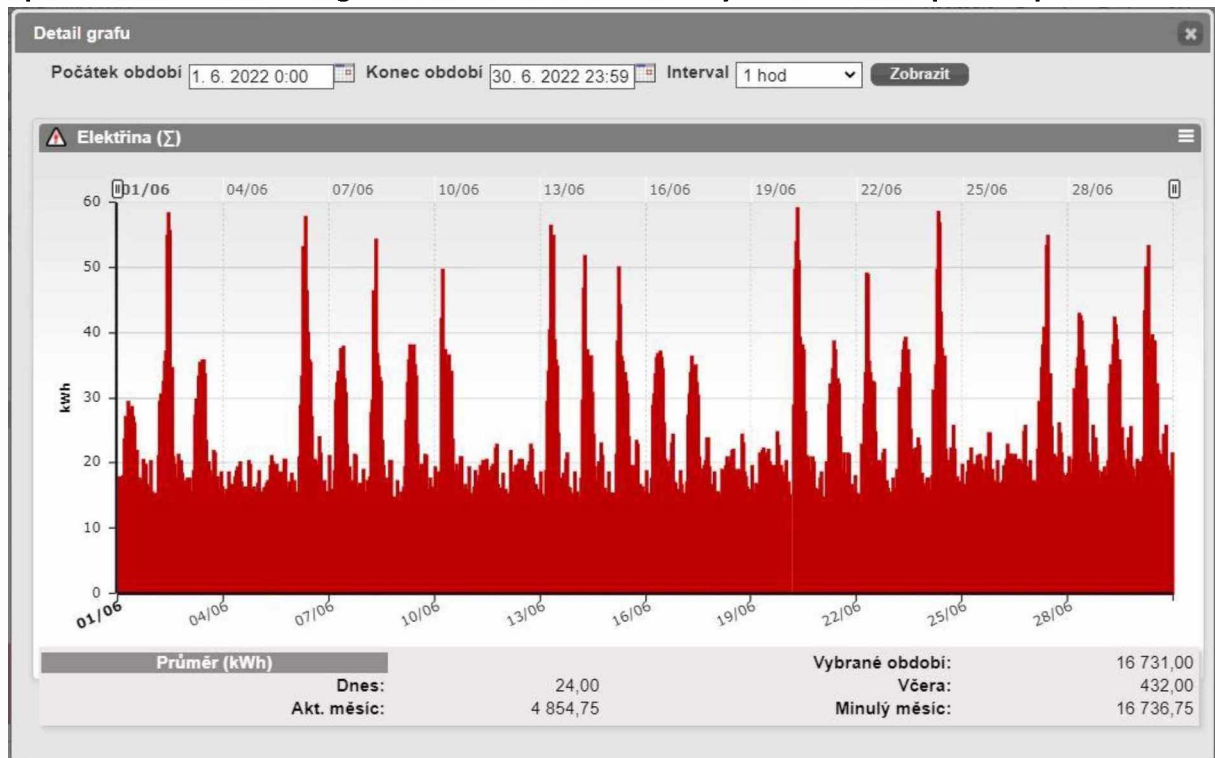

Spotřeba elektrické energie za jeden den v červnu 2022 v hodinových intervalech (Slezská)

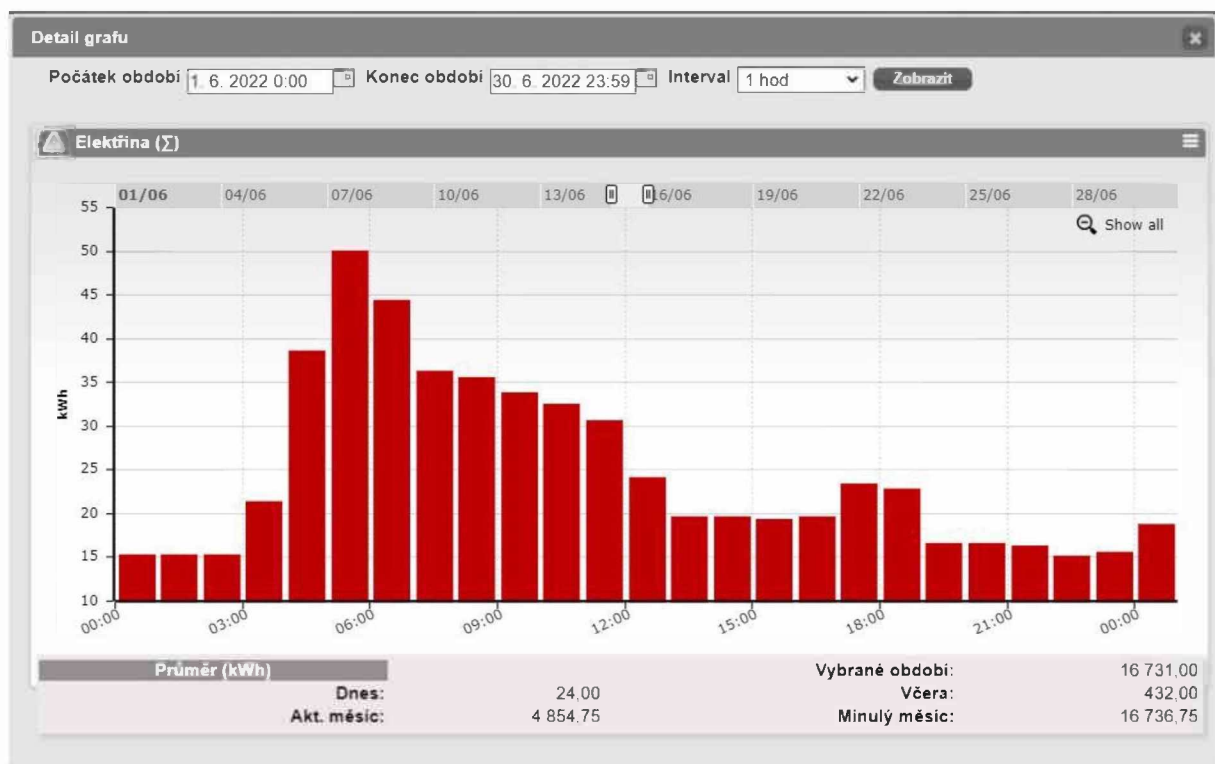

Odběrná místa

Vysoké napětí



Příloha č. 1 závěrkového listu
Soupis odběrných míst

Poř.	Číslo odb. místa	Adresa odběrného místa	EAN	Rez. příkon [kW]	Roční rez. kapacita [kW]	Sjednávání měsíční rez. kapacity	Napět. hladina [kV]	Sjednávání odběrových diagramů	Typ měř.	Tarif	Adresa pro fakturaci
1	3324241	Maxima Gorkého 77, 541 01 Trutnov	859182400700936826	600	600	nesjednává se	10	x	A	jednotarif	Maxima Gorkého 77, Kryblice, 541 01 Trutnov


Nízké napětí



Příloha č. 1 závěrkového listu
Soupis odběrných míst

Poř.	Číslo odb. místa	Adresa odběrného místa	EAN	Distr. sazba	Počet fází	Jistič (A)	Adresa pro zaslání faktur	Typ měř.	Zúčt. období	Frekvence záloh
1	685170	Kryblická 450, 541 01 Trutnov	859182400700792323	C02d	3	40	Maxima Gorkého 77, Kryblice, 541 01 Trutnov	C	rok	měsíční
2	908649	Slezská 167, 541 01 Trutnov	859182400700693286	C25d	3	200	Maxima Gorkého 77, Kryblice, 541 01 Trutnov	B	měsíc	měsíční

Domov důchodců Černožice, Revoluční 84, 50304 Černožice

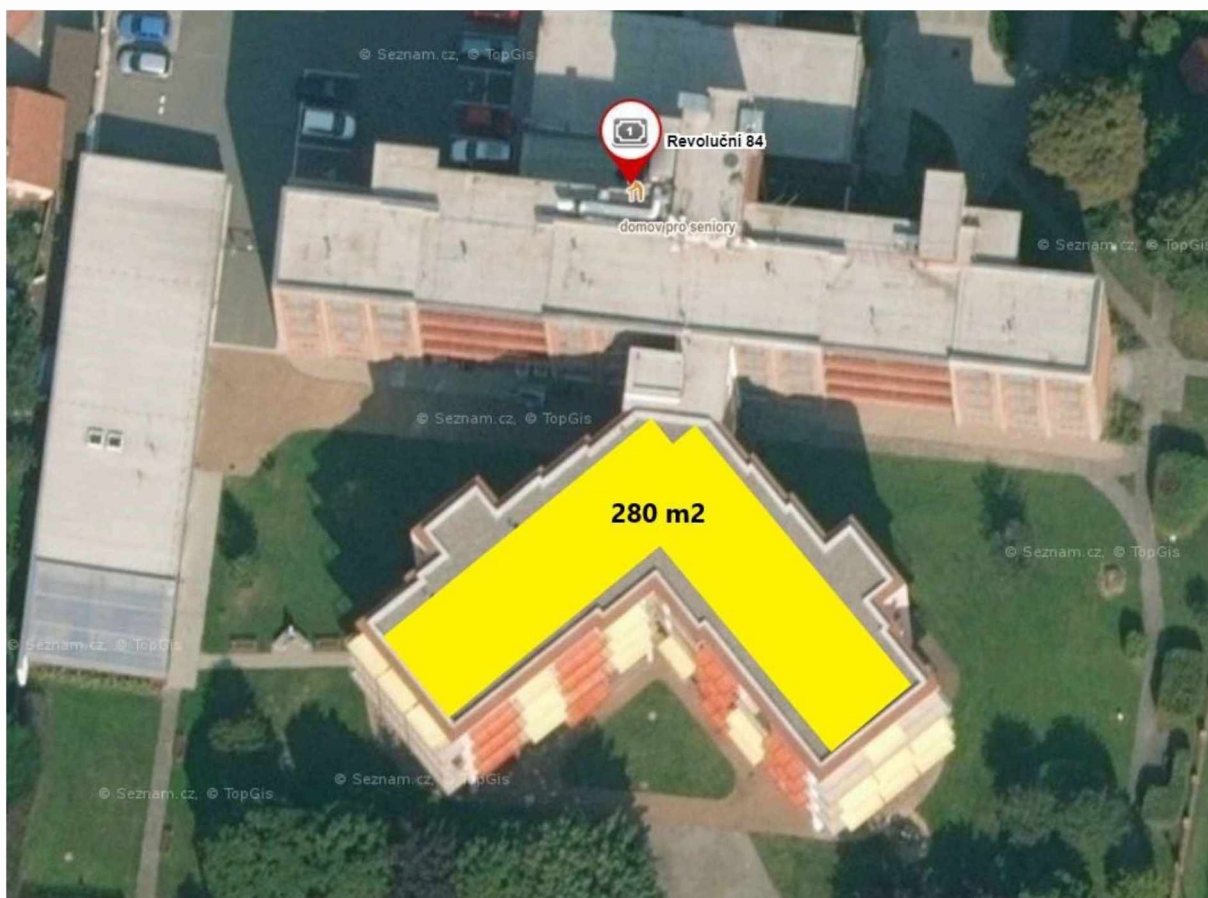


- Na původní budovu nelze – památkově chráněná.
- Nová budova – neměl by být problém, rovná střecha bez jakéhokoliv zastínění. Budova i střecha je cca 12 roků nová.
- Na střеше je kačírek




Památkáři: FVP umístěné na ploché střеше novodobé přístavby Domova důchodců v Černožicích takovým způsobem, aby byly kryty stávající atikou, a nebudou se tudíž z dálkových pohledů uplatňovat, pak lze s jejich umístěním souhlasit. Je to sdělení pouze konzultační a předběžné. Výkonným orgánem památkové péče je v tomto případě Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, takže oficiální závazné stanovisko na základě žádosti s příslušnými přílohami obdržíte od nich (referent pro předmětné území je Radek Mejstřík, tel. [REDACTED], ode dneška (14.7.2022) následných 14 dní má ale dovolenou).

Spotřeba elektrické energie za červen 2022 v hodinových intervalech

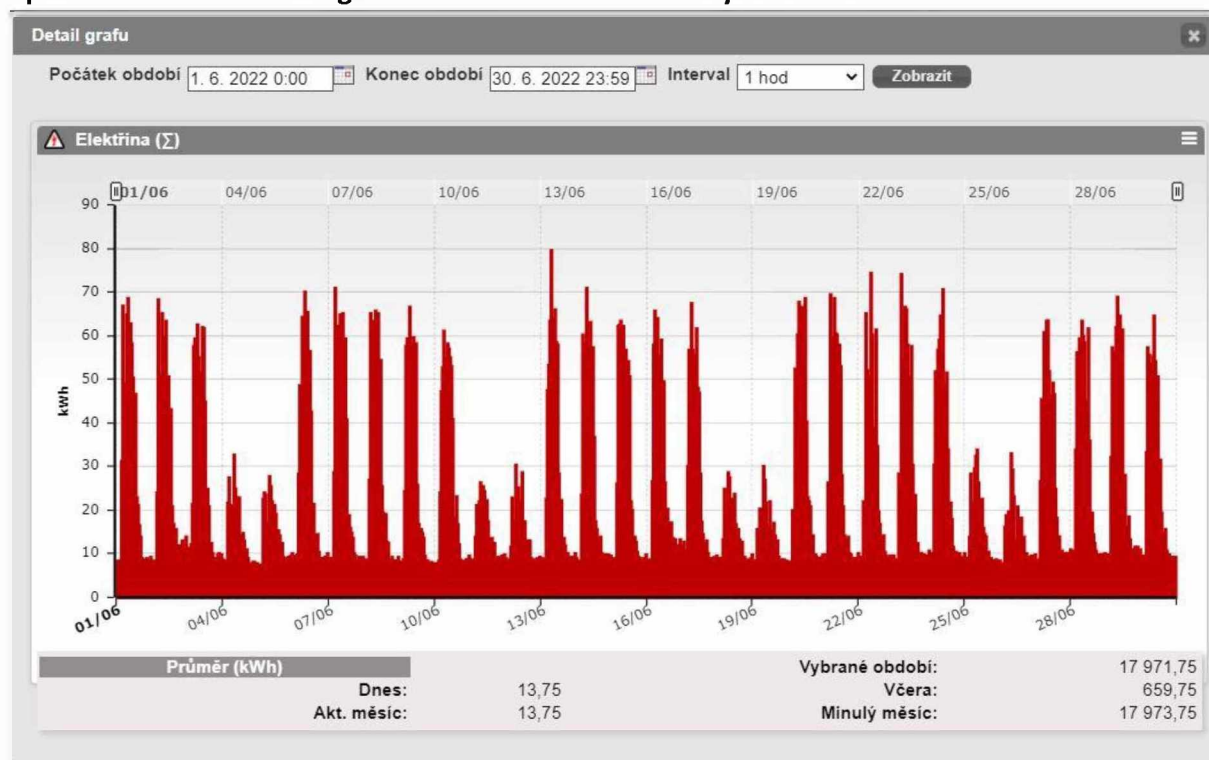

Spotřeba elektrické energie za jeden den v červnu 2022 v hodinových intervalech

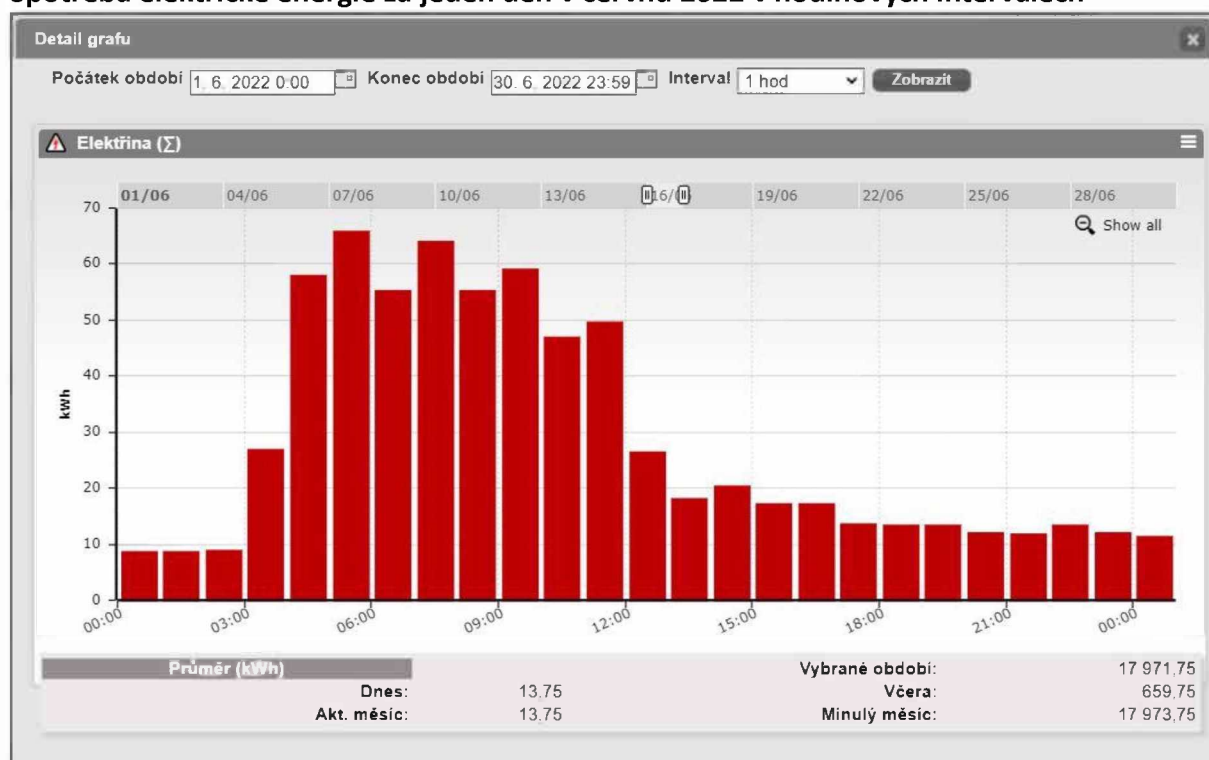

Odběrná místa



Příloha č. 1 závěrkového listu
Soupis odběrných míst

Poř.	Číslo odb. místa	Adresa odběrného místa	EAN	Distr.	Počet sazba	Jistič fází (A)	Adresa pro zaslání faktur	Typ měř.	Frekvence záloh
1	0001095690	Revoluční 84, 503 04 Černožice	859182400700828930	C26d	3	200	Revoluční 84, 503 04 Černožice	B	měsíční
2	0001095692	Revoluční 84, 503 04 Černožice	859182400700828947	C02d	3	40	Revoluční 84, 503 04 Černožice	C	měsíční


Domovy na Orlicí, 1. máje- 104, 51722 Albrechtice nad Orlicí




- na hlavní budově jsou již solární panely na ohřev vody
- Domky A, B, C - rovné střechy – vytápěné tepelnými čerpadly
- žádné stínění
- kačírek, na střeše jenom výstupek pro výtah, vzduchotechnika a klimatizační jednotka




Spotřeba elektrické energie za červen 2022 v hodinových intervalech (hlavní budova 160A)

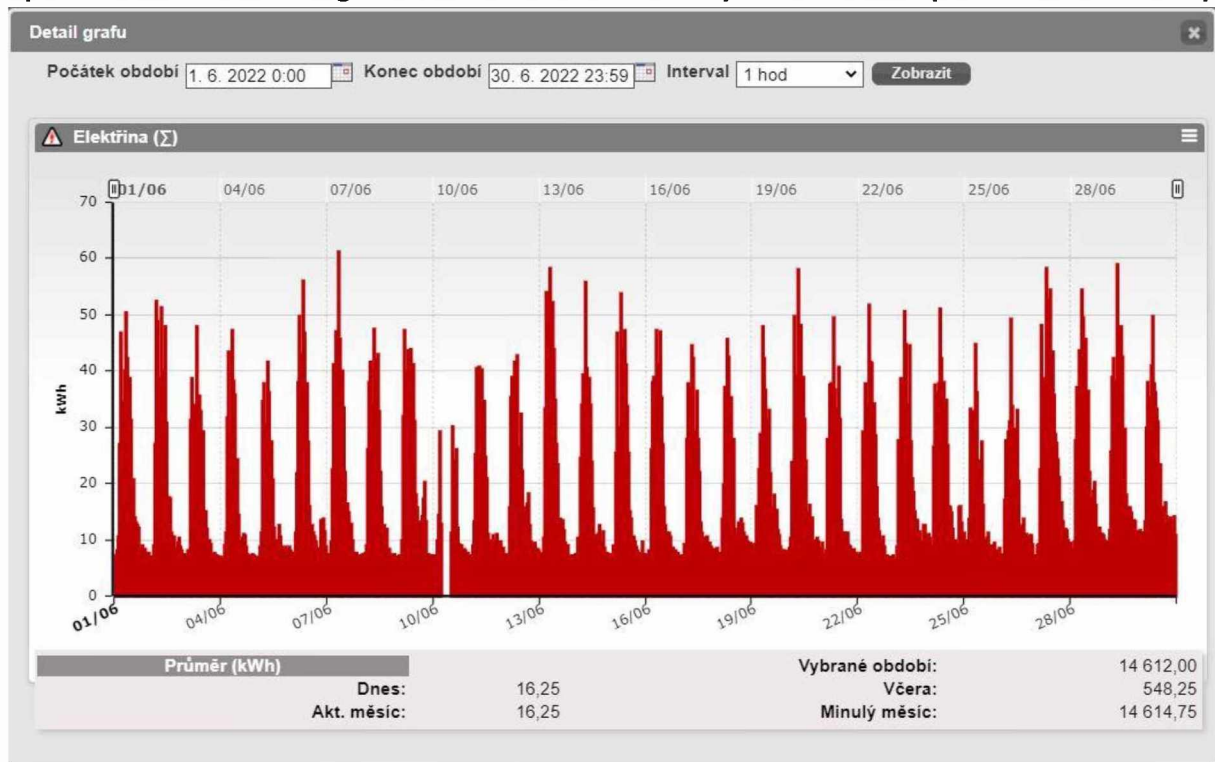


Spotřeba elektrické energie za jeden den v červnu 2022 v hodinových intervalech (hlavní budova 160A)

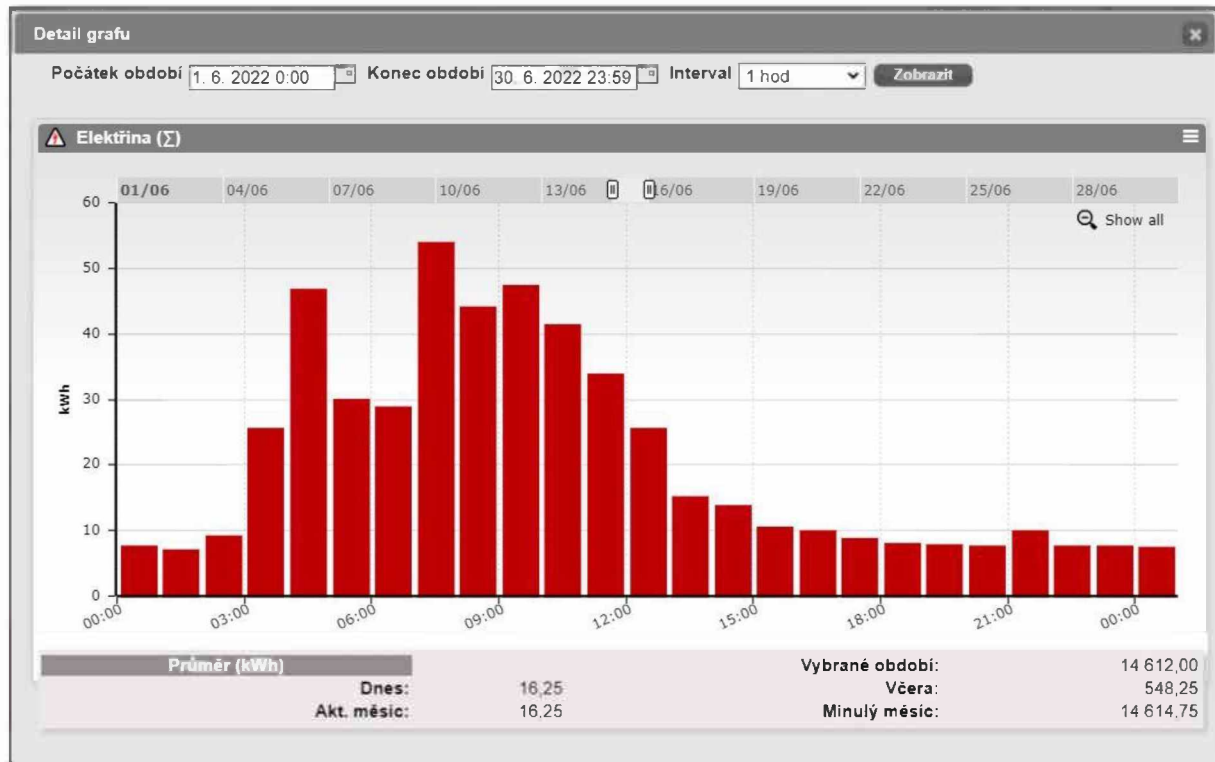

Spotřeba elektrické energie za červen 2022 v hodinových intervalech (domky A, B, C -125A)

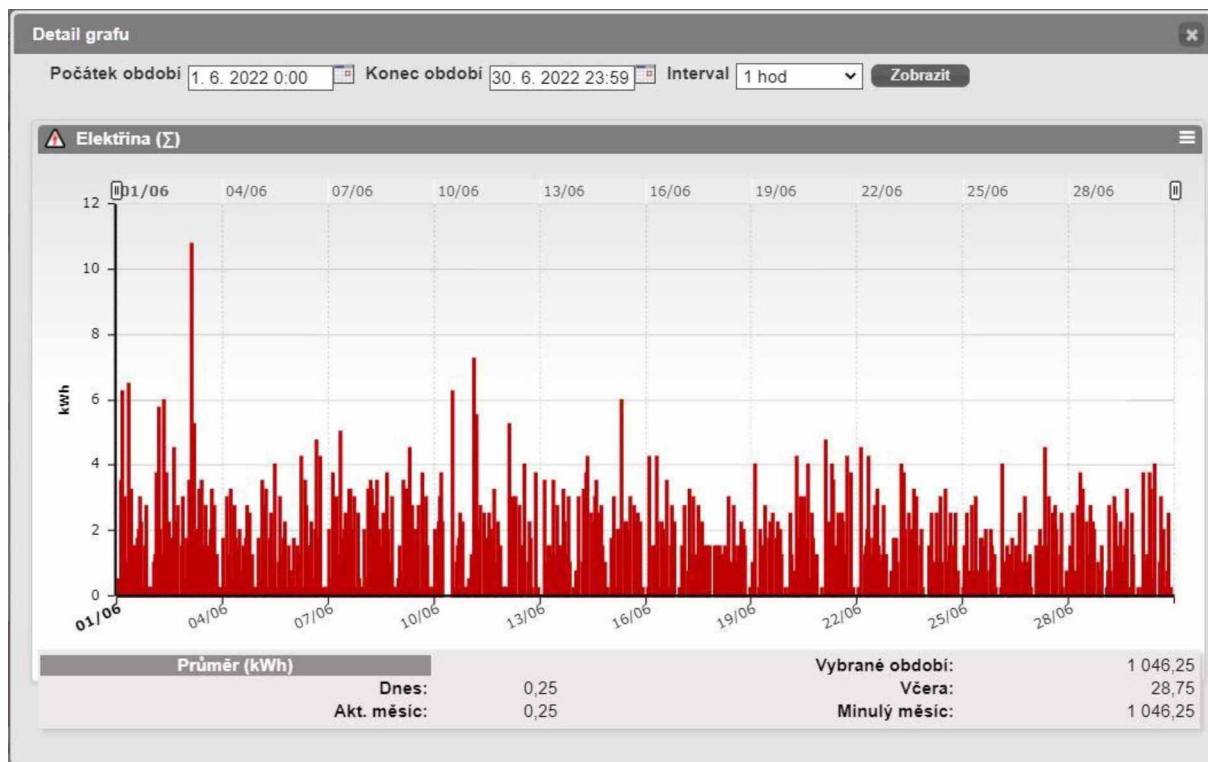

Spotřeba elektrické energie za jeden den v červnu 2022 v hodinových intervalech (domky A, B, C - 125A)

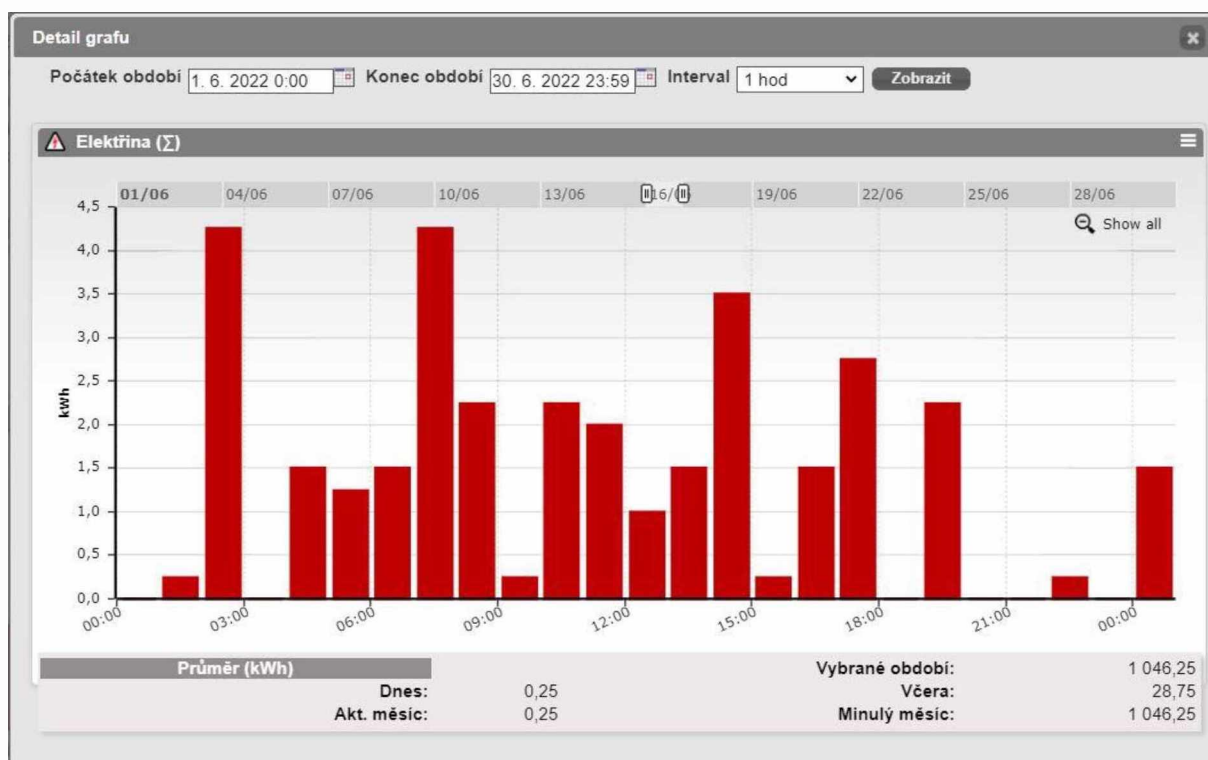


Odběrná místa



Příloha č. 1 závěrkového listu
Soupis odběrných míst

Poř.	Číslo odb. místa	Adresa odběrného místa	EAN	Distr. sazba	Poč. fází	Jistič (A)	Adresa pro zaslání faktur	Typ měř.	Zúčt. období	Frekvence záloh
1	1000438439	1.máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí	859182400707576452	C03d	3	160	1. Máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí	B	měsíc	bez záloh
2	1000438421	1.máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí	859182400707577022	C56d	3	125	1. Máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí	B	měsíc	bez záloh
3	0001163074	1.máje 130, 517 22 Albrechtice nad Orlicí	859182400700416496	C01d	3	20	1. Máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí	C	rok	pololetní
4	0001163394	1.máje 130, 517 22 Albrechtice nad Orlicí	859182400703687855	C25d	3	25	1. Máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí	C	rok	pololetní
5	1203110	Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek	859182400708312448	C03d	3	200	1. Máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí	C	měsíc	bez záloh

Domov pro seniory Pilníkov (Trutnovská 176, Pilníkov)

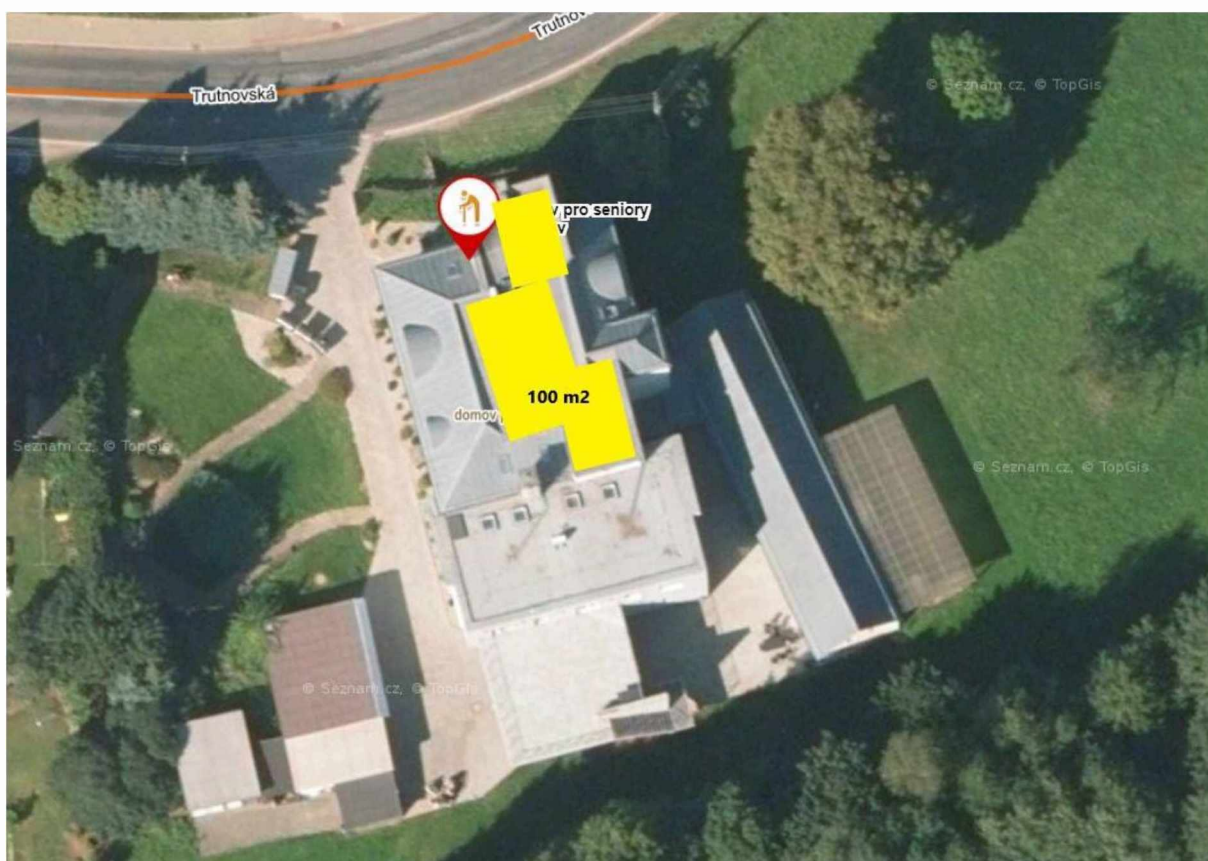

- Část střechy rovná + část střechy mírný sklon cca 15° na jih (pokrytá fólií z měkčeného PVC)
- Střecha osvětlena sluncem celý den.
- Prostor pro FVE – ano.
- Střecha nemá viditelný problém, není v plánu rekonstrukce



Spotřeba elektrické energie za červen 2022 v hodinových intervalech

Data zatím nejsou k dispozici (ale je měření „B“, takže budou)

Spotřeba elektrické energie za jeden den v červnu 2022 v hodinových intervalech

Data zatím nejsou k dispozici (ale je měření „B“, takže budou)


Odběrná místa




Příloha č. 1 závěrkového listu
Soupis odběrných míst

Poř.	Číslo odb. místa	Adresa odběrného místa	EAN	Distr. sazba	Poř. fáze	Jistič (A)	Adresa pro zaslání faktur	Typ měř.	Frekvence záloh
1	0001027474	Trutnovská 176, 542 42 Pilníkov	859182400700766171	C25d	3	125	Trutnovská 176, 542 42 Pilníkov	B	měsíční

Domov pro seniory Vrchlabí (Žižkova 590, Vrchlabí)

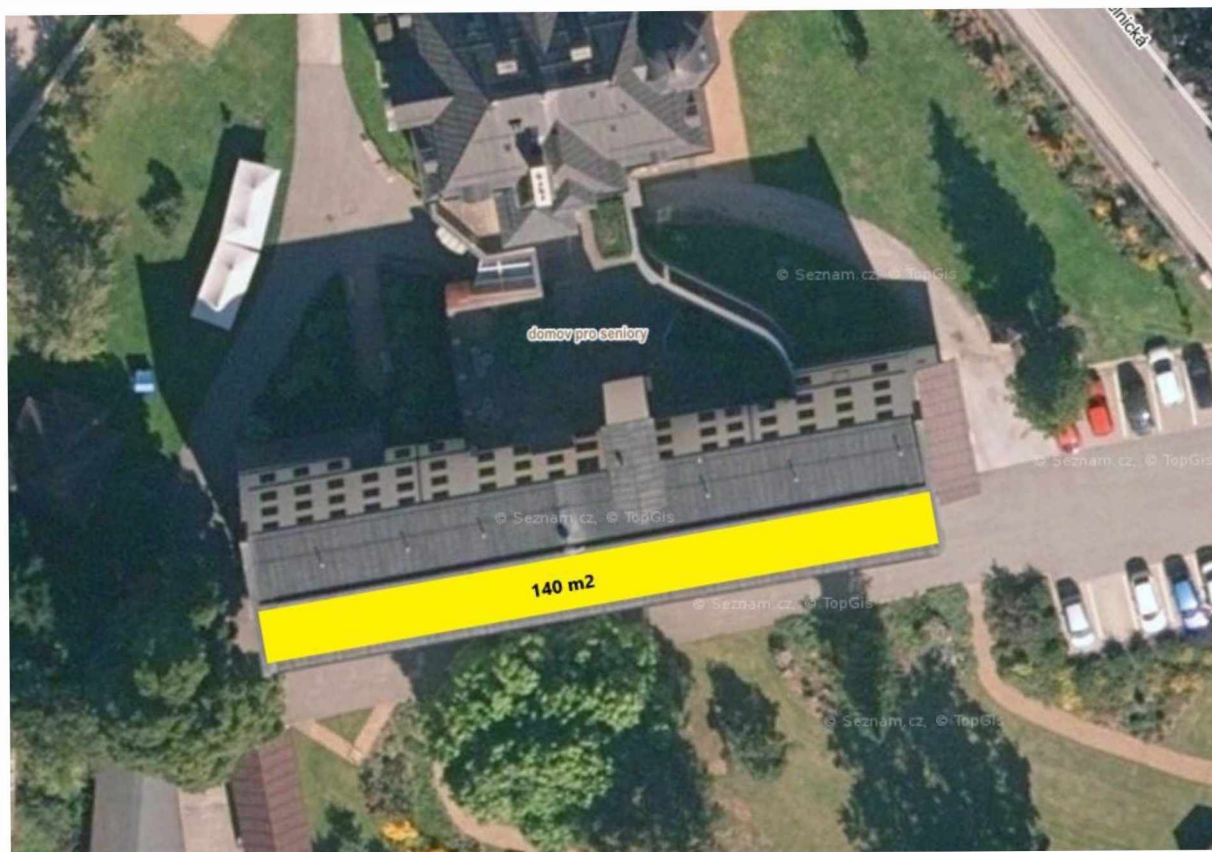


- Šikmá měděná střecha s mírným sklonem cca 20° na jih
- Střecha je celý den osvětlena sluncem
- Prostor pro FVE – ano
- Střecha nemá viditelný problém, není v plánu rekonstrukce
- Plánuje se přístavba s tepelnými čerpadly vzduch – voda a FVE na střeše

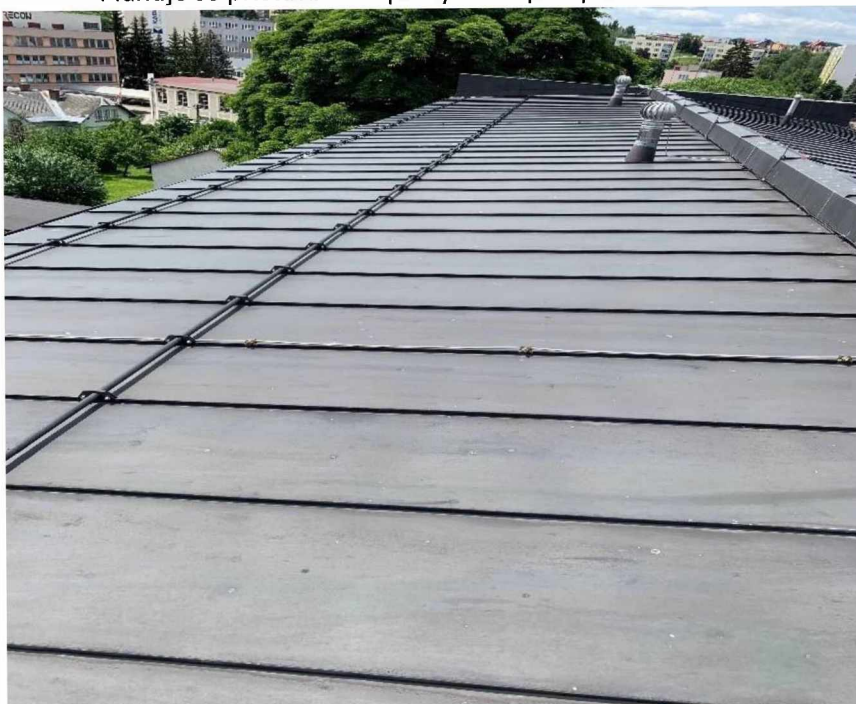

Spotřeba elektrické energie za červen 2022 v hodinových intervalech



Spotřeba elektrické energie za jeden den v červnu 2022 v hodinových intervalech

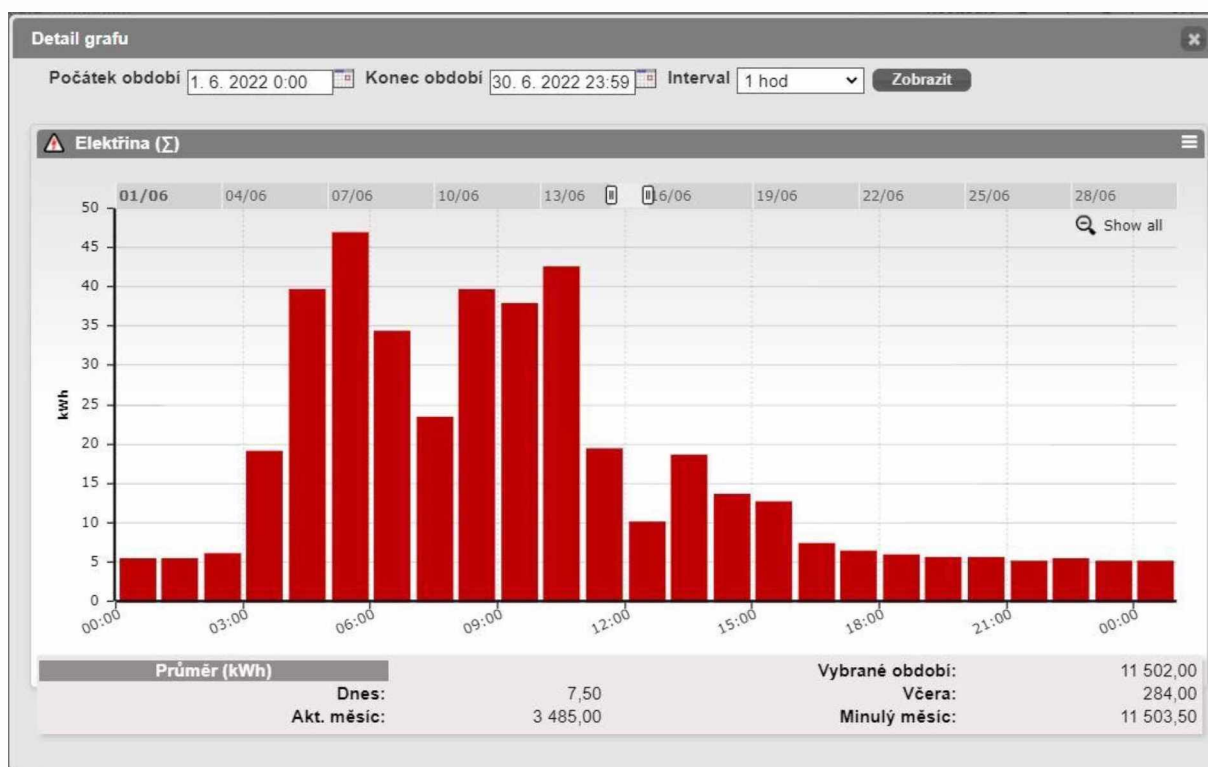

Odběrná místa




ČESKOMORAVSKÁ
KOMODITNÍ BURZA KLADNO

Příloha č. 1 závěrkového listu

Soupis odběrných míst

Poř.	Číslo odb. místa	Adresa odběrného místa	EAN	Distr.	Počet sazba	Jistič fáze (A)	Adresa pro zasílání faktur	Typ měř.	Frekvence záloh
1	953875	Žižkova 506, 543 01 Vrchlabí	859182400700760025	C03d	3	250	Žižkova 590, 543 01 Vrchlabí	B	bez záloh


Domovy Na Třešňovce, Česká Skalice, Riegrova 837

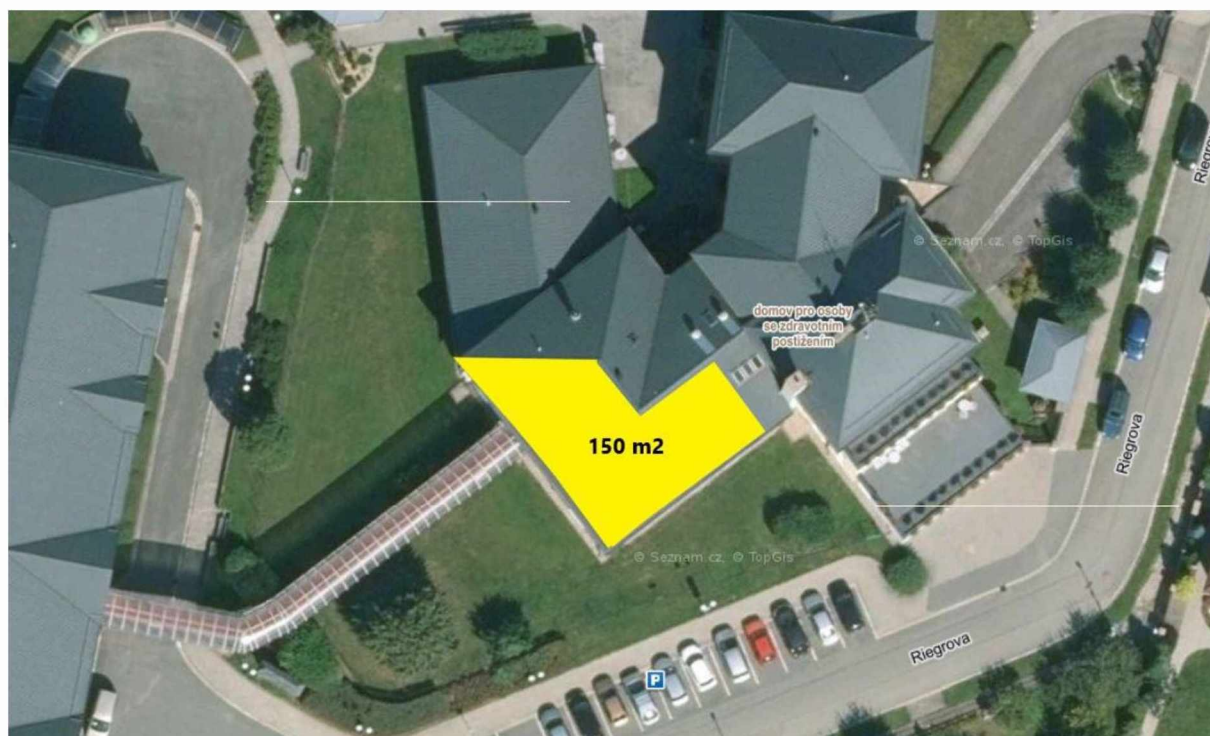


- Střecha na Domově pro seniory vzhledem k členitosti není vhodná
- Vhodné jsou dva segmenty střech na Domově pro osoby se zdravotním postižením
- Střecha je mírně šikmá cca 25°- 30°, orientace dvou segmentů střechy je na JV a JZ
- Střecha je z roku 2001 z tabulí vlnitého plastovaného ocelového plechu Verho-Rannila



Spotřeba elektrické energie za červen 2022 v hodinových intervalech (Reigrova 598)

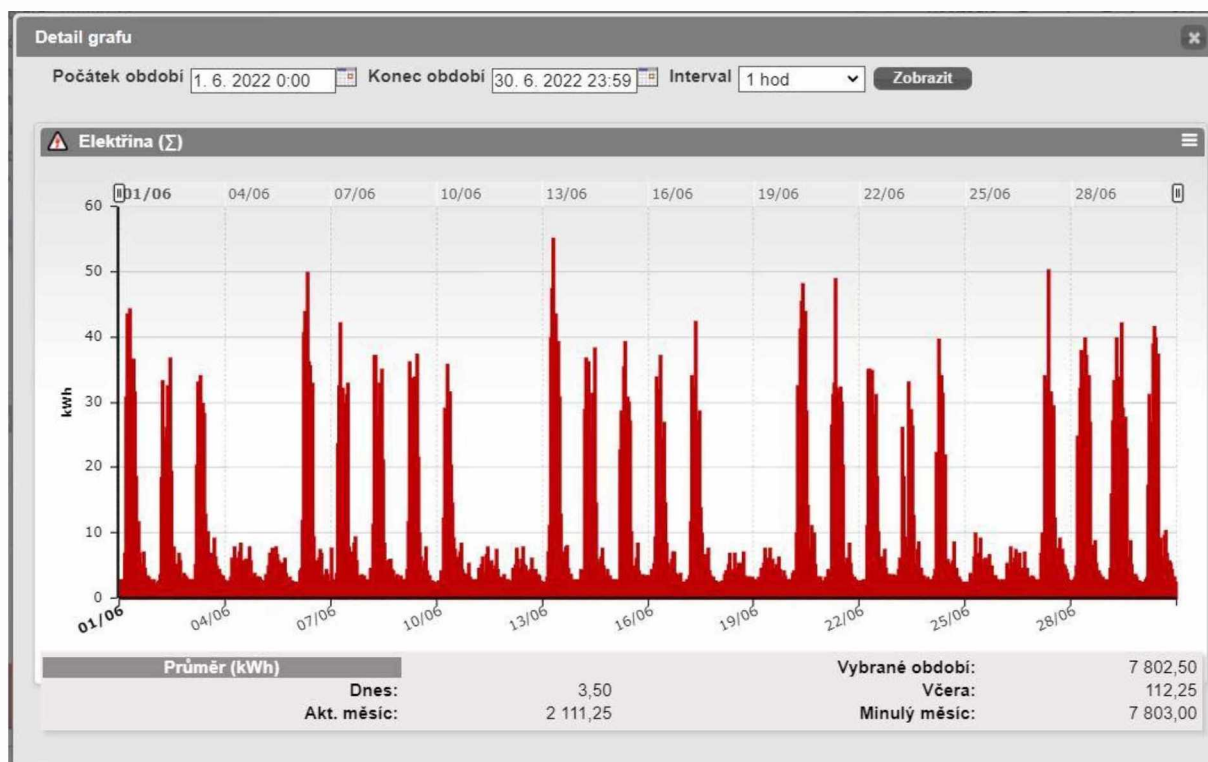


Spotřeba elektrické energie za jeden den v červnu 2022 v hodinových intervalech (Reigrova 598)

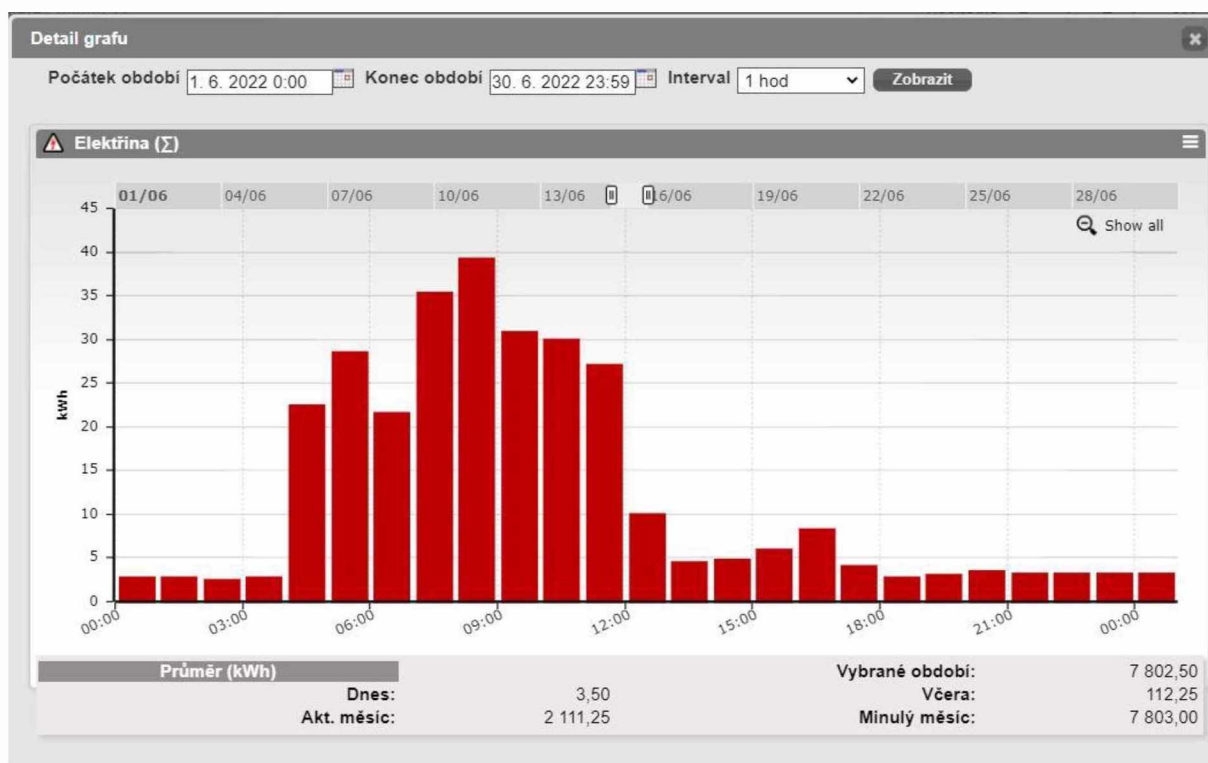

Spotřeba elektrické energie za červen 2022 v hodinových intervalech (Reigrova 837)



Spotřeba elektrické energie za jeden den v červnu 2022 v hodinových intervalech (Reigrova 837)

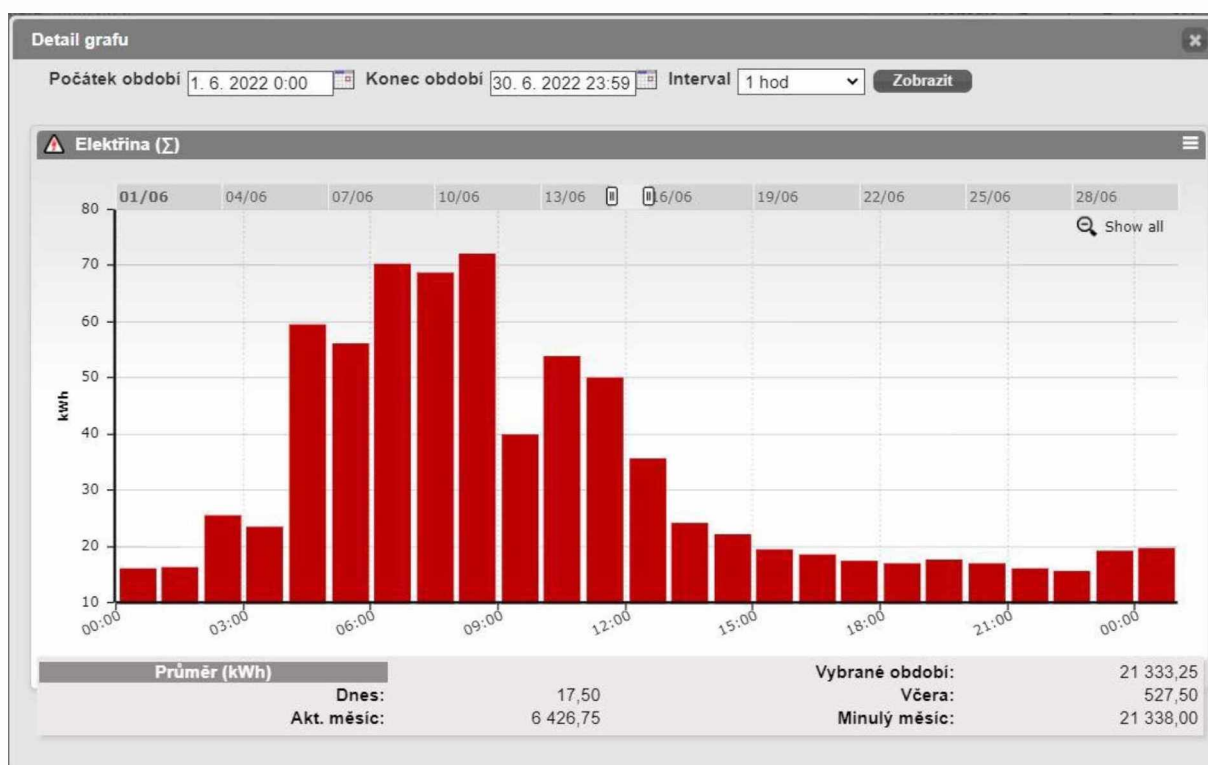

Odběrná místa



Příloha č. 1 závěrkového listu
Soupis odběrných míst

Poř.	Číslo odb. místa	Adresa odběrného místa	EAN	Distr. sazba	Počet fází	Jistič (A)	Adresa pro zasilání faktur	Typ měř.	Frekvence záloh
1	800077264	Riegrova 837, 552 03 Česká Skalice	859182400700793870	C03d	3	315	Riegrova 837, 552 03 Česká Skalice	B	měsíční
2	800076913	Riegrova 594, 552 03 Česká Skalice	859182400700611815	C02d	3	250	Riegrova 837, 552 03 Česká Skalice	B	měsíční

Domov Dědina, Nádražní 709, 517 73 Opočno



Poř.č.	Typ měřidla	Dálkový odečet	Jistič	Dodavatel	Fotodokumentace	poloha	Poznámka
1.	Elektroměr NN		3x125A	Pražská plynárenská	ANO	přízemí	v plotě
2.	Plynoměr MO			Pražská plynárenská		přízemí	zvenku ve skř.
3.	Vodoměr			Technické služby Opočna		šachta	hloubka 1,5m
4.							

Domov Dědina - Přepychy 213, 517 32 Přepychy

Vodoměr - šachta cca 1,5 m, voda v šachtě

Elektroměr

Domov Dědina - Přepychy 213, 517 32 Přepychy

Vodoměr - šachta cca 1,5 m, voda v šachtě

Elektroměr

[illegible]

Poř.č.	Typ měřidla	Dálkový odečet	Jistič	Dodavatel	Fotodokumentace	poloha	Poznámka
1.	Elektroměr	ANO	3x160A	Pražská plynárenská		přízemí	sloupek
2.	Vodoměr			AQUA Servis RK		šachta	hloubka 1,5m
3.							



Poř.č.	Typ měřidla	Dálkový odečet	Jistič	Dodavatel	Fotodokumentace	poloha	Poznámka
1.	Elektroměr	ANO	3x160A	Pražská plynárenská	ANO	přízemí	ve sloupku
2.	Vodoměr			AQUA Servis RK	ANO	šachta	hloubka 1,5m
3.							



Poř.č.	Typ měřidla	Dálkový odečet	Jistič	Dodavatel	Fotodokumentace	poloha	Poznámka
1.	Elektroměr NN		3x80A	Pražská plynárenská	ANO	přízemí	sloupek
2.	Plynoměr MO			Pražská plynárenská	ANO	přízemí	sloupek
3.	Vodoměr			Královéhradecká provozní	ANO	šachta	hloubka 2m
4.							



Poř.č.	Typ měřidla	Dálkový odečet	Jistič	Dodavatel	Fotodokumentace	poloha	Poznámka
1.	Elektroměr		3x25A	Pražská plynárenská	ANO	přízemí	všechna měřidla jsou v jedné technické místnosti
2.	Vodoměr			VAK Náchod	ANO	přízemí	
3.	Vodoměr TV			Innogy Energo s.r.o.	ANO	přízemí	
4.	Kalorimetr			Innogy Energo s.r.o.	ANO	přízemí	
5.							

Střešní FV elektrárny

Vybrané objekty v organizacích KHK							
Jedná se o předběžný výběr, situaci je třeba ověřit na místě.							
Organizace	Objekt	Adresa	Typ střechy	Orientace střechy	Použitelná plocha půdorys m ²	Poznámka	
Ústavy sociální péče							
1	Domečky Rychnov n. K.	Jiráskova 1612, Rychnov n. K.	mírně šikmá	JZ	160	možná i jiné střechy v areálu	
2	Domov dědina	Nádražní 790, Opočno	mírně šikmá	JV	180		
3	Domov na Stříbrném vrchu Rokytnice	Stříbrný vrch 99, Rokytnice v OH	šikmá	J	150	3 objekty	
Zdravotnictví							
4	Městská nemocnice, a.s.	poliklinika	Rooseveltova 474, Dvůr Králové	rovná	160		
5	Oblastní nemocnice Jičín a.s.	objekt B, C, F, G	Jana Maláta 493, Nový Bydžov	rovná	1 600		
6	Oblastní nemocnice Náchod a.s.	objekt H, K	Purkyňova 446, Náchod	rovná	930		
7	Oblastní nemocnice Trutnov a.s.		Maxima Gorkého 77, Trutnov	rovná	650	na 4 stávajících objektech, nově projektovaný urgentní příjem již v projektu FVE	
Domovy důchodců							
8	Domov důchodců Černožice	nová budova	Revoluční 54, Černožice	rovná	300	nová budova - není památkově chráněna	
9	Domovy na Orlicí	3 budovy	1. máje 104, 51722 Albrechtice nad Orlicí	rovná	210	3 budovy Albrechtice	
10	Domov pro seniory Pilníkov		Trutnovská 176, Pilníkov	rovná	150		
11	Domov pro seniory Vrchlabí	nová budova	Žižkova 590, Vrchlabí	mírně šikmá	J	150	další budovy vč. FVE
12	Domovy Na Třešňovce	nová střecha	Riegrova 837, Česká Skalice	šikmé	JV, JZ	200	na více objektech
13	Domov sociální péče Tmavý Důl	původní objekty	Tmavý Důl 958, Rtyně v P.	šikmá	JV	200	
Kultura							
14	Regionální muzeum a galerie v Jičíně	nová budova	Depozitář Robousy	šikmá	ZZI	200	je potřeba energie i v létě

14

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č. 1)

Veřejná zakázka: Fotovoltaické elektrárny – technicko-ekonomická studie

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

Mgr. Jitka Bučková, [REDACTED]

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu.

Zadavatel vydává změnu a doplnění zadávacích podmínek z vlastního podnětu bez předchozího dotazu.

Zadavatel upravuje přílohu č. 1 výzvy k podání nabídek Kontaktní místa střešní FVE u objektu č. 6 a doplňuje podklady k objektu č. 6 Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Zveřejněny upravené přílohy č. 1, které plně nahrazují původní přílohy č. 1:

Příloha č. 1 část 1. P01_kontaktní místa střešní FVE

Příloha č. 1 část 2. P01_FVE_29_7_2022

Zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 15. 8. 2022 v 9:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:

Příloha č. 1 část 1. P01_kontakní místa střešní FVE

Příloha č. 1 část 2. P01_FVE_29_7_2022

V Hradci Králové 2. 8. 2022



Mgr. Jitka Bučková
na základě pověření
