

Smlouva o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datová schránka: uccchjm

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-3747/2022-TOV**

ISPROFOND: 5113720006

a

Společnost „TBR + OHLA + EŽ – BUBNY“

Vedoucí společník: Metrostav TBR a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 098 84 572, DIČ: CZ09884572

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 26059

bank. spoj. spol. „TBR+OHLA+EŽ-BUBNY“: ■

zastoupena: **Ing. Alešem Gothardem**, předsedou představenstva

Ing. Jakubem Píknou, členem představenstva

Společník: OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

zastoupena: **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsedou představenstva

Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

Společník: Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B/1809

zastoupena: **Ing. Luděk Valtrem**, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Metrostav TBR a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8.

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy Metrostav TBR a.s.: 22500308

číslo smlouvy OHLA ŽS, a.s.: SOD00200720

číslo smlouvy Elektrizace železnic Praha a.s.: 45/22-OZ/SOD

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Objednatel si přeje, aby Dílo „**Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)**“ bylo provedeno Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a odstranění všech jeho vad, a proto se

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných dodatků) a jako její součást musí být čteny a vykládány, a to dle pořadí závaznosti uvedeného ve Smluvních podmínkách.
 - 1.1 Dopis o přijetí nabídky datovaný 01.11.2022
 - 1.2 Dopis nabídky datovaný 02.05.2022
 - 1.3 Smluvní podmínky [Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (FIDIC 1999)-Obecné podmínky; Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky pro stavby Správy železnic, státní organizace č.j.: MD/20033/2021/520
 - 1.4 Technická specifikace (VTP/R-F/13/21, ZTP ze dne 2.8.2021 a další dle pod-článku 1.1.1.5 Smluvních podmínek)
 - 1.5 Výkresy
 - 1.6 Formuláře:
 - 1.6.1 Soupis prací
 - 1.7 Ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy (<https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/>)
 - 1.7.1 Metodika pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení – schváleno Ministerstvem dopravy dne 10.11.2020
 - 1.7.2 Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle Smluvních podmínek FIDIC (1.vydání leden 2018) schváleno Ministerstvem dopravy dne 20.2.2018
 - 1.7.3 Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek – 1.vydání, leden 2018
2. Specifikace související dokumentace je uvedena v Technické specifikaci, a to zejména ve Zvláštních technických podmínkách.
3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré příslušné dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s ustanovením Smlouvy.
4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a odstranění jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
5. Objednatel používá informační systém pro řízení a monitoring staveb. Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu XML (viz datový předpis XDC, <https://xdc.szdc.cz/>):
 - 5.1 Faktura,
 - 5.2 souhrn fakturace,
 - 5.3 soupis zjišťovacích protokolů,
 - 5.4 zjišťovací protokoly.

6. Rekapitulace ceny je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy o dílo.
7. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání
Objednatel vymezil ve Smluvních podmínkách požadavky sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací tak, aby jejich aplikací nebyly porušeny zásady zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).
- V rámci plnění Díla jde o dále uvedené požadavky:
- rovnocenné platební podmínky v rámci dodavatelského řetězce,
 - jednání vedená primárně distančním způsobem,
 - studentské exkurze,
 - recyklace kameniva vyzískávaného z kolejového lože.
8. V případě Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby, které je posledním Potvrzením průběžné platby nebo Potvrzením závěrečné platby před převzetí Díla, Sekce nebo jiné části Díla Objednatel ve smyslu Pod-článku 10.1 [*Převzetí díla a sekce*] a Pod-článku 10.2 [*Převzetí části díla*] Smluvních podmínek je Správce stavby povinen vydat Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby nejpozději v den převzetí Díla, Sekce nebo části Díla Objednatel.
9. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92 odst. 1 zákona o DPH.
10. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
11. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený Zadávací dokumentací.
12. Lhůty stanovené v odst 8.3.3 VTP na realizaci a lhůty stanovené v Pod-článku 7.9 Smluvních podmínek se nepoužijí a nahrazují se lhůtou **12 měsíců** po dokončení konečného přejímacího řízení Sekce 1, tj. do **6 měsíců** ode dne vydání posledního Potvrzení o převzetí části Díla.
13. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 21 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této Smlouvy.
14. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost nepůsobí zdánlivostí, neplatností ani nevymahatelností ostatních ustanovení Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení.

15. Objednatel si vyhrazuje:

15.1 požadavek, že níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky:

SO 01-10-01	Praha-Bubny, železniční svršek
SO 02-10-01	TÚ Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, železniční svršek
SO 03-10-01	Praha-Výstaviště, železniční svršek
SO 04-10-01	TÚ Praha-Výstaviště - Praha-Dejvice, železniční svršek
SO 52-10-01	TÚ Praha-Bubny - Stromovka, železniční svršek
SO 01-20-02	Železniční most v km 0,450 – konkrétně tyto položky soupisu prací:
43 422335	MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C30/37
44 422365	VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B
45 42237	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ
46 42237	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ
SO 01-20-03	Železniční most v km 412,120 – konkrétně tyto položky soupisu prací:
44 422335	MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C30/37
45 422365	VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B
46 42237	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ
47 42237	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ
SO 02-20-01	Železniční most v km 0,900 – konkrétně tyto položky soupisu prací:
48 422335	MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C30/37
49 422365	VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B
50 42237	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ
51 42237	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ
	ŽST Praha-Bubny, architektonicko-stavební řešení, konstrukční část
SO 01-61-01.0	– konkrétně tyto položky soupisu prací:
17 273322811	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 40/50-XC2-XA2
20 273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505
37 311321818	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 40/50-XC1
43 311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505
70 411324646	Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 30/37-XC3-XF3
80 411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505

s výjimkou speciálních činností nebo zařízení uvedených v Příloze k nabídce.

15.2 požadavek, že významné činnosti při plnění veřejné zakázky dle předchozího bodu 15.1 musí být plněny takovým subjektem na straně Zhotovitele, který před uzavřením Smlouvy prokázal odpovídající požadavky na technickou kvalifikaci, konkrétně poskytnutí a dokončení odpovídajících nejvýznamnějších stavebních prací, a to jeho vlastními prostředky; pokud by plnění měl poskytovat jiný subjekt na straně Zhotovitele, než který před uzavřením Smlouvy prokázal odpovídající požadavky na technickou kvalifikaci, pak pouze pokud prokáže, že rovněž splňuje předmětnou kvalifikaci v potřebném rozsahu a Objednatel tuto skutečnost potvrdí písemným souhlasem; Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z nabídkové ceny uvedené v Dopise Nabídky za každý případ porušení vyhrazeného požadavku.

15.3 v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ provedení činností v souvislosti s publicitou Stavby spolufinancované Evropskou unií podle platných pravidel publicity projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie – Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Specifikace činností a podmínky pro jejich provedení jsou uvedeny v Technické specifikaci – Zvláštní technické podmínky. V případě, že tato veřejná zakázka nebude spolufinancovaná z prostředků Evropské unie, zajištění publicity Stavby nebude Zhotovitelem provedeno. Zhotoviteli bude uhrazen jen skutečně provedený rozsah tohoto plnění.

15.4 změnu zhotovitele v souladu s § 100, odst. 2 ZZVZ v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k

předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinností Zhotovitele. Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Pokynů pro dodavatele je Objednatel oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Pokynů pro dodavatele. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.

- 15.5 právo valorizovat částky způsobilé k platbě Zhotoviteli, a to v souladu s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek. Pro vyloučení pochybností se potvrzuje, že valorizace může nabývat hodnot kladných i záporných,
- 15.6 změna závazku v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ ve věci měření množství každé původní měřitelné položky s jednotkovou cenou ve výkazu výměr dle čl.12 Smluvních podmínek.
16. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.
17. Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň s předložením Závěrečného vyúčtování (po vyřešení případných sporů):
- a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,
 - b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).
- Součet hodnot dle výše uvedeného písm.a) a písm.b) se musí rovnat 100% hodnotě veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.
- Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky uvedeného v příloze č.11 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu).
18. Podpisem této Smlouvy o dílo Zhotovitel současně jako zpracovatel uzavírá s Objednatелеm jako správcem smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v příloze č. 5 této Smlouvy o dílo.
19. Compliance doložka a etické zásady
- Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností).
20. Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
 - Příloha č. 2 Oprávněné osoby
 - Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
 - Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací

Příloha č. 5	Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6	Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)
Příloha č. 7	Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo
Příloha č. 8	NEOBSAZENO
Příloha č. 9	Žádost o poskytnutí zálohové platby
Příloha č. 10	NEOBSAZENO
Příloha č. 11	Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze

V Praze
za společnost „TBR + OHLA + EŽ – BUBNY“

16.12.2022 08:25
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

2022.11.15
14:32:11 +01'00'

Ing. Aleš Gothard

předseda představenstva
Metrostav TBR a.s.

Datum: 2022.11.16
09:57:47 +01'00'

Mgr. Jakub Pikna

člen představenstva
Metrostav TBR a.s.

V Brně

Digitálně podepsal
Datum: 2022.11.18
08:20:17 +01'00'

Ing. Roman Kocúrek

1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

Digitálně podepsal
Datum: 2022.11.18
08:28:58 +01'00'

Jiří Procházka, MBA

člen představenstva
OHLA ŽS, a.s.

V Praze

Datum: 2022.11.22
10:39:56 +01'00'

Ing. Luděk Valtr

předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Datum: 2022.11.21
17:09:31 +01'00'

Ing. Martin Janovský

místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Aspe

Firma: Firma

Rekapitulace ceny

Stavba: Zm29_5113720006 - Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-V

Varianta: IV - Importovaná varianta

Celková cena bez DPH:3 789 036 696,15

Celková cena s DPH:4 584 734 402,34

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
PS 01-01-11	Praha-Bubny - SZZ			
PS 91-01-52	Praha-Bubny, úprava CDP Praha			
PS 01-02-01	ŽST Praha-Bubny, místní kabelizace			
PS 01-02-02	zast. Praha-Bubny, rozhlasové zařízení			
PS 01-02-03	zast. Praha-Bubny, telefonní zapojovač			
PS 01-02-04	ŽST Praha-Bubny, kamerový systém			
PS 01-02-05	zast. Praha-Bubny, EZS			
PS 01-02-06	SpS Bubny, ZPDP			
PS 01-02-07	SpS Bubny, kamerový systém			
PS 01-02-08	ŽST Praha-Bubny, informační zařízení			
PS 01-02-09	ŽST Praha-Bubny, sdělovací zařízení			
PS 01-02-10	ŽST Praha-Bubny, ZPDP			
PS 03-02-01	zast. Praha-Výstaviště, rozhlasové zařízení			
PS 03-02-02	zast. Praha-Výstaviště, kamerový systém			
PS 03-02-03	zast. Praha-Výstaviště, EZS			
PS 03-02-04	Zast. Praha-Výstaviště, informační zařízení			
PS 03-02-05	zast. Praha-Výstaviště, sdělovací zařízení			
PS 03-02-10	zast. Praha-Výstaviště, ZPDP			
PS 52-02-01	Praha-Bubny - Praha-Holešovice, DOK a TK			
PS 91-02-01	Praha-Bubny - Praha-Dejvice, DOK a TK			
PS 91-02-02	Praha Masarykovo Nádraží - Praha-Bubny, DOK a TK			
PS 91-02-03	Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC			
PS 91-02-05	Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, přenosový systém			
PS 91-02-06	Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, GSM-R			
PS 91-02-07	Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, DDTS ŽDC			
PS 91-02-08	CDP Praha, vybavení dispečerského sálu			
PS 01-03-11	SpS Praha-Bubny, DŘT			
PS 01-03-12	ŽST Praha-Bubny, DŘT			
PS 01-03-41	Praha-Bubny, SpS 3kV-DC, stejnosměrná část			
PS 01-03-42	Praha-Bubny, SpS 3kV-DC, vlastní spotřeba			
PS 01-03-43	Praha-Bubny, SpS 3kV-DC, vazba napaječů			
PS 01-03-52.1	ŽST Praha-Bubny, NTS 22kV, technologie			
PS 01-03-52.2	ŽST Praha-Bubny, ZZEE			
PS 01-03-61	ŽST Praha-Bubny, STS 6kV 50Hz, technologie			
PS 03-03-11	zast. Praha-Výstaviště, DŘT			
PS 03-03-52	zast. Praha - Výstaviště, TS 22 / 0,4 kV, technologie, část SŽ			
PS 03-03-53	zast. Praha - Výstaviště, TS 22 / 0,4 kV, vlastní spotřeba			
PS 91-03-11	ED Praha Křenovka, doplnění DŘT			
PS 01-04-11	ŽST Praha-Bubny, osobní výtahy			
PS 01-04-21	ŽST Praha-Bubny, eskalátory			
PS 03-04-11	zastávka Praha-Výstaviště, osobní výtahy			
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy			
SO 98-98	Všeobecný objekt			
SO 01-10-01	Praha-Bubny, železniční svršek			
SO 01-10-01.1	Praha-Bubny, železniční svršek - provizorní kolej			
SO 02-10-01	TÚ Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, železniční svršek			
SO 03-10-01	Praha-Výstaviště, železniční svršek			
SO 04-10-01	TÚ Praha-Výstaviště - Praha-Dejvice, železniční svršek			
SO 52-10-01	TÚ Praha-Bubny - Stromovka, železniční svršek			
SO 91-14-01	Výstroj a značení trati			
SO 01-11-01	Praha-Bubny, železniční spodek			
SO 01-11-01.1	Praha-Bubny, železniční spodek - provizorní kolej			
SO 02-11-01	TÚ Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, železniční spodek			
SO 03-11-01	Praha-Výstaviště, železniční spodek			
SO 04-11-01	TÚ Praha-Výstaviště - Praha-Dejvice, železniční spodek			
SO 52-11-01	TÚ Praha-Bubny - Stromovka, železniční spodek			
SO 02-27-01	Protluková stěna km 0,630 - 1,205			
SO 01-12-01.0	Praha-Bubny, nástupiště architektonicko - stavební řešení			
SO 03-12-01	Praha-Výstaviště, nástupiště			
SO 02-13-01	Přejezd v ev. km 0,767 - zrušení			
SO 01-20-01	Železniční most v km 411,688 (Bubenské nábreží) - Přiveďnutí			
SO 01-20-02	Železniční most v km 0,450			
SO 01-20-03	Železniční most v km 412,120			
SO 02-20-01	Železniční most v km 0,900			
SO 02-20-02	Železniční most v ev. km 1,120 - zrušení			
SO 03-23-01	Opěrné zdi v km 1,223 - 1,341			
SO 03-24-01	Zárubní zdi km 1,322-1,445			
SO 03-28-01	Lávka pro pěší v km 1,400			
SO 03-28-02	Úprava zdi Královské obory			
SO 01-53-01.1	Přeložka potrubní pošty - trubní část			
SO 01-53-01.2	Přeložka potrubní pošty - doprovodný kabel			
SO 01-54-31	Definitivní VO příjezdové komunikace km cca 0,4			
SO 02-53-02	Přeložka sděl. vedení T-Mobile ul. Bubenská - Strojnická			
SO 02-53-04	Přeložka sděl. vedení Dial Telecom ul. Dukelských hrdinů - U Výstaviště			
SO 02-53-05	Přeložka sděl. vedení T-Mobile ul. Dukelských hrdinů - U Výstaviště			
SO 02-53-06	Ochrana sděl. vedení MV ČR ve Stromovce			
SO 02-54-30	Provizorní přeložky VO Bubenská - Strojnická			
SO 02-54-31	Definitivní přeložky VO Bubenská - Strojnická			
SO 02-54-32	Osvětlení podjezdu Bubenská			
SO 02-54-33	Osvětlení podjezdu Dukelských hrdinů			
SO 02-54-34	Přeložky VO Dukelských hrdinů			
SO 02-54-35	Přeložky VO Strojnická			
SO 02-54-40	TT Dukelských hrdinů, úprava TV			
SO 02-54-41	TT Dukelských hrdinů, přeložky kabelů DP			
SO 02-54-42	TT Dukelských hrdinů, elektrické ovládání a vytápění výměn			
SO 03-54-30	Osvětlení pěších cest v okolí zast. Praha-Výstaviště			
SO 52-54-30	Přeložky VO Železničářů			
SO 01-50-03	Kanalizační přípojka koleji			

SO 01-50-04	Splásková kanalizace, Praha-Bubny				
SO 01-50-05	Dešťová kanalizace, Praha-Bubny				
SO 01-50-05.1	Ražené objekty pro kanalizaci, Praha-Bubny				
SO 01-51-01.1	Vodovod DN 150, Praha-Bubny - neveřejná část				
SO 01-51-01.2	Vodovod DN 150, Praha-Bubny - veřejná část				
SO 01-51-02	Vodovodní přípojka, Praha-Bubny				
SO 02-50-01	Likvidace dešťových vod, Praha-Bubny - Praha-Výstaviště				
SO 02-50-02	Odvodnění estakády, Praha-Bubny - Praha-Výstaviště				
SO 02-50-03	Odvodnění komunikací, ul. Bubenská				
SO 02-51-01	Přeložka vodovodu DN 200, Praha-Bubny - Praha-Výstaviště				
SO 02-51-02	Suchovod				
SO 02-52-01	Přeložka plynovodu STL PE dn160, km cca 0,820				
SO 02-52-02	Přeložka plynovodu STL PE dn225, km cca 1,160				
SO 02-55-01	Zrušení stávajícího parovodu DN200, km cca 0,820				
SO 02-55-02	Dočasná úprava kanálu pro horkovod, km cca 1,100				
SO 02-55-03	Dočasná úprava kanálu pro horkovod, km cca 1,100				
SO 03-50-01	Kanalizační přípojka jednotná, Praha-Výstaviště				
SO 03-50-02	Kanalizační přípojka dešťová, Praha-Výstaviště				
SO 03-50-03	Odvodnění komunikací, ul. Dukelských hrdinů				
SO 03-51-01	Vodovodní přípojka, Praha-Výstaviště				
SO 52-50-01	Kanalizační přípojka kolejí, Praha-Bubny - Stromovka				
SO 01-30-01	Přijezdová komunikace Praha-Bubny				
SO 01-30-02	Chodníky Praha-Bubny - Prefa schodiště, prefa lavice				
SO 01-30-03	Přijezdová komunikace BTS Bubny				
SO 02-30-01	Přijezdová komunikace Spinací stanice				
SO 02-30-02	Přeložka ul. Bubenské				
SO 02-30-03	Úprava komunikací OMNIPOL				
SO 02-30-04	Provizorní mlátová cesta Strojnická				
SO 03-30-01	Úprava komunikací Praha-Výstaviště				
SO 03-30-01.1	Úprava komunikací Praha-Výstaviště, opěrné zdi				
SO 03-30-01.2	Úprava komunikací Praha-Výstaviště, dělicí stěna				
SO 03-30-02	Chodníky Praha-Výstaviště				
SO 03-30-03	Chodníky Stromovka				
SO 91-83-01	Kácení zeleně				
SO 91-83-02	Sadové úpravy				
SO 91-83-02.1	ŽST Praha-Bubny, sadové úpravy				
SO 91-83-02.2	Zast. Praha-Výstaviště, sadové úpravy				
SO 01-40-01	Praha - Bubny, sdružené kabelové trasy				
SO 02-40-01	TU Praha - Bubny - Praha - Výstaviště, sdružené kabelové trasy				
SO 03-40-01	Praha - Výstaviště, sdružené kabelové trasy				
SO 52-40-01	TU Praha - Bubny - Stromovka, sdružené kabelové trasy				
SO 01-61-01.0	ŽST Praha-Bubny - stavební řešení				
SO 01-61-01.1	ŽST Praha-Bubny, doplňkové konstrukce a stavební výrobky				
SO 01-61-01.3	Praha-Bubny, vytápění a chlazení				
SO 01-61-01.4	ŽST Praha-Bubny, VZT				
SO 01-61-01.5	Praha-Bubny, ZTI				
SO 01-61-01.6	Praha-Bubny, vnitřní rozvody NN a osvětlení				
SO 01-61-01.7	Praha-Bubny, vnitřní rozvody slaboproud				
SO 01-61-01.8	Praha-Bubny, hromosvod a uzemnění				
SO 01-61-01.9	Praha-Bubny, MaR				
SO 01-62-01.0	ŽST Praha-Bubny, zastřešení, architektonicko - stavební řešení + konstrukční část				
SO 01-64-01	ŽST Praha-Bubny, orientační systém				
SO 01-65-01	Praha-Bubny, demolice				
SO 01-66-01	ŽST Praha-Bubny - drobná architektura				
SO 02-65-01	TU Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, demolice				
SO 02-66-01	Oplocení areálu Omnipol				
SO 02-66-02	Oplocení autobazaru				
SO 03-61-01.1	zast. Praha-Výstaviště, stavební řešení				
SO 03-61-01.2	zast. Praha-Výstaviště, konstrukční část				
SO 03-61-01.3	zast. Praha-Výstaviště, pomocné kece				
SO 03-61-01.4	zast. Praha-Výstaviště, VZT a chlazení				
SO 03-61-01.5	Praha-Výstaviště, ZTI				
SO 03-61-01.6	Praha-Výstaviště, vnitřní rozvody NN a osvětlení				
SO 03-61-01.8	Praha-Výstaviště, hromosvod a uzemnění				
SO 03-62-01	zast. Praha-Výstaviště, zastřešení				
SO 03-64-01	zast. Praha-Výstaviště, orientační systém				
SO 03-66-01	zast. Praha-Výstaviště - drobná architektura				
SO 01-71-01	Praha-Bubny, TV				
SO 01-71-02	Praha-Bubny, připojení SpS na TV				
SO 01-71-04.1	Praha-Bubny, atypické konstrukce TV, zárubní zeď u el. dělení				
SO 01-71-04.2	Praha-Bubny, atypické konstrukce TV, založení trakčního stožáru 12N				
SO 01-71-04.3	Praha-Bubny, atypické konstrukce TV, sdružené podpěry pro trakci a PHS				
SO 02-71-01	Praha-Bubny - Praha-Dejvice, příprava na elektrizaci				
SO 52-71-01	Praha-Bubny - Stromovka, TV				
SO 02-73-01.1	Spinací stanice Bubny, Architektonicko-stavební řešení				
SO 02-73-01.2	Spinací stanice Bubny, Stavebně-konstrukční řešení				
SO 02-73-01.4	SpS Bubny, VZT a chlazení				
SO 02-73-01.5	SpS Bubny, ZTI				
SO 02-73-01.6	SpS Bubny, vnitřní rozvody NN a osvětlení				
SO 02-73-01.8	SpS Bubny, hromosvod a uzemnění				
SO 01-74-01	ŽST Praha - Bubny, EOv				
SO 03-74-01	Zast. Praha - Výstaviště, EOv				
SO 01-76-01	Praha-Bubny, úprava veřejného rozvodu nn osvětlení				
SO 01-76-02	Zast. Praha-Výstaviště, přípojka nn pro výtahy a eskalátory				
SO 01-76-03	Praha-Bubny, osvětlení nástupišť				
SO 01-76-04	Praha-Bubny, dálkové ovládání úsekových odpojovačů				
SO 01-76-05	Praha-Bubny, světelná návěst				
SO 01-76-06	Praha-Bubny, přípojka nn pro BTS Bubny				
SO 02-76-01	Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, osvětlení na mostech				
SO 02-76-02	Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, magistralní rozvod 22kV				
SO 03-76-01	Zast. Praha-Výstaviště, přípojka nn pro výtahy a eskalátory				
SO 03-76-02	Praha-Výstaviště, osvětlení nástupišť				
SO 03-76-03	Praha-Výstaviště, přípojka nn pro BTS Stromovka				
SO 52-76-01	Praha-Holešovice - Praha-Bubny, kabelový rozvod vn 6kV 50Hz				
SO 01-77-01	Praha-Bubny, ukolejnění				
SO 52-77-01	Praha-Bubny - Stromovka, ukolejnění				
SO 01-78-81	Praha-Bubny, SpS 3kV-DC, vnější uzemnění				

PŘÍLOHA Č. 2

Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele

(Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek)

Oprávněné osoby Zhotovitele, včetně ředitele stavby dle čl. 5, odst. (1) bod g. směrnice SŽDC SM 105 Změny během výstavby

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ředitel stavby

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr)

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na železniční spodek

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████████████

Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████████████

Specialista (vedoucí prací) na silnoproud

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████████████

Specialista (vedoucí prací) na geotechniku

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████████████

Osoba odpovědná za kontrolu kvality

Jméno a příjmení	██████████████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████████████

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████████████

Osoba odpovědná za životní prostředí

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████████████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za odpadové hospodářství

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████████████████
Telefon	██████████

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za realizační dokumentaci zabezpečovacího zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████████████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za realizační dokumentaci sdělovacího zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████████████████
Telefon	██████████


PŘÍLOHA Č. 3


Seznam poddodavatelů


Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
BeMo Tunnelling GmbH se sídlem Bernhard-Höfel-Strasse 11, A-6020 Innsbruck, Rakousko DIČ: ATU31712901 člen koncernu Skupiny Metrostav https://www.skupinametrostav.cz/cs/clenove-koncernu	Práce na SO 01-20-02 Železniční most v km 0,450 SO 01-20-03 Železniční most v km 412,120 SO 02-20-01 Železniční most v km 0,900	■
Metrostav Slovakia a.s. se sídlem Mlynské Nivy 68, Bratislava 824 77, Slovenská republika IČO: 47144190 člen koncernu Skupiny Metrostav https://www.skupinametrostav.cz/cs/clenove-koncernu	Práce na E.2 Pozemní stavební objekty	■
S u b t e r r a a.s. se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 IČO: 453 09 612 člen koncernu Skupiny Metrostav https://www.skupinametrostav.cz/cs/clenove-koncernu	Strojní vybavení pro práce na železničním svršku	■
TOMI - REMONT a.s. se sídlem Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov IČO: 255 08 571 jako koncernový podnik v majetku OHLA ŽS, a.s.	Strojní vybavení pro práce na železničním svršku	■
AŽD Praha s.r.o. se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10 IČO: 480 29 483	D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.4 Ostatní technologická zařízení – výtahy a eskalátory	■

Harmonogram postupu prací



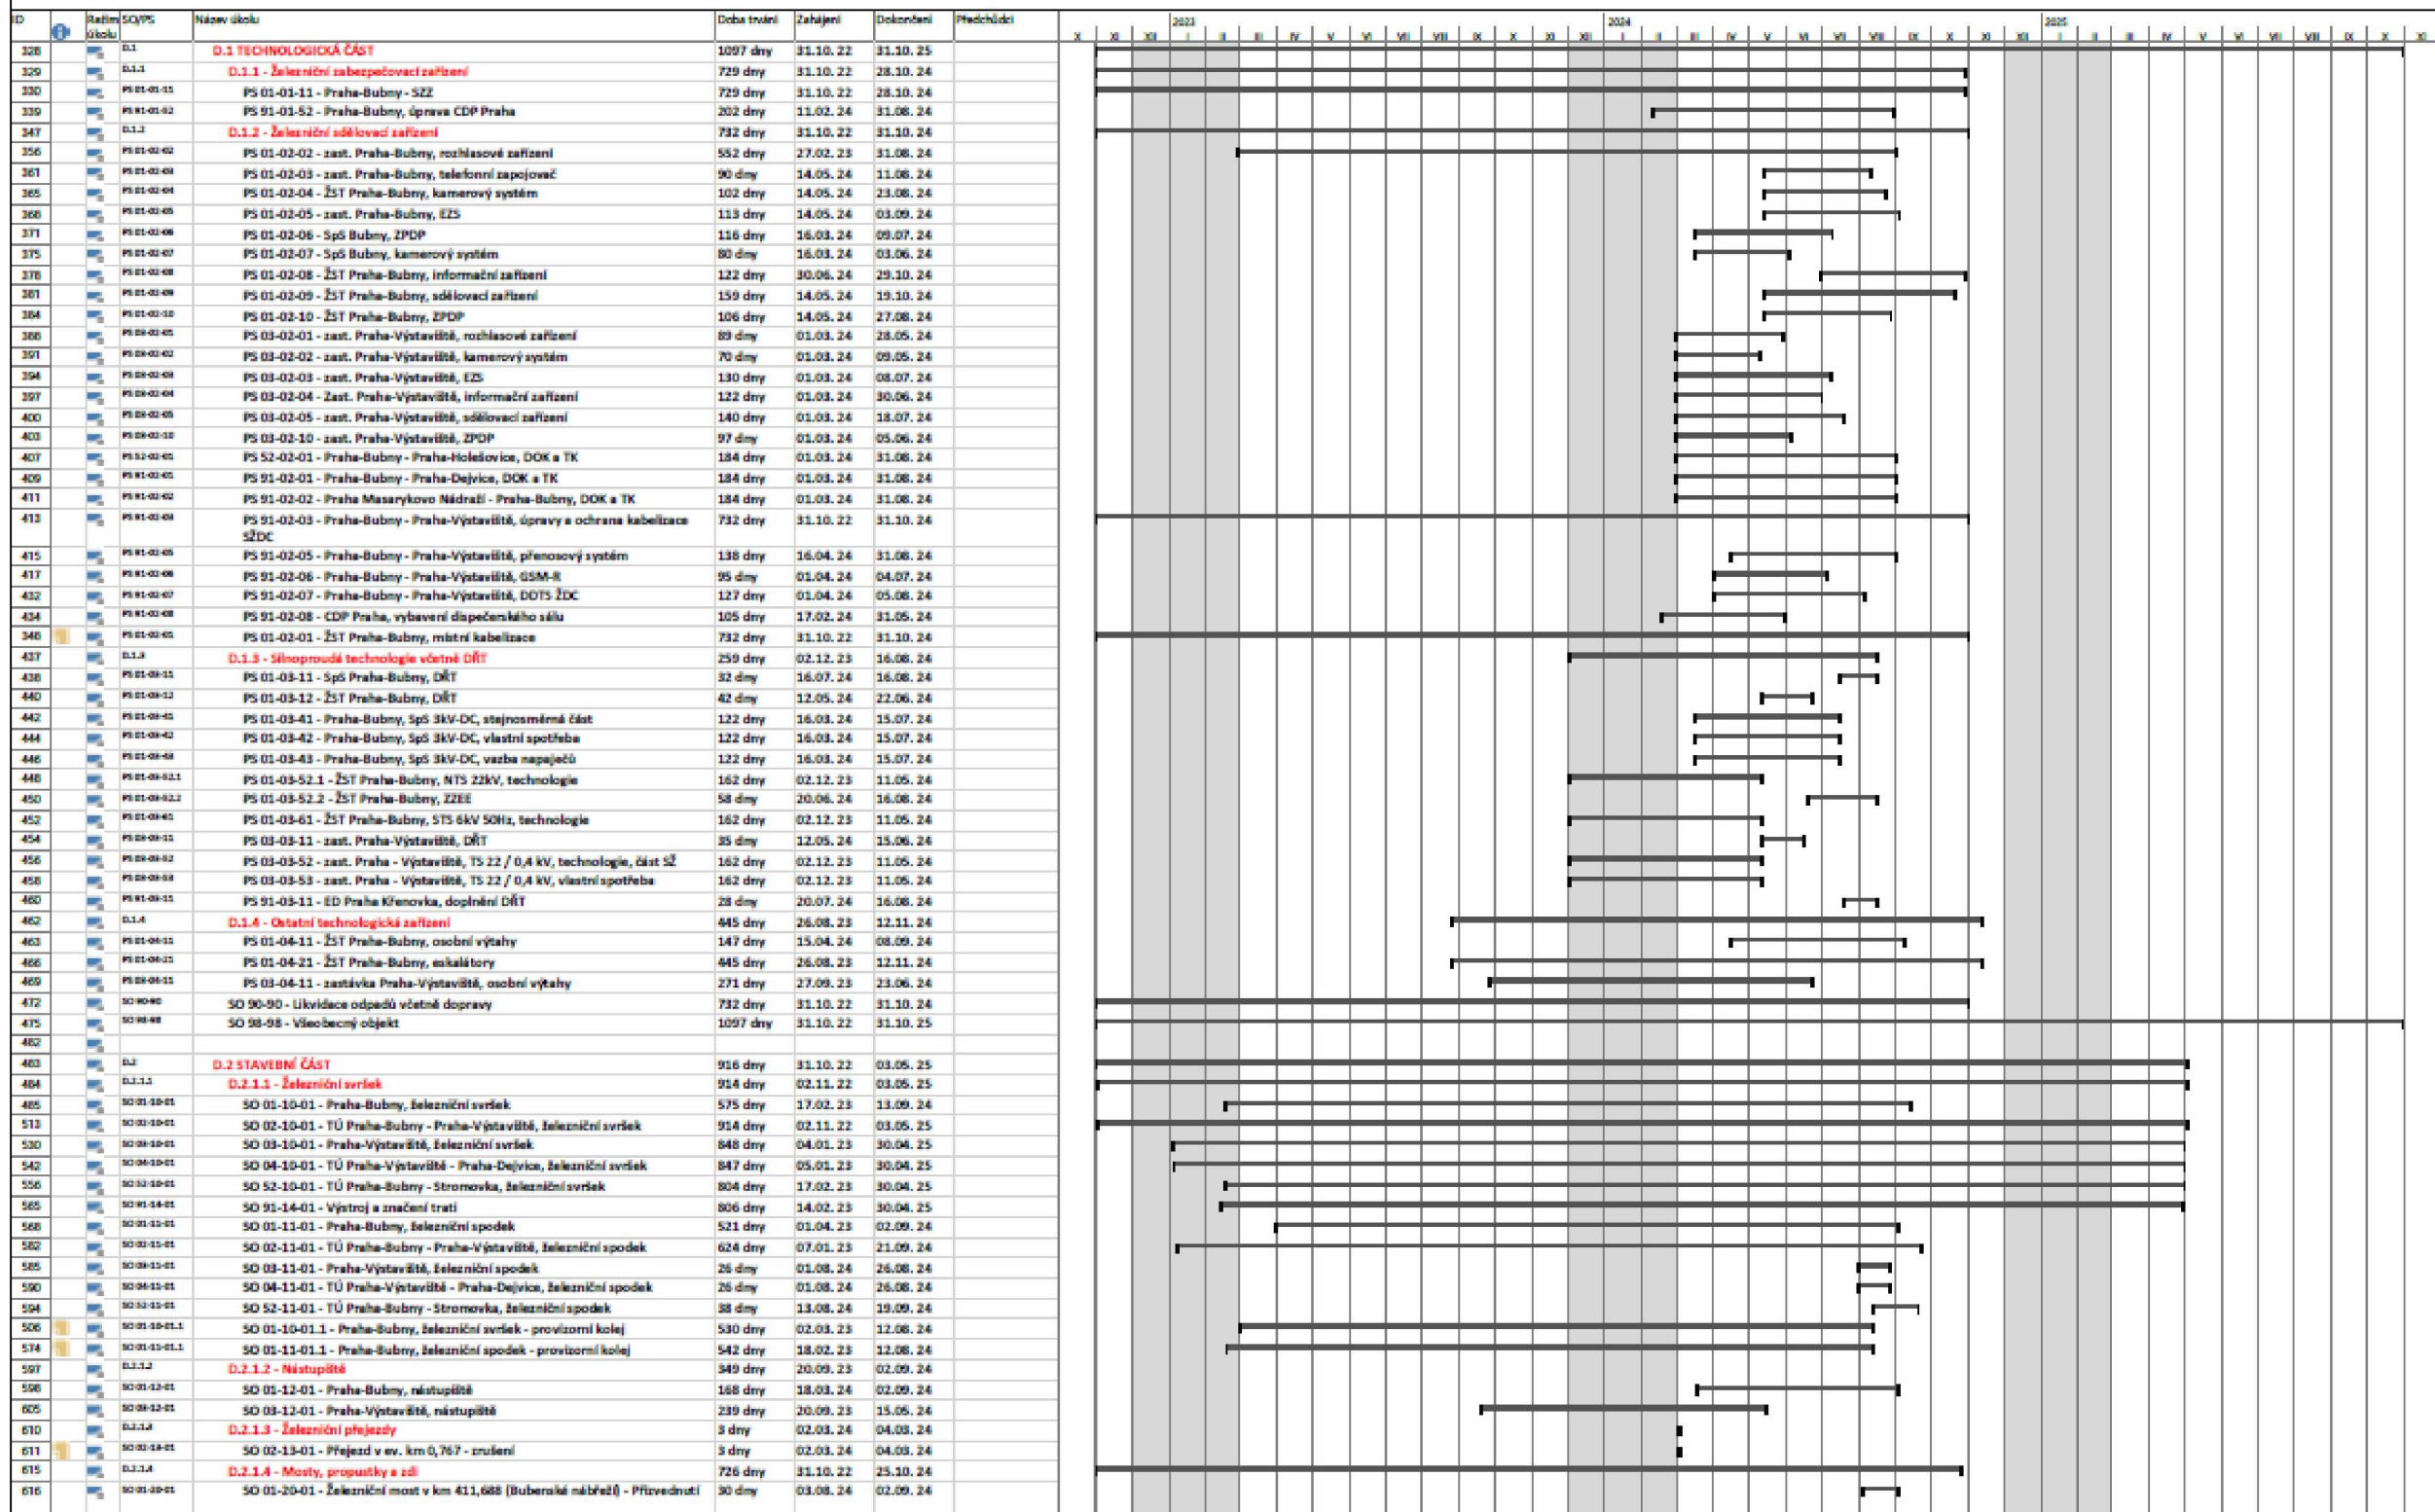

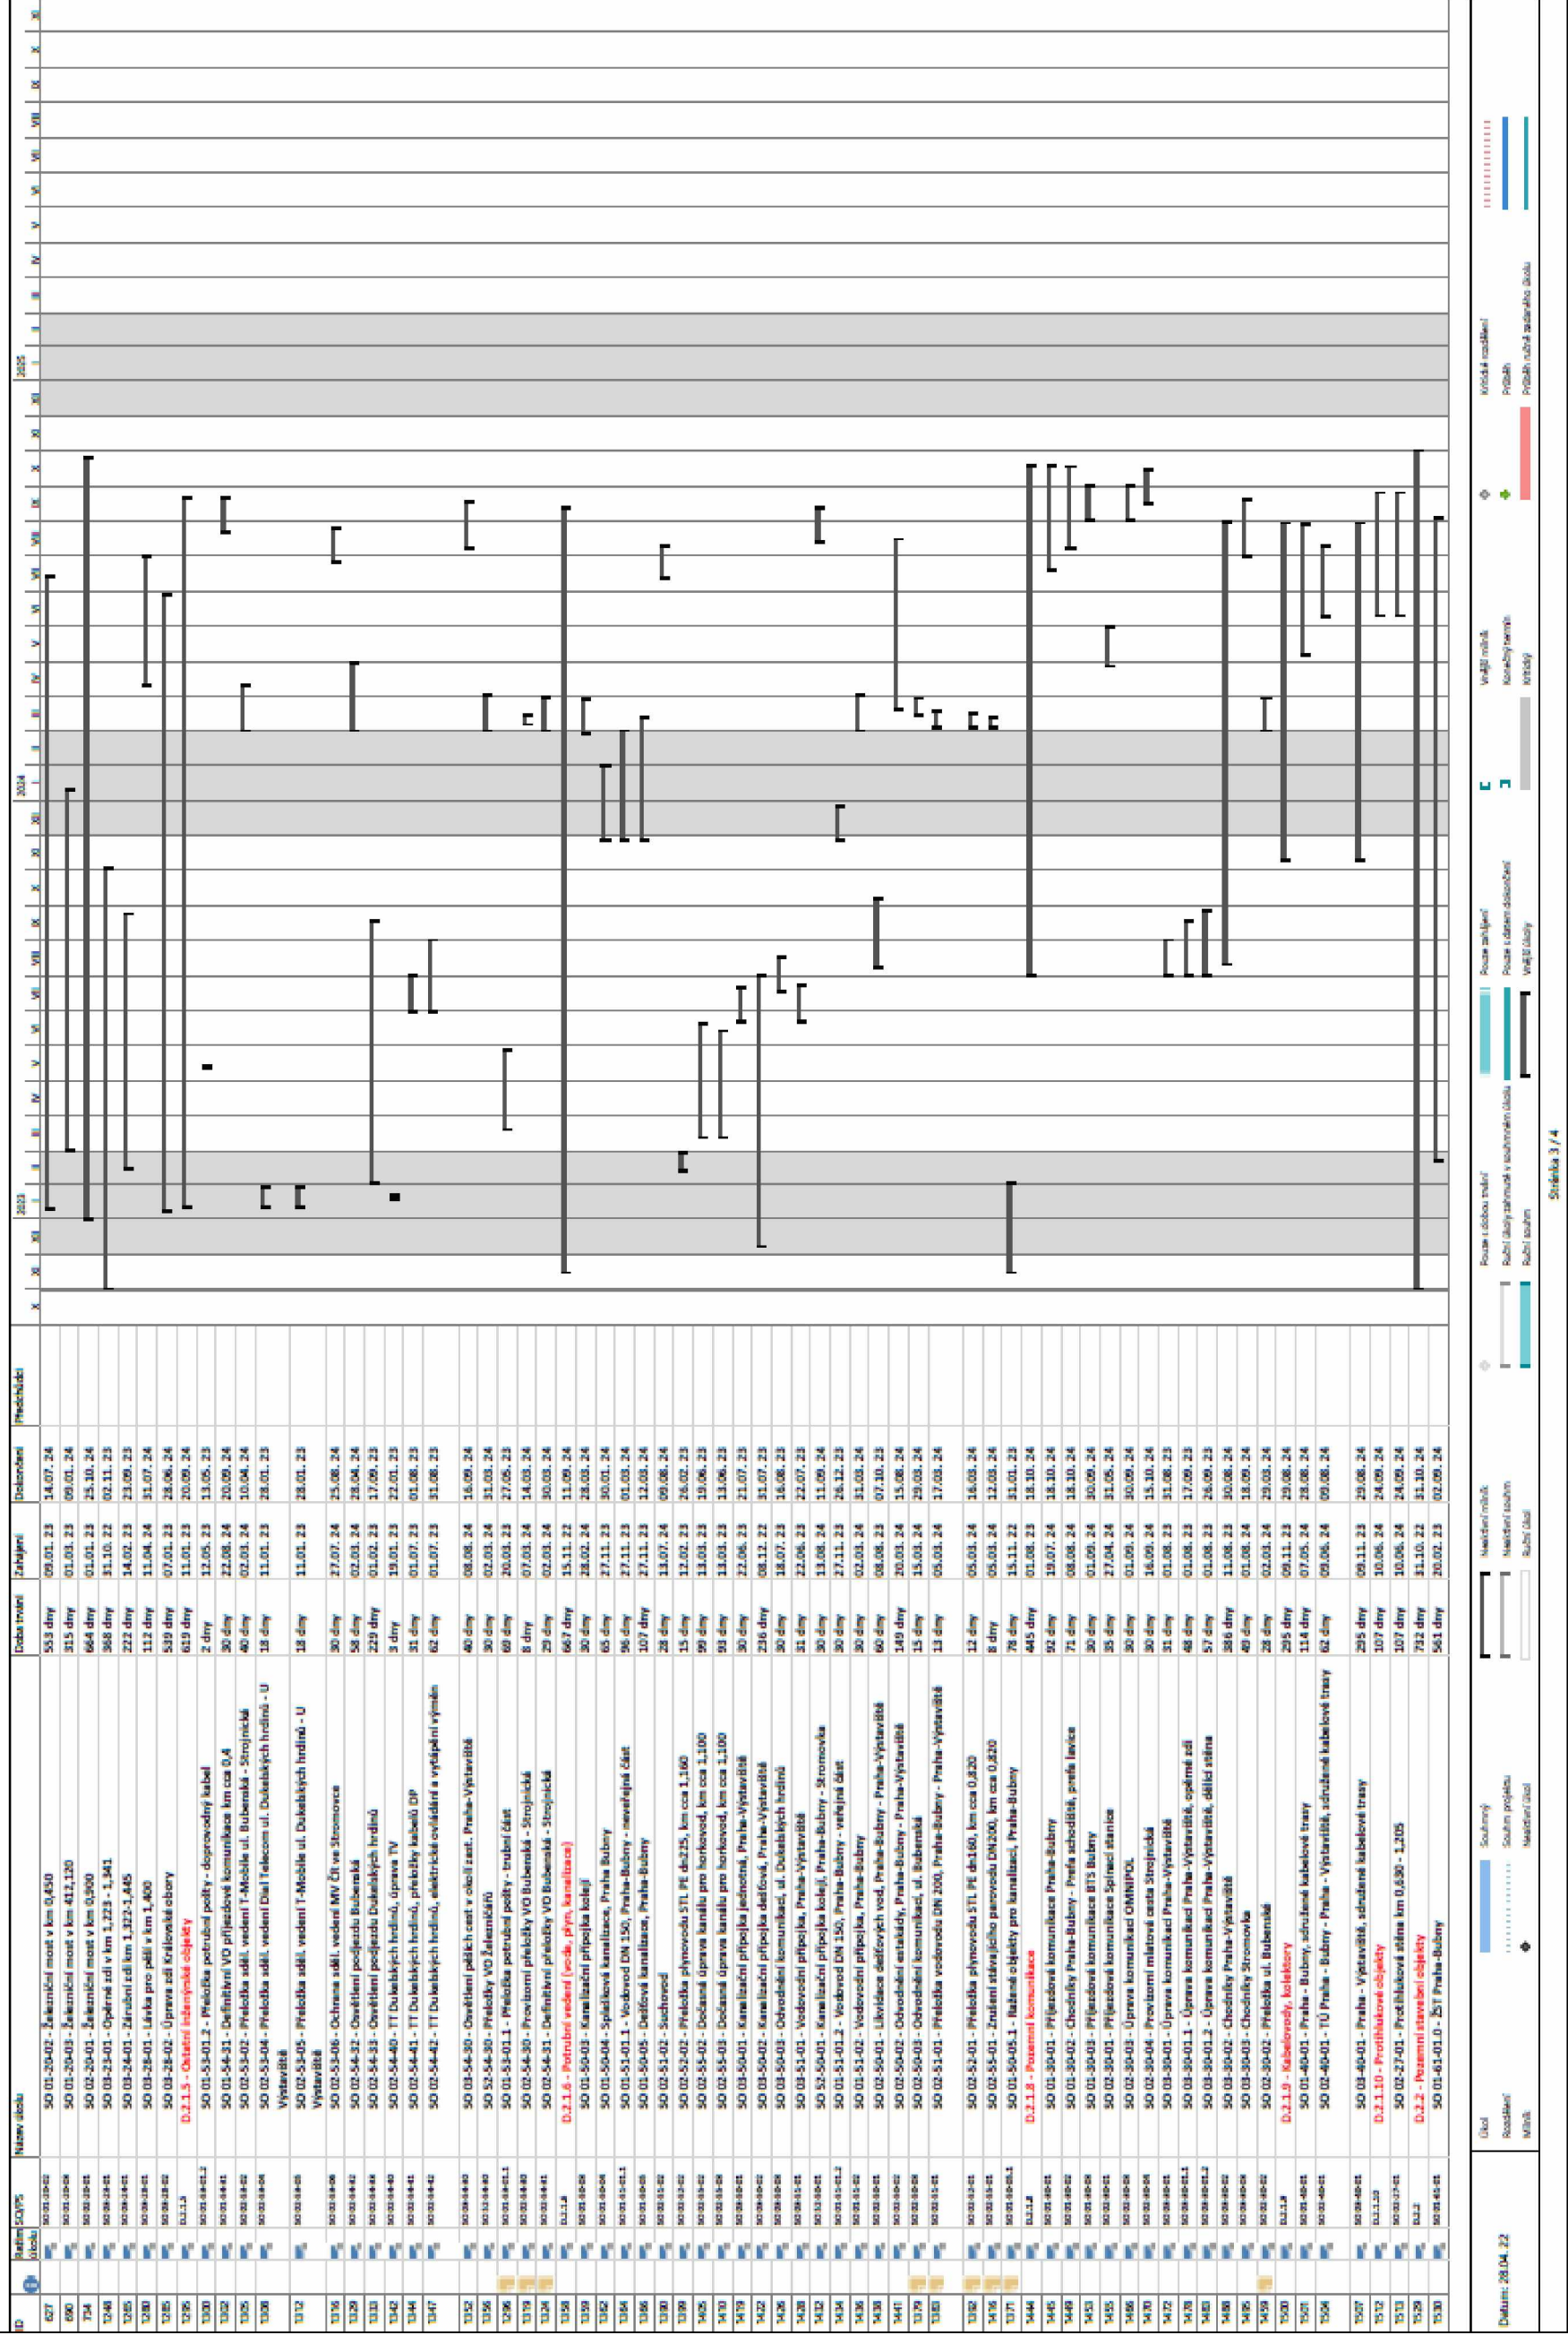



PŘÍLOHA Č. 5

Smlouva o zpracování osobních údajů

1. Předmět smlouvy o zpracování osobních údajů

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran za účelem zajištění uzavření smluv uvedených ve Všeobecných technických podmínkách, a to za splnění podmínek dále uvedených.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat předmětné osobní údaje výhradně za uvedeným účelem a na základě doložených pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi, jak vyplývají z této Smlouvy o zpracování osobních údajů a z této Smlouvy o dílo.

2. Rozsah zpracovávaných údajů

- 2.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v v čl.4 Všeobecných technických podmínek na zhotovení stavby.
- 2.2 Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném bodě 2.1, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

3. Povinnosti Zhotovitele

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Správci.
- 3.2 Zhotovitel bude neprodleně informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru některé pokyny Objednatele v rozporu s platnou právní úpravou.
- 3.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává v souladu se Smlouvou o zpracování osobních údajů, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
- 3.4 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.
- 3.5 Zhotovitel může do zpracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem.
- 3.6 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.
- 3.7 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovávaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.

- 3.8 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě během běžné pracovní doby Zhotovitele provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy o zpracování osobních údajů, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.
- 3.9 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o zpracování osobních údajů je Zhotovitel povinen vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchovávání je v souladu s platnou právní úpravou nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.

4. Odpovědnost Zhotovitele a smluvní pokuta

- 4.1 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování Zhotovitel za „zpracovatele“ ve smyslu GDPR. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený Smlouvou o zpracování osobních údajů nebo doloženými pokyny Objednatele vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit.
- 4.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zaslané Objednatelem na základě tohoto ustanovení.
- 4.3 Zaplacením smluvní pokuty, jak je popsána v odstavci výše, není dotčeno právo Objednatele požadovat náhradu újmy způsobené porušením ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů.

PŘÍLOHA Č. 7

Zmocnění Vedoucího zhotovitele a Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo

Společenská smlouva

na zakázku „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“

č. smlouvy OHLA ŽS, a.s.: SDR00200191

č. smlouvy Elektrizace železnic Praha a.s.: 19/21-OZ/OS

I. Společníci

1. Metrostav TBR a.s.

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 098 84 572

DIČ: CZ09884572

Zastoupená: Ing. Aleš Gothard, předseda představenstva a

Ing. Roman Fuksa, člen představenstva

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 26059 (dále jen „Vedoucí společník“ nebo „Společník“)

a

2. OHLA ŽS, a.s.

Sídlo: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČ: 463 42 796

DIČ: CZ46342796

Zastoupená: Ing. Roman Kocůrek, 1. místopředseda představenstva

Jiří Procházka, MBA, člen představenstva

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695 (dále jen „Společník“)

a

3. Elektrizace železnic Praha a.s.

Sídlo: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČ: 471 15 921

DIČ: CZ47115921

Zastoupená: Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva

Ing. Martin Janovský, místopředseda představenstva

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1809 (dále jen „Společník“)

(Vedoucí společník a Společníci dále společně jen „společníci“ nebo „strany“ a každý z nich jednotlivě jako „společník“ nebo „strana“) uzavřeli podle ustanovení §2716 a násl. zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto

společenskou smlouvu:

II. Název a sídlo Společnosti

1. Společnost bude vykonávat činnost pod názvem:

„TBR + OHLA + EŽ – BUBNY“

(dále jen „Společnost“).

2. Sídlem a doručovací adresou Společnosti je Metrostav TBR a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8.

III. Účel Společnosti, doba jejího trvání a podmínky činnosti

1. Společnost se zakládá za účelem přípravy a podání společné nabídky na realizaci veřejné zakázky na zhotovení stavby „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne 18.11.2021 pod evidenčním číslem zakázky Z2021-042493, (dále jen „Zakázka“ a „zadávací řízení“). V případě výběru a vyhodnocení společné nabídky společníků jako nejvhodnější a uzavření smlouvy o dílo s Objednatelem se Společnost zakládá rovněž za účelem vlastního provedení Zakázkou specifikovaného díla a splnění dalších povinností a závazků plynoucích z uzavřené smlouvy o dílo s Objednatelem (dále jen „Smlouva o dílo“). Zadavatelem předmětného zadávacího řízení je „Správa železnic, státní organizace“, IČ: 70994234 (dále jen „Zadavatel“ nebo i „Objednatel“, „Objednatelem“ se pro účely této smlouvy rozumí i jakýkoliv jeho zástupce, včetně Správce stavby).
2. Společnost se zakládá na dobu určitou, tj. ode dne podpisu této smlouvy do splnění účelu, pro který byla založena. Společnost trvá po celou dobu plnění předmětu veřejné Zakázky v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo s Objednatelem a nezanikne dříve, než budou současně splněny:
 - a. všechny závazky společníků vyplývající ze záručních lhůt a odpovědnosti za vady stanovené Smlouvou o dílo s Objednatelem,
 - b. oprávněné nároky Objednatele,
 - c. nároky na vypořádání majetku a všech závazků mezi společníky,nebude-li dále dohodnuto jinak.
3. Společnost dále zaniká, pokud:
 - a) předmětné zadávací řízení bude zrušeno,
 - b) s jinou osobou, než společníky bude uzavřena smlouva o dílo na realizaci Zakázky,
 - c) nastanou jiné důvody stanovené v občanském zákoníku.

a zároveň se společníci rozhodnou neuplatňovat revizní a přezkumné postupy dle zákona o zadávání veřejných zakázek.
4. Založená Společnost není samostatnou právnickou osobou a jako taková nemá právní osobnost (způsobilost k právům a povinnostem) a nezapisuje se do obchodního rejstříku nebo jiné evidence právnických osob. Společnost není samostatnou účetní jednotkou, ani plátcem daně z příjmů. Touto jednotkou a plátcem je každý ze společníků sám.

IV. Vedoucí společník a zastupování společníků

1. Vedoucím společníkem (Vedoucím zhotovitelem ve smyslu Smlouvy o dílo) pověřeným správou Společnosti je Metrostav TBR a.s.
2. Touto smlouvou je Vedoucí společník všemi ostatními společníky pověřen a zmocněn k jejich samostatnému i společnému zastupování, konkrétně k činění všech hmotněprávních jednání a procesněprávních úkonů, k nimž by byli jako správci společnosti a Vedoucí zhotovitelé oprávněni rovněž, zejména pak:
 - a. k zpracování nabídky ve smyslu zadávací dokumentace a podmínek zadávacího řízení, k podpisu všech kvalifikačních dokladů, prohlášení a jiných dokumentů dle požadavků Zadavatele;
 - b. k podpisu a podání nabídky (včetně podpisu návrhu Smlouvy o dílo) na realizaci Zakázky po jejím předchozím projednání a odsouhlasení statutárním orgánem každého ze společníků či jejich zmocněným zástupcem;
 - c. k jednání o uzavření Smlouvy o dílo mezi Objednatelem a společníky, avšak vždy pouze po předchozím projednání předmětů těchto jednání s ostatními společníky; Smlouva o dílo a její dodatky bude podepsána všemi společníky;
 - d. k přijímání pokynů týkajících se účasti v zadávacím řízení;

- e. k uplatňování revizních a přezkumných postupů dle zákona o zadávání veřejných zakázek, avšak vždy pouze po předchozím projednání a odsouhlasení s ostatními společníky;
- f. k přijímání pokynů od Objednatele pro a za každého společníka a všechny společníky;
- g. po uzavření Smlouvy o dílo mezi Objednatelem a společníky k zastupování Společnosti ve všech věcech týkajících se realizace díla, avšak vždy pouze po předchozím projednání a odsouhlasení s dotčeným společníkem; bude oprávněn a povinen účtovat platby Objednateli a přijímat platby od Objednatele;
- h. k zabezpečení komunikace a poskytování vyjádření vůči veřejnoprávním sdělovacím prostředkům, avšak vždy pouze po předchozím projednání a odsouhlasení s ostatními společníky; a
- i. k výkonu funkce správce Společnosti, Vedoucí společník spravuje majetkové hodnoty do Společnosti vložené a majetek získaný při výkonu společné činnosti.

Výše uvedené zmocnění Vedoucího společníka je určeno po celou dobu trvání účasti Společnosti v zadávacím řízení, resp. při plnění Smlouvy o dílo. Případná změna Vedoucího společníka musí být oznámena Zadavateli spolu se sdělením souhlasu ostatních společníků.

Při výkonu svého oprávnění dle výše uvedeného zmocnění se Vedoucí společník zavazuje uplatňovat vůči Objednateli nároky vyplývající ze Smlouvy o dílo a současně se zavazuje činit nezbytná právní i faktická jednání nutná k zachování či ochraně práv každého ze společníků jak vůči Objednateli, tak i vůči jiným třetím osobám. Každý společník je povinen poskytnout Vedoucímu společníkovi za tímto účelem nezbytnou součinnost. V případě, že společník Vedoucímu společníkovi tuto součinnost neposkytne, není Vedoucí společník odpovědný za případnou škodu, která tímto uvedenému společníkovi vznikne.

Budou-li se právní jednání a úkony Vedoucího společníka týkat jiného společníka, podléhá toto právní jednání či úkon předchozímu schválení dotčeného společníka, resp. dotčených společníků. Žádost o schválení a vlastní schválení je možné poskytnout formou e-mailové zprávy. Společník nebude své stanovisko k žádosti Vedoucího společníka o schválení bezdůvodně zdržovat.

3. Společníci si vyhrazují právo na založení orgánů Společnosti. Případné orgány včetně jejich personálního složení a způsobu výkonu jejich činnosti budou po dohodě společníků ustanoveny po podpisu Smlouvy o dílo s Objednatelem formou dodatku či dodatků k této smlouvě (Stanov Společnosti) v termínu dle článku V., odst. 2. této smlouvy.

Společníci jsou povinni poskytovat Vedoucímu společníkovi veškerou součinnost, zejména jsou povinni se účastnit jím svolaných jednání a vyjadřovat se včas k jeho návrhům či požadavkům.

4. Vedoucí společník se zavazuje, že do 3 pracovních dnů po podání nabídky na Zakázku předá ostatním společníkům kompletní kopii nabídky v digitální formě.

V. Dělbá práce mezi společníky

1. Jednotliví společníci zajistí realizaci díla a všech dalších závazků zhotovitele dle uzavřené Smlouvy o dílo s Objednatelem. Společníci se zavazují poskytnout za účelem splnění účelu Společnosti své vklady, a to zejména: výkony prací, finanční příspěvky, jistoty, stroje, zařízení, materiál a personál v tomto poměru:

Metrostav TBR a.s.	■■■■
OH LA ŽS, a.s.	■■■■
Elektrizace železnic Praha a.s.	■■■■

V Praze

Za Metrostav TBR a.s.:

[REDACTED]
[REDACTED]

Ing. Aleš Gothard
předseda představenstva

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Ing. Roman Fuksa
člen představenstva

Za OHLA ŽS, a.s.:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Ing. Roman Kocůrek
1. [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] 0'

Jiří Procházka, MBA
člen představenstva

Za Elektrizace železnic Praha a.s.:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva

PŘÍLOHA Č. 9

Žádost o poskytnutí zálohové platby

V souladu s ustanovením pod-článku 14.2 Smluvních podmínek ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „**Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)**“ žádáme o poskytnutí zálohové platby na finanční plnění výši: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] Kč.

Záloha bude využita na pokrytí nákladů stavebních prací a dodávek materiálů v souladu s výše uvedenou Smlouvou o dílo v období: MM/RR – MM/RR [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] včetně.

Součástí této žádosti je:

- aktuální Správcem stavby písemně potvrzený finanční harmonogram stavby (smluvní hodnota prací předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle podrobného Harmonogramu Pod-článek 8.3 Smluvních podmínek), do kterého je v souladu s výše uvedenými údaji promítnuto plánované využití zálohové faktury na krytí nákladů Díla, zajišťující vypořádání zálohové faktury v předepsaném období, které musí korespondovat s věcným plněním Díla.
- zálohová faktura č. [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

V dne

.....

Zhotovitel

PŘÍLOHA Č. 11

Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací
č.j. [●]

Název zakázky:	
Číslo smlouvy Správy železnic (CES):	
Objednatel:	
Datum zahájení prací:	
Datum dokončení prací (stavebních nebo technologických):	
Uvedení poslední části stavby do zkušebního provozu:	
Datum dokončení díla (vč. dokumentace):	
Konečná cena díla celkem v Kč:	

Zhotovitel díla (název dle SOD)	
Správce/vedoucí společník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení):	
Další společník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení):	
Další společník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení):	
Další společník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení):	
Další společník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení):	

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS např. popis vykonaných činností nebo dodávek)	Hodnota poddodávky v % ze smluvní ceny díla a konkrétní částka v Kč

Rozsah prací: (dle předmětu díla / předmětu plnění VZ)	
Charakter prací (oprava/údržba/modernizace/rekonstrukce/novostavba)	
Délka traťového úseku* (v km)	
Dílo probíhalo na trati* jednokolejné / vícekolejné	
Dílo probíhalo na trati* elektrifikované / neelektrifikované	
Dílo probíhalo na trati* širé (mezistaniční úsek)/ ve stanici	
Stavební práce zahrnovaly práce na železničním svršku (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a délku traťového úseku, v případě železniční stanice počet výhybek)	
Stavební práce zahrnovaly práce na železničním spodku (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a délku)	
Stavební práce zahrnovaly práce na železničním mostním objektu (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a délku mostního objektů/mostních objektů, případně jinou specifikaci)	
Stavební práce zahrnovaly práce na trakčním vedení (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a délku traťového úseku)	
Stavební práce zahrnovaly práce na zabezpečovacím zařízení (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a délku traťového úseku, v případě železniční stanice počet výhybek)	
Stavební práce zahrnovaly práce na sdělovacím zařízení (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a délku traťového úseku)	
Stavební práce zahrnovaly práce na silnoproudých zařízeních (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč)	
Stavební práce zahrnovaly práce na tunelové stavbě (ANO/NE, v případě ANO uvést délku tunelu)	
Stavební práce zahrnovaly práce na pozemní stavbě (ANO/NE, v případě ANO uvést typ objektu – budova osobního nádraží, technologická budova apod.)	
Stavební práce zahrnovaly práce na stavbě s památkovou ochranou (ANO/NE, v případě ANO uvést druh objektu a hodnotu Kč)	

SOD obsahovala vyhrazené plnění realizované vlastní kapacitou (ANO/NE, v případě ANO uvést níže uvedené podrobnosti):	
Popis vyhrazeného plnění dle SOD (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO):	
Zhotovitel vyhrazeného plnění:	
Hodnota vyhrazeného plnění v Kč:	

	Obchodní firma	Hodnota prováděných prací v Kč (bez DPH)
Správce/vedoucí společník (v případě, kdy se jedná o společnost – dříve sdružení):		
Další společník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení):		
Další společník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení):		
Další společník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení):		
Další společník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení):		
Celkem v Kč	xxx	

Hodnocení objednatele:	Správa železnic osvědčuje, že stavební práce uvedené v tomto osvědčení byly řádně poskytnuty a dokončeny.
-------------------------------	---

Kontaktní osoba:	
-------------------------	--

Jméno a příjmení vystavitele (viz poznámka 1)	
Funkce:	
Podpis vystavitele	
Datum vystavení osvědčení	

** Je-li vzhledem k charakteru stavby relevantní.*

Poznámka 1: Osvědčení je za Správu železnic oprávněna potvrdit (podepsat) výhradně osoba, která za Správu železnic smlouvu, na základě které bylo plněno, podepisovala (uzavírala). V případě, kdy smlouva byla za Správu železnic uzavřena ředitelem odboru či náměstkem GŘ, je možné Osvědčení potvrdit (podepsat) ředitelem organizační jednotky, do jejíž gesce kontrola plnění díla spadá/náleží.

Poznámka 2: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací je vyhotovováno výhradně v jednom znění platném pro všechny zhotovitele/společníky/poddodavatele. Tzn. Osvědčení se nevyhotovuje pro každého ze zhotovitelů/společníků/poddodavatelů zvlášť.

Poznámka 3: Všechny částky v Kč se uvedou v hodnotě bez DPH.
