

SMLOUVA O SPOLEČNÉM ZADÁVÁNÍ

(dále též jen „smlouva“)

uzavřená ve smyslu ustanovení § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

1.

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj**
zastoupený:

adresa: Kydlínovská 245, 50301 Hradec Králové
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

adresa: Haškova 357, 500 02 Hradec Králové

tel.:

e-mail:

ID DS:

IČO:

DIČ:

(dále jen „účastník č. 1“)

z49per3

01312774

není plátcem DPH

a

2.

Česká republika – Ředitelství silnic a dálnic ČR

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

tel.:

e-mail:

ID DS:

IČO:

DIČ:

(dále jen „účastník č. 2“)

zjq4rhz

65993390

CZ65993390

I.

Účel smlouvy

1. Smluvní strany této smlouvy, jakožto veřejní zadavatelé podle § 4 ZZVZ, se touto smlouvou sdružují podle § 7 odst. 1 ZZVZ do sdružení zadavatelů (dále jen „sdružení zadavatelů“) za účelem společného zadávání veřejných zakázek s názvy:

„R 157 – Cesty C1, C6 v k.ú. Osice“

„R 187 - Izolační zeleň, BK v k.ú. Sedlice u Hradce Králové“

Cílem zadávacího či výběrového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele na zhotovení realizace polních cest a samostatné výsadby interakčních prvků a biokoridorů, včetně uzavření příslušných smluv, a to za podmínek specifikovaných dále v této smlouvě.

Součástí budou i samostatné VZMR pro výše uvedené realizace na záchranný archeologický dohled případně archeologický výzkum a technický dozor stavby..

„TDS pro R 157 – Cesty C1, C6 v k.ú. Osice“

„ZAV pro R 157 – Cesty C1, C6 v k.ú. Osice a R 187 - Izolační zeleň, BK v k.ú. Sedlice u Hradce Králové“

2. K dosažení účelu uvedeného v odst. 1 tohoto článku smlouvy se smluvní strany zavazují vzájemně spolupracovat podle pravidel stanovených touto smlouvou a příslušnými právními předpisy.

II.

Specifikace zadávaných veřejných zakázek

1. Předmětem veřejných zakázek je realizace polních cest a samostatné výsadby interakčních prvků a biokoridorů, dále s tím spojené veřejné zakázky na záchranný archeologický dohled případně archeologický výzkum a technický dozor stavby.

Specifikace společných zařízení:

- 1.1. U stavby účelových komunikací – polních cest s názvem R 157 – C1, C6 v k.ú. Osice, realizovaných na základě komplexních pozemkových úprav v k.ú. Osice a schváleného plánu společných zařízení, se jedná o zakázku hrazenou ze 100% Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle zpracovaných Studií obvodu dálnice D11 (úsek 1105).

Název stavby: **R 157 – Cesty C1, C6 v k.ú. Osice**

Projektová dokumentace, zpracovaná firmou Agroprojekce Litomyšl, spol. s r. o., zak. č. 034 30/20, člení stavbu na 2 samostatné stavební objekty - SO - 101 - Cesta C1 a SO - 102 - Cesta C6.

Cesta C1 – kategorie P 6,0/30, délka 1 381,87 m, šířka cesty : vozovka 5,5 m + 2 x 0,25 m zpevněné krajnice, povrch asphaltobeton, součástí jsou sjezdy na pozemky, propusti, výhybny, odvodnění, dopravní značení atd., viz zpracovaná PD.

Cesta C6 – kategorie P 4,5/30, délka 617,60 m, šířka cesty : vozovka 4,0 m + 2 x 0,25 m zpevněné krajnice, povrch penetrační makadam, součástí jsou sjezdy na pozemky, propusti, výhybny, odvodnění, dopravní značení atd., viz zpracovaná PD.

Na tuto stavbu bylo vydáno Magistrátem města Hradec Králové, odborem stavebním dne 5.1.2022 Rozhodnutí - stavební povolení č.j. MMHK/004020/2022 ST1/Kor, SZ MMHK/029503/2021 ST1/Kor, které nabylo právní moci 9.2.2022.

Dle rozpočtů URS (CÚ 01/2023) činí celkové náklady na realizaci stavby dle soupisu prací stavby R 157 – Cesty C1, C6 v k.ú. Osice částku 24 013 808,70 Kč bez DPH, 29 056 708,53 Kč vč. DPH. (Účastník č. 1 toto již nechal u projektanta přecenit na platnou cenovou úroveň).

PD a AD této stavby R 157 – Cesty C1, C6 v k.ú. Osice byly zpracovány na základě Smlouvy o společném postupu směřujícím k zadávání veřejných zakázek čj. SPU 012168/2016 (23248/21/16-21500-Tal), uzavřené dne 25.2.2016.

Po realizaci díla a vydání kolaudačního souhlasu bude stavba majetkově protokolárně převedena jejímu budoucímu vlastníkov – Obci Osice, která se bude následně o dílo řádně starat.

- 1.2. U společného zařízení s názvem R 187 - Izolační zeleň, BK v k.ú. Sedlice u Hradce Králové, realizovaného na základě komplexních pozemkových úprav v k.ú. Sedlice u Hradce Králové a schváleného plánu společných zařízení, se jedná o zakázku hrazenou ze 100% Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle zpracovaných Studií obvodu dálnice D11 (úsek 1105).

Název: R 187 - Izolační zeleň, biokoridory v k.ú. Sedlice u Hradce Králové

Projektová dokumentace je zpracována firmou Zahrady pro radost s.r.o., 08/2020. jedná se o výsadby izolační zeleně a biokoridorů, jež jsou v PD členěny na 4 samostatné objekty:

SO 101 – Izolační zeleň IP

SO 102 – BK 147B

SO 103 – BK 142G

SO 104 – Výsadba biokoridoru (část z BC/44)

SO 105 - Následná péče o zeleň v průběhu 1. roku od výsadby

SO 106 - Následná péče o zeleň v průběhu 2. roku od výsadby

SO 107 - Následná péče o zeleň v průběhu 3. roku od výsadby

Jedná se o výsadbu zeleně v k.ú. Sedlice u Hradce Králové na ploše 1,9815 ha, celkem 1 589 ks stromů a 3 149 keřů. Druhová skladba stromů a keřů – viz zpracovaná PD. Součástí je geodet. vytyčení, výstavby 4 samostatných oplocenek okolo celé výsadby jednotlivých stavebních objektů, vč. vjezdových bran, kůly, zamulčování, zálivka, osetí travní směsí atd. – viz bližší specifikace v zpracované PD. Zhotovitel bude provádět následnou péči o zeleň v 1. – 3. roce od výsadeb. Po realizaci díla a provedení 3. leté následné péče o zeleň bude celé dílo R 187 - Izolační zeleň, BK v k.ú. Sedlice u Hradce Králové protokolárním zápisem předáno jejímu budoucímu vlastníkov – Obci Praskačka. Obec Praskačka následně o dílo bude pečovat s péčí řádného hospodáře.

Č.j. účastníka č. 1: SPU 004632/2023

Č.j. účastníka č. 2: RSD-8936/2023-1

Dle rozpočtů URS (CÚ 02/2022) činí celkové náklady na výsadby a 3. letou následnou péči celkem 4 341 869,32 Kč bez DPH, 5 253 661,88 Kč vč. DPH. (Účastník č. 1 toto již nechal u projektanta přecenit na platnou cenovou úroveň).

Zhotovitel díla bude předkládat faktury postupně:

1. Faktura – realizace výsadeb vč. VRN
2. Faktura – za provádění následné péče v 1. roce po výsadbách
3. Faktura – za provádění následné péče v 2. roce po výsadbách
4. Faktura – za provádění následné péče v 3. roce po výsadbách

PD a AD výsadeb s názvem R 187 - Izolační zeleň, biokoridory v k.ú. Sedlice u Hradce Králové byly zpracovány na základě Smlouvy o společném postupu směřujícím k zadávání veřejných zakázek čj. SPU 012168/2016 (23248/21/16-21500-Tal) uzavřené dne 25.2.2016.

5. Účastník č. 2 ponese a bude hradit 100 % nákladů v rozsahu skutečných nákladů a provedení dle uzavřených smluv se zhotoviteli, a to na základě samostatných faktur vystavovaných jednotlivými zhotoviteli.

III.

Jednání za sdružení

1. Účastníci této smlouvy se dohodli, že k administrativnímu jednání a k úkonům souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky, není-li dále v této smlouvě uvedeno jinak, je za sdružení zadavatelů podle této smlouvy pověřen jednat:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj**
zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat
(dále jen „zástupce sdružení“)

Zástupce sdružení je dále oprávněn za sdružení zadavatelů právně jednat vůči orgánu dohledu při případném přezkumném řízení vztahujícím se k veřejné zakázce podle této smlouvy.

Účastník č. 1 prostřednictvím svých organizačních jednotek v rámci jejich územní působnosti dle jednotlivých katastrálních území je dále oprávněn za sdružení zadavatelů dle této smlouvy jednat a činit veškeré právní úkony vůči orgánu dohledu při případném přezkumném řízení vztahujícím se k veřejným zakázkám podle této smlouvy.

Účastník č. 1 prostřednictvím svých organizačních jednotek nese odpovědnost za jednání a úkony související se zadáváním veřejných zakázek dle vnitřních předpisů SPÚ a ZZVZ.“

2. Zástupce sdružení nese odpovědnost za čínění jednotlivých úkonů v rámci zadávacího/výběrového řízení dle ZZVZ a dle vnitřních předpisů SPÚ pro zadávání veřejných zakázek a dle příslušných částí ZZVZ; tím však není dotčeno jeho právo na náhradu škody vůči

účastníkovi smlouvy, který svým zaviněným jednáním porušil povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy.

IV.

Povinnosti smluvních stran

1. Zástupce sdružení je povinen zejména:

- a) zajistit přípravu a zpracování zadávací dokumentace, včetně návrhu obchodních podmínek příslušného smluvního vztahu;
- b) zahájit a vést zadávací řízení podle ZZVZ, respektive výběrové řízení podle příslušných částí ZZVZ;
- c) zajistit uveřejnění vyhlášení;
- d) přijímat nabídky dodavatelů;
- e) poskytovat dodavatelům případné vysvětlení zadávací dokumentace;
- f) v případě nejasností požádat o písemné vysvětlení nabídky;
- g) zajistit otevírání nabídek a veškerou administraci s tím spojenou;
- h) zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v ZZVZ, respektive výběrové řízení na základě dohody obou účastníků této smlouvy;
- i) přijímat a přezkoumávat námítky dodavatelů proti nesprávnému postupu zadavatele;
- j) kdykoliv na požádání předložit účastníku smlouvy příslušnou dokumentaci vážící se k veřejné zakázce;
- k) po zániku sdružení dle této smlouvy předat smluvním stranám protokolárně kopie veškerých písemností a dokladů vážících se k zadání zakázky a výběru dodavatele.

2. Účastník č. 2 je povinen:

Stanovit svého pověřeného zástupce pro jednání ve věcech technických a zástupce do komise pro výběr dodavatele.

3. Smluvní strany jsou povinny zejména:

- a) poskytovat zástupci sdružení součinnost v rámci procesu zadávání veřejné zakázky;
- b) po výběru dodavatele uzavřít smlouvu podle čl. VI odst. 2 této smlouvy.

4. Zpracovaná zadávací dokumentace bude společně projednaná účastníky sdružení formou zaslání připomínek.

5. Připomínky a návrhy budou zaslány v termínu nejpozději do 15-ti dnů po zahájení projednání zadávací dokumentace. Neuplatní-li v tomto termínu některá ze smluvních stran připomínky či návrhy k zadávací dokumentaci, má se za to, že tato smluvní strana žádné připomínky či návrhy k zadávací dokumentaci nemá.

6. Případné připomínky či návrhy jednotlivých smluvních stran k zadávací dokumentaci je zástupce sdružení povinen vypořádat nejpozději do 15-ti dnů po uplynutí lhůty pro podání připomínek a návrhů podle odst. 5 tohoto článku a bezodkladně poté o způsobu vypořádání připomínek či návrhů příslušnou smluvní stranu informovat.

7. Bez zbytečného odkladu po faktickém vypořádání všech obdržených připomínek a návrhů smluvních stran k zadávací dokumentaci podle odst. 6 tohoto článku předloží zástupce sdružení pro informaci všem účastníkům smlouvy kopii konečné verze zadávací dokumentace.
8. Pokud lze některou ze zakázek realizovat jako veřejnou zakázku malého rozsahu, je Zástupce sdružení povinen ji realizovat za těchto méně přísných zákonných požadavků. Ustanovení této smlouvy, která se ze zákona nevztahuje na veřejné zakázky malého rozsahu, se na ně nevyužijí. Pokud je v této smlouvě zmíněno výběrové řízení, použije se toto ustanovení přiměřeně i na zadávací řízení a naopak.

V.

Hodnocení nabídek

1. Smluvní strany za účelem posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávacího/výběrového řízení mají právo ustanovit zástupce do komise, která bude provádět posouzení a hodnocení nabídek.
2. Posuzování a hodnocení nabídek bude probíhat v termínu a místě určeném zástupcem sdružení, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto něco jiného.

VI.

Výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy

1. Na základě vyhodnocení nabídek zástupce sdružení rozhodne o výběru dodavatele, a to v souladu se ZZVZ.
2. Po uplynutí lhůty pro podání námítky proti rozhodnutí o výběru dodavatele podle ZZVZ bude uzavřena příslušná smlouva/příslušné smlouvy v souladu se zadávací dokumentací.
3. Zástupce sdružení informuje jednotlivé účastníky smlouvy o okamžiku uplynutí lhůty pro podání námítek.

VII.

Způsob komunikace, místo jednání

1. Při komunikaci mezi účastníky této smlouvy se upřednostňuje elektronická forma komunikace, tj. ve formě e-mailu. V případě potřeby osobního jednání s účastníky této smlouvy v rámci procesu zadávání veřejné zakázky bude jednáno v sídle zástupce sdružení, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto něco jiného.

VIII.

Platnost smlouvy, zánik sdružení a účasti na něm

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. do okamžiku dosažení účelu podle čl. I smlouvy, tj. do uzavření smlouvy podle této smlouvy účastníky smlouvy. Tímto okamžikem sdružení zadavatelů podle této smlouvy zaniká.

2. Platnost smlouvy ani zánik sdružení zadavatelů, případně zánik účasti v něm, však nemá vliv na případnou odpovědnost zástupce sdružení za jednotlivé úkony v rámci zadávacího/výběrového řízení podle této smlouvy ani na případné uplatnění náhrady škody podle téhož ustanovení.

X.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ZZVZ.
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně formou číselně označených dodatků, ke své platnosti a účinnosti vyžadují podpis všech účastníků.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. Smluvní strany dojednávají, že tuto dohodu zašle správci registru Účastník č. 1
4. Účastníci prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, a že byla sepsána po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí jsou přílohy:

Rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ v k.ú. Osice, PÚ/1048/schval KPÚ/K25/D11/2006/Zi,No, z 10.11.2006, pravomocné dne 18.12.2006,

Rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ v k.ú. Sedlice u Hradce Králové, PÚ/46/K27/R-I./2008/Zi z 24.1.2008, pravomocné dne 26.2.2008,

Schválený Plán společných zařízení v k.ú. Osice (hlavní výkres G5),

Schválený Plán společných zařízení v k.ú. Sedlice u Hradce Králové (hlavní výkres G5),

Smlouva o společném postupu směřujícím k zadávání veřejných zakázek čj. SPU 012168/2016 (23248/21/16-21500-Tal) uzavřená dne 25.2.2016 (na projektové dokumentace) vč. Dodatku č. 1, uzavřeného 3.1.2023

Závazek obce – usnesení obecního zastupitelstva Osice

Závazek obce – usnesení obecního zastupitelstva Praskačka (k.ú. Sedlice u HK)

V Hradci Králové dne

V Praze dne

Účastník č. 1:

Účastník č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
21.02.2023 07:36:58

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD HRADEC KRÁLOVÉ
Ulrichovo nám. 810, 500 02 Hradec Králové



Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne: 12. 12. 2006
POZEMKOVÝ ÚŘAD HRADEC KRÁLOVÉ

12. 12. 06

Telefon:
Telefax:
e.mail :

Naše zn.:
PÚ/ 1048/schval KPÚ/K25/D11/2006/Zi,No

Vyřizuje:

Datum:
10.11.2006

R o z h o d n u t í

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Hradec Králové (dále jen „pozemkový úřad“), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 20 písm. b) a § 11 odst. 4,5 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

s c h v a l u j e

návrh komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Osice

zpracovaný projekční a geodetickou firmou GEOVAP spol. s r.o., Čechovo nábř. 1790, 530 03 Pardubice

Odůvodnění:

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Hradec Králové zahájil dle § 6 odst. 4,5 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění pozdějších předpisů veřejnou vyhláškou ze dne 21.10.2003 komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Osice vyvolané výstavbou dálnice D11 z podnětu Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, stavebníka této stavby.

Na prvním kontrolním dnu na Pozemkovém úřadě Hradec Králové dne 5.1.2004 byl stanoven termín konání úvodního jednání dle § 7 zákona. Projektant KPÚ předal seznam dotčených vlastníků pozemků stanovený na základě předpokládaného obvodu KPÚ. Úvodní jednání se uskutečnilo dne 22.1.2004 od 16.30 ve školní jídelně v obci Osice. Dotčení vlastníci pozemků byli na jednání pozváni doporučeným dopisem pozemkového úřadu. Přítomní účastníci byli seznámeni s cílem, účelem a principy KPÚ. Z řad vlastníků pozemků byli zvoleni členové sboru zástupců.

Ihned po zahájení KPÚ byly na Katastrálním pracovišti Hradec Králové vyzvednuty podklady pro zahájení geodetických prací. V zimě 2004 proběhla rekognoskace stávajícího bodového pole a následně byl vypracován projekt pro vybudování a doplnění nového podrobného polohového bodového pole (PBPP). Na základě katastrálním úřadem schváleného PBPP mohly probíhat v terénu další měřické práce – šetření hranic vnitřního a vnějšího obvodu KPÚ, šetření hranic vodních toků a silnic a zaměření dalších prvků polohopisu.

K šetření hranic vnitřního obvodu byli přizváni vlastníci pozemků na obou stranách hranice. K šetření vnějšího obvodu KPÚ (katastrální hranice) byli vlastníci přizváni podle konkrétní situace. Vždy byli pozváni členové komise pro zjišťování hranic při KPÚ, členové sboru zástupců a příp. zástupci sousedních obcí. Práce na vnitřním obvodu KPÚ včetně

vypracování vytyčovacích náčrtů a geometrických plánů byly ukončeny na podzim 2004. Vnější obvod KPÚ byl vytyčován v několika etapách a to závislosti na probíhajících KPÚ v sousedních k.ú. a navržených změnách katastrálních hranic. Kompletní zaměření prvků polohopisu (skutečného stavu) bylo prováděno během roků 2003-2005. Do konce roku 2005 taky byly ukončeny veškeré přípravné geodetické práce.

Projekční práce na KPÚ byly zahájeny na podzim v roce 2003. Byl stanoven předpokládaný obvod KPÚ, na jehož základě byl pozemkovému úřadu předán seznam vlastníků pozemků pro úvodní jednání. V terénu byl zjištěn současný stav řešeného území a byly zajištěny dostupné projekční dokumentace. Rozbor současného stavu (průzkum a analýza) nebyl předmětem smlouvy, neboť již byl součástí studie pozemkových úprav vypracované před zahájením KPÚ. Studie posloužila jako jeden z podkladů pro plán společných zařízení.

Plán společných zařízení dle § 9 zákona byl vypracován v první polovině roku 2004. Plán společných zařízení byl schválen zastupitelstvem obce Osice a sborem zástupců. K plánu společných zařízení se vyjádřily bez připomínek také dotčené orgány státní správy a organizace.

Na základě zaměření skutečného stavu a výsledků průzkumu v terénu byla navržena aktualizace hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) a zaslána k posouzení na Výzkumný ústav meliorace a ochrany půd (VÚMOP) do Prahy. VÚMOP návrh schválil.

V průběhu zpracování KPÚ vyvstala potřeba změnit katastrální hranici z důvodu rozdělení souvislých ploch zemědělské půdy v souvislosti s výstavbou dálnice D11. Zachováním původního stavu by některé pozemky zůstaly zcela nepřístupné v rámci katastrálního území Osice. To se týkalo hranice na styku s katastrálními územími Staré Ždánice a Krásnice. Zároveň s tím byla katastrální hranice s k.ú. Dolany u Pardubic zarovnána na v minulosti upravené koryto vodního toku Černská strouha, resp. na jeho pravý břeh. Zpracovatel KPÚ v k.ú. Osičky provedl zarovnání katastrální hranice s k.ú. Osice na skutečný průběh polní cesty. Jelikož v případech změn katastrální hranice s k.ú. Staré Ždánice a Dolany u Pardubic se jednalo zároveň o krajskou hranici, proběhlo kvůli tomu několik jednání mezi dotčenými pozemkovými a katastrálními úřady. Bylo rozhodnuto, že změny katastrálních hranic budou provedeny formou jednoduchých pozemkových úprav. Každá změna je tedy samostatným projektem, který je ale zároveň součástí KPÚ. Změny katastrálních hranic byly zapsány v katastru nemovitostí.

Po konečném stanovení obvodu KPÚ, byly vypracován soupis nároků. Podle platných právních předpisů byly všechny parcely řešené podle §8 zákona oceněny. Celková výměra pro všechny listy vlastnictví v obvodu KPÚ nebyla upravována koeficientem. Skutečná výměra zaměřeného obvodu KPÚ souhlasila se součtem všech dotčených parcel. V k.ú. Osice existovala digitální katastrální mapa (DKM). Vzdálenost pro jednotlivé parcely byla měřena vzdušnou čarou od středu parcely ke středu stavební parcely č. 44, na které se nachází kostel v Osicích. Tento způsob měření vzdálenosti byl dohodnut na úvodním jednání sboru zástupců.

Dne 29.6.2005 byl na Obecním úřadě v Osicích a na Pozemkové úřadě v Hradci Králové po dobu 15 dnů vystaven soupis nároků. Každému účastníku řízení byl soupis jeho nároku zaslán poštou. Někteří vlastníci odsouhlasený soupis nároků zaslali zpět také poštou. S některými vlastníky byl soupis projednán osobně v termínu 13.-14.7.2005. K vystavenému soupisu nároků nebyly žádné připomínky. Během projednávání nároků byli vlastníci dotazováni na své požadavky pro návrh nového uspořádání. Někteří vlastníci uzavřeli dohodu o vypořádání spoluvlastnických podílů. U takových vlastníků, kteří neměli žádné jiné vlastnictví v k.ú. Osice byla zavedena zatím pracovní čísla nových listů vlastnictví (5001 – 5016). Přechíslování bude provedeno v souladu s požadavky Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj ještě před rozhodnutím Pozemkového úřadu Hradec Králové o výměně vlastnických práv.

První návrh nového uspořádání pozemků byl vypracován ke konci roku 2005. Dotčení vlastníci pozemků byli pozváni, aby se k návrhu vyjádřili. Na jaře roku 2006 byl vypsán ještě náhradní termín pro projednání prvního návrhu KPÚ. Se všemi vlastníky, kteří se jednání zúčastnili byly sepsány protokoly. Přípomínky a požadavky byly zpracovatelem KPÚ zapracovány. Konečný návrh KPÚ byl vystaven na Obecním úřadě v Osicích a na Pozemkovém úřadě v Hradci Králové po dobu 30 dnů. Návrh nového uspořádání byl projednáván s vlastníky v termínu 12. – 14.7.2006. K některým pozemkům byly vzneseny ústní připomínky, které byly s vlastníky projednány individuálně. Souhlas s návrhem nového uspořádání vlastníci stvrdili svým podpisem v soupisech nových pozemků.

Návrh KPÚ v k.ú. Osice odsouhlasilo 146 vlastníků nebo jejich zplnomocněných zástupců, což je **97,55 % celkové zahrnuté výměry** půdy v KPÚ. To je v souladu s § 11 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb. pro další řízení o KPÚ. Žádný z vlastníků k návrhu nepodal nesouhlasné stanovisko. Ke zbylé výměře se dotčení vlastníci ve stanovených lhůtách nevyjádřili.

Z hlediska bilance výměr, cen a vzdáleností pozemků před a po KPÚ pro jednotlivé listy vlastnictví bylo dodrženo kritérium výměry dané § 10 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb. ve všech případech.

CELKOVÝ PŘEHLED	VÝMĚRA	% z celkové výměry v KPÚ
CELKEM	3720218	100,00
Souhlas	3628895	97,55
Nesouhlas	0	0,00
Souhlas s výhradou	0	0,00
Nevyjádřil se	91323	2,45

Závěrečné jednání se uskutečnilo 18.10.2006 ve školní jídelně v Osicích.

Toto rozhodnutí bude doručeno ve smyslu § 11 odst. 5 zákona 139/2002 Sb. všem známým účastníkům řízení. Rozhodnutí o schválení návrhu je zároveň oznámeno veřejnou vyhláškou.

Do doby vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům nastane závazný právní vztah, kdy o údajích týkajících se schváleného návrhu podává informace pozemkový úřad.

Jednotlivé pozemky nebo jejich části nemůže jejich vlastník v uvedené době bez souhlasu pozemkového úřadu zatížit nebo zcizit (§ 11 odst. 12 zákona č. 139/2002 Sb.).

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů od jeho doručení k Ministerstvu zemědělství, Ústřednímu pozemkovému úřadu, podáním učiněným u Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu v Hradci Králové dle § 22 odst. e) zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a § 54 zákona č. 71/67 Sb. o správním řízení.

Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Hradec Králové
Ulrichovo nám. 810, 500 02 Hradec Králové


Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne: 26.2.2008
POZEMKOVÝ ÚŘAD HRADEC KRÁLOVÉ
dne: 24.2.2008 podpis:
(4)

Č.j. : PÚ/46/K27/R-I./2008/Zi

Vyřizuje:

Telefon:

Telefax:

e-mail:

Dle rozdělovníku

V Hradci Králové dne 24.1.2008

R o z h o d n u t í

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Hradec Králové (dále jen „pozemkový úřad“), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 20 písm. b) a § 11 odst. 4, 5 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úradech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“)

s c h v a l u j e

návrh komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Sedlice u Hradce Králové,

zpracovaný firmou AGRO-AQUA s.r.o. Pardubice, Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice -
firma GEOVAP,
spol. s r.o., Čechovo nábř. 1790, 530 03 Pardubice.

Odůvodnění:

Pozemkový úřad v Hradci Králové zahájil řízení o komplexní pozemkové úpravě (dále jen „KPÚ“) v katastrálním území Sedlice u Hradce Králové oznámením všem účastníkům řízení podle § 6, odst. 4, 5 zákona č. 139/2002 Sb. a vyvěšením veřejné vyhlášky na úřední desce Obecního úřadu v Praskačce a Pozemkového úřadu v Hradci Králové dne 24.10.2003.

Tato komplexní pozemková úprava v katastrálním území Sedlice byla vyvolána přípravou stavby dálnice D11, úsek D1105.2 z podnětu Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, stavebníka této stavby.

Zahájení pozemkové úpravy předcházelo zpracování „Investičního záměru – Studie pozemkových úprav souvisejících s realizací výstavby dálnice D 11 Praha – Hradec Králové, stavba 1105.2 Osice – Stěženy“.

Předmětem této studie bylo stanovení koncepce řešení komplexní pozemkové úpravy v úrovni konceptu plánu společných zařízení a ve stanovení rozsahu území přímo ovlivněného dopravními stavbami.

Úvodní jednání podle § 7 zákona č. 139/2002 Sb. se konalo v obci Praskačka, v Sokolovně dne 17.2.2004 od 16.30 hodin. Přítomní účastníci řízení byli seznámeni s formou, účelem a principy pozemkové úpravy, dále byli seznámeni s obvyklým postupem projekčních a geodetických prací. Na závěr úvodního jednání byl zvolen sbor zástupců vlastníků pozemků (§ 5 odst. 7 zákona č. 139/2002 Sb.) se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných vlastníků. Po skončení oficiální části úvodního jednání se sešel zvolený sbor zástupců vlastníků pozemků a jednohlasně zvolil předsedou sboru

Zájmové území KPÚ (obvod vnitřní a vnější) bylo stanoveno komisionálními terénními pochůzkami (§ 9 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 139/2002 Sb.) s komisí, která byla jmenována rozhodnutím pozemkového úřadu a odsouhlasena Katastrálním úřadem v Hradci Králové dne 20.4.2004. Vlastní komisní šetření proběhlo ve dnech 9.9.2004 – vnitřní obvod KPÚ, 16.9.2004 – hranice vodotečí, 18.10.2004 – hranice silnic a 14.4.2005 – hranice vnějšího obvodu KPÚ.

Výsledné geometrické plány na určení obvodu pozemkové úpravy byly předány katastrálnímu úřadu k zápisu do katastru nemovitostí.

V návrhu plánu společných zařízení (§9 odst. 8 č. 139/2002 Sb.) byly vyhodnoceny stanoviska dotčených orgánů státní správy, závěry studie pozemkových úprav souvisejících s realizací výstavby dálnice D 11 (zakázkové číslo 17/02) a analýza současného stavu.

Bylo nutno řešit změnu trasy biokoridoru BK I 42, původně vedeného od BC I 43 (písníku) jihovýchodním směrem přes silnici Sedlice – Praskačka k propustku na silnici Sedlice – Libišany, kde končí koryto Čertůvky. Respektování této trasy by vedlo k roztržštění zemědělských pozemků na dvou půdních blocích. Jako vhodnější trasa se navrhlo propojení BC I 42 na luční biokoridor BK I 47 podél vodoteče od Žižkovce s obvedením západně od obce a s kombinovaným využitím jako větrolam proti západním větrům.

Do plánu společných zařízení byl z podnětu Obecního úřadu navržen pás izolační zeleně podél jihovýchodního okraje zástavby, která se nachází nejbližší dálnici, resp. mimoúrovňové křižovatky, a zapracovány veškeré výše uvedené nesoulady. Návrh plánu společných zařízení byl projednáván ve dnech 24.5. a 11.8.2005 a byl schválen zastupitelstvem obce, sborem zástupců vlastníků pozemků a dotčenými orgány státní správy.

Před celkovou pozemkovou úpravou v k.ú. Sedlice u HK byly provedeny změny katastrálních hranic Sedlice u HK – Praskačka a Sedlice u HK – Krásnice (vedeny v samostatné dokumentaci). Změny vyplynuly ze zaměření skutečného stavu v terénu. Po zápisu těchto změn katastrálních hranic byl zpracován soupis vstupních nároků. V těchto nárocích byly pozemky dotčené záborovým elaborátem pro D 11, MUK a R 35 vedeny jako neřešené dle § 2, zákona č.139/2002 Sb. V průběhu zpracování a projednávání návrhu došlo k dohodě se ŘSD o dořešení pozemkové úpravy po dokončení dopravních staveb, a proto byly všechny pozemky v k.ú. Sedlice u HK převedeny do řešených dle § 2, aby mohly být upravovány hranice dle skutečného stavu po kolaudaci těchto staveb. Takto upravené nároky byly vyhotoveny 6.3.2007 a byli s nimi postupně seznamováni vlastníci pozemků při dalších jednáních.

První soupis nároků byl vypracován v programu Pozem, verze 7.95, dne 16.6.2006.

Druhý soupis nároků byl vypracován dne 6.3.2007. Soupisy nároků byly vyhotoveny podle těchto zásad:

Pro výpočet vzdálenosti pozemků byl zvolen jako referenční bod severovýchodní roh stavební parcely 3/2.

Výměra jednotlivých parcel byla převzata z SPI.

Při ocenění pozemků se vycházelo u zemědělských pozemků z mapy BPEJ. Cena zemědělských pozemků vycházela z vyhlášky č.540/2002Sb. Touto cenou byly oceněny i vodní toky a cesty.

Spoluvlastníkům společné cesty (p.č. 459 na LV 133) majícím jiné pozemky v obvodu pozemkové úpravy byl nárok zvýšen o výměru příslušného podílu na společné cestě.

První soupisy vstupních nároků byly vystaveny dne 10.7.2006 a projednány ve dnech 2.3. a 4.8.2007. Druhé soupisy nároků byly projednány postupně společně s návrhem nového umístění pozemků v průběhu r. 2007.

První pracovní koncept návrhu byl projednáván s vlastníky, kteří se zúčastnili jednání ve dnech 2. až 4.8.2006 při odsouhlasování vstupních nároků.

Na základě připomínek vlastníků byl postupně v období leden až duben 2007 návrh upřesňován.

Upravený návrh ze dne 22.3.2007 byl projednán dne 20.4.2007 v mateřské škole v Sedlici u HK.

Vzhledem k malému počtu zúčastněných byl stanoven náhradní termín na 6.6.2007, na který byli všichni nezúčastnění pozváni. Jednání se konalo v zasedací místnosti Pozemkového úřadu v Hradci Králové.

Po těchto jednáních byly připomínky vlastníků dále projednávány jednotlivě.

U osob, zjištěných v evidenci obyvatel jako osoby neznámé, byl ustanoven opatrovník.

Upravený návrh byl projednáván dne 9.8.2007 v zasedací místnosti Pozemkového úřadu v Hradci Králové.

Poslední změna návrhu byla provedena 25.9.2007. Pozemková úprava byla odsouhlasena 84,67% vlastníků. Návrh pozemkové úpravy byl vystaven po dobu 30-ti dnů k vyjádření a posledním připomínkám od 1.11.2007 na Obecním úřadě v Praskače a Pozemkovém úřadě v Hradci Králové.

Dne 19.12.2007 proběhlo v mateřské škole v Sedlici u HK závěrečné ústní jednání, kde byla souhrnem veřejnost seznámena s průběhem a dokončováním pozemkové úpravy v tomto katastrálním území.

Sbor zástupců vlastníků půdy doporučil návrh pozemkové úpravy ke schválení rozhodnutím Pozemkového úřadu v Hradci Králové.

Součástí tohoto rozhodnutí je grafická příloha ve formě návrhu digitální katastrální mapy (DKM) pro k.ú. Sedlice u Hradce Králové s nově přiřazenými parcelními čísly. Při tvorbě DKM došlo k upřesnění výměr a z těchto důvodů i k drobným odchylkám výměr v příložených bilancích tohoto rozhodnutí proti projednaným soupisům nových pozemků (tento postup je v souladu s § 11 odst.8 zákona č. 139/2002 Sb.).

Toto rozhodnutí bude doručeno ve smyslu § 11 odst. 5 zákona č. 139/2002 Sb. všem známým účastníkům řízení. Rozhodnutí o schválení návrhu je zároveň oznámeno veřejnou vyhláškou.

Do doby vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům, nastane závazný právní vztah, kdy o údajích týkajících se schváleného návrhu podává informace pozemkový úřad. Jednotlivé pozemky nebo jejich části nemůže jejich vlastník v uvedené době bez souhlasu pozemkového úřadu zatížit nebo zcizit (§ 11 odst. 12 zákona č. 139/2002 Sb.).

Pozemkový úřad zajistí, aby nové uspořádání pozemků bylo vytyčeno a označeno v terénu podle potřeby vlastníků, včetně fyzického předání se zřetelem na finanční zajištění z prostředků státního rozpočtu (§ 12 odst. 1,2 zákona č. 139/2002 Sb.).

Poučení o odvolání:


Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15-ti dnů od doručení odvolání k Ministerstvu zemědělství, Ústřednímu pozemkovému úřadu (§ 22, písm. e) zákona č. 139/2002 Sb., podáním učiněným u Pozemkového úřadu v Hradci Králové (viz § 54 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení - správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Přílohy:

- **vlastníkům pozemků** jen ta **písemná** (souhrnná bilance – neposílat zpět, je to součást rozhodnutí) + **grafická část návrhu**, která se dotýká konkrétního účastníka řízení (§ 11 odst. 5 zákona č. 139/2002 Sb.)

Rozdělovník:

- I. **známí účastníci řízení** dle seznamu založeném na pozemkovém úřadě
- II. **ostatní účastníci řízení** - dle § 11 odst. 5 zákona č. 139/2002 Sb. se rozhodnutí oznamuje veřejnou vyhláškou, vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední desce Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu v Hradci Králové a na úřední desce Obecního úřadu v Praskače, kde lze do schváleného návrhu nahlédnout
- III. **Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové**, Collinova 481, 502 00 Hradec Králové (po nabytí právní moci)

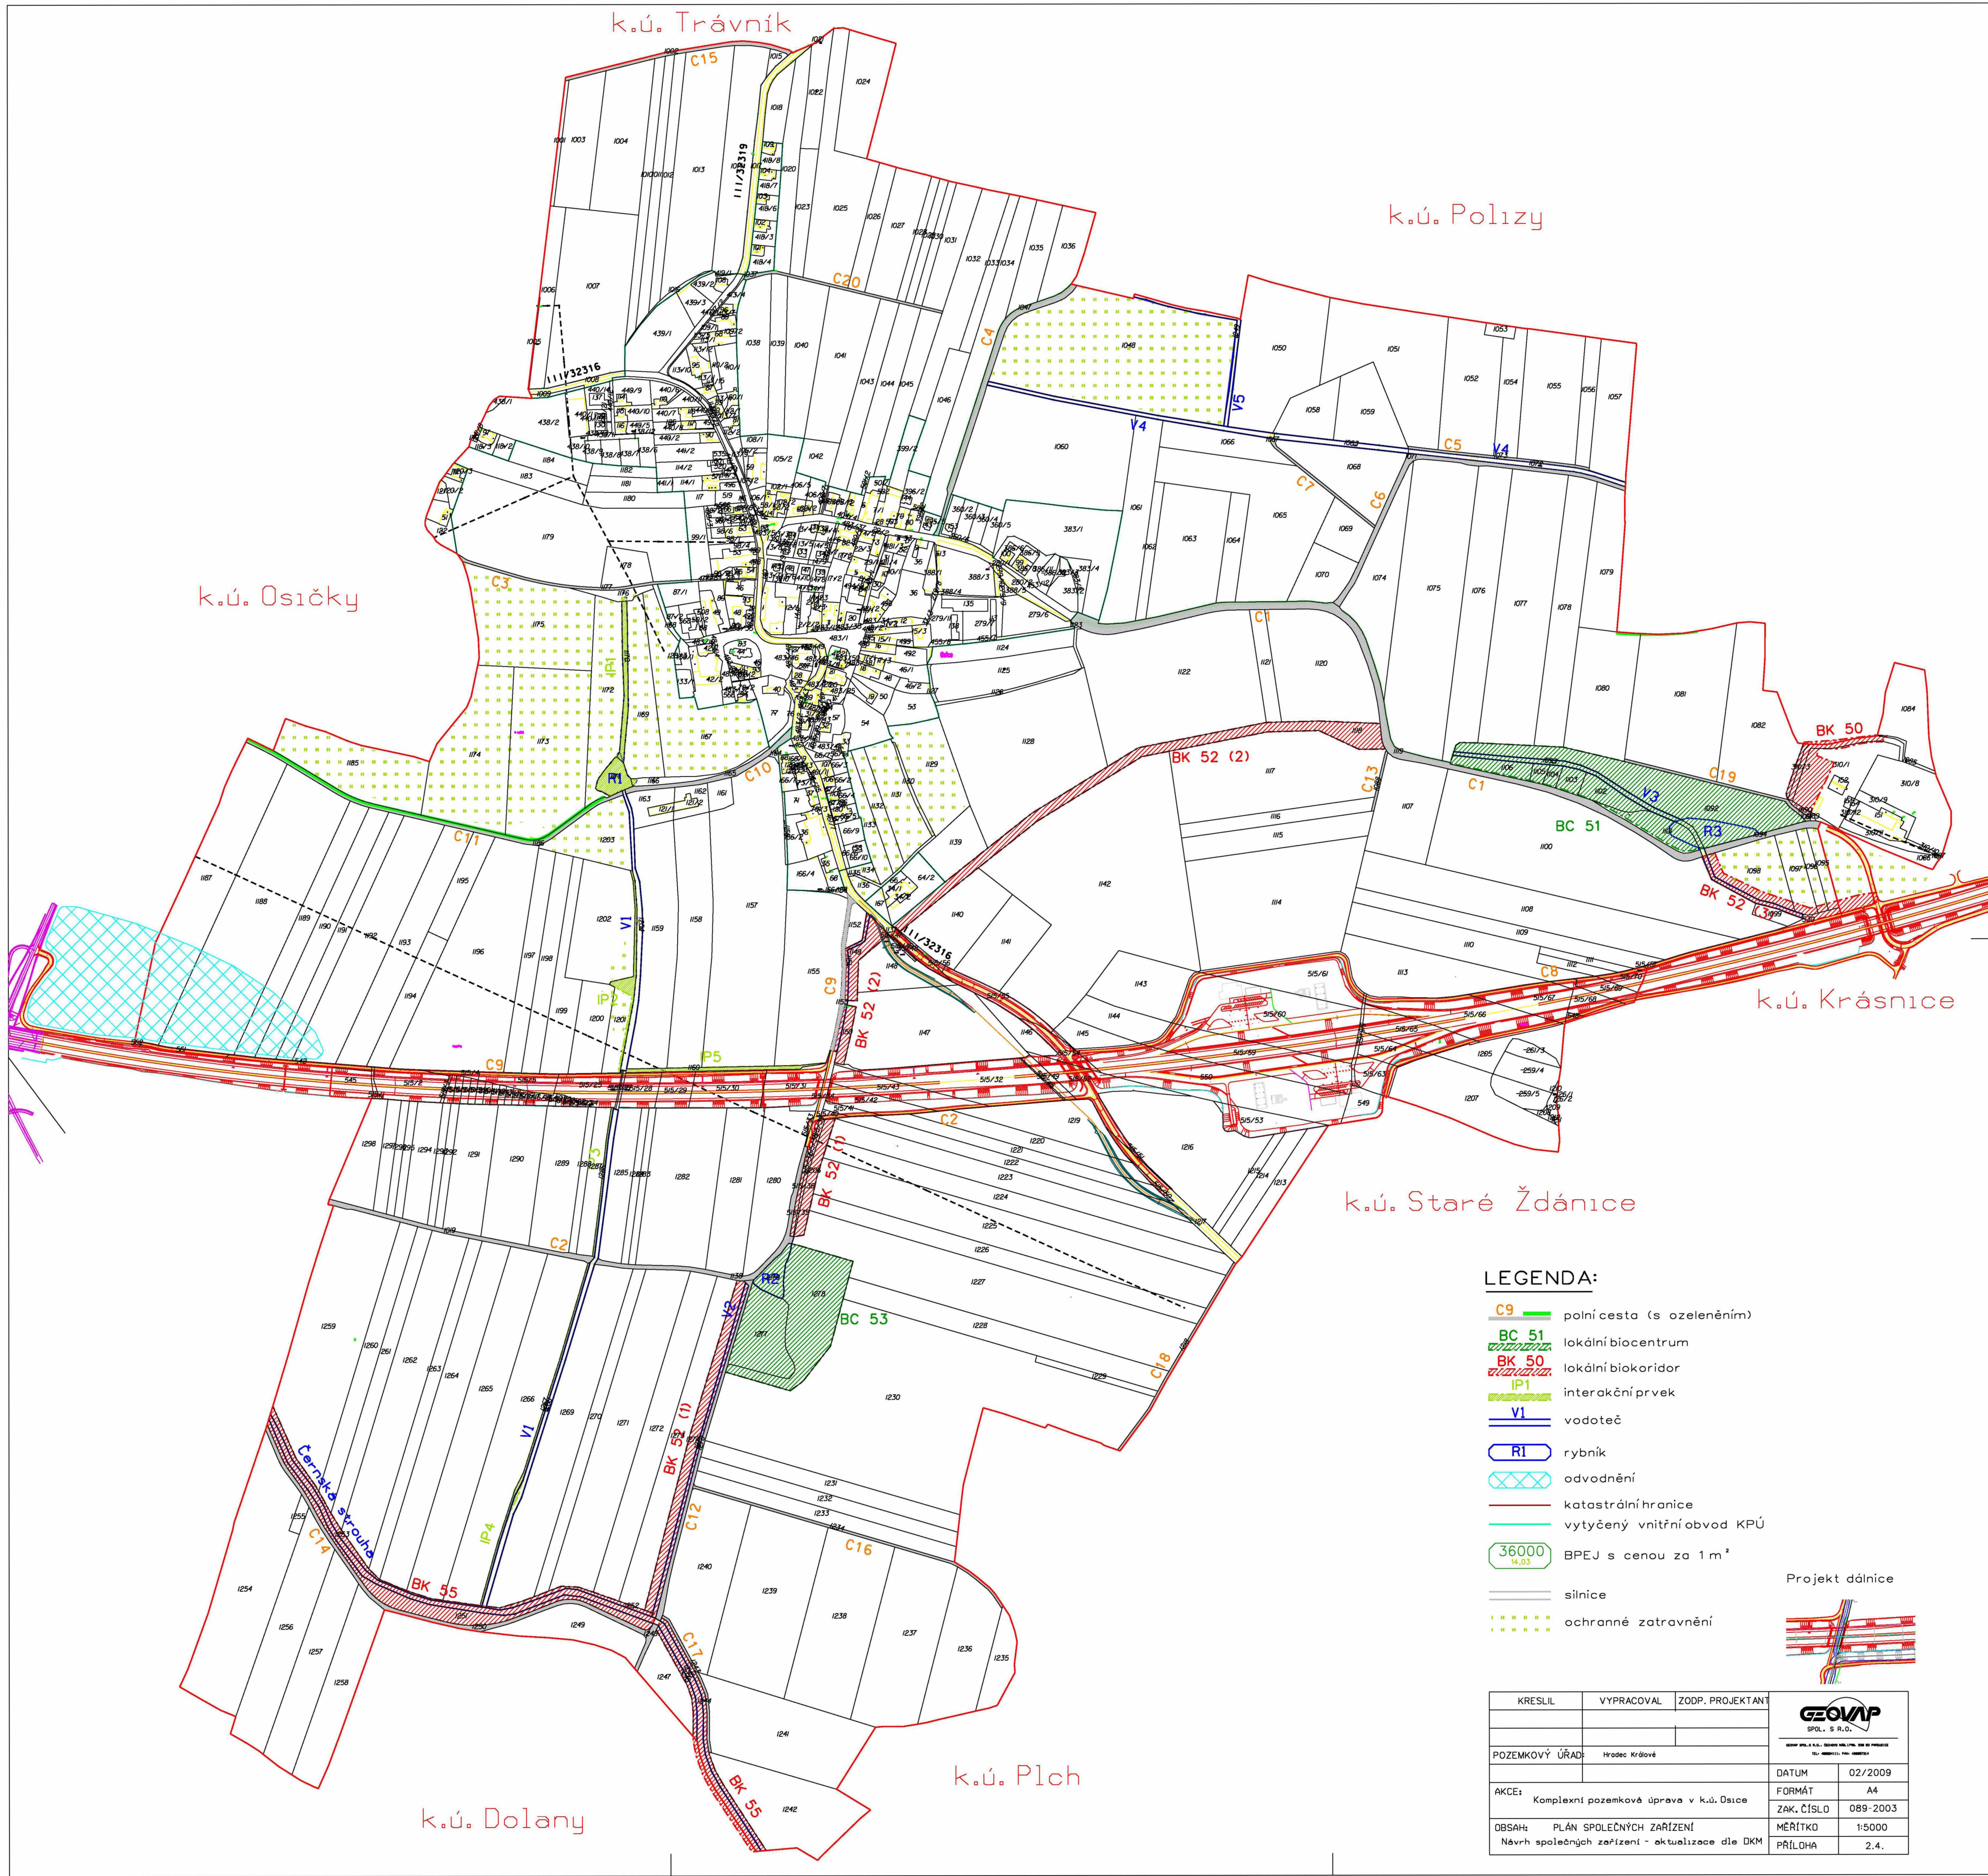

Hubenice

Polizy

LEGENDA

- HRANICE POZEMKOVÝCH ÚPRAV
- NEPLODNÁ PŮDA PODLE ÚDAJŮ KN
- VODNÍ NÁDRŽ UMĚLÁ PODLE KN
- PLOCHY TTP PODLE ÚDAJŮ KN
- ZELEN PODLE ÚDAJŮ KN
- STÁTNÍ SILNICE
- POLNÍ CESTY — REKONSTRUKCE
- POLNÍ CESTY — NOVOSTAVBA
- VODOTEČE
- ▼ BIOCENTRUM STÁVAJÍCÍ
- ▲ BIOCENTRUM NAVRŽENÉ
- BIOKORIDOR NAVRŽENÝ
- INTERAKČNÍ PRVEK STÁVAJÍCÍ
- INTERAKČNÍ PRVEK NAVRŽENÝ
- IZOLAČNÍ ZELEN
- ② ODTOKOVÁ LÍNIE VODNÍ EROZE
- HRANICE POVODÍ
- LÍNIE BPEJ

Kreslil	Vypracoval	Zodp.projektant
Kraj: Královéhradecký Obec: Prácheň		
Investor: Město ČR – ŽA a PÚ Hradec Králové, ČR – RSD Praha AKCE: KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. SEDLICE U HRADCE KRÁLOVÉ		
Období: ROZBOR SOUČASNÉHO STAVU A PLÁN SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ MAPA PLÁNU SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ		
PRACOVNÍ VERZE AKRO-AQUA IP: 23330000 DIČ: 233300000		
Dokumentace: KPÚ Datum: 5/2009 Formát: A4 Zak. číslo: 32/03 Měřítko: 1:5000 Číslo přílohy: 2.3.		

Krásnice

SMLOUVA

o společném postupu směřujícím k zadání veřejných zakázek

uzavřená ve smyslu ust. § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
pozdějších předpisů
mezi následujícími smluvními stranami:

Státní pozemkový úřad
Doručeno: 23.02.2016
SPU 092934/2016
listy: 1 přílohy:



spuess625a6741

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupený

V technických záležitostech je oprávněna jednat:

Bankovní spojení: Česká národní banka

IČ 01312774
(dále jen „zadavatel č. 1“)

a

Česká republika - Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zastoupené
ve věcech smluvních oprávněn jednat:
Adresa: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
Bankovní spojení: Českomoravská záruční banka a.s.

IČ 65993390
DIČ CZ65993390
(dále jen „zadavatel č. 2“)

Čl. I.

Účel smlouvy

Zadavatelé č. 1 a č. 2, jakožto veřejní zadavatelé podle § 2 odst. (2) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), se touto smlouvou sdružují do sdružení zadavatelů podle § 2 odst. 9 zákona o veřejných zakázkách (dále jen „sdružení zadavatelů“) za účelem společného postupu při zadání veřejných zakázek, jejímž cílem má být realizace prioritních schválených společných zařízení navržených v rámci pozemkových úprav v souvislosti se Studiemi pozemkových úprav souvisejících s realizací výstavby dálnice D 11 – stavba 1105-2 Osičky – Hradec Králové, která spadá do územní působnosti Pobočky Hradec Králové, včetně uzavření příslušných smluv, a to za podmínek specifikovaných dále v této smlouvě.

K dosažení účelu uvedeného v odst. 1 tohoto článku smlouvy se smluvní strany zavazují vzájemně spolupracovat podle pravidel stanovených touto smlouvou.

Čl. II.

Specifikace veřejné zakázky

1. Předmětem veřejných zakázek podle čl. I této smlouvy je realizace schválených prioritních společných zařízení v souladu s pozemkovými úpravami v k.ú. Stará Voda, k.ú. Nové Město n. Cidlinou a k.ú. Klamoš, vše v obvodu pozemkových úprav vyvolaných z podnětu stavebníka v souvislosti s výstavbou dálnice D 11 – stavba 1105-2 Osičky – Hradec Králové

Konkrétně se jedná o následující stavby s názvy:

R 139 – Polní cesta „Ke Kozině“ v k.ú. Stará Voda

R 140 – Polní cesta „Široká“ v k.ú. Nové Město nad Cidlinou

R 145 – Polní cesta „Ke Rtánovu“ v k.ú. Klamoš, Nové Město nad Cidlinou

R 146 – Polní cesta „Za Humny“ v k.ú. Klamoš

(všechny v okrese Hradec Králové), na nichž se zadavatel č. 2 podílí v závislosti na rozsahu území dotčeného stavbou Dálnice D 11 – stavbou 1105-2 Osičky - Hradec Králové. Jedná se o realizaci účelových komunikací – polních cest, včetně zajištění technického dozoru těchto staveb a záchranného archeologického dohledu těchto staveb. Financování těchto akcí je ze 100 % z rozpočtu zadavatele č. 2 (ŘSD ČR). Zahájení realizací stavebních prací se předpokládá od 04/2016.

2. Předmětem veřejných zakázek podle čl. I této smlouvy je dále příprava a zadání výběrových řízení schválených prioritních společných zařízení v souladu se schválenými pozemkovými úpravami v k.ú. Osice, k.ú. Krásnice, k.ú. Osičky, k.ú. Dobřenice, k.ú. Praskačka a k.ú. Sedlice vše v obvodu pozemkových úprav vyvolaných z podnětu stavebníka v souvislosti s výstavbou dálnice D 11 – stavba 1105-2 Osičky – Hradec Králové. Konkrétně se jedná o veřejné zakázky malého rozsahu na služby (zadávané mimo režim zákona) na zadání zpracování následujících projektových dokumentací (DSP, DPS) na stavby polních cest vč. ozelenění s názvy:

R 157 – Polní cesta C1, C5, C6 v k. ú. Osice

R 148 – Polní cesta „Salvátorka“ v k. ú. Krásnice

R 149 – Polní cesta P6OS v k. ú. Osičky a k. ú. Dobřenice

R 159 - Polní cesta O6DO (Bohdanečská) v k. ú. Dobřenice

R 185 – Polní cesta „Za Simonovými“ v k. ú. Praskačka

R 186 – Polní cesta „Za Humny“ v k. ú. Praskačka

R 187 – Polní cesta a izolační zeleň 5, 1.5, 1.6 v k. ú. Sedlice

(všechny v okrese Hradec Králové), na nichž se zadavatel č. 2 podílí v závislosti na rozsahu území dotčeného stavbou Dálnice D 11 – stavbou 1105-2 Osičky - Hradec Králové. Jedná se o zpracování projektové dokumentace (DSP, DPS) pro polní cesty vč. odvodnění, sjezdů na pole a výhyben a doprovodné zeleně v této lokalitě stanovené Studiemi souvisejících s realizací výstavby dálnice D 11.

Následně dojde k realizaci účelových komunikací – polních cest, včetně ozelenění. Zajištění zadávacích řízení na zhotovitele staveb a zajištění autorského dozoru, technického dozoru těchto staveb a záchranného archeologického dohledu těchto staveb. Financování těchto akcí je hrazeno

ze 100 % z rozpočtu zadavatele č. 2 (ŘSD ČR). Zahájení výběrových řízení na zpracování projektových dokumentací – předpoklad 02/2016.

Čl. III. Jednání za sdružení

K jednání a činnostem souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky, není-li dále v této smlouvě uvedeno jinak, je za sdružení zadavatelů podle této smlouvy oprávněn zadavatel č. 1.

Zadavatel č. 1 je dále oprávněn za sdružení zadavatelů jednat a činit veškeré právní úkony vůči orgánu dohledu při případném přezkumném řízení vztahujícím se k veřejné zakázce podle této smlouvy.

Zadavatel č. 1 nese odpovědnost za jednání a úkony související se zadáváním veřejných zakázek dle zákona o veřejných zakázkách, resp. dle platné Směrnice státního pozemkového úřadu pro zadávání veřejných zakázek.

Čl. IV. Povinnosti smluvních stran

Zadavatel č. 1 je mimo jiné povinen:

- a) zajistit přípravu a zpracování zadávacích dokumentací na zhotovitele staveb uvedených v čl. II., bodě 1 a na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na technické dozory staveb a archeologické dohledy staveb uvedených v čl. II., bodě 1 a předat tuto dokumentaci a návrhy smluv zadavateli č. 2 k připomínkování
- b) zajistit přípravu a zpracování veřejných zakázek malého rozsahu na zpracování projektových dokumentací staveb uvedených v čl. II., bodě 2 a následně i zajištění přípravy a zpracování zadávacích dokumentací na zhotovitele staveb, zajistit veřejné zakázky na technické dozory staveb a archeologické dohledy staveb uvedených v čl. II., bodě 2 a předat tuto dokumentaci a návrhy smluv zadavateli č. 2 k připomínkování
- c) zahájit a vést zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách, resp. dle platné Směrnice státního pozemkového úřadu pro zadávání veřejných zakázek
- d) přijímat nabídky uchazečů
- e) poskytovat zájemcům a uchazečům případné doplňující informace
- f) v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky
- g) přijímat a přezkoumávat námitky dodavatelů proti nesprávnému postupu zadavatele
- h) kdykoliv na požádání předložit zadavateli č. 2 příslušnou dokumentaci vážící se k veřejné zakázce
- i) po zániku sdružení dle této smlouvy předat zadavateli č. 2 kopie veškerých písemností a dokladů vážících se k zadání zakázky a výběru nejvhodnějšího uchazeče, pokud o ně zadavatel č. 2 požádá a pokud je již neobdržel v průběhu zadávání

Zadavatel č. 2 je mimo jiné povinen:

- a) respektovat v rámci aplikace „zákon o veřejných zakázkách“ postup zadavatele č. 1 podle jeho vnitřního předpisu
- b) poskytovat zadavateli č. 1 součinnost v rámci procesu zadávání veřejné zakázky
- c) uplatnit připomínky a návrhy k zadávací dokumentaci a návrhu smlouvy o dílo, pokud zadavateli č. 1 nesdělí, že připomínky či návrhy neuplatní
- d) vyjádřit se k jednotlivým uchazečům a navrhnout případné doplnění či jiné úpravy okruhu uchazečů, pokud to povaha veřejné zakázky připouští, a pokud zadavateli č. 1 nesdělí, že k okruhu uchazečů nemá připomínek

- e) účastnit se posouzení a hodnocení nabídek v příslušných komisích a za tímto účelem delegovat do těchto komisí dva zástupce
- f) po výběru nejvhodnější nabídky uzavírat příslušnou smlouvu o dílo jako jeden z účastníků smlouvy na straně objednatele.

Čl. V.

Platnost smlouvy, zánik sdružení a účasti na něm

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. do okamžiku dosažení účelu podle čl. I. smlouvy, tj. do uzavření plnění z poslední smlouvy o dílo všemi účastníky smlouvy, specifikované v čl. II, bodě 1. a 2. specifikace veřejné zakázky. Tímto okamžikem sdružení zadavatelů podle této smlouvy zaniká.

Účastník této smlouvy je oprávněn ze sdružení zadavatelů vystoupit pouze z vážných důvodů, které je povinen sdělit druhému účastníkovi této smlouvy.

Platnost této smlouvy ani zánik sdružení zadavatelů, případně zánik účasti v něm, nemá vliv na případnou odpovědnost zadavatele č. 1 za jednotlivé úkony v rámci zadávacího řízení podle čl. III. a IV. této smlouvy.

Čl. VI.

Závěrečná ustanovení

Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany ustanovení uvedenými v čl. II. této smlouvy, jinak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o veřejných zakázkách.

Při komunikaci mezi účastníky této smlouvy se upřednostňuje elektronická forma komunikace, tj. ve formě e-mailu.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý z účastníků této smlouvy obdrží po dvou vyhotoveních.

Tato smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných smluvními stranami.

Účastníci této smlouvy si smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne: 25. 02. 2016 V Praze dne: 16 -02- 2016

Zadavatel č. 1:

Zadavatel č. 2:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o společném postupu směřujícímu k zadání veřejných zakázek

uzavřená ve smyslu ust. § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů
mezi následujícími smluvními stranami:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

V technických záležitostech je oprávněn jednat:

Bankovní spojení: Česká národní banka

IC 01312774

(dále jen „zadavatel č. 1“)

a

Česká republika - Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zastoupené

ve věcech smluvních oprávněn jednat:

ve věcech technických oprávněn jednat:

Adresa: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Bankovní spojení: Českomoravská záruční banka a.s.

IČ 65993390

DIČ CZ65993390

(dále jen „zadavatel č. 2“)

Smluvní strany uzavřeny níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o společném postupu směřujícímu k zadání veřejných zakázek, č.j. zadavatele č. 1: SPU 012168/2016, zadavatele č. 2: 23248/21/16-21500

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s čl. VI. Smlouvy o společném postupu směřujícímu k zadání veřejných zakázek se v původní smlouvě mění v čl. II, bod 2.

Původní text:

1. Předmětem veřejných zakázek podle čl. I této smlouvy je dále příprava a zadání výběrových řízení schválených prioritních společných zařízení v souladu se schválenými pozemkovými úpravami v k.ú. Osice, k.ú. Krásnice, k.ú. Osičky, k.ú. Dobřenice, k.ú. Praskačka a k.ú. Sedlice vše v obvodu pozemkových úprav vyvolaných z podnětu stavebníka v souvislosti s výstavbou dálnice D 11 – stavba 1105-2 Osičky – Hradec Králové. Konkrétně se jedná o veřejné zakázky malého rozsahu na služby (zadávané mimo režim zákona) na zadání zpracování následujících projektových dokumentací (DSP, DPS) na stavby polních cest vč. ozelenění s názvy:

R 157 – Polní cesta C1, C5, C6 v k. ú. Osice

R 148 – Polní cesta „Salvátorka“ v k. ú. Krásnice

R 149 – Polní cesta P6OS v k. ú. Osičky a k. ú. Dobřenice

R 159 – Polní cesta O6DO (Bohdanečská) v k. ú. Dobřenice

R 185 – Polní cesta „Za Simonovými“ v k. ú. Praskačka

R 186 – Polní cesta „Za Humny“ v k. ú. Praskačka

R 187 – Polní cesta a izolační zeleň 5, 1.5, 1.6 v k. ú. Sedlice

(všechny v okrese Hradec Králové), na nichž se zadavatel č. 2 podílí v závislosti na rozsahu území dotčeného stavbou Dálnice D 11 – stavbou 1105-2 Osičky - Hradec Králové. Jedná se o zpracování projektové dokumentace (DSP, DPS) pro polní cesty vč. odvodnění, sjezdů na pole a výhyben a doprovodné zeleně v této lokalitě stanovené Studiemi souvisejících s realizací výstavby dálnice D 11.

Následně dojde k realizaci účelových komunikací – polních cest, včetně ozelenění. Zajištění zadávacích řízení na zhotovitele staveb a zajištění autorského dozoru, technického dozoru těchto staveb a záchranného archeologického dohledu těchto staveb. Financování těchto akcí je hrazeno ze 100 % z rozpočtu zadavatele č. 2 (ŘSD ČR). Zahájení výběrových řízení na zpracování projektových dokumentací – předpoklad 02/2016.

a nahrazuje se novým textem:

2. Předmětem veřejných zakázek podle čl. I této smlouvy je dále příprava a zadání výběrových řízení schválených prioritních společných zařízení v souladu se schválenými pozemkovými úpravami v k.ú. Osice, k.ú. Krásnice, k.ú. Osičky, k.ú. Dobřenice, k.ú. Praskačka a k.ú. Sedlice u Hradce Králové vše v obvodu pozemkových úprav vyvolaných z podnětu stavebníka v souvislosti s výstavbou dálnice D 11 – stavba 1105-2 Osičky – Hradec Králové. Konkrétně se jedná o veřejné zakázky malého rozsahu na služby (zadávané mimo režim zákona) na zadání zpracování následujících projektových dokumentací (DSP, DPS) na stavby polních cest vč. ozelenění s názvy:

R 157 – Polní cesta C1, C5, C6 v k. ú. Osice

R 148 – Polní cesta „Salvátorka“ v k. ú. Krásnice

R 149 – Polní cesta P6OS v k. ú. Osičky a k. ú. Dobřenice

R 159 – Polní cesta P8DO v k. ú. Dobřenice

R 187 – Polní cesta a izolační zeleň 5, 1.5, 1.6 v k. ú. Sedlice u Hradce Králové

(všechny v okrese Hradec Králové), na nichž se zadavatel č. 2 podílí v závislosti na rozsahu území dotčeného stavbou Dálnice D 11 – stavbou 1105-2 Osičky - Hradec Králové. Jedná se o zpracování projektové dokumentace (DSP, DPS) pro polní cesty vč. odvodnění, sjezdů na pole a výhyben a doprovodné zeleně v této lokalitě stanovené Studiemi souvisejících s realizací výstavby dálnice D 11.

Zahájení výběrových řízení na zpracování projektových dokumentací R 148 – Polní cesta „Salvátorka“ v k. ú. Krásnice, R 149 – Polní cesta P6OS v k. ú. Osičky a k. ú. Dobřenice a R 159 – Polní cesta P8DO v k. ú. Dobřenice – předpoklad zadávání VZMR na služby v průběhu let 2022-2023.

Následně dojde k realizaci účelových komunikací – polních cest, včetně ozelenění. Zajištění zadávacích řízení na zhotovitele staveb a zajištění autorského dozoru, technického dozoru těchto staveb a záchranného archeologického dohledu těchto staveb. Financování těchto akcí je hrazeno ze 100 % z rozpočtu zadavatele č. 2 (ŘSD ČR).

U R 157 – Polní cesta C1, C5, C6 v k. ú. Osice a R 187 – Polní cesta a izolační zeleň 5, 1.5, 1.6 v k. ú. Sedlice u Hradce Králové jsou k datu podpisu tohoto Dodatku č. 1 již projektové dokumentace (DSP+DPS) zpracovány, tato společná zařízení v k.ú. Osice a Sedlice u Hradce Králové jsou připravená k realizaci (viz samostatná smlouva o společném zadávání realizace společných zařízení).

Odůvodnění:

Ke změně došlo z důvodů změny ve stanovení prioritních staveb společných zařízení a jejich počtu ze strany příslušných obcí.

Ostatní ustanovení smlouvy o společném postupu směřujícímu k zadání veřejných zakázek, neuvedené v Dodatku č. 1, zůstávají beze změny.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro příkazce a dvou vyhotoveních pro příkazníka, každý z nich má váhu originálu.

Přílohy:

- Zápis z jednání ze dne 26.4.2022,
- Usnesení ze zastupitelstva Obce Dobřenice ze dne 27.6.2022 (č.j. 32/04/2022, č.j. 33/04/2022, č.j. 34/04/2022, č.j. 35/04/2022).

V Hradci Králové dne: - 7 - 11 - 2022

Zadavatel č. 1:

V Praze dne: - 3 - 01 - 2023

Zadavatel č. 2:



V ý p i s z u s n e s e n í

zastupitelstva obce Osice, které se konalo dne 14. prosince 2022

5.10. Projednání stavby účelové komunikace „ R 157 – Cesty C1, C6 v k.ú. Osice “

Zastupitelstvo Obce Osice se zavazuje k převzetí stavby účelové komunikace – polní cesty C1, C6 v k.ú. Osice na parcele č. 1071, 1072, 1073, 1093, 1094, 1119, 1123 v k.ú. Osice po její realizaci a kolaudačním řízení do majetku obce.

O toto společné zařízení – účelové komunikace s názvem stavby „R 157 – Cesty C1, C6 v k.ú. Osice“, navržené dle komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Osice a schváleného PSZ, se následně bude starat obec s péčí řádného hospodáře.

Obec
OSICE



Obec Praskačka

Praskačka 12
503 33 Praskačka
IČ 00269352

ISDS: 28sbbwr

Statní pozemkový úřad
Doručeno: 03.01.2023
SPU 002731/2023
listy: přílohy: 4



spuess8c123419

Praskačka dne 3. ledna 2023

Výpis z usnesení

Zastupitelstva obce Praskačka ze dne 14. prosince 2022

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo Obce Praskačka schvaluje realizaci výsadeb vč. provedení následné péče v 1. – 3. vegetačním období po realizaci výsadeb u společného zařízení, dle zpracované projektové dokumentace s názvem R 187 – Izolační zeleň, BK v k.ú. Sedlice u Hradce Králové.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2022/9/33 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo Obce Praskačka se zavazuje k převzetí společného zařízení s názvem „R 187 – Izolační zeleň, BK v k.ú. Sedlice u Hradce Králové“ po její realizaci a tříleté následné péči do majetku obce. O toto společné zařízení, navržené dle komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sedlice u Hradce Králové a schváleného PSZ, umístěné na parcele č. 745, 754, 755, 787, 796 v k.ú. Sedlice u Hradce Králové, evidované ve vlastnictví obce na LV 10001, se následně bude starat obec s péčí řádného hospodáře.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2022/9/34 bylo schváleno.

Obec
PRASKAČKA
503 33
