
**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. PN 2022_0023_1**

mezi

CETIN a.s.

a

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková
organizace**

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
ID DS: qa7425t
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupen [REDAKCE]
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2019160003/6000
(dále jen „**CETIN**“)

a

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
IČO: 72053119
DIČ: CZ72053119
ID DS: qbep485
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. Pr 737
zastoupená Mgr. Martinem Vítem,MPA, technickým ředitelem, na základě pověření č.j.
20971/22/SÚSPK-P
e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Hunčice spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 02.02.2023 vydané pod čj. 33555/23, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

Zákon o vyvlastnění je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC I/20 Všeruby - Hunčice**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektu,
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky,
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však čtyři (4) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Smluvní strany si potvrzují, že na společnost CETIN byla převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí Městského úřadu Města Touškov – rozhodnutí o umístění stavby I/20 Všeruby - Hunčice, úprava křižovatky se sil. III/2051 č.j. 3261/2017/MUT-12 ze dne 24.4.2018, které nabylo právní moci dne 19.5.2018 (dále jen „**Územní rozhodnutí**“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v Územním rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Územním rozhodnutí výslovně uvedeny. Práva a povinnosti z Územního rozhodnutí specifikovaná v první větě tohoto odst. 4.2 Smlouvy byla na společnost CETIN převedena dohodou o převodu některých práv a povinností z Územního rozhodnutí (dále jen „**Dohoda o převodu některých práv a povinností z Územního rozhodnutí**“), Dohoda o převodu některých práv a povinností z Územního rozhodnutí včetně Územní rozhodnutí je Přílohou č. 2 Smlouvy.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do pěti (5) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
- (c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodloužení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodloužení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **546 254,00 Kč** (slovy: pět set čtyřicet šest tisíc dvě stě padesát čtyři korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do čtyř (4) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle

- pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoací na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
 - (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
 - (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
 - (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
 - (f) náklady na identifikaci parcel,
 - (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
 - (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
 - (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
 - (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
 - (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
 - (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
 - (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:

- (a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši **61 835,00 Kč** (slovy: šedesát jedna tisíc osm set třicet pět korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy,
- (b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.

6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.

6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu

se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.

- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo do datové schránky Stavebníka.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: [REDACTED]
funkce: specialista pro výstavbu sítě
tel. [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]
funkce: specialista pro výstavbu sítě
[REDACTED]

- 8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: [REDACTED]
funkce: Vedoucí technik přípravy a realizace staveb PS
[REDACTED]

ve věcech technických : [REDACTED]
funkce: Vedoucí technik přípravy a realizace staveb PS
[REDACTED]

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno

pozdější datum jeho účinnosti.

- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN od smlouvy dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.
- 9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marré uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů,

kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přijímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přijímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přijímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přijímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přijímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přijímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- (a) v listinné podobě;
 - (b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
 - (c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;

- (d) e-mailovou zprávou zaslou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu

- 12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.6 Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, právními jednáními výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran na též dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo elektronicky; změna jinou formou je vyloučena. Odstoupit od Smlouvy a vypovědět ji lze pouze písemně. Smluvní strany ujednaly, že ustanovení první věty tohoto odstavce nebudou aplikovat na změny osob dle čl. 8 Smlouvy a pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy, kdy postačí písemné oznámení o změně druhé Smluvní straně.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoliv svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem

obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoliv souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13 Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Dohoda o převodu některých práv a povinností z Územního rozhodnutí

Příloha č. 3 - Rozhodnutí krajského úřadu Plzeňského kraje – stavební povolení čj. PK-DSH/11504/19 ze dne 13.1.2020

Příloha č. 4 - Rozhodnutí krajského úřadu Plzeňského kraje – prodloužení platnosti stavebního povolení PK-DSH/5926/22 ze dne 18.1.2023

CETIN
V Praze dne

Stavebník
V Plzni dne

za **CETIN a.s.**

Jiří Šittler, MBA
manažer výstavby a údržby fixní sítě ČR
(elektronicky podepsáno)

za **Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje,
p.o**

Mgr. Martin Vít, MPA
technický ředitel
(elektronicky podepsáno)

ČÁST C

VÝŠKOVÝ SYSTÉM [REDAKCE]

Číslo změny:	Obsah změny:	[REDAKCE]
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, 140 00 Praha
tel.: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]

Hlavní inženýr projektu:

Garant profese:

Středisko:

PROJEKTOVÉ STŘEDISKO PLZEŇ

Vedoucí střediska:

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

Vypracoval:

Kontroloval:

Název akce:

**I/20 VŠERUBY - HUNČICE, ÚPRAVA
KŘÍŽOVATKY SE SIL. III/2051**

Číslo smlouvy:

18-300.230

Projektový stupeň:

DSP

Část:

Datum:

04/2019

SITUAČNÍ VÝKRESY

Číslo části:

C

Název přílohy:

SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Měřítko:


1:10 000

Počet formátů:

2 x A4

Číslo přílohy:

1

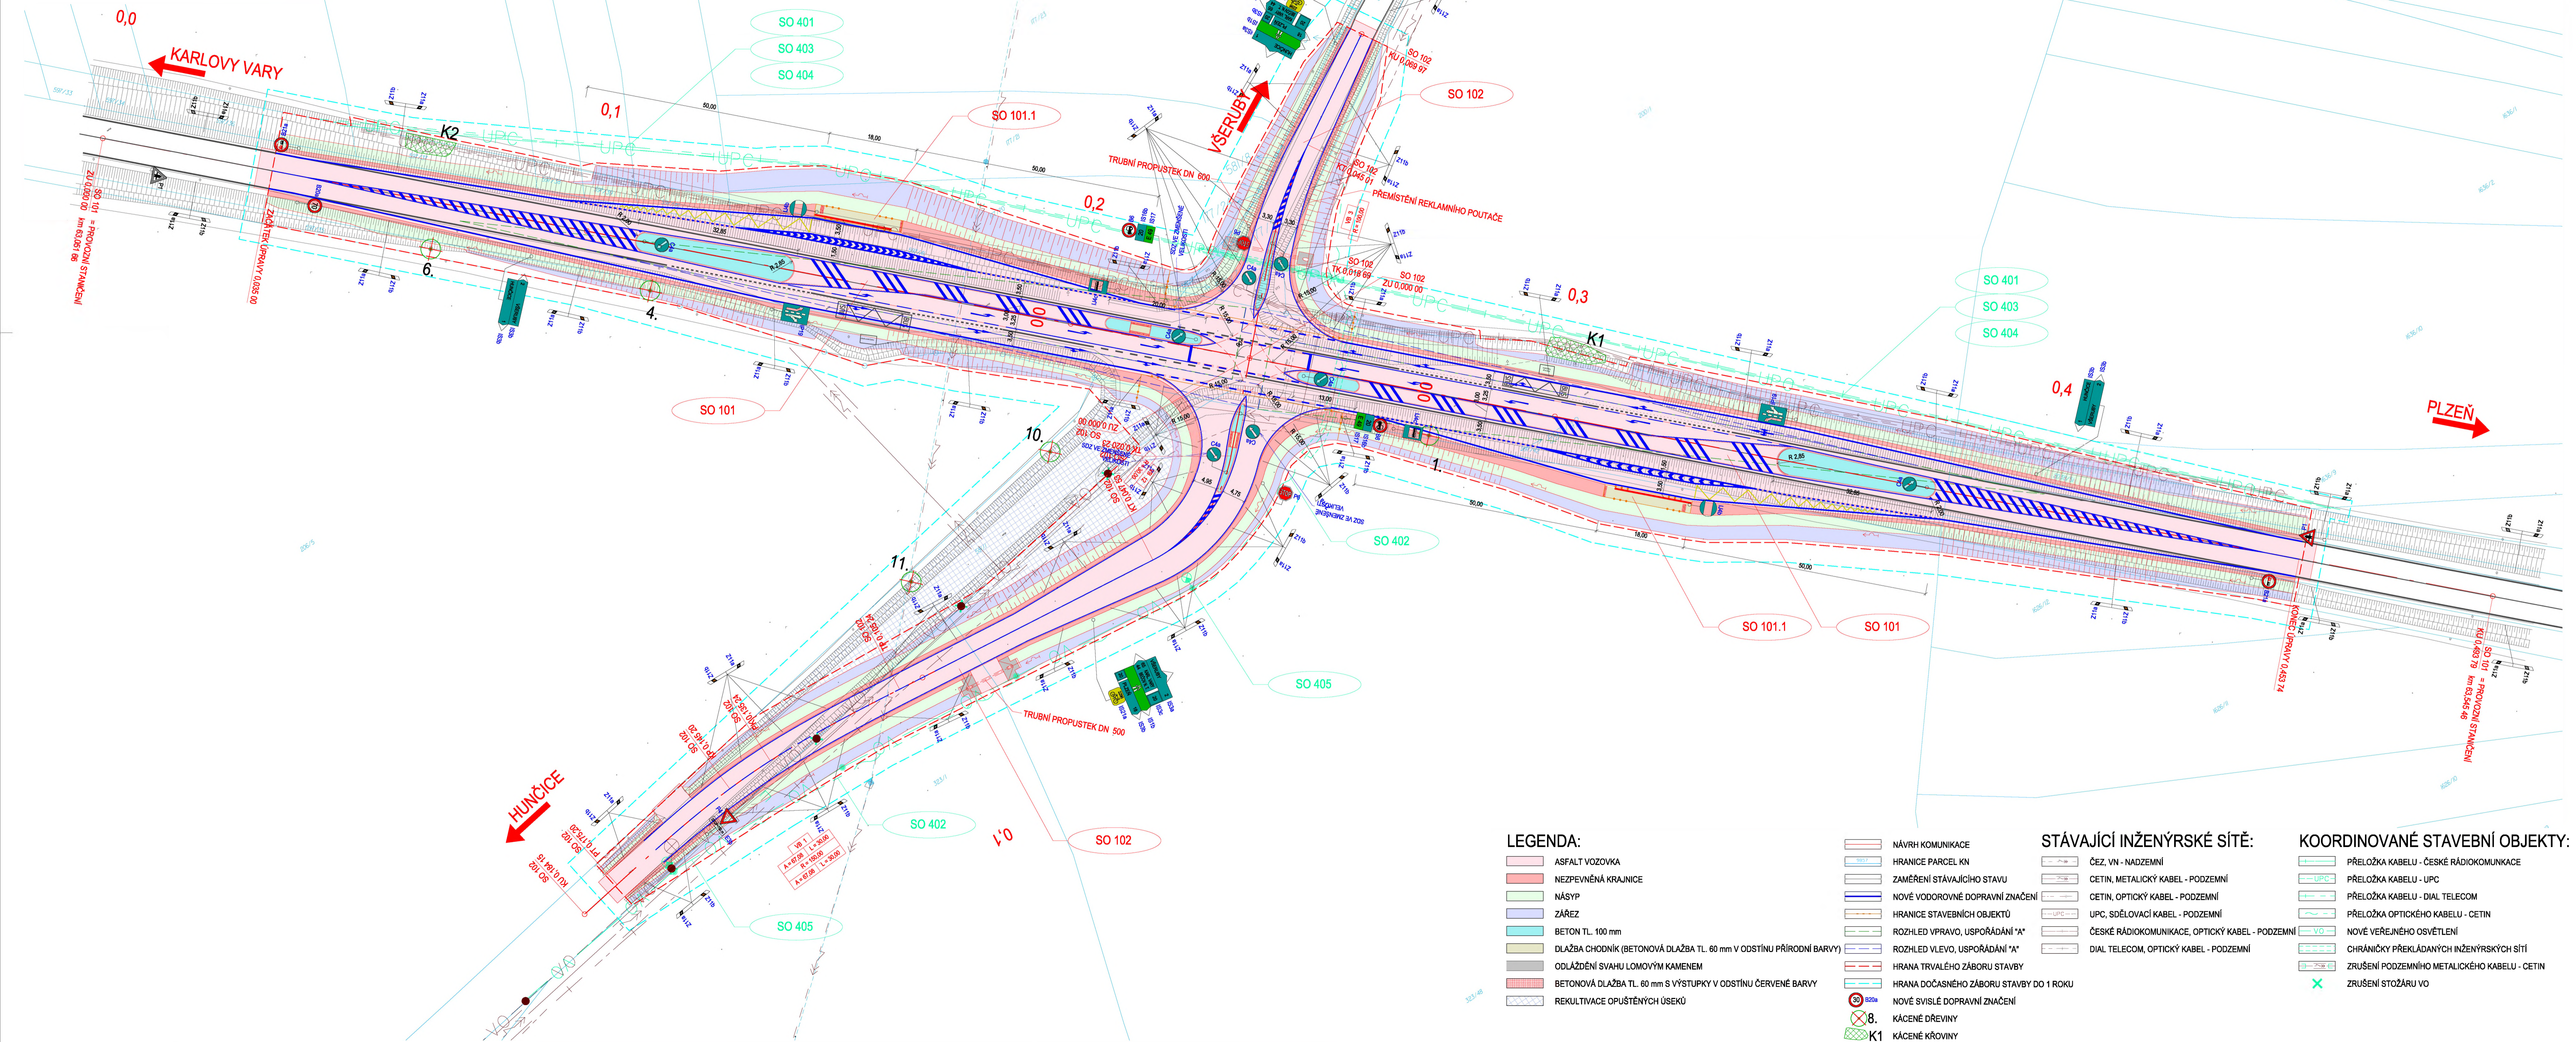

PARAMETRY PRUHU PRO LEVÉ ODBOČENÍ:
 SMĚR KARLOVY VARY - PLZEŇ: Lr = 100 m, Lv = 30 m, Ld = 50 m, Lc = 5 m
 SMĚR PLZEŇ - KARLOVY VARY: Lr = 100 m, Lv = 30 m, Ld = 65 m, Lc = 5 m

PARAMETRY ROZHLEDOVÝCH TROJÚHELNÍKŮ:
 VPRAVO, USPOŘÁDÁNÍ "A" DLE ČSN 73 6102: XB = 160 m, YB = 14,75 m
 VLEVO, USPOŘÁDÁNÍ "A" DLE ČSN 73 6102: XC = 140 m, YC = 5 m

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
 OBJEKTY ŘADY 100:
 SO 101 ÚPRAVA SILNICE I/20
 SO 101.1 AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY
 SO 102 ÚPRAVA SILNICE III/2051
 OBJEKTY NEPODLÉHAJÍCÍ STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ:
 SO 401 PŘELOŽKA KABELU ČESKÝCH RÁDIOKOMUNIKACÍ
 SO 402 PŘELOŽKA KABELU CETIN
 SO 403 PŘELOŽKA KABELU UPC
 SO 404 PŘELOŽKA KABELU DIAL TELECOM
 SO 405 PŘELOŽKA VEŘEJNEHO OSVĚTLENÍ

ČÁST C
 VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Generální projektant: SUDOP PRAHA a.s.
 Ošňanská 1a, 130 80 Praha 3
 tel.: +420 267 094 111
 e-mail: praha@sudop.cz
Hlavní inženýr projektu: ING. PETER VALIŠ
Genert profese: ING. LUKÁŠ SZABÓ

Sřídka:	Projektové středisko Plzeň	Číslo smlouvy:
Vedoucí střediska:	ING. OTA HELLER	18-300.230
Odpovědný projektant SO, IO, PS:	ING. PETER VALIŠ	Projektový stupeň:
Vypracoval:	ING. PETER VALIŠ	DSP
Kontroloval:	ING. LUKÁŠ SZABÓ	Datum:
		04/2019

Název akce:	Číslo smlouvy:
I/20 VŠERUBY - HUNČICE, ÚPRAVA KŘIŽOVATKY SE SIL. III/2051	18-300.230
SITUAČNÍ VÝKRESY	Projektový stupeň:
Název přílohy:	DSP
	Datum:
	04/2019
	Číslo části:
	C
	Mřížka:
	1:500
	Počet formátů:
	12 x A4
	Číslo přílohy:
	2

LEGENDA:

- ASFALT VOZOVKA
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE
- NÁSYP
- ZÁŘEZ
- BETON TL. 100 mm
- DLAŽBA CHODNÍK (BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60 mm V ODSTĚNU PŘÍRODNÍ BARVY)
- ODLÁŽDĚNÍ SVAHU LOMOVÝM KAMENEM
- BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60 mm S VÝSTUPKY V ODSTĚNU ČERVENÉ BARVY
- REKULTIVACE OPUŠTĚNÝCH ÚSEKŮ
- HRANICE PARCEL KN
- ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU
- NOVÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- HRANICE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
- ROZHLED VPRAVO, USPOŘÁDÁNÍ "A"
- ROZHLED VLEVO, USPOŘÁDÁNÍ "A"
- HRANA TRVALÉHO ZÁBORU STAVBY
- HRANA DOČASNÉHO ZÁBORU STAVBY DO 1 ROKU
- NOVÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- KÁCENÉ DŘEVINY
- KÁCENÉ KŘOVINY


STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- ČEZ, VN - NADZEMNÍ
- CETIN, METALICKÝ KABEL - PODZEMNÍ
- CETIN, OPTICKÝ KABEL - PODZEMNÍ
- UPC, SDĚLOVACÍ KABEL - PODZEMNÍ
- ČESKÉ RÁDIOKOMUNIKACE, OPTICKÝ KABEL - PODZEMNÍ
- DIAL TELECOM, OPTICKÝ KABEL - PODZEMNÍ

KOORDINOVANÉ STAVEBNÍ OBJEKTY:

- PŘELOŽKA KABELU - ČESKÉ RÁDIOKOMUNIKACE
- PŘELOŽKA KABELU - UPC
- PŘELOŽKA KABELU - DIAL TELECOM
- PŘELOŽKA OPTICKÉHO KABELU - CETIN
- NOVÉ VEŘEJNEHO OSVĚTLENÍ
- CHRÁNIČKY PŘEKLÁDANÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- ZRUŠENÍ PODZEMNÍHO METALICKÉHO KABELU - CETIN
- ZRUŠENÍ STOŽÁRU VO

Hunčice

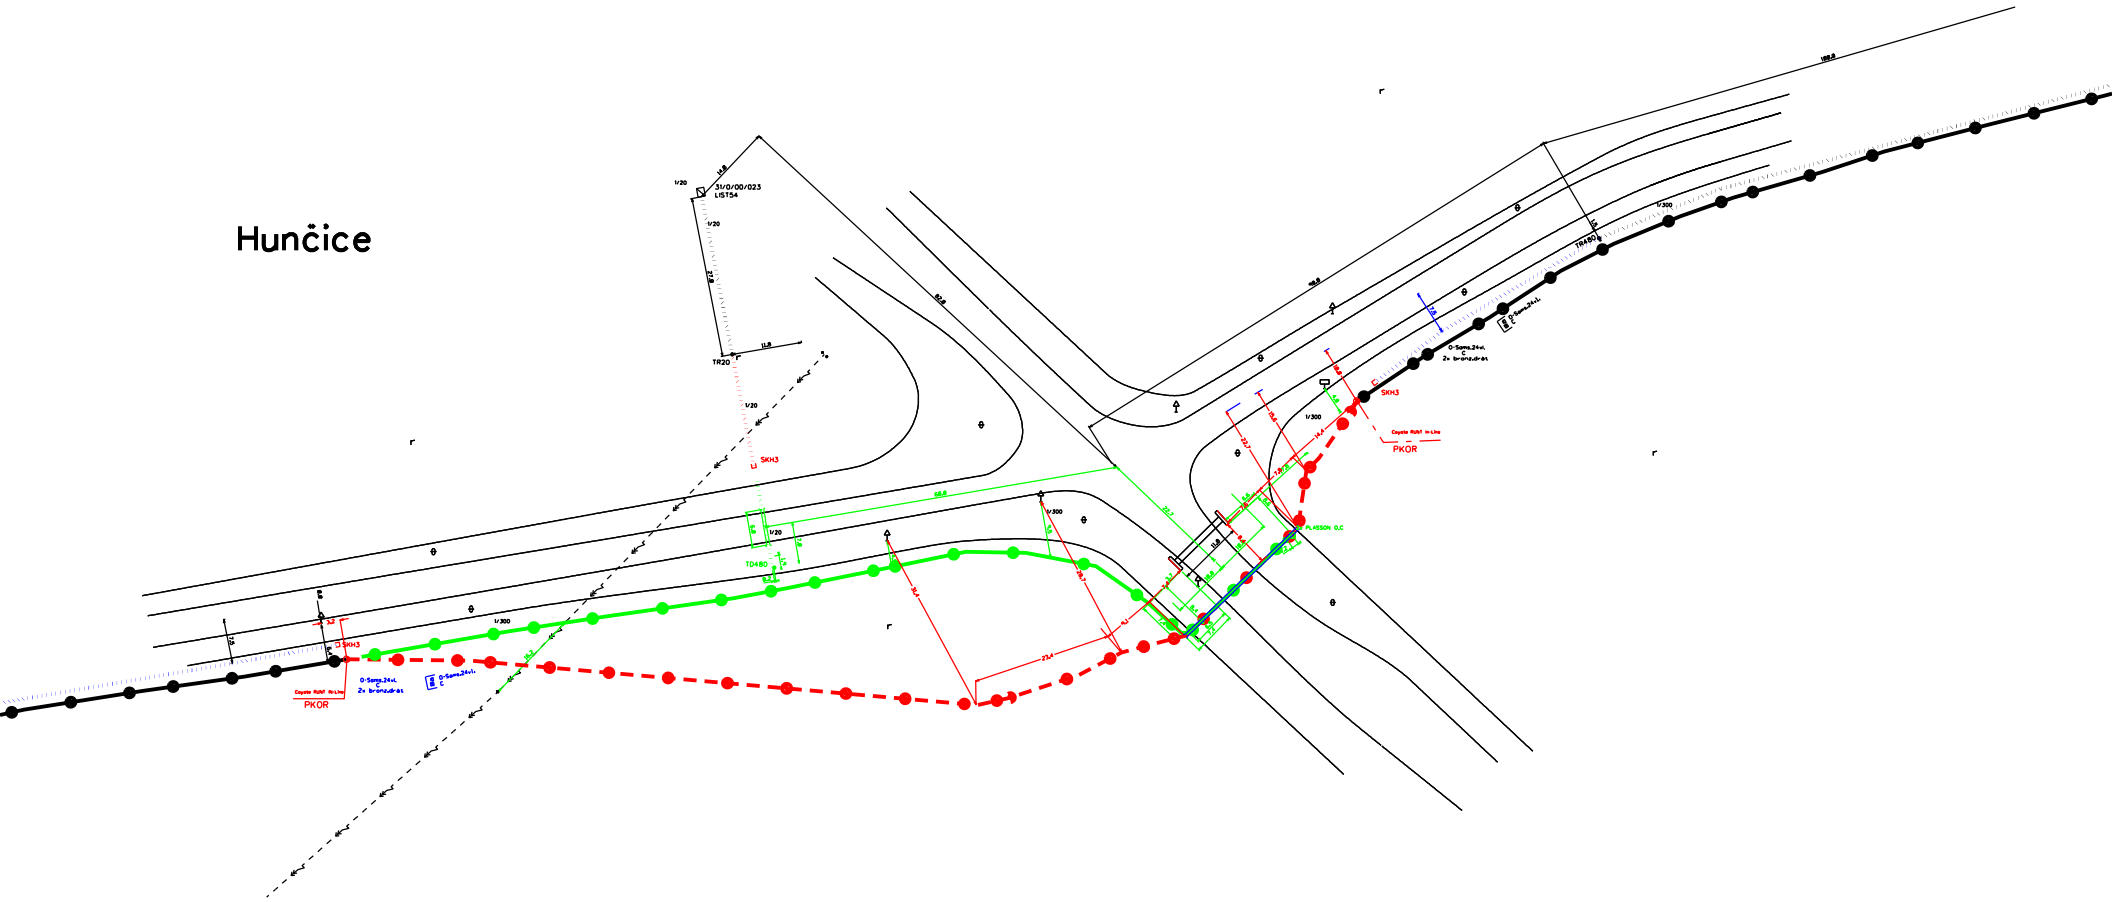

	stavební/územní:	Českomoravská 2510/19	
	Cetin a.s. IČ 04084063	190 00 Praha 9	
	projektant:	Cetin a.s. IČ 04084063	
	Cetin a.s. IČ 04084063	Českomoravská 2510/19 190 00 Praha 9	
kraj:	Plzeňský	stupeň PD:	
název:	VPIC I20 VŠeruby - Hunčice	DSP	
vypracoval:	odpovědný projektant:	datum:	paré č.:
Evžen Veselý	Evžen Veselý	3/2020	


b

VSEU:BS:1
Všeruby-RSU

SIII/Ø2e
Coyote RUNT In-Line

SIII/Ø2f
Coyote RUNT In-Line

LIST:BS:1
Líšťany-RSU

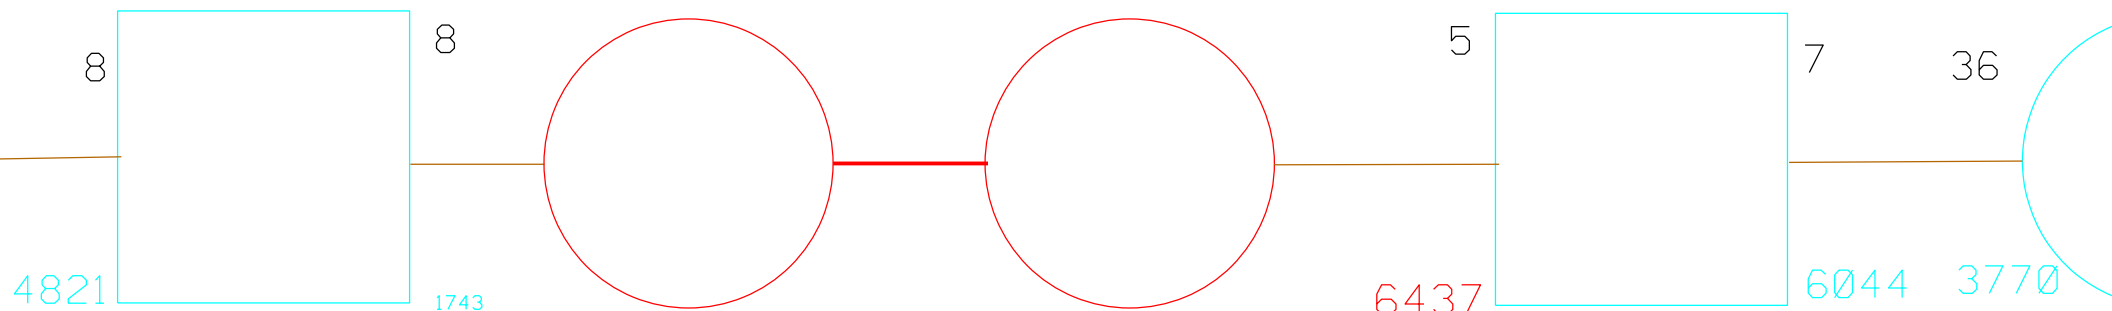

345 Ø12 Ø4 - 4687 m
SAM 24f LT MC CU

P 345 Ø12 Ø5-2274
SAM 24f LT MC CU

	stavebník/investor:	sídl o:	
	Cetin a.s IČ 04084063	Českomoravská 2510/19 190 00 Praha 9	
	projektant:	sídl o:	
	Cetin a.s IČ 04084063	Českomoravská 2510/19 190 00 Praha 9	
kraj:	název:	stupeň PD:	
Plzeňský	VPIC 120 Všeruby - Hunčice	DSP	
vypracoval:	odpovědný projektant:	datum:	paré č.:
Evžen Veselý	Evžen Veselý	3/2020	

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: x VP 2021 - Ostatní STAND. x 2022.12
Položková d 2022.12

Název stavby: VPIC I20 Všeruby- Hunčice
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD:
KPO:
HOST:
VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.214	KMP:	0.000	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.000	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.600	PP HR:	0
		KMOK:	0.400	PP UR:	0
		KMVL:	9.600		
		KMTRK:	0.000		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	33 730,14 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	151 910,16 Kč
MONTÁŽ	176 391,29 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	13 441,54 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	15 684,77 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	14 663,52 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	39 238,48 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	1 330,60 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	89 863,99 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	10 000,00 Kč

Celkové náklady: **546 254 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST	446 178,45 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	100 076,04 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	6 788,66 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	16492.00 JV	16 492,00 Kč
953635		Projekt tlkm liniové optické sítě	10449.48 JV	10 449,48 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954968 S		Podvrt neřízený do 150 mm	26.00 m	57 669,04 Kč
958554 S		Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks	6 493,66 Kč
952354 S		Rýha v poli 35/100	178.00 m	75 799,52 Kč
952352 S		Rýha v poli 35/100 rozšíření o 10 cm	18.00 m	1 948,50 Kč
958751 S		Rýha v poli 50/130	10.00 m	8 825,30 Kč
955052 S		Vytyčení trasy ve volném terénu	198.00 m	1 174,14 Kč
MONTÁŽ				
955037 S		Demontáž nadložního lana ve výkopu	10.00 m	122,20 Kč
958306 S		Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	600.00 m	2 670,00 Kč
958310 S		Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavb	24.00 ks	12 738,00 Kč
958314 S		Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavb	24.00 ks	2 278,08 Kč

955288 S	Montáž koncovky SKH	4.00 ks	245,40 Kč
955002 S	Montáž nadložního lana ve výkopu	200.00 m	3 062,00 Kč
955003 S	Montáž ochranného boxu pro spojku	2.00 ks	1 740,38 Kč
955286 S	Montáž spojky bez montáže vláken	2.00 ks	2 525,38 Kč
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	10.00 ks	583,90 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	600.00 m	12 000,00 Kč
958592 S	Provádění PEW v maintenance window	2.00 ks	64 973,56 Kč
958557 S	Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks	20 258,57 Kč
958331 S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní	48.00 ks	22 810,08 Kč
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	2.00 ks	2 735,22 Kč
958336 S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	600.00 m	17 700,00 Kč
958558 S	Zkouška trhací	1.00 ks	3 179,56 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	6 324,56 Kč
955043 S	Zrušení úložných kabelů nad 300 XN	10.00 m	444,40 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA			
956278	Předměření trasy do 100 m	1.00 ks	6 720,77 Kč
956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	6 720,77 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE			
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	300.00 m	8 964,00 Kč
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná část	1.00 ks	6 720,77 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	4.00 ks	14 663,52 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
958749 S	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	3.00 ks	10 997,64 Kč
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	4.00 ks	11 404,96 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	4.00 ks	14 935,04 Kč
958459	Zápis dokumentu do systému Objednatele	4.00 ks	1 900,84 Kč
POPLATKY			
955368	Poplatky k podzemním tratím síť.optickým odhad náhrad - poplatky za VBŘ	10000.00 JV	10 000,00 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL VYŘAZENÝ				
303003 S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson		10.00 ks	1 330,60 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
306093 S	Drát bronzový D 4,00 mm ČSN 423058		25.00 kg	5 940,25 Kč
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová		10.00 m	42,10 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		194.00 m	935,08 Kč
303777 S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá		200.00 m	458,00 Kč
300218 S	Kabel opt. MiDia ,24vl. AW+,OD 7,5mm,Cu		400.00 m	9 396,00 Kč
318863 S	Kazeta24 svárůCoyoteRunt modré držáky4x6		2.00 ks	1 049,26 Kč
316558 S	Koncovka smršť. SKH 6 70/120 mm		4.00 ks	1 249,16 Kč
321714 S	Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x450		2.00 ks	24 371,26 Kč
320879 S	Materiál pro tratě síťové		6200.00 ks	6 200,00 Kč
302532 S	Mini Marker 1255 80-6102-2191-5		4.00 ks	1 129,64 Kč
323050 S	Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm		60.00 ks	326,40 Kč
306776 S	Průchodka spojky Coyote s 4 vst. 8-11mm		2.00 ks	1 421,56 Kč
306758 S	Průchodka spojky Coyote s 6 vstupy 3-7mm		2.00 ks	1 421,56 Kč
303251 S	Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon		4.00 ks	391,04 Kč
306732 S	Spojka opt.univerzální.Coyote RUNT In-Line		2.00 ks	10 307,08 Kč
310020 S	Svorka zemnicí ZS 16 A		2.00 ks	86,90 Kč
300023 S	Trubka HDPE 40/33 černá		300.00 m	9 786,00 Kč
300030 S	Trubka HDPE 40/33 oranžová		300.00 m	9 786,00 Kč
302752 S	Trubka PE 125/7,1/6000mm		5.00 ks	5 566,70 Kč

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

CETIN a.s.

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
ID DS: qa7425t
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená na základě pověření [REDAKCE]

(dále jen „**Nabyvatel**“)

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ 65993390
ID datové schránky: zjq4rhz
Zastoupená: [REDAKCE]

(dále jen „**Převodce**“)

Nabyvatel a Převodce dále společně jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

dne, měsíce a roku níže uvedeného, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“) uzavírají tuto

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

(dále jen „**Dohoda**“)

1. PŘEDMĚT DOHODY

- 1.1 Převodce je na základě rozhodnutí o umístění stavby **I/20 Všeruby - Hunčice, úprava křižovatky se sil. 111/2051**, které bylo vydáno dne 24.4.2018, městským úřadem ve Městě Touškov pod čj. 3261/2017/MUT-12 a nabylo právní moci dne 19.5.2018 (dále jen „**Rozhodnutí o umístění stavby**“) oprávněn k umístění **I/20 Všeruby - Hunčice, úprava křižovatky se sil. 111/2051** (dále jen „**Stavba**“). Rozhodnutí o umístění stavby je Přílohou č. 1 Dohody.
- 1.2 Předmětem převodu jsou některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to právo k umístění Stavby za podmínek v citovaném rozhodnutí stanovených, a dále s ním související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, tak jak jsou stanoveny v Rozhodnutí o umístění stavby.

2. PŘEVOD PRÁV

- 2.1 Převodce uzavřením Dohody, s účinností ke dni uzavření Dohody, převádí na Nabyvatele některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to toliko právo k umístění Stavby za podmínek v Rozhodnutí o umístění stavby stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Rozhodnutí o umístění stavby stanoveny.
- 2.2 Převodce se zavazuje postoupení písemně oznámit Správnímu orgánu nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne uzavření Dohody.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Dohoda, a práva a povinnosti Smluvních stran z Dohody vyplývající, se řídí právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem, a případné spory budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
- 3.2 Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani projev učiněný po uzavření Dohody, jež není v Dohodě uveden, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek ani jedné ze Smluvních stran.
- 3.3 Dohoda může být měněna nebo zrušena pouze písemně; změna jinou formou je vyloučena. Pojmem „písemně“ se pro účely Dohody rozumí předání zpráv v listinné podobě anebo prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zaručený elektronický podpis**“). Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv než výše uvedených.
- 3.4 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Dohody byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Dohody, ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 3.5 Dohoda nabývá platnosti a účinnosti v den jejího uzavření.
- 3.6 Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.
- 3.7 Smluvní strany ujednaly, že Dohodu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Dohoda je uzavřena doručením Dohody opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.
- 3.8 Následující Přílohy jsou nedílnou součástí Dohody:

Příloha č. 1 – Rozhodnutí o umístění stavby

Číslo Dohody společnosti CETIN: PN 2020_0023
Číslo smlouvy Stavebníka:


SAP S/4 Hana: NE
Registr smluv: NE

Nabyvatel:


Převodce:

V Praze dne.

V Plzni dne



specialista pro výstavbu sítě - překládky SEK
(podepsáno elektronicky)



ředitel Správy Plzeň
(podepsáno elektronicky)

Městský úřad Město Touškov

Stavební úřad

Dolní náměstí 1, 330 33 Město Touškov



SU A0058017

Spis zn. /3261/2017/STAV/Ma
Č.j.: 3261/2017/MUT-12
Vyřizuje: [redacted]
E-mail: [redacted]
Telefon: [redacted]

Město Touškov, dne 24.4.2018



5

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 19.5.2018
MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚSTO TOUŠKOV
dne 21.5.2018 [redacted]

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Město Touškov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 28.6.2017 podal

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, kterého zastupuje SUDOP PRAHA a.s., IČO 25793349, Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3-Žižkov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

I/20 Všeruby - Hunčice, úprava křižovatky se sil. III/2051

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 177/15, 177/16, 177/17, 177/18, 177/19, 177/20, 177/21, 177/22, 177/23 – vše orná půda, 177/24 – ostatní plocha, 200/1, 206/5, 323/1, 323/48 – vše orná půda, 581/1, 581/2, 581/7, 581/8, 581/9, 597/7, 597/35, 597/36, 597/37, 597/38, 597/39, 597/40, 597/41, 597/42 – vše ostatní plocha v katastrálním území Hunčice, parc. č. 1626/12, 1636/8, 1639/9 – vše orná půda, 2038/11, 2038/50, 2038/51 – vše ostatní plocha v katastrálním území Všeruby u Plzně.

Druh a účel umístěvané stavby:

- dopravní stavba, změna dokončené stavby - stavební úpravy stávající křižovatky v prostoru křížení silnic I/20 a III/2051
- stavba členěna na jednotlivé stavební objekty:

SO 101 Úprava silnice I/20

SO 102 Úprava silnice III/2051

SO 401 Přeložka kabelu Českých Radiokomunikací

SO 402 Přeložka kabelu UPC

SO 403 Přeložka kabelu Dial Telecom

SO 404 Přeložka kabelu CETIN

SO 405 Přeložka veřejného osvětlení

Umístění stavby na pozemku, určení prostorového řešení stavby:

SO 101 Úprava silnice I/20

- bude umístěna na pozemku parc.č.581/1, 597/41, 597/42, 177/18, 177/20, 177/21, 206/5, 200/1, 323/48, 177/19, 597/7, 597/25, 597/36, 597/37, 597/38, 597/39, 597/40 v k.ú. Hunčice a parc.č.1626/12, 2038/11, 1636/9, 2038/50, 2038/51 v k.ú. Všeruby
- celková délka řešeného úseku 0,493 79 km; celková délka stavebních úprav 0,418 74 km
- provozní staničení km 63,051 66 – 63,545 46
- výšková trasa řešeného úseku respektuje stávající stav
- šířkové uspořádání: průběžný jízdní pruh (3,5 m), pruh pro levé odbočení (3,25 m), dělicí dopravní ostrůvek (2,50 m), vodící proužek (0,25), zpevněná krajnice (0,50 m), nezpevněná krajnice (0,75 m)

- přesunutí stávajících autobusových zastávek do polohy za křižovatkou (ve směru jízdy), šířka zastávkového pruhu 3,0 m, délka nástupiště 2,5 m; v místě pohybu chodců rozšířena nezpevněná krajnice na 2,0 m
- vodorovné a svislé dopravní značení
- zřízení a úprava silničních příkopů

SO 102 Úprava silnice III/2051

- bude umístěna na pozemku parc.č.581/1, 597/41, 597/42, 177/20, 177/21, 177/22, 177/23, 321/1, 200/1, 323/48, 581/2, 177/24, 581/7, 581/8, 581/9, 597/7, v k.ú. Hunčice
- stavební úpravy obou křižovatkových větví větev III/2051 – sever (směr Všeruby):
 - změna směrového napojení na silnici I/20 se stávajícího úhlu napojení 75° na 90°; změna napojení provedena směrovým obloukem o poloměru R=100,0 m
 - výškové vedení přizpůsobeno příčnému sklonu I/20 v místě napojení a stávajícímu podélnému vedení silnice III/2051
 - šířkové uspořádání: jízdní pruh (2,75 m), zpevněná krajnice (0,50 m), nezpevněná krajnice (0,75 m); v místě napojení na I/20 vložen kapkovitý dělicí dopravní ostrůvek
 - vodorovné a svislé dopravní značení
 - zřízení a úprava silničních příkopů včetně propustků
 - odstraňované části vozovkového souvrství odstraněny na zemní plán vozovky

větev III/2051 – jih (směr Hunčice):

- změna směrového napojení na silnici I/20 se stávajícího úhlu napojení 53° na 90°; změna napojení provedena pomocí dvou protisměrných oblouků o poloměru R=30,0 m a R=150,0m
- výškové vedení přizpůsobeno příčnému sklonu I/20 v místě napojení a stávajícímu podélnému vedení silnice III/2051
- šířkové uspořádání: jízdní pruh (2,75 m), zpevněná krajnice (0,50 m), nezpevněná krajnice (0,75 m); v místě napojení na I/20 vložen kapkovitý dělicí dopravní ostrůvek
- vodorovné a svislé dopravní značení
- zřízení a úprava silničních příkopů včetně propustků
- odstraňované části vozovkového souvrství odstraněny na zemní plán vozovky

SO 401 Přeložka kabelu Českých Radiokomunikací

- bude umístěna na pozemku parc.č.177/15, 177/16, 177/17, 177/18, 177/20, 177/21, 200/1, 177/19, 597/7, 597/36, 597/37, 597/38 v k.ú. Hunčice a parc.č.1636/8, 1636/9, 2038/50, 2038/50 v k.ú. Všeruby
- optotrubky budou v křižovatce a místě nového zálivu (km 0,080-0,460) přeloženy do nové trasy stranovou přeložkou bez přerušení kabelů; v celé délce bude nová trasa uložena za vnější hranou nově budovaného příkopu podél komunikace I/20

postup prací:

- odkopání HDPE optotrubek na konec kolizních míst s terénními úpravami spojených s rozšířením I/20
- ověřit délku stávající a nové trasy, zda je možno provést přeložku bez přerušení, v případě nutnosti prodloužit vložení nového kusu prázdné HDPE s řádným naspojkováním; obsazené HDPE budou naříznuty, od stávající kabelové rezervy se profoukne rezerva v požadované délce a chybějící kus HDPE trubky se nahradí půlenou ochrannou trubkou
- pod silnicí budou optotrubky uloženy do dělených chrániček a obetonovány
- vodič CYY6mm² bude stranově přeložen bez přerušení s optotrubkami, popř. bude provedena kabelová vložka stejným typem vodiče
- práce nad trubkami prováděny ručně, minimální krytí ve volném terénu 100 cm, pod komunikací 120 cm
- délka trasy cca 390 m

SO 402 Přeložka kabelu UPC

- bude umístěna na pozemku parc.č.177/15, 177/16, 177/17, 177/18, 177/20, 177/21, 200/1, 177/19, 597/7, 597/36, 597/37, 597/38 v k.ú. Hunčice a parc.č.1636/8, 1636/9, 2038/50, 2038/50 v k.ú. Všeruby
- optotrubky budou v křižovatce a místě nového zálivu (km 0,080-0,460) přeloženy do nové trasy stranovou přeložkou bez přerušení kabelů; v celé délce bude nová trasa uložena za vnější hranou nově budovaného příkopu podél komunikace I/20

postup prací:

- odkopání HDPE optotrubelek na konec kolizních míst s terénními úpravami spojených s rozšířením I/20
- ověřit délku stávající a nové trasy, zda je možno provést přeložku bez přerušení, v případě nutnosti prodloužit vložení nového kusu prázdné HDPE s řádným naspojkováním; obsazené HDPE budou naříznuty, od stávající kabelové rezervy se profoukne rezerva v požadované délce a chybějící kus HDPE trubky se nahradí půlenou ochrannou trubkou
- pod silnicí budou optotrubky uloženy do dělených chrániček a obetonovány
- práce nad trubkami prováděny ručně, minimální krytí ve volném terénu 100 cm, pod komunikací 120 cm
- délka trasy cca 390 m

SO 403 Přeložka kabelu Dial Telecom

- bude umístěna na pozemku parc.č.177/15, 177/16, 177/17, 177/18, 177/20, 177/21, 200/1, 177/19, 597/7, 597/36, 597/37, 597/38 v k.ú. Hunčice a parc.č.1636/8, 1636/9, 2038/50, 2038/50 v k.ú. Všeruby
- optotrubky budou v křižovatce a místě nového zálivu (km 0,080-0,460) přeloženy do nové trasy stranovou přeložkou bez přerušení kabelů; v celé délce bude nová trasa uložena za vnější hranou nově budovaného příkopu podél komunikace I/20

postup prací:

- odkopání HDPE optotrubelek na konec kolizních míst s terénními úpravami spojených s rozšířením I/20
- ověřit délku stávající a nové trasy, zda je možno provést přeložku bez přerušení, v případě nutnosti prodloužit vložení nového kusu prázdné HDPE s řádným naspojkováním; obsazené HDPE budou naříznuty, od stávající kabelové rezervy se profoukne rezerva v požadované délce a chybějící kus HDPE trubky se nahradí půlenou ochrannou trubkou
- pod silnicí budou optotrubky uloženy do dělených chrániček a obetonovány
- práce nad trubkami prováděny ručně, minimální krytí ve volném terénu 100 cm, pod komunikací 120 cm
- délka trasy cca 390 m

SO 404 Přeložka kabelu CETIN

- bude umístěna na pozemku parc.č.323/1 a 323/48 v k.ú. Hunčice
- metalický kabel již není provozován, bude na hranici stavby přerušen a řádně zakončen
- optotrubky budou pod nově budovaným jižním ramenem silnice III/2051 i pod rozšířením silnice I/20 zahloubeny, uloženy do dělených chrániček a obetonovány

postup prací:

- odkopání HDPE optotrubelek na konec kolizních míst s terénními úpravami spojených úpravami křižovatky
- ověřit délku stávající a nové trasy, zda je možno provést přeložku bez přerušení, v případě nutnosti prodloužit vložení nového kusu prázdné HDPE s řádným naspojkováním; obsazené HDPE budou naříznuty, od stávající kabelové rezervy se profoukne rezerva v požadované délce a chybějící kus HDPE trubky se nahradí půlenou ochrannou trubkou
- pod silnicí budou optotrubky uloženy do dělených chrániček a obetonovány
- práce nad trubkami prováděny ručně, minimální krytí ve volném terénu 100 cm, pod komunikací 120 cm
- délka trasy cca 210 m

SO 405 Přeložka veřejného osvětlení

- bude umístěna na pozemku parc.č.323/1 a 323/48 v k.ú. Hunčice
- přeložení 4 ks stávajících betonových sloupů VO za hranu odvodňovacího příkopu
- na sloupech osazena dvě svítidla, mezi sloupy zavěšen samonosný závěsný vodič 1-AES 2x16 ve čtyřech úsecích
- stávající betonové sloupy budou demontovány
- délka trasy cca 160 m

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- pozemky parc. č. 177/15, 177/16, 177/17, 177/18, 177/19, 177/20, 177/21, 177/22, 177/23, 177/24, 200/1, 206/5, 323/1, 323/48, 581/1, 581/2, 581/7, 581/8, 581/9, 597/7, 597/35, 597/36, 597/37, 597/38, 597/39, 597/40, 597/41, 597/42 v katastrálním území Hunčice a parc. č. 1626/12, 1636/8, 1639/9, 2038/11, 2038/50, 2038/51 v katastrálním území Všeruby u Plzně

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací zpracovanou ing. Jan Dočekal (ČKAIT 0202150). Případné změny nesmějí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli, musí zadavatel stavby podle § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zjištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, určit koordinátora BOZP. Přesáhne-li stavba svým plánovaným objemem prací a činností dobu stanovenou § 15 odst. 1 zákona 309/2006 Sb., o zjištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí zadavatel stavby doručit oznámení o zahájení prací na oblastní inspektorát práce v Plzni.
3. Pro umístění stavby, přípravu projektové dokumentace a provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů:

MěÚ Nýřany, prac. Plzeň, odbor životního prostředí – souhrnné stanovisko s podmínkami (ochrana přírody a krajiny)

- Orgánu ochrany přírody bude doložen dendrologický průzkum uvedený v žádosti jako součást PD-F.5 Dendrologický průzkum, na základě kterého bude možno stanovit podmínky ochrany stavby.

MěÚ Nýřany, prac. Plzeň, odbor životního prostředí, závazné stanovisko – souhlas s trvalým odnětím 0,5558 ha zemědělské půdy s povinnostmi pro žadatele:

- Na základě projektové dokumentace bude provedeno vytýčení hranice odnětí půdy a zajištěno její nepřekročení.
- Odděleně bude skryta odděleně svrchní kulturní vrstva půdy, případně i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na ploše odnímané zemědělské půdy, na které budou prováděny případné terénní úpravy vyžadující skrytí. Skrytá ornice bude uchována na pozemcích zásahem dotčených.
- Se skrývkou bude nakládáno dle doložené bilance - 2501 m³ skrývky bude využito dle doložené a schválené bilance skrývky.
- O činnostech, souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy, vést protokol (pracovní deník) s uvedením všech skutečností pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání skrytých zemín.
- Pokud by výstavbou došlo k znepřístupnění některých zemědělských pozemků, je nutné zřídit na ně na vlastní náklady náhradní vjezdy podle dispozic vlastníků (nájemců) pozemků.
- Umístění stavby musí být provedeno tak, aby co nejméně narušovalo organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry v území a nedocházelo k poškozování zemědělského půdního fondu.
- V průběhu terénních prací je třeba učinit taková opatření, aby bylo zabráněno úniku látek (zejména pevných a kapalných) poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
- Nebude stanoven odvod finančních prostředků.

KÚ Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství – závazné stanovisko k PD pro územní rozhodnutí na stavbu „I/20 Všeruby – Hunčice, úprava křižovatky se sil. III/2051“ s podmínkami:

- Veškeré změny a úpravy pozemních komunikací budou projednány s jejich vlastníky, resp. Majetkovým správcem (silnice II. a III. tř. – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.).
- Z hlediska bezpečnosti silničního provozu budou změny a úpravy pozemních komunikací projednány s Policií ČR.
- Stavební úpravy silnice III/2051 budou realizovány podle předložené PD, zpracované projektantem SUDOP PRAHA a.s., Projektové středisko Plzeň, Husova 71, 301 17 Plzeň

4. Pro umístění stavby, přípravu projektové dokumentace a při realizaci stavby, popř. části stavby (jednotlivých stavebních objektů) budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření účastníků řízení, správců a vlastníků jednotlivých sítí (Cetin dne 21.5.2017, č.j.POS-PD-95-2017; ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 13.4.2017, č.j.1092192645; UPC ČR, s.r.o. v zastoupení: InfoTel, spol. s r.o., ze dne 8.6.2017, č.j.A1725/2017; Dial Telecom, a.s. ze dne 27.1.2017, č.j.CR462454; ČESKE RADIOKOMUNIKACE a.s. ze dne 16.6.2017, č.j.UPTS/OS/167076/2017)
5. Po zpracování projektové dokumentace, před zahájením prací požádá investor o vydání stavebního povolení na příslušném speciálním stavebním úřadě: MěÚ Nýřany, prac. Plzeň, odbor dopravy.
6. Stavební objekty: SO 401 Přeložka kabelu Českých Radiokomunikací, SO 402 Přeložka kabelu UPC, SO 403 Přeložka kabelu Dial Telecom, SO 404 Přeložka kabelu CETIN, SO 405 Přeložka veřejného osvětlení lze realizovat na základě tohoto rozhodnutí (po nabytí právní moci

rozhodnutí). Provádění staveb jednotlivých stavebních objektů musí být vzájemně koordinováno. Pro tyto stavby bude zpracována prováděcí projektová dokumentace. Po realizaci stavby požádá žadatel (stavebník) o vydání souhlasu kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu doloží: dokumentaci skutečného provedení stavby, geodetické zaměření stavby, doklady o provedení a vyhodnocení zkoušek požadovaných zvláštními předpisy (revize, doklady o použitých materiálech a výrobcích a pod.) dle druhu stavby.

7. Zřízení staveniště – staveniště bude umístěno na pozemku jehož se týká výstavba.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4
Správa s údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00
Plzeň 1

Obec Líšňany, Líšňany 77, 330 35 Líšňany

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha 6-Repy, 163 00 Praha 618

Odůvodnění:

Dne 28.6.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 2.8.2017, 3261/2017/MUT-2 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Na základě znalostí poměrů v území a předložené dokumentace v souladu s ustanovením §87 odst.1 stavebního zákona upustil od ústního jednání. Současně stanovil lhůtu - 15 - ti dnů od doručení oznámení ve které účastníci řízení mohli podat své námítky a dotčené orgány sdělit svá stanoviska.

Současně byl žadatel vyzván k odstranění nedostatků podání výzvou ze dne 2.8.2017, č.j. 3261/2017/MUT-4 v termínu nejpozději do 15 - ti dnů od doručení výzvy.

Dne 19.9.2017 žadatel požádal o prodloužení lhůty k odstranění nedostatků podání dle výše uvedené výzvy. Stavební úřad žádosti vyhověl, a usnesením ze dne 27.9.2017, č.j. 3261/2017/MUT-8 řízení přerušil.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 19.9.2017 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 12.3.2018.

Protože v průběhu řízení došlo ke změně majetkoprávních vztahů, stavební úřad vyzval žadatele dne 13.3.2018 výzvou č.j.3261/2017/MUT-10 k doplnění souhlasu s umístěním stavby na pozemcích u kterých došlo ke změně vlastníka. Chybějící doklad byl doložen dne 26.3.2018.

Stavební úřad opatřením ze dne 29.3.2018, č.j. 3261/2017/MUT-11 vyrozuměl účastníky řízení o pokračování v řízení, seznámení s podklady rozhodnutí a o změně účastníků řízení. Současně stanovil lhůtu do 15 -ti dnů od obdržení, kdy je možno nahlédnout do podkladů řízení a vyjádřit se k podkladům řízení.

Této lhůty nebylo využito.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, jedná se o stavební úpravu stávající dopravní infrastruktury. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Byla doložena dokumentace zpracovaná Sudop Praha a.s. z 03/2017, č.smlouvy 16-297.230, zpracoval ing. ing. Jan Dočekal (ČKAIT 0202150)(kontroloval), hlavní inženýr projektu [redacted]

Projektant odpovídá za správnost, celistvost, a úplnost jím zpracované dokumentace a respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Stanoviska sdělili:

Dotčené orgány:

- KÚ Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství – Rozhodnutí – povolení úpravy připojení silnice III/2051 k silnici I/20 ze dne 26.6.2017, č.j.ZN/1662/DSH/17
- KÚ Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství – závazné stanovisko k PD pro územní rozhodnutí na stavbu „I/20 Všeruby – Hunčice, úprava křižovatky se sil. III/2051“ ze dne 14.2.2017, č.j.ZN/627/DSH/17 s podmínkami
- KÚ Plzeňského kraje, odbor životního prostředí – vyjádření (k PD pro územní rozhodnutí na stavbu „I/20 Všeruby – Hunčice, úprava křižovatky se sil. III/2051“) ze dne 14.2.2017, č.j.ZN/4/ŽP/17 bez podmínek
- MěÚ Nýřany, prac. Plzeň, odbor dopravy – stanovisko k DÚR na stavbu „ Všeruby-Hunčice, úprava křižovatky I/20 a III/2051“ souhlasné stanovisko souhlas, nemá námitek (s obecnými podmínkami) z 24.4.2017, č.j.OD-Fro/4024/2017
- MěÚ Nýřany, prac. Plzeň, odbor životního prostředí, souhrnné stanovisko ze dne 21.2.2017, č.j.OŽP-REI/3653/2017 (s podmínkami)
- Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Odbor služby dopravní policie stanovisko ze dne 24.3.2017, č.j.KRPP-22297-2/ČJ-2017-0300DP – odsouhlasení dokumentace
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni – závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení, souhlas ze dne 20.2.2017, č.j.KHSPL/3225/21/2017 (bez podmínek)
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, souhlasné závazné stanovisko k projektové dokumentaci ze dne 23.2.2017, č.j.HSPM-716-2/2017 ÚPP (bez podmínek)
- Ministerstvo dopravy, závazné stanovisko ze dne 12.4.2017, č.j.140/2017-910-IPK/4 (bez podmínek)
- KÚ Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje ze dne 14.2.2017, č.j.ZN/94/RR/17, určení stavebního úřadu
- MěÚ Nýřany, prac. Plzeň, odbor životního prostředí, závazné stanovisko – souhlas s trvalým odnětím 0,5558 ha zemědělské půdy ze dne 6.3.2018, č.j.OŽP-Han/7065/2018 s povinnostmi pro žadatele

Ostatní:

- Plná moc ze dne 14.9.2016 (ŘSD ČR – SUDOP Praha a.s.)
- Vyjádření vlastníka (spoluvlastníka) pozemků, které jsou dotčeny stavbou „I/20 Všeruby – Hunčice, úprava křižovatky se sil.III/2051“ parc.č.KN 177/19 v k.ú. Hunčice ze dne 17.5.2017, Michael Hubka
- Vyjádření vlastníka (spoluvlastníka) pozemků, které jsou dotčeny stavbou „I/20 Všeruby – Hunčice, úprava křižovatky se sil.III/2051“ parc.č.KN 200/1 v k.ú. Hunčice ze dne 29.5.2017, Eva Brunerová
- Vyjádření vlastníka (spoluvlastníka) pozemků, které jsou dotčeny stavbou „I/20 Všeruby – Hunčice, úprava křižovatky se sil.III/2051“ parc.č.KN 581/2 v k.ú. Hunčice ze dne 16.5.2017, obec Líšťany
- Vyjádření vlastníka (spoluvlastníka) pozemků, které jsou dotčeny stavbou „I/20 Všeruby – Hunčice, úprava křižovatky se sil.III/2051“ parc.č.KN 177/15,16,17,18,20,21,22,23;206/5 v k.ú. Hunčice a parc.č.1626/12 v k.ú. Všeruby u Plzně ze dne 7.7.2017, Jan Jílek
- Vyjádření vlastníka (spoluvlastníka) pozemků, které jsou dotčeny stavbou „I/20 Všeruby – Hunčice, úprava křižovatky se sil.III/2051“ parc.č.KN 323/48,1 v k.ú. Hunčice ze dne 7.7.2017, Jan Jílek, Petra Jílková
- SPÚ, odbor převodu majetku, vyjádření k trvalému záboru – územnímu a stavebnímu posouzení ze dne 20.12.2017, č.j.SPU 419133/2017 (souhlas s umístěním stavby, pozemky parc.č.177/24,581/7,581/8,581/9,597/7 v k.ú. Hunčice a parc.č.1636/9 v k.ú. Všeruby u Plzně)
- Vyjádření vlastníka (spoluvlastníka) pozemků, které jsou dotčeny stavbou „I/20 Všeruby – Hunčice, úprava křižovatky se sil.III/2051“ parc.č.KN 2038/50,51 k.ú. Všeruby u Plzně ze dne 24.1.2018, ČR,Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci
- Vyjádření vlastníka (spoluvlastníka) pozemků, které jsou dotčeny stavbou „I/20 Všeruby – Hunčice, úprava křižovatky se sil.III/2051“ parc.č.KN 597/35,36,37,38,39,40 v k.ú. Hunčice ze dne 21.3.2018, ČR,Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci
- ŘSD ČR, správa Plzeň, vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni DÚR ze dne 17.3.2017, č.j.,625/17-33200/We
- Správa s údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, souhlas s vydáním územního rozhodnutí bez podmínek ze dne 9.3.2017, č.j.399/17/SÚSPK-PS/MP
- CETIN souhlas s vydáním územního rozhodnutí ze dne 21.5.2017, č.j.POS-PD-95-2017 (s podmínkami)
- ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření k PD ze dne 13.4.2017, č.j.1092192645 (s podmínkami)

UPC ČR, s.r.o. v zastoupení: InfoTel, spol. s r.o., vyjádření o existenci vedení veřejné komunikační sítě (VVKS) (nachází se) a souhlas s umístěním a realizací stavby s podmínkami ze dne 8.6.2017, č.j.A1725/2017

- Dial Telecom, a.s. vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí, v zájmovém území se nachází podzemní komunikační vedení, souhlas s podmínkami ze dne 27.1.2017, č.j.CR462454
- ČESKE RADIOKOMUNIKACE a.s. souhlas s dokumentací s podmínkami ze dne 16.6.2017, č.j.UPTS/OS/167076/2017
- Obec Líšřany, souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci ze dne 15.2.2017, č.j.101/17, stanovisko (kladné) k přeložce VO ze dne 18.1.2017
- Město Všeruby, souhlas rady města s předloženou dokumentací k územnímu řízení ze dne 2.3.2017, č.j.29/2017

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí bod č. 3.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení dle stavebního zákona - další dotčené osoby:

- účastníci řízení dle §85 odst.1: Ředitelství silnic a dálnic ČR, obec Líšřany, město Všeruby
- účastníci řízení dle §85 odst.2 písm.a): Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa s údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Obec Líšřany, [redacted] a, Státní pozemkový úřad, [redacted] Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., InfoTel, spol. s r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Dial Telecom, a.s., České Radiokomunikace a.s.
- účastníci řízení dle §85 odst.2 písm.b): [redacted]

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Podmínky ve vyjádřeních účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí bod č.4.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje, Plzeň podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Podle § 94 stavebního zákona lze na žádost oprávněného změnit územní rozhodnutí, jestliže se změnila územně plánovací dokumentace nebo jiné podklady pro územní rozhodnutí nebo podmínky v území. Územní rozhodnutí lze z moci úřední změnit nebo zrušit v řízení o umístění veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšného opatření.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli a obecnímu úřadu v místě stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



vedoucí stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč byl zaplacen dne 8.8.2017.

Obdrží:účastníci řízení:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz v zastoupení: SUDOP PRAHA a.s., IDDS: nd9sqfy

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

InfoTel, spol. s r.o., IDDS: t4wbzpv

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Dial Telecom, a.s., IDDS: p4vdqdt

České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

Obec Líšťany, IDDS: jd4b28a

město Všeruby, IDDS: 6wubid3

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, IDDS: rb8wvq3

dotčené orgány:

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p

MěÚ Nýřany, prac.Plzeň, odbor dopravy, IDDS: 8hrbtcq

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Odbor služby dopravní policie, IDDS: Sixai69

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k

Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aaau3

dále obdrží na vědomí:

MěÚ Všeruby, IDDS: 6wubid3

obecní úřad Líšťany IDDS: jd4b28a



Naše č. j.: PK-DSH/11504/19
Spis. zn.: ZN/2532/DSH/19
Počet listů:
Počet příloh:
Počet listů příloh:

Vyřizuje:

Datum: 13.1.2020

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

Dne 10.6.2020

V Plzni dne 15.6.2020



ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Stavebník - **Ředitelství silnic a dálnic ČR**, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390, Správa Plzeň, Hřimálého 37, 301 00 Plzeň, zastoupen právníkou osobou SUDOP PRAHA a. s., se sídlem Olšanská 1a, 180 00 Praha 3, IČ 25793349 podal dne 30.9.2019 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „**I/20 Všeruby – Hunčice, úprava křižovatky se sil. III/2051**“, v rozsahu stavebních objektů **SO 101 Úprava silnice I/20, SO 101.1 Autobusové zastávky**, umístěný na pozemku parc. č. 581/1, 597/41, 597/42, 177/18, 177/20, 177/21, 206/5, 200/1, 323/48, 177/19, 597/7, 597/35, 597/36, 597/37, 597/38, 597/39, 597/40 v k. ú. Hunčice, parc. č. 1626/12, 2038/11, 1636/9, 2038/50, 2038/51 v k. ú. Všeruby u Plzně, **SO 102 Úprava silnice III/2051**, umístěný na pozemku parc. č.: 581/1, 597/41, 597/42, 177/20, 177/21, 177/22, 177/23, 323/1, 200/1, 323/48, 581/2, 177/24, 581/7, 581/8, 581/9, 597/7 v k. ú. Hunčice. Dnem podání bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební řízení je vedeno rovněž v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad, příslušný podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), žádost ve stavebním řízení projednal a se souhlasem příslušného stavebního úřadu, kterým je Městský úřad Město Touškov, Stavební úřad, č. j.: 1238/2019/MUMT-3, ze dne 31.5.2019 (§ 15 odst. 2 stavebního zákona), rozhodl t a k t o :

stavba „**I/20 Všeruby – Hunčice, úprava křižovatky se sil. III/2051**“, v rozsahu stavebních objektů **SO 101 Úprava silnice I/20, SO 101.1 Autobusové zastávky**, umístěný na pozemku parc. č. 581/1, 597/41, 597/42, 177/18, 177/20, 177/21, 206/5, 200/1, 323/48, 177/19, 597/7, 597/35, 597/36, 597/37, 597/38, 597/39, 597/40 v k. ú. Hunčice, parc. č. 1626/12, 2038/11, 1636/9, 2038/50, 2038/51 v k. ú. Všeruby u Plzně, **SO 102 Úprava silnice III/2051**, umístěný na pozemku parc. č.: 581/1,

597/41, 597/42, 177/20, 177/21, 177/22, 177/23, 323/1, 200/1, 323/48, 581/2, 177/24, 581/7, 581/8, 581/9, 597/7 v k. ú. Hunčice se podle § 115 stavebního zákona

p o v o l u j e

v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání stavby, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy atd.

Rozsah stavby:

SO 101 Úprava silnice I/20: na silnici I/20 budou vloženy samostatné pruhy pro levé odbočení šířky 3,25 m v obou směrech, mezi odbočovací pruh vlevo a protisměrný jízdní pruh bude vloženy dělicí dopravní ostrůvek šířky 2,50 m; na ostrůvku ve směru na Karlovy Vary bude přes ostrůvek vedené místo pro překonání komunikace.

SO 101.1 Autobusové zastávky: stávající autobusové zastávky budou v obou směrech (Plzeň, Karlovy Vary) přeloženy do nové polohy za křižovatkou (ve směru jízdy) a budou umístěny do zastávkových zálivů s délkou nástupní hrany 18,00 m a délkou výřazovacích a zařazovacích klínů 50,00 m.

SO 102 Úprava silnice III/2051: úhel napojení silnice III/2051 ve směru na Všeruby bude upravený ze stávajících 73° na 90°, úhel napojení druhé křižovatkové větve silnice III/2051 ve směru na Hunčice bude upraven ze stávajících 53° na 90°, na obou větvích bude vloženy kapkovitý dělicí dopravní ostrůvek, ve směru na Hunčice bude přes ostrůvek vedené místo pro překonání komunikace.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, zpracované projektantem SUDOP PRAHA a. s., Olšanská 1a, 180 00 Praha 3, IČ 25793349, č. sml.: 18-300.230, datum 04/2019. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
- 2) Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby oprávněným subjektem.
- 3) Před zahájením stavebních prací musí být ověřen stav všech podzemních a nadzemních sítí v prostoru stavby. Stavebník projedná stavbu se správcem všech podzemních a nadzemních vedení, které mohou být stavbou dotčeny, za účelem vytýčení jejich tras a ochranných pásem. Výkopy v ochranném pásmu sítí je nutno provádět dle příslušných bezpečnostních opatření. Bez souhlasu vlastníka sítě (správce) nelze měnit výšku krytí dotčené sítě.
- 4) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. Stavebník je povinen neprodleně po zjištění závad na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby, ohlásit tuto skutečnost stavebnímu úřadu.
- 5) Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán na základě výběrového řízení. Název a sídlo stavebního podnikatele včetně fotokopie dokladů o jeho odborné způsobilosti a termín zahájení stavby sdělí stavebník zdejšímu odboru ještě před zahájením stavebních prací.
- 6) Stavebník zajistí technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta.

- 7) Stavebník upozorní stavebního podnikatele (zhotovitele) na řádné vedení stavebního deníku.
- 8) Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek o povolení stavby, popřípadě informační tabule s uvedením údajů ze štítku. Štítek (informační tabule) musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a musí být ponechán na místě až do vydání kolaudačního souhlasu.
- 9) Pro provedení stavby budou použity jen takové materiály, které splňují platná nařízení vlády ČR o technických požadavcích na výrobky.
- 10) Na stavebníka se vztahují povinnosti vyplývající z ustanovení § 22-23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- 11) Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky a požadavky:
 - a) **MěÚ Nýřany, Odbor životního prostředí** – koordinované stanovisko č.j.: OŽP-LEV/18652/2019 ze dne 18.6.2019
 - ve vztahu k ust. z. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny - upozornění na povinnost dodržet pravidla ČSN 83 9061 „Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“ v případech, kdy se stavba dostane do styku se stávající zelení, v případě kácení, bude požádán příslušný úřad o povolení kácení
 - investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění všech nevyužitých odpadů, které v rámci akce vzniknou, a to tak, že veškeré nevyužité odpady předá oprávněné osobě
 - před předáním odpadů oprávněné osobě, budou odpady soustředovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem
 - musí být plněny i další povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech – zejména plnění ohlašovací povinnosti
 - b) **MěÚ Nýřany, Odbor životního prostředí** – závazné stanovisko č.j.: OŽP-Čel/466/2020 ze dne 6.1.2020
 - Na základě projektové dokumentace bude provedeno vytýčení hranice odněti půdy a zajištěno její nepřekročení.
 - Před zahájením stavby skrýt odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše odnímané zemědělské půdy a zajistit její hospodárné využití. Vytěžená kulturní zemina cca 2 567 m³ - bude hospodárně využita 437m³ bude použito na rekultivaci opuštěného úseku, 1 507 m³ bude použito zpět do stavby na ohumusování zatravnovacích ploch, 623 m³ bude nabídnuto majitelům okolních pozemku k rozprostření.
 - Skrývaná kulturní vrstva půdy bude do doby jejího využití uložena na vhodném pozemku nedaleko stavby na složišti (deponii), kde bude zajištěno její řádné ošetřování a ochrana před znehodnocením a velkými ztrátami.
 - O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy, vést protokol (pracovní deník) s uvedením všech skutečností pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání skrytých zemín.

- Pokud by výstavbou došlo k zneprístupnění některých zemědělských pozemků, je nutné zřídit na ně na vlastní náklady náhradní vjezdy podle dispozic vlastníků (nájemců) pozemků.
 - Umístění staveb musí být provedeno tak, aby co nejméně narušovalo organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry v území a nedocházelo k poškozování zemědělského půdního fondu.
 - Učinit opatření k zabránění úniku látek (zejména pevných a kapalných), poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
 - Provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám.
- c) **Česká telekomunikační infrastruktura a. s. (CETIN a. s.)** - vyjádření č.j.: 634954/19 ze dne 21.5.2019
- d) **ČEZ Distribuce a. s.** – vyjádření zn.: 1104077625 ze dne 16.5.2019
- e) **Dial Telecom, a. s.** – vyjádření zn.: CR691635 ze dne 22.5.2019
- f) **České radiokomunikace a. s.** – vyjádření zn.: UPTS/OS/219624/2019 ze dne 20.5.2019
- 12) Stavebník upozorní zhotovitele na povinnost požádat v souladu s ustanovením § 77 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů u zdejšího odboru dopravy a silničního hospodářství o povolení přechodné úpravy provozu na silnicích I. třídy.
- 13) Stavebník upozorní zhotovitele na povinnost požádat v souladu s § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (min. 30 dnů před zahájením vlastních stavebních prací) u příslušného silničního správního úřadu o povolení uzavírky a objížďky stavbou dotčeného úseku stávající silnice I/20
- 14) Stavbou nesmí být dotčena práva a právem chráněné zájmy majitelů sousedních nemovitostí ani nesmí docházet k poškozování nemovitostí. Případné škody způsobené stavbou na sousedních nemovitostech budou majitelům dotčených nemovitostí uhrazeny dle platných předpisů a nařízení
- 15) Po dobu výstavby budou zabezpečeny přístupy k sousedním nemovitostem a na přilehlé pozemky nacházející se v blízkosti staveniště.
- 16) Veškeré odpady vzniklé při stavebních pracích je nutno zneškodňovat zákonným a doložitelným způsobem pouze na zařízeních k tomu určených. Evidenci likvidace odpadů ze stavby předložit při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- 17) Po dobu provádění stavby bude zajištěn bezpečný průchod chodců v částech určených k užívání veřejností. Tyto trasy musí vyhovovat ustanovením vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
- 18) Stavba a zařízení staveniště musí být řádně zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob.
- 19) Bude zamezeno šíření prašnosti a bude prováděno účinné čištění vozidel. Případné znečištění komunikační sítě v důsledku realizace stavby bude neprodleně odstraněno stavebníkem na náklady stavby.
- 20) Vozidla zhotovitele ani podzhotovitelů nebudou zajiždět a nebudou odstavována na zelených plochách mimo obvod staveniště.
- 21) Pozemky dotčené předmětnou stavbou budou po jejím ukončení uvedeny do původního stavu.

22) Kontrolní prohlídka bude provedena v těchto fázích (lze termínově spojit s pravidelně konanými kontrolními dny stavby):

- při výstavbě levé poloviny I/20 do staničení cca 0,250 km, autobusové zastávky a větve silnice III/2051 do Všerub
- při výstavbě levé poloviny I/20 od staničení cca. 0,250 km na konec úseku
- při výstavbě pravé poloviny I/20 od staničení cca 0,250 km na konec úseku, sil. III/2051 do Hunčic, k napojení na stávající III/2051
- při výstavbě pravé strany I/20 v rozsahu staničení km 0,170 – 0,250, propojení stávající III/2051 a nového úseku III/2051 ve směru do Hunčic
- při výstavbě pravé strany I/20 od začátku úseku do staničení cca. 0,170 km
- po provedení obrusné vrstvy, svíslého a vodorovného dopravního značení
- závěrečná kontrolní prohlídka

Datum ukončení těchto fází oznámí písemně stavebník zdejšímu odboru dopravy a silničního hospodářství.

23) Po dokončení stavby je stavebník povinen předložit v souladu s ust. § 122 stavebního zákona zdejšímu odboru žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu se řídí ust. § 18i vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

24) Stavba bude dokončena **do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí**

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., IČ 72053119, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Obec Lišťany, Státní pozemkový úřad, Státní statek Jeneč v likvidaci, ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a. s., České radiokomunikace a. s., Dial Telecom, a. s., Info Tel, spol. s. r. o., [REDACTED]

Odůvodnění

Dne 30.9.2019 byla zdejšímu odboru doručena žádost stavebníka Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ: 65993390, v zastoupení SUDOP PRAHA a. s., se sídlem Olšanská 1a, 180 00 Praha 3, IČ 25793349 o vydání stavebního povolení na stavbu „I/20 Všeruby – Hunčice, úprava křižovatky se sil. III/2051“, v rozsahu stavebních objektů SO 101 Úprava silnice I/20, SO 101.1 Autobusové zastávky, umístěný na pozemku parc. č. 581/1, 597/41, 597/42, 177/18, 177/20, 177/21, 206/5, 200/1, 323/48, 177/19, 597/7, 597/35, 597/36, 597/37, 597/38, 597/39, 597/40 v k. ú. Hunčice, parc. č. 1626/12, 2038/11, 1636/9, 2038/50, 2038/51 v k. ú. Všeruby u Plzně, SO 102 Úprava silnice III/2051, umístěný na pozemku parc. č.: 581/1, 597/41, 597/42, 177/20, 177/21, 177/22, 177/23, 323/1, 200/1, 323/48, 581/2, 177/24, 581/7, 581/8, 581/9, 597/7 v k. ú. Hunčice. Návrh byl doložen dokumentací ke stavebnímu povolení vypracovanou projektantem právnické osoby SUDOP PRAHA a. s., se sídlem Olšanská 1a, 180 00 Praha 3, IČ 25793349. Žádost byla doplněna dne 13.1.2020 a byla tedy doložena těmito podklady, rozhodnutími a stanovisky:

- plná moc – Ředitelství silnic a dálnic ČR k zastupování SUDOP PRAHA a. s. ze dne 29.10.2018

- územní rozhodnutí ze dne 24.4.2018, č. j.: 3261/2017/MUT-12 – Městský úřad Město Touškov, stavební úřad
- souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona ze dne 31.5.20019, č.j.: 1238/2019/MUMT-3 – Městský úřad Město Touškov, stavební úřad
- závazné stanovisko ze dne 6.1.2020, č.j.: OŽP-Čel/466/2020 – Městský úřad Nýřany, Odbor životního prostředí
- sdělení ze dne 24.5.2019, č.j.: PK-DSH/5717/19 – Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a SH
- rozhodnutí ze dne 26.6.2017, č. j.: DSH/7598/17 - Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a SH
- vyjádření ze dne 28.5.2019, č. j.: PK-ŽP/7772/19 - Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí
- stanovisko ze dne 4.7.2019, č.j.: OD-Fro/15893/2019 – Městský úřad Nýřany, odbor dopravy
- koordinované stanovisko ze dne 18.6.2019, č.j.: OŽP-LEV/18652/2019 – Městský úřad Nýřany, odbor životního prostředí
- stanovisko ze dne 17.6.2019, č. j.: KRPP-74263-1/ČJ-2019-0300DP – Policie ČR, KŘP Plzeňského kraje, odbor služby dopravní policie
- závazné stanovisko ze dne 29.5.2019, č.j.: KHSPL/13054/21/2019 – Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
- závazné stanovisko ze dne 4.6.2019, č.j.: HSPM-716-6/2017 ÚPP – Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství
- sdělení ze dne 15.8.2019, zn.: 1057/19/SÚSPK-PS/MP – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.
- vyjádření ze dne 21.5.2019, č.j.: 634954/19 – CETIN a. s.
- vyjádření ze dne 5.6.2019, zn.: 1104077625 – ČEZ Distribuce, a. s.
- vyjádření ze dne 9.9.2019, zn.: A1728/2019 – Info Tel, spol. s r. o.
- vyjádření ze dne 22.5.2019, zn.: CR691635 – Dial Telecom, a. s.
- vyjádření ze dne 20.5.2019, zn.: UPTS/OS/219624/2019 – České Radiokomunikace a. s.
- stanovisko ze dne 27.5.2019, zn.: 203/19 – Obec Líšňany
- souhlas ze dne 17.6.2019, č.j.: 114/2019 – Město Všeruby

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný speciální stavební úřad opatřením ze dne 10.10.2019 oznámil zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení a vzhledem k tomu, že žádost spolu s projektovou dokumentací po doplnění poskytovala dostatečný podklad pro řádné posouzení navrhované stavby (podání obsahovalo vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a účastníků řízení) a stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště, upustil ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání a stanovil lhůtu pro námítky, popřípadě důkazy účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů. Zároveň účastníky řízení seznámil s tím, že na uvedené stavební řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů.

V průběhu řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 109

stavebního zákona. Současně speciální stavební úřad v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost o vydání stavebního povolení a připojené podklady z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona. Všechna vyjádření byla zkoordinována a stanovené podmínky zakotveny do podmínek vydávaného povolení. Stavební úřad zahrnul do podmínek rozhodnutí toliko odkazy na stanoviska a vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné infrastruktury, jelikož jsou nedílnou součástí dokladové části projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem a podmínky k provedení stavby vyplývají ze zákonných ustanovení jednotlivých provozovatelů veřejné technické infrastruktury.

Ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníci řízení podle § 109 písm. e) až f) stavebního zákona identifikováni v souladu s ust. § 27 odst. 2, odst. 3 správního řádu: [REDAKCE]

Stanoviska ke stavebnímu řízení sdělili:

Po zahájení stavebního řízení dotčené orgány nesdělili svá stanoviska.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:

V rámci tohoto stavebního řízení účastníci řízení neuplatnili návrhy a námítky. Účastník řízení pan [REDAKCE] dne 17.10.2019 a pan [REDAKCE] den 21.10.2019 nahlédli do projektové dokumentace „I/20 Všeruby – Hunčice, úprava křižovatky se sil. III/2051“, v rozsahu stavebních objektů SO 101 Úprava silnice I/20, SO 101.1 Autobusové zastávky, SO 102 Úprava silnice III/2051 a po nahlédnutí do projektové dokumentace neuplatnili v rámci řízení připomínky, návrhy ani námítky.

Současně speciální stavební úřad v průběhu řízení přezkoumal žádost o vydání stavebního povolení a připojené podklady z hledisek uvedených v § 108 – § 111 stavebního zákona. V rámci řízení bylo v souladu s § 15 stavebního zákona ověřeno, že uvedená stavba je v souladu s vydaným územním rozhodnutím ze dne 24.4.2018, č.j.: 3261/2017/MUT-12. Všechna vyjádření a stanoviska byla zkoordinována a stanovené podmínky byly zakotveny do podmínek povolení. Ze strany vlastníků a provozovatelů veřejné technické infrastruktury stavební úřad zahrnul do podmínek toliko odkazy na stanoviska a vyjádření, jelikož tyto jsou nedílnou součástí dokladové části projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem a podmínky k provedení stavby vyplývají ze zákonných ustanovení jednotlivých provozovatelů veřejné technické infrastruktury.

Dále bylo zjištěno, že projektová dokumentace stavby je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, je úplná, přehledná a řeší v odpovídající míře obecné požadavky na výstavbu, je zpracována oprávněnou osobou a předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Vzhledem k tomu, že speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu dopravy ČR v Praze, a to podáním učiněným u Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství.

Odvolání má odkladný účinek.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 74 správního řádu).

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena (§ 115 odst. 4 stavebního zákona).

Na uvedené řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů.



vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

podepsáno elektronicky

Ověřená projektová dokumentace stavby (paré č. 2) a štítek „Stavba povolena“ budou stavebníkovi – Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 546/56, IČ 65993390, zastoupené [redacted] pověřeným řízením Správy Plzeň předány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Dle položky č. 18, která je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, je od poplatku osvobozeno vydání stavebního povolení v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem.

Obdrží:

Účastníci řízení

Účastníci řízení s postavením účastníků řízení dle § 27 odst. 1 právního řádu (účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona)

- stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, zastoupení: SUDOP PRAHA a. s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň
- Obec Líšřany, Líšřany 77, PSČ 330 35
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

- Státní statek Jeneč v likvidaci, Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/7, 405 02 Děčín
- CETIN, a. s., Olčanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- České radiokomunikace a. s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6
- Dial Telecom, a. s., Křížikova 237/36a, 186 00 Praha 8
- InfoTel, spol. s r. o., Novolišeňská 2678/18, 328 00 Brno

Účastníci řízení s postavením účastníků řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona)

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- TJ Sokol Hunčice, Hunčice, 330 35 Líšňany
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- Římskokatolická farnost Dolní Bělá, Dolní Bělá 41, PSČ 331 52
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

Dotčené orgány

- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Skrétova 15, 303 22 Plzeň
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
- Policie ČR, KŘ policie Plzeňského kraje, odbor služby dopravní policie, Nádražní 2, 306 28 Plzeň
- Městský úřad Město Touškov, stavební úřad, Dolní náměstí 1, 330 33 Město Touškov
- MěÚ Nýřany, pracoviště Plzeň, Odbor životního prostředí, Americká 39, 304 66 Plzeň
- MěÚ Nýřany, pracoviště Plzeň, Odbor územního plánování, Americká 39, 304 66 Plzeň


Na vědomí

- vlastní k založení

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
odbor dopravy a silničního hospodářství

STAVBA POVOLENA

Rozhodnutím odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Plzeňského kraje
dne 13.1.2020, pod čj.: PK-DSH/11504/19, které nabylo právní moci dne 10.6.2020.


vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


Místo stavby: k. ú. Hunčice, k. ú. Všeruby u Plzně

Druh stavby: I/20 Všeruby – Hunčice, úprava křižovatky se
sil. III/2051

Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Plzeň

Dokončení stavby: 10.6.2022

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Naše č. j.: PK-DSH/5926/22
Spis. zn.: ZN/1341/DSH/22
Počet listů:
Počet příloh:
Počet listů příloh:

Vyřizuje: [REDACTED]

Datum: 18.1.2023

R O Z H O D N U T Í

prodloužení platnosti stavebního povolení a lhůty k dokončení stavby

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad, příslušný podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vydal stavebníku Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň, IČ 65993390, dne 13.1.2020, pod čj. PK-DSH/11504/19 stavební povolení na stavbu „**I/20 Všeruby – Hunčice, úprava křižovatky se silnicí III/2051**“, na pozemcích parc. č. 177/22, 177/30, 177/32, 177/33, 200/3, 200/4, 206/6, 323/105, 323/106, 323/107, 323/108, 581/1, 581/2, 581/7, 581/8, 581/15, 597/7, 597/35, 597/26, 597/42, 597/43 v k. ú. Hunčice a parc. č.: 2038/11 v k. ú. Všeruby u Plzně, které nabylo právní moci dne 10.6.2020.

Na základě žádosti stavebníka Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 546/56, IČ 65993390, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň, ze dne 31.5.2022 zdejší speciální stavební úřad

1. podle § 115 odst. 4 stavebního zákona **prodlužuje** platnost shora uvedeného stavebního povolení **do 31. prosince 2024**.
2. podle § 118 stavebního zákona povoluje změnu stavby před jejím dokončením, spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby **do dvou let od zahájení stavebních prací**.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 31.5.2022 oznámil stavebník - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň, IČ 65993390, že realizaci stavby „**I/20 Všeruby – Hunčice, úprava křižovatky se silnicí III/2051**“ na pozemcích parc. č. 177/22, 177/30, 177/32, 177/33, 200/3, 200/4, 206/6, 323/105, 323/106, 323/107, 323/108, 581/1, 581/2, 581/7, 581/8, 581/15, 597/7, 597/35, 597/26, 597/42, 597/43 v k. ú. Hunčice a parc. č.: 2038/11 v k. ú. Všeruby u Plzně, nebylo možné zahájit a dokončit v termínu uvedeném ve stavebním povolení ze dne 13.1.2020, pod č. j.: PK-DSH/11504/19, které nabylo právní moci dne 10.6.2020, z důvodu složitých a zdlouhavých majetkoprávních jednání s vlastníky dotčených pozemků. Dne 25.10.2022 žadatel žádost doplnil.


Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný speciální stavební úřad opatřením vydaným dne 26.10.2022, pod čj. PK-DSH/12485/22 oznámil zahájení řízení o prodloužení stavebního povolení a lhůty k dokončení stavby dotčeným orgánům státní správy a účastníkům řízení a vzhledem k tomu, že žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště, upustil ve smyslu §112, odst. 2 stavebního zákona od ústního projednání a místního šetření. Ve lhůtě určené k uplatnění námitek, připomínek a stanovisek, neuplatnil žádný účastník řízení ani dotčené orgány státní správy námítky, připomínky ani stanoviska.

Skutečnost, že stavba nemohla být zahájena v době platnosti stavebního povolení, bylo zdůvodněno zdlouhavými majetkoprávními jednáními s vlastníky dotčených pozemků.

Speciální stavební úřad v řízení posoudil uvedený důvod, a protože předpoklady a podmínky, za kterých bylo stavební povolení vydáno, se nezměnily, zejména zůstala v platnosti stanoviska spolupůsobících dotčených orgánů státní správy, žádosti vyhověl.

P o u č e n í :

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu dopravy v Praze prostřednictvím odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Plzeňského kraje.


vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

podepsáno elektronicky

Obdrží:Účastníci řízení:*Účastníci řízení dle § 109 písm. a) až písm. d) stavebního zákona*

- stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň,
- Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň
- Obec Líšňany, Líšňany 77, 330 35 Líšňany
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
- České Radiokomunikace a. s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
- InfoTel, spol. s r. o., Novolíšeňská 2678/18, 628 00 Brno
- Quantcom, a. s., Křížíkova 237/36a, 186 00 Praha 8
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Účastníci řízení dle § 109 písm. e) písm. f) stavebního zákona

- Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond a. s., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Dotčené orgány:

- Policie ČR, KŘ policie Plzeňského kraje, odbor služby dopravní policie, Nádražní 2, 306 28 Plzeň
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 1188/15, 301 00 Plzeň
- Městský úřad Město Touškov, stavební úřad, Dolní náměstí 1, 330 33 Město Touškov
- Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, Odbor životního prostředí, Americká 39, 304 66 Plzeň
- Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, Odbor územního plánování, Americká 39, 304 66 Plzeň

Na vědomí

- vlastní k založení

POVĚŘENÍ

Obchodní korporace **CETIN a.s.**, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („**Společnost**“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje zaměstnance pana


Manažer

os. č. 
(„**Zaměstnanec**“)

adresa pro doručování: CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19,
Libeň, 190 00 Praha 9, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě, smlouvy nájemní a podnájemní k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- projednával a uzavíral smlouvy kupní, jejichž předmětem je koupě či prodej veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o realizaci, jejichž předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005 (dále jen „Překládka“) Společnosti pro stavebníka bez limitu,

- projednával jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění všech zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou,
- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti,
- uzavíral veřejnoprávní smlouvy nahrazující správní rozhodnutí v oblasti výstavby sítí elektronických komunikací,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo ukončení shora uvedených právních vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku **1.000.000,- Kč** (slovy: jeden milion korun českých).

Zaměstnanec je dále oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku **5.000.000,- Kč** (slovy: pět milionů korun českých).

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající zrušenému závazku.

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 10.6.2023. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne uvedeného na obrazu elektronického podpisu níže.

CETIN a.s.

Představenstvo

Toto pověření je elektronicky podepsáno, obraz elektronického podpisu naleznete níže, metadata užítých certifikátů jsou obsažena ve vlastnostech dokumentu.

č.j.: 20971/22/SÚSPK-P

POVĚŘENÍ

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (dále jen „organizace“) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle Pr, vložka 737 se sídlem: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň – Koterov
IČ: 72053119
DIČ: CZ72053119
zastoupena: Ing. Miroslavem Doležalem, generálním ředitelem

tímto pověřuje pana **Mgr. Martina Víta, MPA**,
nar.: [REDAKCE],
trvale bytem: [REDAKCE]

k tomu, aby ji zastupoval při právních jednáních, a to v rozsahu kompetencí generálního ředitele organizace, včetně podepisování smluv či dohod, a to:

1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti nebo reálného břemene);
2. Smlouva o zřízení věcného břemene (služebnosti nebo reálného břemene);
3. Smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka – PK investor;
4. Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení;
5. Smlouva o provedení překládky telekomunikačního zařízení;
6. Smlouva o smlouvě budoucí o zajištění přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie;
7. Smlouva o zajištění přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie;
8. Smlouva o zvláštním užívání silnic (v nichž je organizace v postavení správce komunikace, resp. vykonává vlastnické oprávnění Plzeňského kraje) třetími stranami dle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích;
9. Smlouva o omezení užívání nemovitosti (v nichž je organizace v postavení správce komunikace, resp. vykonává vlastnické oprávnění Plzeňského kraje), jejímž předmětem je stanovení podmínek při provádění stavebních prací v komunikaci anebo pozemku a uložení inženýrské sítě do silničního pozemku, na něm nebo na mostních objektech za účelem zvláštního užívání dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích;
10. Dohoda o technických podmínkách při zvláštním užívání komunikace (v nichž je organizace v postavení správce komunikace, resp. vykonává vlastnické oprávnění Plzeňského kraje).

Toto pověření nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Plzni dne

26 -09- 2022

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Koterovská 162, 326 00 Plzeň
IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel

V Plzni dne

Pověření přijímám

Mgr. Martin Vít, MPA

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr, vložka č. 737
IČO: 72053119
DIČ: CZ72053119

Pracoviště:
Koterovská 162
326 00 Plzeň

Tel.: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
