

SMLOUVA O DÍLO

na provedení stavebních prací uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Rudná, IČ: 00233773

na adrese Městského úřadu Rudná, Masarykova 94, PSČ: 252 19 Rudná

Zastupuje : Lubomír Kocman, starosta obce

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 0388165329/0800

a

Zhotovitel:

Petr Majer - Elektro

se sídlem Panská Zahrada 477, 252 31 Všenory

IČ: 47566647

DIČ: CZ7305260061

Bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 115-8488100297/0100

zapsaný u MÚ ŽÚ pod č.j. 210/93/V/Hu

Zastupuje: Petr Majer

uzavřeli níže uvedeného dne měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo na provedení stavebních a montážních prací (dále také „SOD“).

II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ, ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Název díla: „Veřejné osvětlení v části ulic Sládkova a Jinočanská“

1. Místo stavby: Rudná, k.ú. Dušníky u Rudné.
2. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti ani důvody bránící uzavřít tuto smlouvu o dílo (SOD) a dále prohlašují, že veškeré o nich uváděné údaje jsou správné. Smluvní strany se zavázaly, že v případě změny údajů jsou povinny o nich neprodleně písemně informovat objednatele; dojde-li ke změně sídla zhotovitele a tento ji prokazatelně objednateli neoznámí, platí důsledky doručení do sídla zhotovitele dle této SOD.
3. Objednatel se zhotovitelem uzavřel tuto SOD na základě skutečnosti, že nabídka zhotovitele na provedení předmětu díla byla vybrána ve výběrovém řízení vedeném pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce jako nabídka nejvýhodnější.
4. Závazek zhotovitele: „Zhotovitel je povinen ode dne zahájení prací umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

III. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla dle této SOD je stavba dle jejího odst. II čl. 1. této SOD, kterou vymezuje

- a) Dokumentace pro provádění stavby.
- b) Výkaz výměr oceněný zhotovitelem a podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „Rozpočet“).
- c) Podmínky územního rozhodnutí dopadajícími na zhotovitele.
- d) Podmínky pro provedení díla uvedené ve Výzvě k podání nabídky.
- e) Uchazeč je v průběhu stavby povinen spolupracovat s TDI a reagovat na jeho požadavky v souvislosti s prováděním stavebních prací.

IV. LHŮTY VÝSTAVBY

1. Dílo bude provedeno v těchto termínech:
 - a) předání staveniště/zahájení prací:dle postupu prací pro ČEZ.....
 - b) předání a převzetí celého díla: dle postupu prací pro ČEZ.....
2. Uchazeč je povinen převzít staveniště (nebo jeho část) do 5 dnů od výzvy zadavatele.
 - a) Dokladem o předání staveniště a zahájení prací je datovaný Zápis o předání staveniště
 - b) Dokladem o ukončení prací je datovaný Zápis o předání a převzetí díla
 - c) Dokladem o odstranění vad a nedodělků datovaný Zápis o odstranění vad a nedodělků
 - d) Dokladem o předání staveniště zpět objednateli je Zápis o likvidaci staveniště.
3. Objednatel je povinen od zhotovitele převzít řádně provedené dílo i před sjednaným termínem.
4. Jestliže Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nikoli z důvodů ležících na straně zhotovitele po termínu dle odst. 3 tohoto článku, prodlužuje se termín plnění o počet dní rovnající se prodlení objednatele.
5. Vyšší moc: Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných událostí mimořádné povahy, které zavazují jednu ze smluvních stran tak, že nemůže svému závazku dostát. Uvedené platí za podmínky, že strana postižená vyšší mocí splní povinnost do 5 (pěti) dnů prokazatelně informovat druhou stranu o výsledku vyšší moci a provede neodkladně všechna opatření k vyloučení škod.

V. CENA ZA DÍLO

1. Smluvní strany sjednaly pevnou smluvní cenu díla ve výši
 - o 644 796 nabídková cena bez DPH
 - o 135 407 výše DPH (21%)
 - o **780 203** nabídková cena s DPH
2. Změna smluvní ceny z titulu změny stávající zákonné úpravy DPH není považována za porušení této SOD.
3. Smluvní strany prohlašují, že dílo bylo zadáno dle oceněného výkazu výměr. Pro účely této SOD se práce hrazené nad rámec rozpočtu považují za vícepráce.
4. Zhotovitel díla prohlašuje, že zpracoval závaznou cenu za dílo podle projektové dokumentace, jejíž součástí je výkaz výměr, seznámil se s podmínkami místa plnění a že

nenalezl rozdíly mezi PD a výkazem výměr a tyto rozdíly neuvedl v nabídce. Původ rozdílů neoznačil a neocenil mimo nabídkovou cenu včetně vyčíslení dopadu do nabídkové ceny.

5. Zhotovitel díla závazně prohlašuje, že smluvní cena díla dle odst. 1 tohoto článku obsahuje veškeré jeho náklady na řádné a včasné provedení předmětu zakázky dle této SOD.
6. Pro účtování víceprací či méněprací platí oceněné položky v Rozpočtu jako jednotkové ceny. V ostatních případech budou sjednány dohodou na základě kalkulace zhotovitele. Součástí ocenění víceprací cen nebudou vedlejší, doplňkové ani jiné doprovodné náklady včetně parciálního podílu z částky na ZS.
7. Objednatel hradí prováděné práce 1 fakturou po dokončení díla, jeho předání a převzetí a po odstranění vad a nedodělků.
8. Vícepráce:
 - a) vícepracemi se rozumí práce vyžádané objednatelem navíc oproti předmětu plnění dle této SOD (změna technologie, změna materiálů) a vícepráce, mající původ v chybném nebo nedostatečném Prováděcím projektu či Rozpočtu,
 - b) vícepracemi se rozumí i náklady spojené s provedením prací, které jsou pro řádné provedení předmětu této VZ nezbytné, ale které nebylo možno ani při vynaložení potřebné odborné péče předvídat co do množství nebo druhovosti,
 - c) za vícepráce se nepovažují práce dodávky mající původ v pochybení zhotovitele nebo jeho subdodavatelů.
9. Úhrada víceprací:
 - a) vícepráce je možno provést pouze tehdy, jestliže se na tom smluvní strany dohodnou, a to na základě podkladů od Technického dozoru zadavatele a stavbyvedoucího. V případě sporu bude směrodatné stanovisko zpracovatele projektové dokumentace,
 - b) pro ocenění víceprací platí, že ve výkazu výměr uvedené ceny jednotlivých položek jsou cenami jednotkovými; do ocenění víceprací nelze zahrnout vedlejší, doplňkové či jiné náklady včetně nákladů na zřízení a provozování staveniště,
 - c) vícepráce neobsažené ve výkazu výměr uchazeč ocení formou cenové kalkulace, kterou musí zadavatel odsouhlasit,
 - d) podmínky dle a) až d) je nutno splnit před započatím provádění víceprací.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Platby se mezi smluvními stranami uskutečňují bezhotovostním platebním stykem. Platba je provedena připsáním dlužné částky na účet věřitelské smluvní strany. Totéž se týká způsobu úhrady penalizačních faktur.
2. Objednatel prohlašuje, že má ke dni dohodnutého termínu zahájení prací projednáno financování stavby a zavazuje se k zaplacení ceny za dílo dle této SOD.
3. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy. Objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce po řádném provedení díla či jeho částí; dokladem je Zápis o jeho předání a převzetí. Splatnost faktury je 14 dní.
4. Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu; objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Pokud fakturu nevrátí do osmi dnů, má se za to, že s ní souhlasí. V případě vrácení faktury je zhotovitel povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a lhůta splatnosti opravené faktury počíná znovu.



VII. SMLUVNÍ POKUTA, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel má právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu:
 - a) 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení oproti sjednanému termínu ukončení
 - b) 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady díla uvedené v Zápisu o předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel má právo účtovat objednateli za každý den prodlení s úhradou jednotlivých faktur nebo konečné faktury anebo zádržného smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SOD z důvodů uvedených v občanském zákoníku. Smluvní strany mimo to sjednaly, že za hrubé porušení povinností zhotovitele považují jeho prodlení oproti harmonogramu postupu stavby o více jak 30 dnů.
4. V ostatním smluvní strany při odstoupení od SOD postupují podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

VIII. Provádění prací

1. Zhotovitel bude realizovat stavbu dle PD zpracované v srpnu 2021.
2. Zhotovitel bude respektovat požadavky obsažené ve vyjádřeních a stanoviscích příslušných orgánů, majitelů a správců sítí technického vybavení.
3. Zhotovitel před zahájením prací projedná a v předstihu zajistí potřebné dopravně inženýrské opatření k této stavbě pro zachování bezpečného provozu v místech provádění prací.
5. V případě potřeby většího dopravního omezení je nutné v předstihu požádat o stanovení Přečasných úprav provozu na pozemní komunikaci.
4. Zhotovitel provede geodetické zaměření dokončeného díla a příp. dokumentaci skutečného provedení, které bude předáno v jednom písemném a v jednom elektronickém vyhotovení.
5. Zhotovitel vede po celou dobu provádění díla stavební deník (SD) v rozsahu § 6 vyhl. 499/2006 Sb., přičemž do SD bude učiněn i Zápis o předání staveniště včetně uvedení kontaktů na stavbyvedoucího a technický dozor investora (TDI).
6. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě a za sjednanou cenu; v případě subdodávek ručí, jakoby plnil sám. Ve stejném rozsahu zhotovitel odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku na staveništi, jakož i dodržování předpisů o nakládání s odpady.
7. Zhotovitel při předání staveniště oznámí objednateli jméno stavbyvedoucího, jeho zástupce a kontakty na ně.
8. TDI průběžně kontroluje provádění díla a SD, kde kromě zápisů podepisuje i konce jednotlivých listů a odebírá první kopie listů; TDI v případě potřeby k zápisu stavbyvedoucího připojí své stanovisko.
9. Zhotovitel bude ve spolupráci s objednatelem, v nezbytném předstihu informovat vlastníky nemovitostí podél opravované komunikace (chodníku) o zahájení a ukončení prací.
10. Zhotovitelem požadované změny oproti zadání a použití náhradních hmot a výrobků musí odsouhlasit zástupci objednatele ve SD. Použitím náhradních hmot a výrobků nesmí dojít ke zhoršení kvality díla ani navýšení ceny díla.
11. Zhotovitel odpovídá za dodržování právních předpisů v platném znění, zejména požární ochrany, životního prostředí, bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi, včetně zabezpečení dotčených veřejných prostranství.
12. Zhotovitel díla je povinen poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi bezpečnosti

práce na stavbě, bude-li ustaven, a v takovém případě plnit povinnosti vyplývající pro zhotovitele stavby z ustanovení zákona č. 309/2006 Sb.

13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním povinností, vyplývajících ze zákona, ČSN nebo závazků vyplývajících z této SOD, je zhotovitel povinen bez zbytečného odklad tuto škodu odstranit a není - li to možné, tak finančně uhradit.
Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu u pojišťovny Kooperativa a toto pojištění udrží po celou dobu plnění této SOD.
14. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním uzavřené SOD na webových stránkách Města Rudná.
15. Předání a převzetí díla bude provedeno takto:
 - a) zhotovitel vyzve objednatele alespoň 2 pracovní dny předem k předání a převzetí řádně provedeného díla a to zápisem v SD nebo jiným prokazatelným způsobem; součástí přejímky je zejména vizuální kontrola provedeného díla a osvědčení o jakosti použitých materiálů a doklady prokazující jakost díla dle Dokumentace,
 - b) dojde-li k odchylkám v niveletě opravovaných komunikací, které mají dopad na okolní zástavbu, bude součástí plnění i zakreslení těchto změn do Dokumentace,
 - c) smluvní strany sepiší o předání a převzetí provedeného díla Protokol, který podepíše oprávněný zástupce zhotovitele a stavbyvedoucí a oprávněný zástupce objednatele a TDI; nedílnou součástí Zápisu je seznam zjištěných vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění,
 - d) zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést plochy dotčené prováděním prací do 5ti dnů po předání a převzetí díla do původního stavu; o vyklizení staveniště a jeho předání sepiší stavbyvedoucí a TDI zápis do SD,
 - e) jestliže se tak smluvní strany dohodnou, lze dílo přejímat po ucelených částech; postup je obdobný jako u ad c).

IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

1. Zhotovitel je odpovědný za vady díla, které má dílo v době předání díla; tyto je povinen bez zbytečného odkladu odstranit na svůj náklad v termínech uvedených v Příloze Zápisu o předání a převzetí díla.
2. Smluvní strany sjednaly záruční lhůtu díla v trvání 60 měsíců. Běh záruční lhůty počíná dnem podepsání Zápisu o předání a převzetí celého díla smluvními stranami a správcem zadavatele.
3. Objednatel je povinen písemně ohlásit (reklamovat) zhotoviteli výskyt skrytých vad bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil a uvede, jak se projevují. Zhotovitel je povinen odstranit řádně reklamovanou vadu díla na svůj náklad bez zbytečného odkladu; objednatel mu v takovém případě poskytne potřebné spolupůsobení.
4. Jestliže zhotovitel neodstraní reklamované vady dle, odst. 3 tohoto článku ani po opakované výzvě objednatele, je objednatel oprávněn si zajistit odstranění těchto vad sám a náklady s tím spojené vyúčtovat zhotoviteli.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené jeho poškozením, neodborným provozováním nebo nedostatečnou údržbou.

X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


1. Přílohy uváděné v této SOD jsou její nedílnou součástí.



2. Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel nepostoupí pohledávku ani její část bez výslovného souhlasu objednatele a dále, že žádná smluvní strana nepostoupí svá práva a povinnosti z této SOD nebo z její části třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.
3. Zhotovitel se zavazuje neuplatnit vůči zadavateli žádné sankce ani náhrady škody pro případ, že zadavatel s ohledem na své finanční možnosti zúží předmět plnění této SOD, nebo se rozhodne z těchto důvodů dílo vůbec nerealizovat. Zhotovitel se dále zavazuje, že zúžení předmětu plnění pro něj nebude důvodem k odstoupení od této SOD.
4. Technický dozor u stavby, která je předmětem díla dle této SOD, nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
5. Změny a doplňky této SOD musí mít podobu písemných číslovaných Dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Vztahy smluvních stran neupravené touto SOD se řídí příslušnými ustanoveními platného znění občanského zákoníku.
6. Tato SOD nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran za podmínky jejího schválení zastupitelstvem Města Rudná.
7. Tato SOD je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.

Rudná dne 8.3.2023

Petr Majer




.....
(podpisy dle OR

nebo Živnostenského oprávnění)

Město Rudná

Lubomír Kocman

starosta

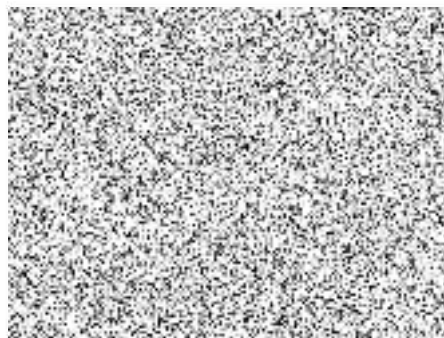

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rudná, Sládkova, Palackého - veřejné osvětlení	Objednatel:	Město Rudná	IČ/DIČ:	00233773/
Druh stavby:	Veřejné osvětlení	Projektant:	Jiří Majer	IČ/DIČ:	12372285/
Lokalita:		Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	65
JKSO:		Zpracoval:	Petr Majer	Datum:	20.02.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Výchozí revize	6 500,00	Zařízení staveniště	0,00	Mimostav. doprava	0,00
	Montáž	0,00		4 500,00		0,00		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Montážní plošina	16 200,00	Územní vlivy	0,00	Provozní vlivy	0,00
	Montáž	0,00		4 800,00		0,00		0,00
"M"	Dodávky	0,00	Geodet. práce	15 800,00	Ostatní	0,00	NUS z rozpočtu	0,00
	Montáž	215 556,10		2 500,00		0,00		0,00
Ostatní materiál		378 940,05						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		594 496,15	DN celkem		50 300,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
					ORN celkem		0,00	
					ORN celkem z obj.		0,00	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	644 796,15
Základ 21%	644 796,15	DPH 21%	135 407,19	Celkem včetně DPH	780 203,34

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		20.02.2023 Petr Majer
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



Chy

Stavební rozpočet

Název stavby:	Rudná, Stádkova, Palackého - veřejné osvětlení	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Rudná
Druh stavby:	Veřejné osvětlení	Začátek výstavby:		Projektant:	Jiří Majer
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	20.02.2023	Zpracoval:	Petr Majer

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
		M21	Elektromontáže				0,00	116 768,98	116 768,98
1			Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	8,00	804,99	0,00	6 439,92	6 439,92
2			Stožár osvětlovací ocelový délky do 8 m	kus	5,00	1 633,00	0,00	8 165,00	8 165,00
3			Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	13,00	652,99	0,00	8 488,87	8 488,87
4			Montáž svítidla veřejného osvětlení	kus	13,00	559,00	0,00	7 267,00	7 267,00
5			Stožárová manžeta	kus	13,00	402,50	0,00	5 232,50	5 232,50
6			Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2	m	98,00	33,50	0,00	3 283,00	3 283,00
7			Kabel CYKY 750 V 4x10 mm2	m	560,00	39,90	0,00	22 344,00	22 344,00
8			Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2	m	430,00	57,40	0,00	24 682,00	24 682,00
9			Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	33,00	76,49	0,00	2 524,17	2 524,17
10			Svorka uzemňovací nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, altd/	kus	39,00	133,00	0,00	5 187,00	5 187,00
11			Ukončení kabelů do 4x10 mm2	kus	36,00	116,00	0,00	4 176,00	4 176,00
12			Ukončení kabelů do 3 x 4 mm2	kus	13,00	95,70	0,00	1 244,10	1 244,10
13			Ukončení vodičů - zapojení do 10 mm2	kus	144,00	39,29	0,00	5 657,76	5 657,76
14			Ukončení vodičů svorkováním	kus	2,00	136,00	0,00	272,00	272,00
15			Spojka pro plast kabely 1kV, do 4x25 mm2	kus	2,00	1 662,99	0,00	3 325,98	3 325,98
16			Štítek označovací na kabel	kus	34,00	12,00	0,00	408,00	408,00
17			Pojistka montáž	kus	13,00	7,49	0,00	97,37	97,37
18			Trubka ocelová závitová uložená pevně, 29 mm	m	6,00	75,59	0,00	453,54	453,54
19			Konstrukce nosná Bandimex pro zařízení do 5 kg	kus	10,00	148,99	0,00	1 489,90	1 489,90
20			Skříň přechodová SP100	kus	1,00	494,00	0,00	494,00	494,00
21			Skříň přechodová SP200	kus	1,00	494,00	0,00	494,00	494,00
22			Vypnutí vedení a zajištění tabulkou proti zapnutí	kus	2,00	85,99	0,00	171,98	171,98
23			Odpojení kabelů do 3 x 4 mm2	kus	9,00	47,81	0,00	430,29	430,29
24			Demontáž svítidla veřejného osvětlení	kus	9,00	280,00	0,00	2 520,00	2 520,00
25			Demontáž - konzola na stožáry a špičáky	kus	9,00	120,00	0,00	1 080,00	1 080,00
26			Demontáž vodiče pro vedení NN do 70 mm2	km	0,30	2 802,00	0,00	840,60	840,60
		M46	Zemní práce při montážích				0,00	98 787,12	98 787,12
27			Vytýčení kabelové trasy	km	0,43	2 000,00	0,00	860,00	860,00
28			Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	430,00	10,80	0,00	4 644,00	4 644,00
29			Trubka ochranná Kopoflex 50	m	430,00	44,21	0,00	19 010,30	19 010,30
30			Jáma pro základ stožáru	ks	13,00	1 444,00	0,00	18 772,00	18 772,00
31			Jáma - odkop u poj. skříní	kus	3,00	1 542,00	0,00	4 626,00	4 626,00
32			Základ pro stožár VO	kus	13,00	1 545,00	0,00	20 085,00	20 085,00
33			Naložení a odvoz zeminy	m3	4,00	420,00	0,00	1 680,00	1 680,00
34			Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3	m	12,00	270,50	0,00	3 246,00	3 246,00
35			Zához rýhy 35/60 cm, homina l'řidy 3, se zhutněním	m	12,00	61,00	0,00	732,00	732,00
36			Zřízení kabelového lože v rýze š. do 35 cm	m	430,00	56,50	0,00	24 295,00	24 295,00
37			Provizorní úprava terénu v přírodní homině 3	m2	18,00	46,49	0,00	836,82	836,82
			Ostatní materiál				378 940,05	0,00	378 940,05
38			Beton C16/20	m3	4,00	2 580,00	10 320,00	0,00	10 320,00
39			Kabel silový CYKY 4 x10 mm2	m	560,00	118,50	66 360,00	0,00	66 360,00
40			Kabel silový CYKY 3 x 1,5 mm2	m	98,00	18,50	1 813,00	0,00	1 813,00
41			Svorkovnice stožárová SV	kus	13,00	624,00	8 112,00	0,00	8 112,00
42			Manžeta na stožár OMP	kus	13,00	1 202,00	15 626,00	0,00	15 626,00
43			Koncovka kabelová rozdělovací	kus	36,00	110,00	3 960,00	0,00	3 960,00
44			Pojistka 6 A	kus	13,00	10,00	130,00	0,00	130,00
45			Svorka připojovací SP	kus	13,00	12,90	167,70	0,00	167,70
46			Svorka SR 3	kus	26,00	33,70	876,20	0,00	876,20
47			Spojka 1kV smršťovací SVCZ 6/35	kus	3,00	216,50	649,50	0,00	649,50
48			Trubka kabelová chránička KOPOFLEX 50	m	430,00	23,70	10 191,00	0,00	10 191,00
49			Trubka PVC 200x4,9x1000 mm	kus	13,00	320,00	4 160,00	0,00	4 160,00
50			Trubka elektro, ocelová 29 mm	m	6,00	282,50	1 695,00	0,00	1 695,00
51			Štítek kabelový	kus	34,00	9,65	328,10	0,00	328,10
52			SVÍTIDLO VOLTANA 2/5102/16 LED / 350 mA / 5247 / WW 730 / 19 W	kus	8,00	7 478,00	59 824,00	0,00	59 824,00
53			SVÍTIDLO VOLTANA 2/16 LED / 700 mA / 5102 / WW 730 / 40 W	kus	5,00	6 620,00	33 100,00	0,00	33 100,00
54			Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm	m	430,00	65,00	27 950,00	0,00	27 950,00
55			Drát pozinkovaný D 10,00 mm	kg	33,00	42,20	1 392,60	0,00	1 392,60
56			Štěrkopísek k záspy	t	12,00	235,00	2 820,00	0,00	2 820,00
57			Štěrk frakce 4-8	t	1,00	290,00	290,00	0,00	290,00
58			Skříň připojková plastová SP 100 na sloup NSP1P	kus	1,00	1 042,00	1 042,00	0,00	1 042,00
59			Skříň připojková plastová SP 200 na sloup NSP1P	kus	1,00	1 516,00	1 516,00	0,00	1 516,00
60			Fólie signalizační š. 120 mm červeno-bílá	m	530,00	4,20	2 226,00	0,00	2 226,00
61			Fólie výstražná š. 300 mm	m	430,00	5,63	2 418,75	0,00	2 418,75
62			Stožár K6	kus	8,00	6 101,00	48 808,00	0,00	48 808,00
63			Stožár osvětlovací uliční UZNA 8-133/108/89	kus	5,00	12 596,00	62 980,00	0,00	62 980,00
64			Výložník UZD1-1000/ D 89	kus	5,00	1 995,00	9 975,00	0,00	9 975,00
65			Svorka proudová odbočná Al Fe 16-70 mm2	kus	4,00	52,30	209,20	0,00	209,20
							Celkem:		594 496,15

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Rudná, Sládkova, Palackého - veřejné osvětlení	Objednatel:	Město Rudná	IČ/DIČ:	00233773/
Druh stavby:	Veřejné osvětlení	Projektant:	Jiří Majer	IČ/DIČ:	12372285/
Lokalita:		Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	65
JKSO:		Zpracoval:	Petr Majer	Datum:	20.02.2023

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Výchozí revize	6 500,00			6 500,00
Doprava pracovníků	4 500,00			4 500,00
Montážní plošina	16 200,00			16 200,00
Doprava materiálu	4 800,00			4 800,00
Geodet. práce	15 800,00			15 800,00
Koordinační činnost	2 500,00			2 500,00
Celkem DN				50 300,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				0,00

Celkem VRN	50 300,00
-------------------	------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00
